工作管理平台 使用手冊

> 適用版本:2026-10-06(含「上一步 / 下一步」、批次複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除、人員選單搜尋、風險與議題的結案審核、工時管理)
>
> 本文所有畫面都是**虛構的示範資料**(示範專案 M-100),不是任何真實專案。

目錄

1. 快速開始
2. 角色與權限
3. 看板的基本概念
4. 表格視圖
5. 項目卡片
6. 上一步 / 下一步
7. 勾選後批次操作:複製、移動、取代名稱、刪除
8. 看板(Kanban)視圖
9. 甘特圖
10. 報表
11. 風險與議題
12. 階段閘門
13. 變更管理
14. 預算
15. 看板的進階功能
16. 儀表板
17. 工時
18. 待我審核與請假
19. 週報
20. 搜尋、專案群組、資料備份
21. 管理者功能
22. 常見問題
23. 名詞對照

角色標示:【全員】所有登入的人都能用;【主管以上】主管與管理者;【管理者】只有管理者;【分組角色】被指定為某分組負責角色的人(只在該分組內有效)。

1. 快速開始


1.1 登入

用公司給你的 Email 與密碼登入。



- 連續輸入錯誤 **5 次**,帳號會鎖 **15 分鐘**;管理者可以在「使用者管理」提早幫你解除鎖定。
- 登入狀態會保留 **7 天**,不用天天重新登入。
- 忘記密碼:點「忘記密碼?」,輸入 Email,系統會寄一封重設連結給你(需要系統已設定寄信功能)。

1.2 畫面總覽

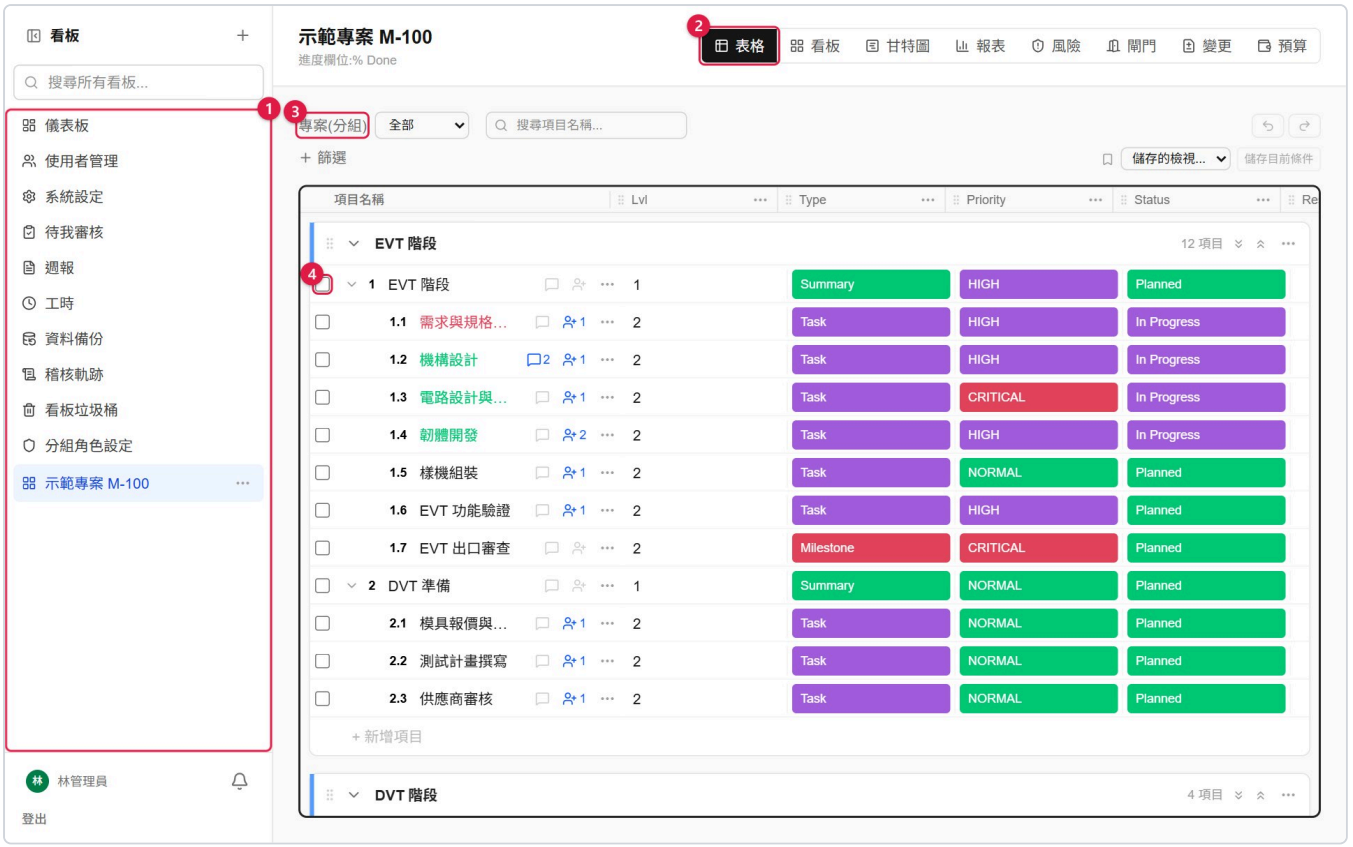

編號	位置	說明
①	左側邊欄	儀表板、工時、週報、設定,以及你能看到的所有看板
②	視圖切換	同一個看板的 8 種看法:表格、看板、甘特圖、報表、風險、閘門、變更、預算
③	分組篩選與搜尋	只看某個分組,或用名稱搜尋項目
④	勾選框	勾選項目之後,可以批次修改、複製、移動、取代名稱、刪除

1.3 側邊欄

側邊欄會依你的角色顯示不同的項目(見第 2 章)。

項目	誰看得到	用途
搜尋所有看板	全員	搜尋工作項、留言、附件檔名、風險與議題
儀表板	全員	個人與團隊的工作量、逾期清單
使用者管理	管理者	新增 / 編輯帳號、休假、資源
系統設定	全員(管理者看到全部,其他人只有看板分享設定)	全公司的設定
待我審核	有部屬的主管、管理者	核准工時與請假
週報	全員	每週自動產生的進度週報

項目	誰看得到	用途
工時	全員	登記與統計工時
資料備份	全員(匯入限管理者)	每個看板匯出 / 匯入 CSV
稽核軌跡	管理者	誰在什麼時候改了什麼
看板垃圾桶	主管以上	還原被刪除的看板
分組角色設定	管理者	指定每個分組的 Team Leader、DM 等
專案群組	有群組時	把同一專案的幾個看板放在一起看
看板列表	全員	你能開啟的看板;主管以上可用「+」新增

側邊欄左上角的按鈕可以**收合**,邊緣可以**拖寬**;手機畫面會變成左上角的選單按鈕。

1.4 個人資料與外觀

點側邊欄左下角你的名字或頭像:



- **更換照片**:上傳頭像,畫面上各處都會用這張。
- **外觀主題**:白色或黑色。
- **變更密碼**:輸入目前密碼與新密碼(至少 8 個字元)。

1.5 通知

名字旁邊的鈴鐺會顯示未讀數量。



- 通知類型:**新增、刪除、修改、指派、留言、自動化**。點通知會直接跳到那個項目。
- 「全部標為已讀」清掉未讀;右上的齒輪可以**設定每一種通知要不要顯示在鈴鐺、要不要另外寄 Email**。
- 管理者可以在系統設定整個關掉某些類型(全公司都不會收到),或關掉 Email 通知。

2. 角色與權限

帳號分三種角色,由管理者在「使用者管理」設定:

	管理者	主管	團隊成員
看到的選單	全部	少了使用者管理、稽核軌跡、分組角色設定	只有儀表板、系統設定(看板分享)、週報、工時、資料備份
新增看板	✓	✓	
新增 / 插入 / 改名 / 搬移 / 複製項目	✓	✓	
改任何儲存格	✓	✓	只能改**自己被指派的項目**的「狀態」與進度欄位
改日期、天數、拖甘特長條	✓	自己建立的項目	不行
刪除項目	✓	自己建立的項目	不行
匯入 / 匯出 / Resource 對應	✓		
自動化、專案範本、垃圾桶	✓	✓	
看板重新命名 / 刪除	✓	自己建立的看板	

		
團隊成員	主管	管理者

看板的存取範圍

每個看板可以設成**公開**(所有登入的人都能開)或**限制存取**(只有擁有者、管理者與被指定的成員)。限制存取的看板標題旁會有「限制存取」標籤。在「系統設定 → 看板分享設定」調整;看板擁有者可以調整自己的看板。

被指定為某分組任何角色(Team Leader、DM、QA...)或實作成員的人,不用另外加進名單也一定看得到該看板。

分組角色【管理者設定】

某個分組的負責人,可以在**那個分組**內擁有額外的權限,不需要升成主管。在側邊欄「分組角色設定」選看板與分組,按「設定角色」:



角色	權限(僅限這個分組)
Team Leader、PMD(專案 PM)	調整此分組任何項目的時程(拖甘特圖、改起訖日);新增 / 指派項目
SW / EE / ME / QA / PM DM	在此分組新增、指派項目,並管理自己部門成員的進度
PMM(行銷 PM)	目前只是名冊,不授予額外權限
實作成員	供各部門 DM 管理範圍使用(DM 只能管理自己部門名單內的人)

DM 的人選預設只列該部門的人(部門在「使用者管理」的「單位」欄設定);Team Leader、PMM、PMD 可以是任何人。

私人項目與私人分組

分組或單一項目可以設成**私人**:只有指定的人、建立者、被指派到的人與管理者看得到。分組標題或項目列的「…」選單 → **可見範圍**。私人項目名稱旁會有鎖頭圖示;私人項目的子項目一起隱藏。只有建立者或管理者能改這個設定。

---

3. 看板的基本概念

看板 → 分組 → 工作項(可以一層一層往下)

- **看板**:一個專案或一個團隊的工作清單。
- **分組**:看板裡的大段落,例如「EVT 階段」「DVT 階段」。每個分組各自從 1 開始編號。
- **工作項**:一筆工作,可以有**子項目**,形成階層。編號會自動依階層與順序產生,稱為 **WBS 編號**(例如 1.2.3),畫面上項目名稱前面那個數字。
- 新增子項目時,上一層會**自動變成 Summary(摘要)**;它的起訖日期由底下子項目統計出來。底下的子項目全部刪光,會還原成原本的 Type。

預設欄位

新看板預設有這些欄位(管理者可以在系統設定改預設,也可以在每個看板新增或刪除欄位):

欄位	類型	用途
Lvl	數字	階層數字,會依位置自動維護
Type	狀態	**Task**(一般工作)、**Summary**(摘要,由子項統計)、**Milestone**(里程碑,時間固定為一天)
Priority	狀態	CRITICAL / HIGH / NORMAL
Status	狀態	Planned / In Progress / Completed
Resource	文字	負責的資源名稱
Pred	文字	前置依賴:這個工作要等誰做完(或開始)才能做
Link	狀態	前置的關聯類型:FS / FF / SS / SF
Lag	數字	前置之間要空幾天(負數代表提前)
Comment	文字	備註
Start / Days / Finish	日期 / 數字 / 日期	開始日、天數、結束日
% Done	數字	完成百分比(進度欄位)


欄位類型有五種:**文字、狀態、人員、日期、數字**。表格最右邊欄位標題列的「＋」新增欄位;欄位標題的「…」可以**設為進度欄位**或**刪除欄位**;拖曳欄位標題可以調整順序,拖曳項目名稱欄的邊界可以調整寬度。

> 刪除欄位是永久的。Lvl、Type、Pred、Link、Start、Days、Finish 等欄位會被排程計算用到,請不要刪除。

4. 表格視圖

4.1 新增與整理項目

- **新增項目**:分組底下的「+ 新增項目」輸入名稱後按 Enter。
- **新增子項目 / 在上方或下方插入**:項目列右邊的「…」選單。

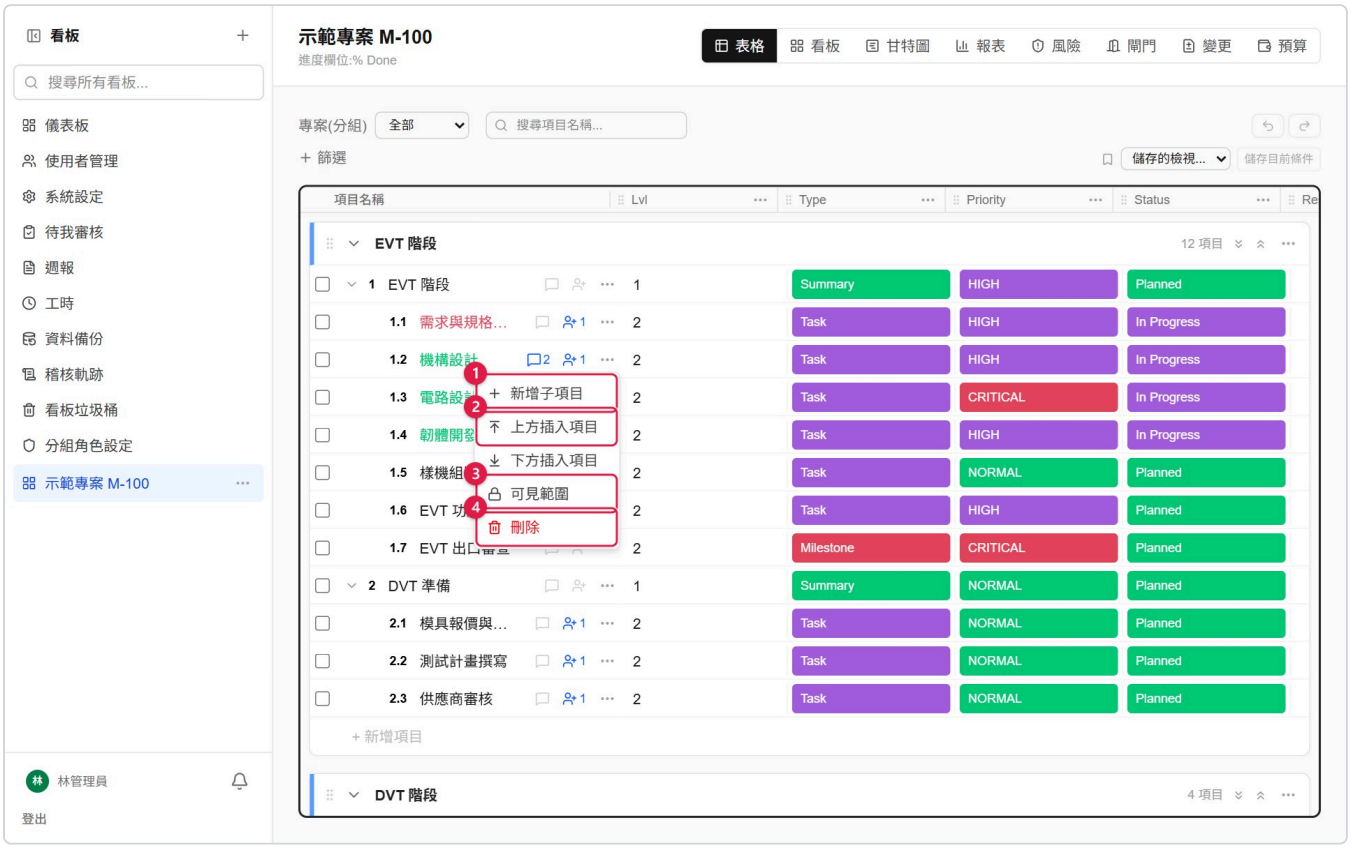

編號	功能
① 新增子項目	在這個項目底下加一個子項目
② 上方插入項目	在這個項目前面插入同階的新項目
③ 可見範圍	設成私人項目
④ 刪除	移到垃圾桶(可還原)

- **新增分組**:表格最底下的「+ 新增分組」;分組標題可以直接改名,標題左邊的把手可以拖曳調整順序;分組標題右邊的雙箭頭可以把整個分組**全部展開 / 全部收合**。
- **名稱旁的小圖示**:留言數、指派的人數(點開可以直接分配)。

4.2 直接編輯儲存格

直接點儲存格就能改:

- 文字、數字:輸入後按 **Enter** 或點旁邊就會儲存。
- 日期:點選日期欄位。
- 狀態、人員:從下拉選單選。**人員**與**工作項**的下拉選單(例如工時登記的專案工作項、批次設定負責人、甘特圖的父項目篩選)最上面都有搜尋框,輸入關鍵字就會即時過濾,可以用空白隔開多個關鍵字(例如「AMR poc-3」),按 Enter 選第一個符合的(見 9.6)。
- **灰底的日期欄位**是被鎖住的,表示它由前置依賴或子項目統計算出來,不能手動改(游標移上去會說明原因)。要改請改它的「天數」、「前置依賴」或子項目。

4.3 拖曳:重新排列與改階層


按住項目列的**空白處**(不是名稱或按鈕)往上下拖曳,放開時依位置決定結果,**拖曳途中就會看到放開後的新 WBS 編號**:

放開的位置	結果
目標列的上半部(中間)	成為目標的**子項目**
目標列的下緣	變成目標的**同階**項目(放在它後面)
目標列的下緣、而且滑鼠往左偏	**外移一層**,變成目標父項的同階項目

規則:只能在**同一個分組**內拖曳;不能拖進自己的子孫底下。需要結構權限(管理者、主管、或該分組的負責角色)。搬移後會自動重新編號,Lvl 與 Summary 狀態也會一起處理。

4.4 篩選與儲存的檢視


按「+ 篩選」新增一個條件,可以疊加多個:

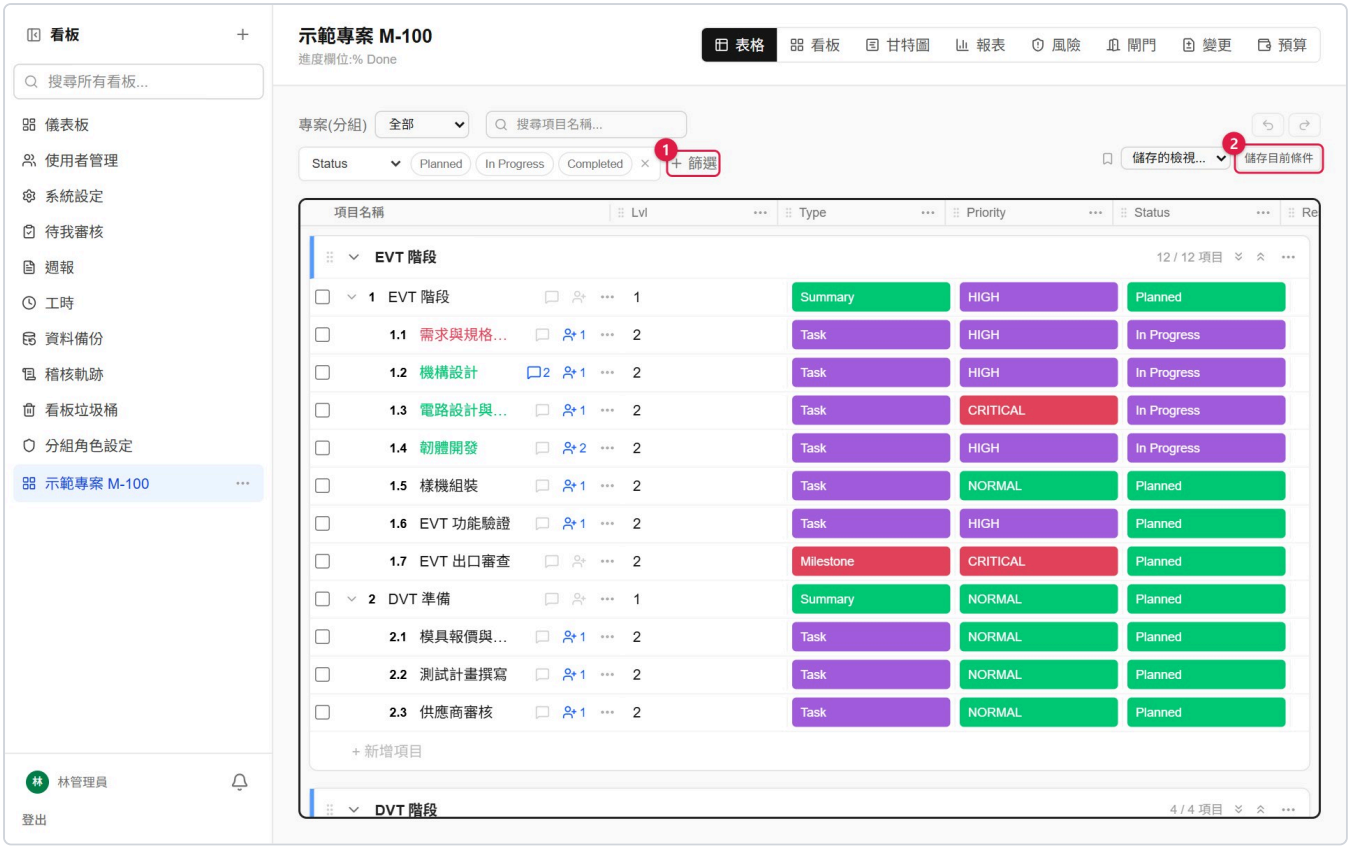

- 依欄位類型提供不同的篩選:文字(包含)、狀態(選項)、人員、日期(區間;可選「今天」,存成檢視後每天自動跟著今天走)、數字(最小–最大)。
- 另外還有兩個特殊條件:**任務分派者**、**任務新增時間**。
- 設好條件後按「儲存目前條件」,取名後存成**檢視**;可以勾選「共用給看板成員」。之後從「儲存的檢視...」下拉選單切換。
- 篩選條件在表格與甘特圖各自獨立,但儲存的檢視兩邊都能套用。

5. 項目卡片

點項目名稱,會打開這個項目的卡片,上面有七個分頁:

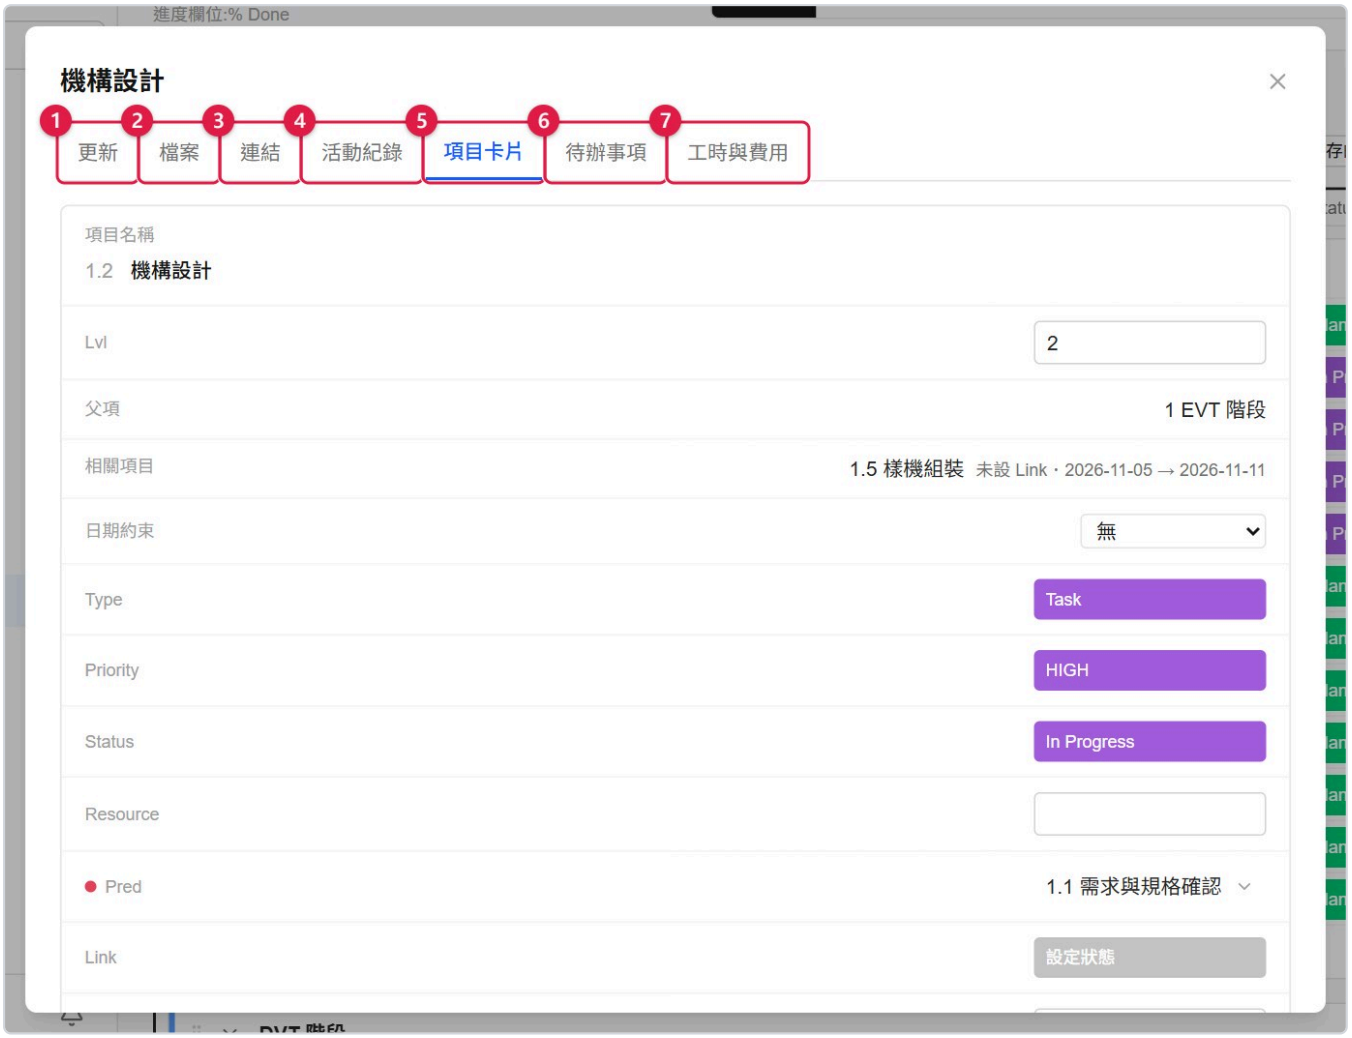

分頁	內容
① 更新	留言討論,輸入 @ 可以提及成員(他會收到通知)
② 檔案	上傳這個項目的檔案
③ 連結	貼上雲端硬碟、Google Sheet、外部文件的網址,可以取顯示名稱
④ 活動紀錄	這個項目所有被修改的歷史:誰、什麼時候、改了什麼
⑤ 項目卡片	所有欄位、父項、相關項目、日期約束、浮時、基準線、人員分配
⑥ 待辦事項	這個項目底下的小清單,可以勾選完成
⑦ 工時與費用	直接費用與實際工時

更新分頁:



待辦事項分頁:



工時與費用分頁:



- **直接費用**:預算與實際金額,記錄買來的錢(NRE、BOM、外包)。人力成本不要填在這裡,它由工時 × 成員時薪自動算出。
- **實際工時**:選日期、輸入小時、說明(選填)後按「登記」。新登記的工時是「**待審**」,要等直屬主管核准後才會計入成本報表。

項目卡片分頁裡值得注意的欄位

- **相關項目**:列出誰以這個項目為前置(也就是排在它後面的工作)。
- **日期約束**:替項目加上一條日期規則。
  - 不得早於(開始):前置算出的開始日若早於這天,會被推到這天。
  - 不得晚於(完成):是**期限**,不會改動排程,只在超過時提出警告。
  - 必須完成於:完成日固定在這天,開始日往回推算。
- **總浮時 / 要徑**:這個項目最多可以延幾天而不影響整個專案;0 天代表在要徑上。
- **基準線**:與原始計畫相比延遲或提前幾天(建立基準線後才會出現)。
- **人員分配**:指派人員與投入百分比,會換算成工時與成本。
- **任務派遣人**:誰建立了這個項目。

---

6. 上一步 / 下一步

改錯了不必手動一個一個改回來。表格與甘特圖工具列都有兩顆按鈕:



- **上一步**(復原)、**下一步**(重做)。按鈕停用(灰色)代表沒有可以復原的紀錄。滑鼠停在按鈕上會顯示是哪一個動作。
- 快捷鍵:**Ctrl + Z**(Mac 用 ⌘ + Z)上一步;**Ctrl + Y** 或 **Ctrl + Shift + Z** 下一步。游標在輸入框裡、或對話框開著時,快捷鍵不會觸發(輸入框自己的文字復原照常運作)。
- 三個視圖(表格、看板、甘特圖)**共用同一份紀錄**,切換視圖不會掉;最多保留 **50 步**。

可以復原的動作

類型	說明
儲存格修改	文字、數字、日期、人員、狀態、Pred,以及在看板視圖拖曳卡片換狀態
甘特圖日期	拖移整根長條、拉長或縮短長條(依賴它的項目會跟著重新排程)
拖曳搬移項目	表格與甘特圖裡拖曳改階層或順序
項目改名	在項目卡片改名稱

限制,請先知道

- 紀錄只存在**這次開著的畫面**:重新整理、換看板就清空。
- 新增、刪除、批次操作(包含批次取代名稱)、人員分配(指派人員與投入 %)、分組與欄位的修改**無法復原**。刪除的項目請從垃圾桶還原。
- 復原前,系統會先確認那個值**還是你當初改完的值**。如果期間別人(或別的分頁)又改過,會跳出「無法復原」並擋下來,不會蓋掉別人的修改。
- 復原也會再發一次通知,被指派的人可能多收到一則「已更新」。若狀態改變曾觸發自動化規則,復原只會把狀態改回去,不會反轉自動化做的事。

---

7. 勾選後批次操作:複製、移動、取代名稱、刪除

表格與甘特圖每一列前面都有**勾選框**。勾選一個或多個項目後,上方會出現操作列:



編號	功能
① 已選 N 項	括號內會標出連同子項目一共幾項
② 複製到...	複製到指定的父項目底下
③ 移動到...	搬到指定的父項目底下,並決定位置
④ 取代名稱...	把勾選項目名稱裡的某個字樣,統一換成別的字樣
⑤ 刪除	移到垃圾桶
⑥ 取消選取	清除勾選

重點規則:複製、移動、刪除:勾選一個父項,它底下的**所有子項目會一起被處理**。如果父項和它的子項都被勾選,只算父項(不會複製兩份)。**取代名稱例外**,只改打勾的項目本身(見 7.3)。表格視圖的操作列除了這幾個,還保留原本的批次設定狀態、人員欄位、與「推移 N 天」。表格裡的複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除只有管理者與主管看得到;只有分組負責角色的人(例如 Team Leader)請在**甘特圖**操作,系統會再逐個分組檢查權限。

7.1 複製

按「複製到...」:



1. 選擇**分組**(同一個看板內的任何分組)。
2. 選擇**目標父項目**;留空代表放在該分組最上層。被選的項目與它們的子項目不能當目標。
3. 按「複製」。

複製的內容:


- 項目名稱、階層、所有**欄位值**(日期、天數、狀態、優先度、負責人欄位等);Lvl 依新位置自動調整。
- 日期約束、直接費用預算。
- **前置依賴(Pred)**:指到「這次一起複製」的項目,會改指它們的複本(複本之間的先後關係保持原樣);指到範圍外的項目維持不變(複本和原件等同一個前置)。每一條依賴自己的關聯類型與 Lag 都保留。
- 目標父項會自動變成 Summary。

不會複製:指派人員(人員分配)、留言、附件、連結、待辦、工時。你看不到的私人子項目也不會被複製。

複製整批在同一個交易裡完成,失敗就什麼都不會建立。複製出來的項目名稱和原件一樣。

7.2 移動,並決定位置

按「移動到...」:

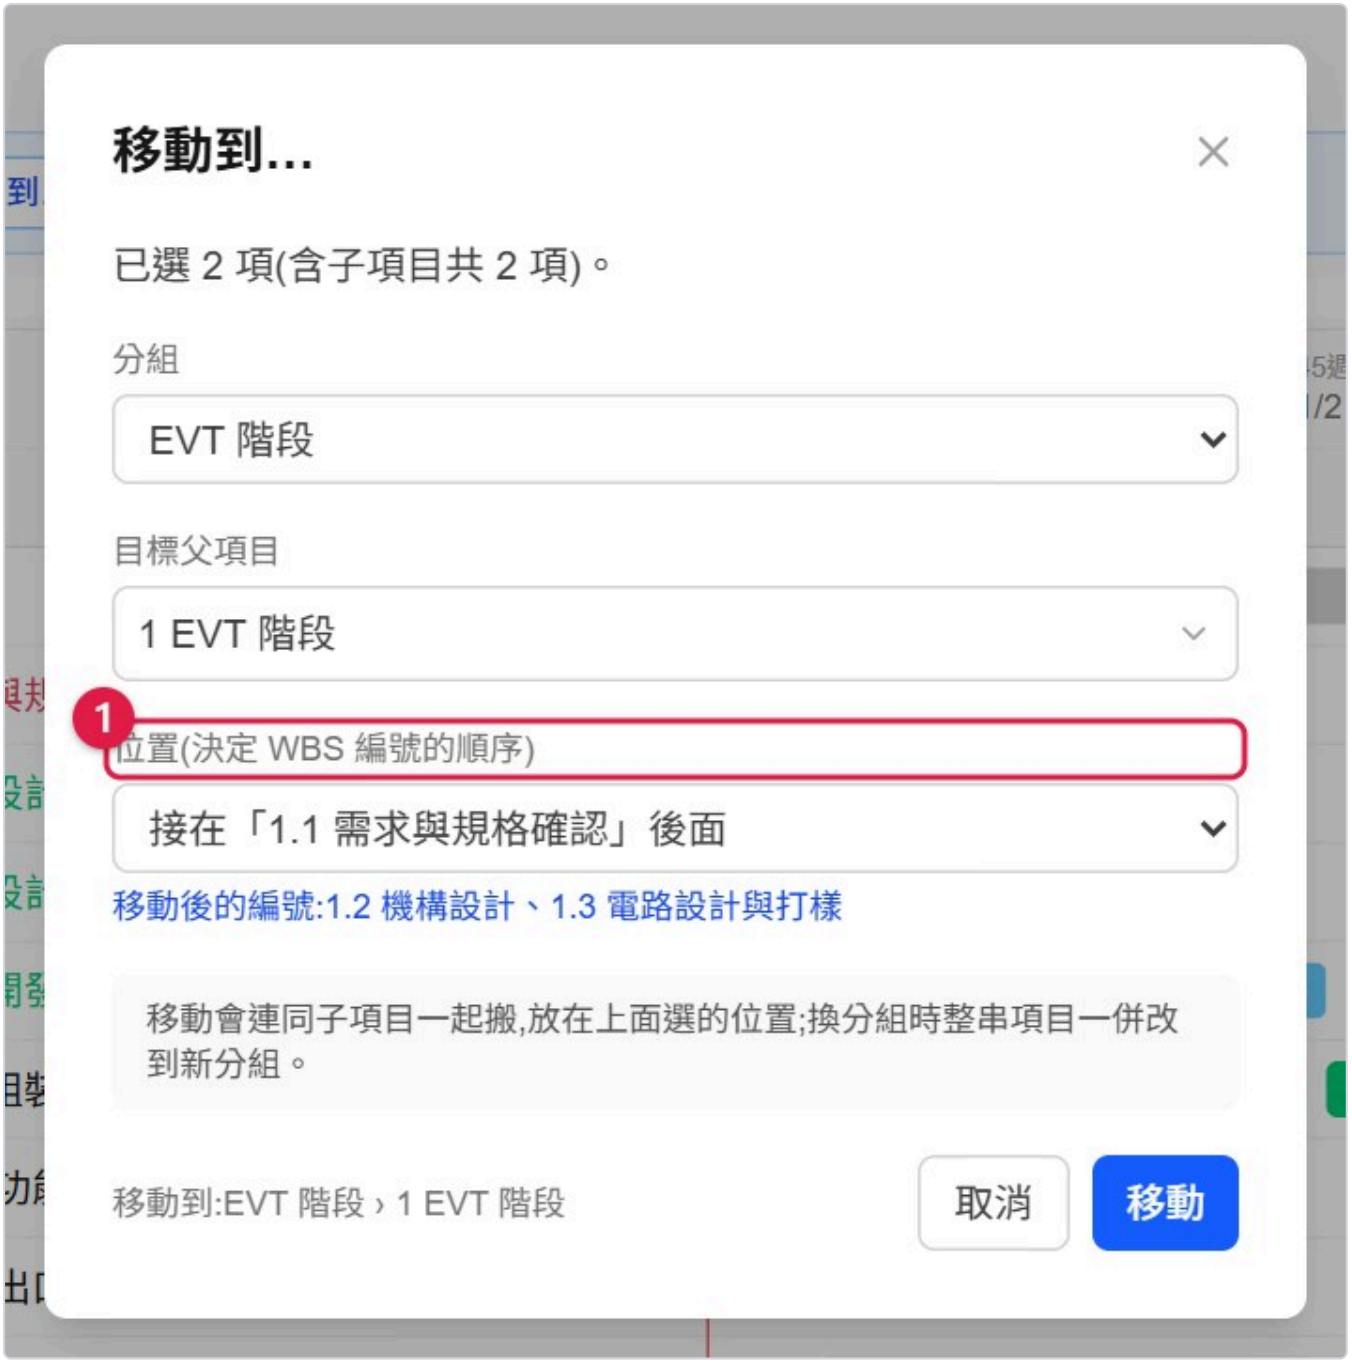

1. 選擇分組與目標父項目(同複製)。
2. **位置**(決定新的 WBS 編號順序):
    - 放在最後面(預設)
    - 放在最前面
    - 接在「某個項目」後面 —— 清單是目標底下現有的項目(扣掉被搬的)。
3. 選擇之後,視窗會即時顯示**移動後的編號**(藍字),例如「1.2 機構設計、1.3 電路設計與打樣」。
4. 按「移動」。

也可以用來在**同一個父項底下重新排序**:目標選原本的父項,再挑位置。

- 換分組時,整串子項目一起改到新分組;Lvl、Type=Summary、舊父項的順序都會一併處理。搬空的舊父項會還原成原本的 Type。

- 舊匯入留下的「WBS 編號式」前置依賴,會在跨分組搬移前先轉成固定的項目參照,不會因為搬走而指錯人。
- 搬出去的**來源分組**也需要結構權限。

7.3 取代名稱

按「取代名稱…」:



1. **尋找**:要換掉的字樣。
2. **取代為**:換成什麼;**留空**就是把那段字刪掉。
3. 下方即時列出每個項目改完的名稱(舊名稱劃線 → 新名稱),以及「會改 N 項」、有幾項沒有這段字樣。確認後按「取代 N 項」。

規則:

- **只改打勾的項目本身**,不會連帶改沒勾的子項目(這點和複製、移動、刪除不同)。想改整串,請把子項目也一起勾起來。
- 照字面比對,**區分大小寫**。「.」「(」「$」這些符號都當一般文字,不是規則運算式。

- 名稱裡出現幾次就換幾次,例如把「PoC」換成「POC」,「PoC-1 spec / PoC-1 review」兩處都會換。
- 取代之後名稱會變成空白的項目會**略過**(不會被改成「未命名項目」),預覽裡會註明。
- 需要結構權限(管理者、主管,或該分組的負責角色)。勾選的項目涉及的分組只要有一個沒權限,整批都不會改。
- 每個被改的項目,項目卡片的「活動紀錄」分頁會留下一筆「項目名稱從…改為…」。
- 這個動作**不能用「上一步」還原**(批次操作不支援復原)。取代錯了,把「尋找」與「取代為」對調再做一次,通常就能改回來。

7.4 刪除


按「刪除」,會先列出要刪的項目;若有**其他**工作項以它們為前置依賴,會列出受影響的項目,並讓你選:

- **改為參照被刪項目的前置**(讓後面的工作接上前一個),或
- **清空它們的前置**(它們會停在目前算出來的時間,系統會提醒你補上排程規則)。

刪除是移到**垃圾桶**,不是永久刪除,可以還原(見 15.6)。刪除項目限管理者,或主管**自己建立的**項目;沒有權限刪的項目會被略過並列出來。


---

8. 看板(Kanban)視圖

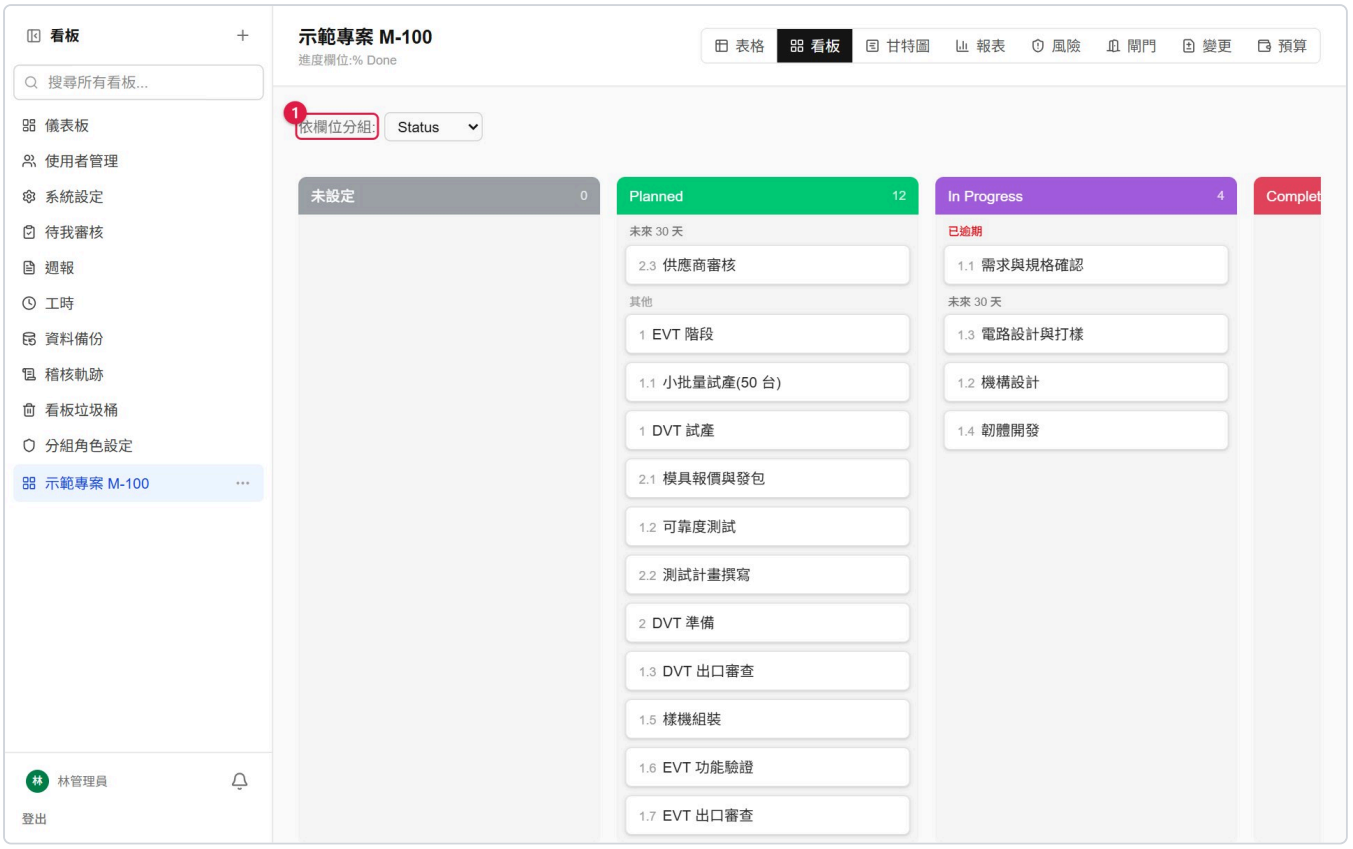

- 上方「**依欄位分組**」選一個狀態欄位(例如 Status),每個選項成為一欄;也可以選「**到期時間**」,分成「已逾期 / 本週完成 / 未來 7 天 / 未來 30 天」。
- **拖曳卡片**到另一欄,就是把那個項目的狀態改成該欄(會被記進「上一步」)。
- 點卡片開啟項目卡片。
- 主管可以用「我的團隊 / 全部」切換只看部屬的項目或全部。

9. 甘特圖

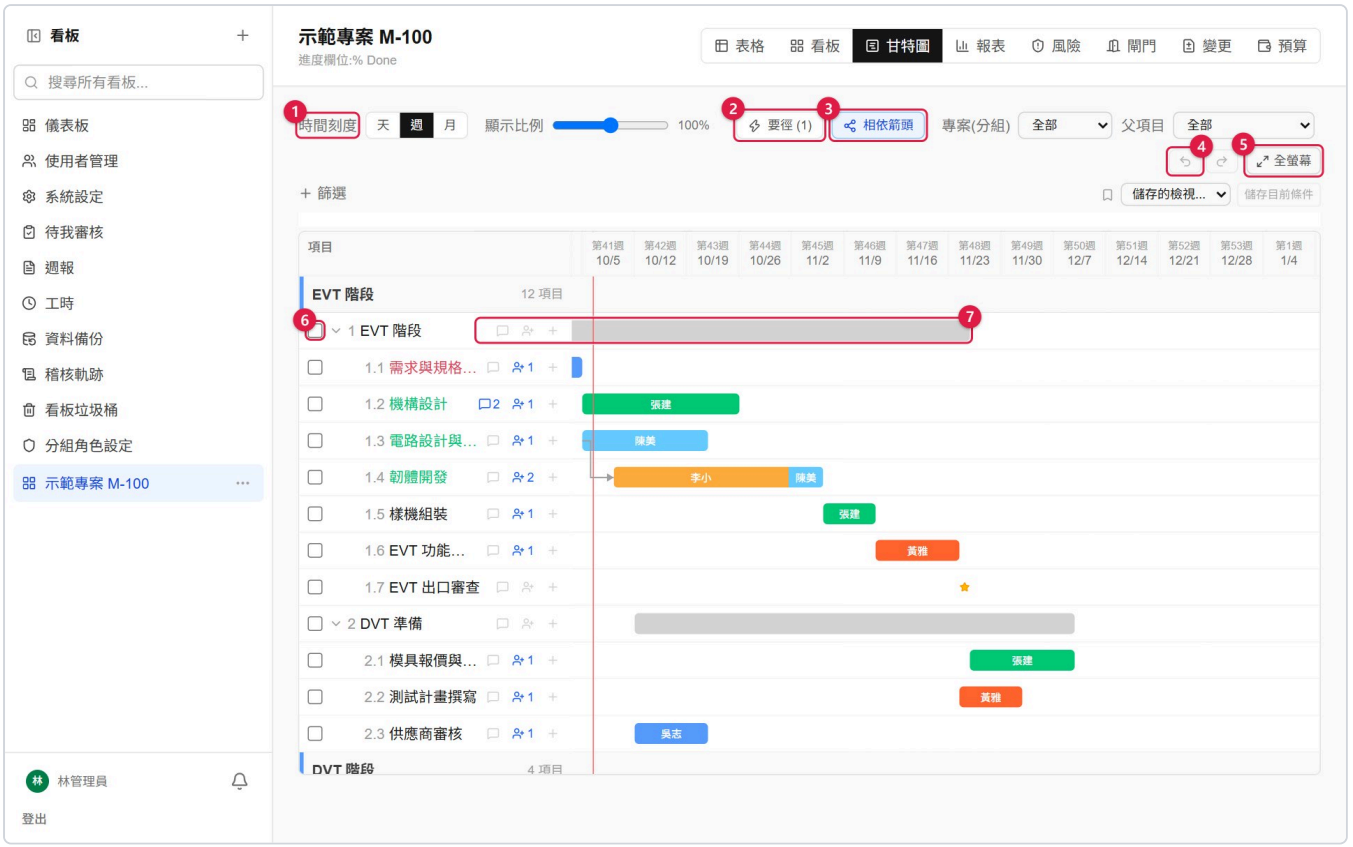

9.1 工具列

編號	功能
① 時間刻度	天 / 週 / 月
② 要徑	標出「延一天整個專案就延一天」的項目(總浮時為 0)
③ 相依箭頭	在長條之間畫出前置依賴的箭頭
④ 上一步 / 下一步	見第 6 章
⑤ 全螢幕	擴大成整個螢幕,按「退出全螢幕」回來
⑥ 勾選框	勾選後批次複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除(第 7 章)
⑦ 長條	見下

另有「顯示比例」滑桿、「專案(分組)」與「父項目」篩選、「+ 篩選」與「儲存的檢視」(與表格相同)。

9.2 怎麼看長條

- **顏色**依指派的人區分,多人共同做的會分成幾段;長條上顯示人員姓名的前兩個字。
- **灰色長條**:沒有指派人員,或是 Summary 父項(範圍由子項統計)。

- **星形**:里程碑。
- **紅色豎線**:今天。時間刻度為「日曆天」時,週末與國定假日有淺色底;為「工作天」時,時間軸直接略過非工作日。
- **要徑**打開後,在要徑上的長條會有紅色外框與閃電。
- 建立**基準線**後,每根長條下方會多一條細線,是當初的計畫日期。
- 項目名稱的顏色代表狀態(完成 / 逾期 / 進行中),顏色可由管理者調整。
- **滑鼠停在長條上**,會顯示:指派人員與投入 %、**開始日期**、**結束日期**、**工作天數**、總浮時與最晚完成日。

9.3 拖曳調整時程

需要時程權限(建立者、管理者、Team Leader / PMD)。

- **拖移整根長條**:整體搬到新的開始日,天數不變。
- **拉長或縮短**:拖長條左右兩端,改開始日或結束日(天數會跟著重算)。
- 放開後會先跳出**確認視窗**,列出這個項目的新舊日期,以及會被連動的後續項目;按「確定」才會套用。

拖不動的常見原因(滑鼠停在長條邊緣會說明):

- 開始或結束日由**前置依賴**決定;
- 它是**父項**,時程由子項目統計;
- 它是**里程碑**,天數固定;
- 你沒有調整這個項目時程的權限。

9.4 父項目的長條

有子項目的父項,長條會**自動涵蓋所有子項目的範圍**(最早的開始到最晚的結束),子項目調整後它會跟著變。例外:父項目自己設有 **Pred(前置依賴)**時,它保留依前置排出來的自己的日期,子項目要落在它的區間內。

9.5 前置依賴(Pred / Link / Lag)

在表格的 Pred 欄、項目卡片或下面的人員分配視窗設定。

- **Pred**:選擇這個項目要等誰;可以選**多個**前置,時間以排得最晚的那一條為準。
- **關聯類型 Link**:
  - **FS**(完成 → 開始):前置完成後,這個才開始。最常見。
  - **SS**(開始 → 開始):前置開始後,這個才開始。
  - **FF**(完成 → 完成):前置完成時,這個一起完成。
  - **SF**(開始 → 完成):前置開始,這個才完成。
- **Lag**:兩者之間再空幾天;負數代表可以提前。
- 每一個前置還可以**各自**設關聯類型與 Lag(在 Pred 選單裡每一條前置旁邊),不設就沿用這個項目的 Link / Lag 欄位。
- Pred 欄位旁有**燈號**:綠 = 前置已完成,可開始;橘 = 等待前置;紅 = 前置已逾期,被延後(預設顏色,管理者可以調整)。
- 改了前置、天數或日期,後續依賴它的項目會**自動重新排程**。

9.6 點長條:人員分配視窗

點長條(不拖動),會開啟這個視窗:



區塊	說明
人員分配	選人、填投入百分比後按「新增」,即指派給這個項目;百分比會換算成工時與成本。選人的選單有搜尋框(見下);百分比 1–100%、最小單位 1%,游標在輸入框裡時可以用滑鼠滾輪加減(往上滾增加),已指派的人改了數字,停手半秒後自動儲存
① 時程設定	Start / Finish 顯示目前結果;下方可以設 Pred、Link、Lag、天數(或 start(set))
② 負責人	設定「負責人」欄位的人
③ 日期約束	不得早於 / 不得晚於 / 必須完成於,再選日期

選人時搜尋:按「選擇人員…」後,選單最上面有搜尋框,輸入姓名(或其中幾個字)就會過濾名單,按 **Enter** 直接選第一個符合的人;都不符合會顯示「找不到符合的人員」。「負責人」欄位、新增子任務時的人員選單也一樣(「負責人」選單多一個「未指派」,輸入關鍵字時會先收起來)。



改了會影響日期的欄位時,視窗會先預覽「Start / Finish → 新日期」,並問「此變更將調整時程,是否套用?」,按「確認套用」才會生效。

9.7 自動排程看板

有些看板啟用了「自動排程」:Start / Days / Finish 變成**唯讀**,改填 **start(set)**(手動開始日)與 **duration**(手動天數),再由前置依賴自動算出結果。管理者在「系統設定 → 甘特圖欄位設定」對應這些欄位,並可以按「重算全部」重新計算整個看板。

10. 報表




- 上方數字卡:全部任務、尚未處理、計畫中、進行中、暫停、卡住、逾期、已完成。分類依「報表設定」把各狀態歸到哪一類。
- **依狀態分布**、**依負責人分布**:圖表。主管可用「我的團隊 / 全部」切換範圍。
- **延遲追因**:找出**自己**延誤的工作項(扣掉前置推給它的部分之後仍然晚了),與影響多少下游。需要先建立基準線。
- **成本與 EVM**:完工總預算 BAC、實際成本 AC、實獲值 EV、計畫價值 PV、成本效率 CPI、進度效率 SPI、成本差異 CV、完工預估 EAC。需要有直接費用預算與成員時薪。
- **進度曲線**、**逾期清單**。

> 報表要統計哪個狀態欄位、每個狀態算哪一類,由管理者在「系統設定 → 報表設定」指定。

11. 風險與議題

NUDD 會議上談到的風險與議題,記在這裡才追得下去。

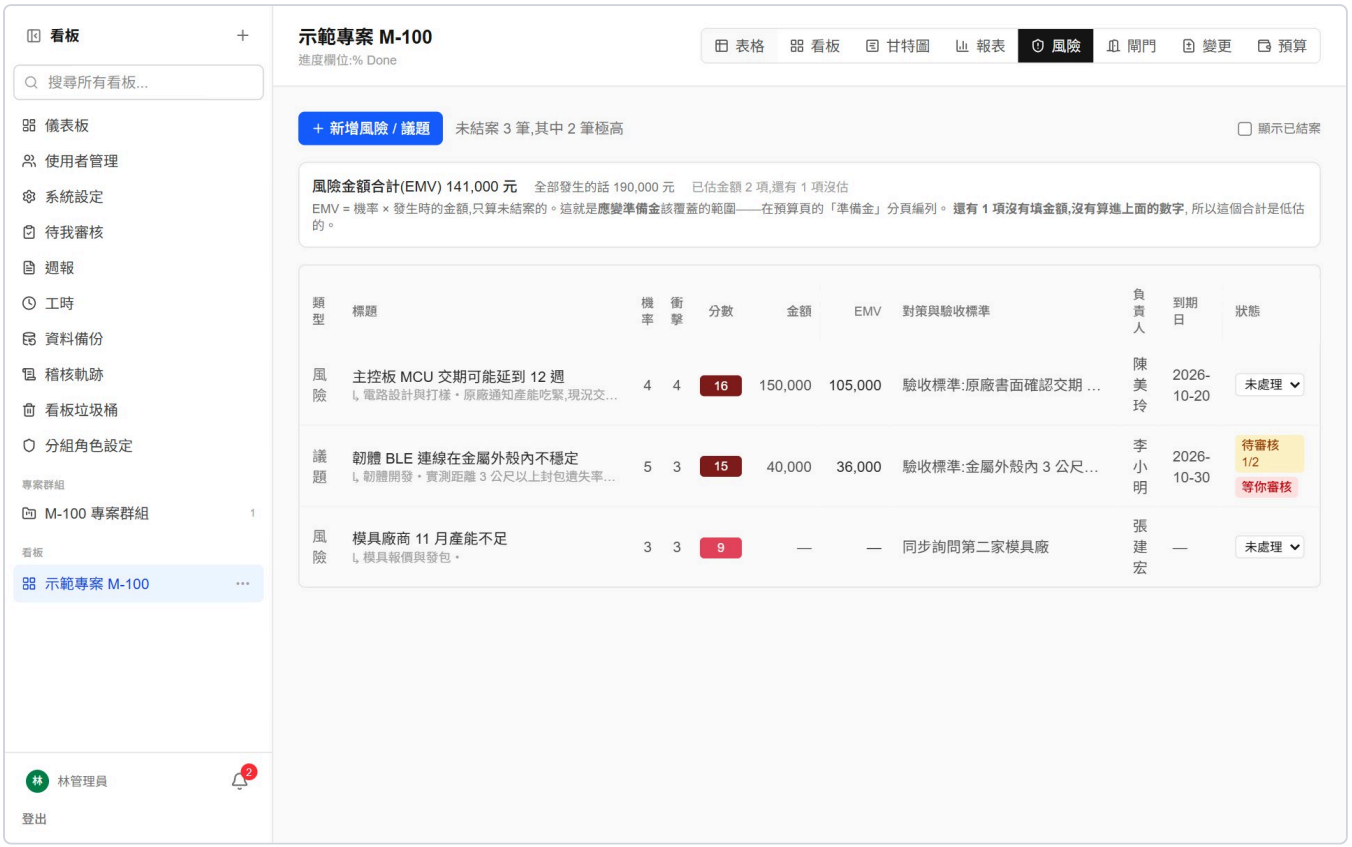

- 清單依「**機率 × 衝擊**」分數由高到低排;已結案的沉到最後。
- **分數**:機率與衝擊各 1–5,相乘 1–25:低(< 4)、中(4–7)、高(8–14)、極高(≥ 15)。
- **EMV 風險金額**:機率 × 發生時的金額,只算未結案的(包含待審核),就是**應變準備金**該覆蓋的範圍。沒填金額的項目不會算進去,畫面上會提醒你合計偏低。
- **狀態欄**:負責人與編輯者可以直接在「未處理 / 處理中」之間切換;**待審核**會標出已同意的審核人數(例如 1/2),輪到你審核的另外標紅色的「等你審核」;**已結案**不能直接選,要走 11.3 的流程。

11.1 誰可以做什麼

風險與議題的分工是:**指派的人**把要做什麼、做到什麼程度才算解除寫清楚;**負責人**去做、回報進度;**審核人**確認真的解除了。

角色	能做的事
建立者(指派的人)	改標題、說明、機率、衝擊、金額、**對策與驗收標準**;指定**負責人**與**審核人**;寫進度更新;重新開啟已結案的;刪除
負責人	寫**進度更新**;切換「未處理 / 處理中」;處理完成後**申請結案**。**不能改內容**
審核人	申請結案後**同意解除**或**退回**;也可以改內容、寫進度更新、重新開啟

角色	能做的事
管理者	除了「同意 / 退回」以外都可以(包含代負責人申請結案);要同意或退回,得是被指定的審核人
其他看板成員	只能看內容、進度更新與紀錄

沒有編輯權的人打開一筆,表單是唯讀的,也不會有儲存鍵。

11.2 新增風險 / 議題

按「+ 新增風險 / 議題」:



欄位:類型(風險 / 議題)、狀態(新增時只能選未處理 / 處理中)、標題、說明、機率、衝擊、發生的話要多少錢、機率 %(選填,不填則依 1–5 等級換算)、 ① **對策與驗收標準**(由指派的人寫給負責人:要做什麼、測試標準與需求、做到什麼程度才算解除)、負責人、對策到期日、相關工作項、 ② **審核人**(可以指定多位,申請結案後每一位都同意才算解除)。你自己就是這一筆的「建立者」。

11.3 進度更新、申請結案與審核

打開既有的一筆,上面有三個分頁:**內容與審核**、**進度更新**、**紀錄**。


編輯風險 / 議題
內容與審核
進度更新(2)
紀錄
1
待審核
等審核人同意(1/2),全部同意才會結案;任何一位退回就回到處理中。
撤回申請
同意解除
退回...
王主管已同意
林管理員未同意
類型
議題
狀態
待審核
標題
韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定
說明
實測距離 3 公尺以上封包遺失率偏高
機率(1-5)
5
衝擊(1-5)
3
發生的話要多少錢(元)
40000
機率 %(選填)
留空則用「5」= 90%
分數
15 極高
2
對策與驗收標準(由指派的人寫給負責人)
驗收標準:金屬外殼內 3 公尺連線,連續 24 小時封包遺失率 < 3%;附 A/B 測試報告。
負責人
李小明
對策到期日
2026/10/30
相關工作項
1.4 韌體開發
3
審核人(申請結案後,每一位都同意才算解除)
王主管
林管理員
新增審核人...
待審核中不能更換審核人,要換請先撤回申請結案。
建立者:林管理員 • 2026/10/6 下午12:49:13
取消
儲存

編號	說明
① 狀態列	目前狀態與下一步,按鈕依你的角色出現:申請結案、撤回申請、同意解除、退回、重新開啟;待審核時列出每位審核人同不同意
② 對策與驗收標準	指派的人寫的解除條件,負責人照這個做、審核人照這個驗
③ 審核人	申請結案後,每一位都同意才算解除

流程:

1. **負責人**在「進度更新」分頁寫進度(新的在上面,寫了不能改)。
2. 處理完成後,在「內容與審核」分頁按「**申請結案**」,狀態變成「待審核」。要先指定至少一位審核人並儲存。
3. 每位**審核人**按「**同意解除**」或「**退回...**」。退回一定要寫原因:原因會記進進度更新,狀態回到「處理中」,**所有人的同意票清空**,負責人補完後要重新申請。
4. **全部審核人都同意**,才會變成「已結案」。
5. 已結案的,建立者、審核人或管理者可以按「重新開啟」,回到處理中。

注意:

- 待審核中不能更換審核人;要換請先「撤回申請」(負責人、建立者、審核人都可以撤回)。
- 目前**沒有**站內通知或 email:負責人申請結案後,請告訴審核人;審核人到風險頁看有沒有「等你審核」。
- 舊的風險沒有審核人;要結案請先補上審核人。已經是已結案的維持原樣。

11.4 進度更新與紀錄



「**紀錄**」分頁會列出這一筆發生過的每件事:誰建立、改了哪個欄位(例如「負責人:李小明 → 張建宏」)、寫了進度更新、申請結案、誰同意、誰退回、重新開啟。



管理者也可以在「稽核軌跡」選「風險議題」分類看全部看板的紀錄,被刪掉的風險議題也會留下一筆「刪除」。

12. 階段閘門

每個階段(POC / EVT / PVT)的出口審查:條件、簽核人,以及是誰放行的。




1. **建立閘門**【主管以上】:按「新增閘門」,填名稱(例如 EVT 出口審查)、可綁定一個階段、預計審查日。
2. **加入條件**:每一條可標為「必要」或非必要,達成後勾選。
3. **加入簽核人**:沒有簽核人的閘門只是一張清單,不能放行。
4. **送審**:狀態變成「待審」。
5. 簽核人各自選「核准」或「不通過」,可附意見。
6. 主管以上**放行**。必要條件沒全部達成、或簽核沒過,就不能放行,只能選「**有條件放行**」或「**不通過**」,並且**必須寫理由**——這是之後唯一查得到當初為什麼放行的紀錄。

狀態:準備中 → 待審 → 已放行 / 不通過 / 有條件放行。若閘門還沒放行、下一階段卻已經有工作項在進行,頁面上方會出現紅色警示「有工作跑在閘門前面」。

13. 變更管理

規格或時程要改,先開一張單:為什麼改、影響多少、誰批准。

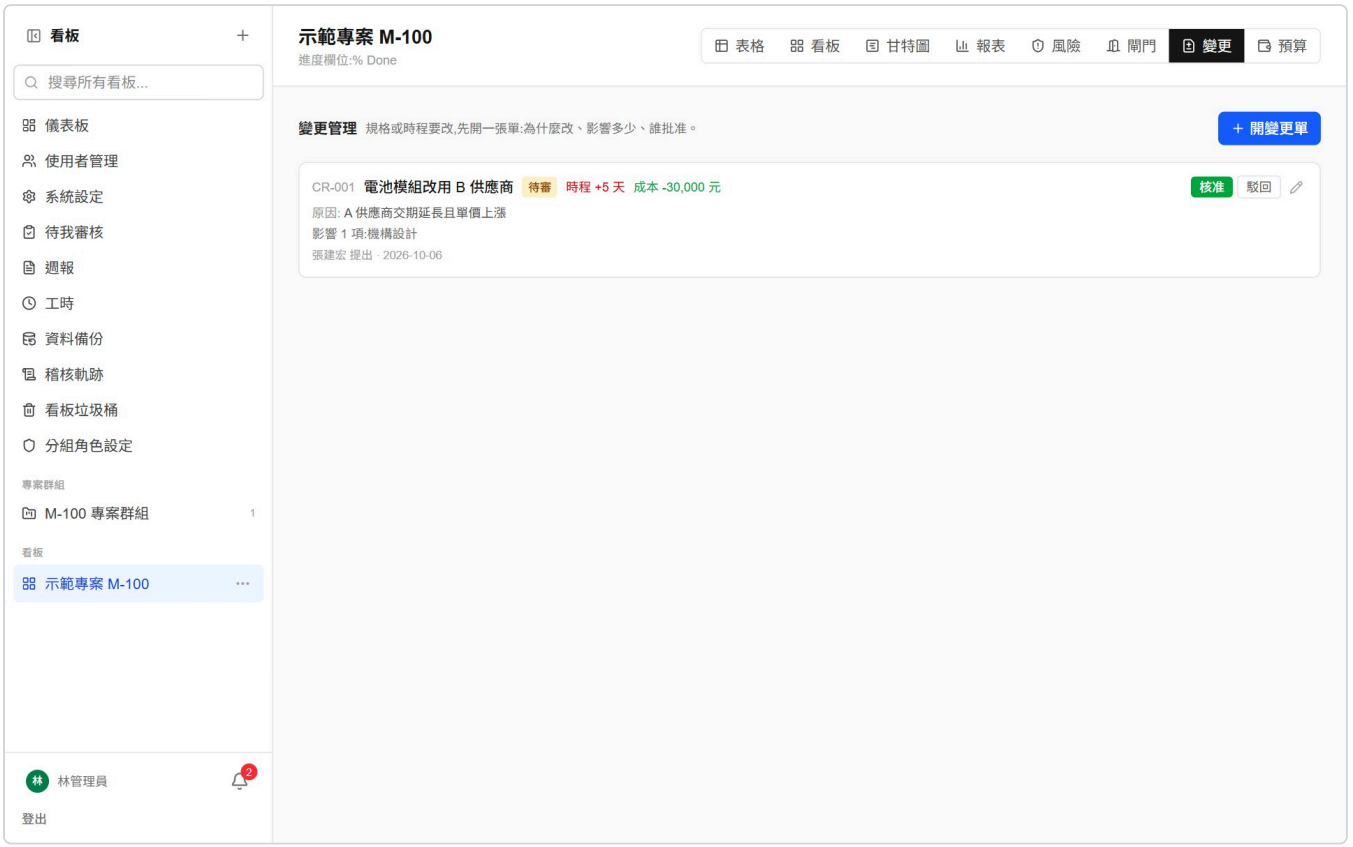

- 按「開變更單」,填:標題、原因、要改什麼、**時程影響(天)**、**成本影響(元)**、影響說明、關聯的工作項。單號自動編為 CR-1、CR-2…
- 狀態流程:**草稿 → 待審 → 已核准 / 駁回 → 已執行**;也可以**撤回**。
- **核准、駁回、標記已執行**限主管以上。駁回要寫原因;標記已執行時可連到某一版**基準線**,之後就查得到日期為什麼變。

14. 預算



預算依「**預算階段**」編列(例如 EFS、EVT、DVT1),階段由「人力表」排出。分頁:

分頁	內容
階段預算	各類別(人力、材料、模具、委外、差旅、其他)的核准預算、已花費、已下單未入帳、剩餘;**準備金**(應變、管理)的動支;**完工預估**;已下單與支出明細
人力表	先排出各階段的起訖日,再填每個名額每個月投入多少人月
樣機計畫	每個產品、用途單位在各階段要幾台
樣機 BOM	產品在各階段用的料(廠商、型號、名稱,可往下分子集),單台價格會寫回材料預算
人力規劃彙總	由人力表彙總而來,乘上單位標準月薪就是人力預算金額(唯讀)

重點:

- 實際花費記在對應到的那一列工作項底下;人力的「已花費」由**核准的工時**算出。
- 準備金不能直接花,要先**動支**撥進某個費用類別;動支時必須寫理由。專案總額不變,動支是搬錢不是生錢。
- 外幣支出與訂單會依輸入當下的匯率換算,事後改匯率不會動到已記的帳(匯率在系統設定)。
- 超支或預算將盡時,**儀表板**最上面會出現「預算警示」。
- **誰能編預算**:管理者、看板擁有者、或這個看板任一分組的 Team Leader;其他人唯讀。

- 整個專案群組的總預算在「專案群組」頁。

15. 看板的進階功能

側邊欄看板名稱右邊的「…」選單:



編號	功能	誰能用
① 匯入	從 Excel / CSV / Google Sheet 匯入工作項	管理者
② 匯出	匯出成 Google Sheet 用的 Gantt 檔	管理者
③ Resource 對應	把文字欄位裡的名字對應到帳號	管理者
④ 自動化	狀態變更時自動動作	主管以上
⑤ 專案範本	存成範本、套用範本	主管以上
⑥ 垃圾桶	還原被刪除的工作項	主管以上
重新命名 / 刪除	看板本身	管理者,或主管自己建立的看板

15.1 匯入



1. 選擇**上傳檔案**(.csv / .xlsx / .xls,最多讀前 40 欄、2000 列),或貼上 **Google Sheet 連結**(需設為「知道連結的使用者」皆可檢視)。
2. 選擇工作表。
3. 點選**哪一列是欄位標題列**。
4. 設定**每一欄要匯入成什麼**:忽略、項目名稱(只能剛好一欄)、階層層級(最多一欄,用來決定子項目)、對應現有欄位、或新增文字 / 狀態 / 人員 / 日期 / 數字欄位。
5. 選擇匯入到新分組或現有分組,按「開始匯入」。

注意:人員欄位只能對應到已註冊的帳號,找不到的會略過(外部人員名稱請改選「新增文字欄位」);數字欄位遇到「1.1.3」這類編號會略過,也請改用文字欄位。

15.2 匯出 Google Sheet(Gantt)

下載一個 .xlsx(含甘特條、要徑標記、相依連線、階層顏色、日期約束、預算、燃盡圖、延遲追因共九個分頁)與一份 Apps Script(.gs)。把 .xlsx 上傳到 Google 雲端硬碟並以「Google 試算表」開啟,再到「擴充功能 → Apps Script」貼上 .gs 內容並儲存,重新整理後就有「Gantt」選單。可選擇匯出的分組、深度與額外欄位。

15.3 Resource 對應

把某個文字欄位(例如 Resource 欄裡的 "SW")的每一個不同的值,對應到系統裡的使用者帳號,並可選擇同時建立人員分配。適合匯入之後整批補上負責人。

15.4 自動化規則



每一條規則:**當某個狀態欄位變更為某個值時**,可以同時:通知某個人、把另一個欄位設為某個值、把項目移到某個分組。規則可以隨時啟用或停用。


15.5 專案範本



- **從分組存成範本**:把一個排好的分組存起來,範本全站共用。
- **套用範本**:選範本、目標分組、起始日期,建立一批工作項。

- 範本只帶**結構**:名稱、階層、Type / Lvl、天數與前置關係。負責人、狀態、% 完成與日期都不會複製,日期由起始日期加上天數與前置關係算出。

15.6 垃圾桶(項目)與看板垃圾桶

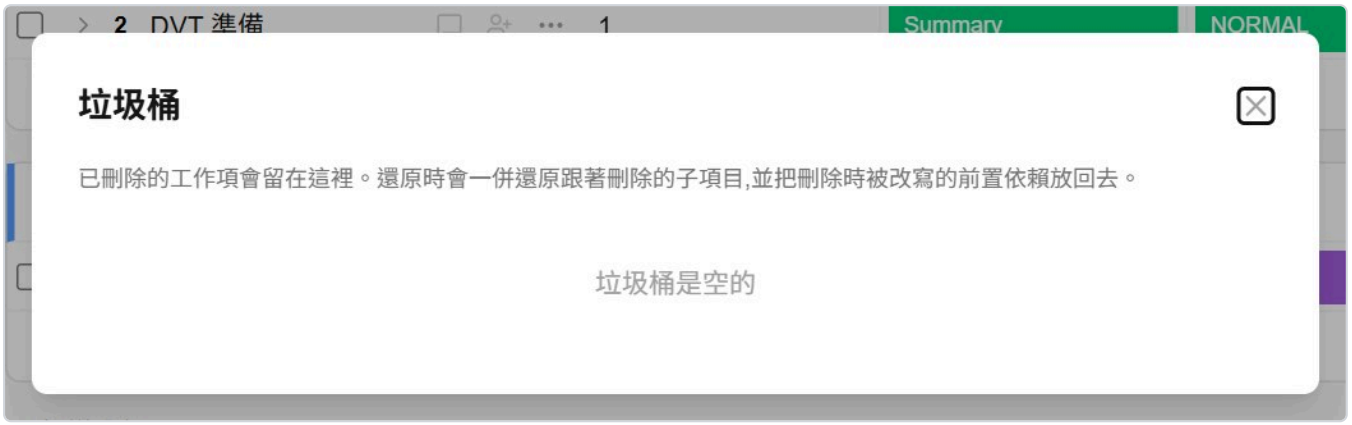

- 被刪除的工作項會留在垃圾桶(含留言、檔案與歷史)。按「**還原**」會連同一起刪除的子項目一起還原,並把刪除時被改寫的前置依賴放回去。
- 「**永久刪除**」連留言、檔案與歷史一併消失,**無法復原**。
- **被刪除的整個看板**在側邊欄「看板垃圾桶」,主管以上可以還原,永久刪除限管理者。


---

16. 儀表板

登入後的首頁,可以用右上角「看板篩選」只看某一個看板。



區塊	說明
預算警示	超支、需動用準備金、接近上限的預算(沒有警示時不顯示)
團隊工作量總覽	每個人在選定期間(本日 / 本週 / 本月 / 自訂)的負載百分比;可切換長條圖 / 圓餅圖。主管看自己的團隊,管理者看全部,成員看自己
過度配置	一天配置總和超過門檻(預設 95%,可改)的人與日期,並提示哪些有浮時的項目可以往後挪;休假日的工作也會被點出來
成員工作量明細	以時間軸列出每個人的任務與每週負載(顏色代表負載高低),可展開查看、點選調整

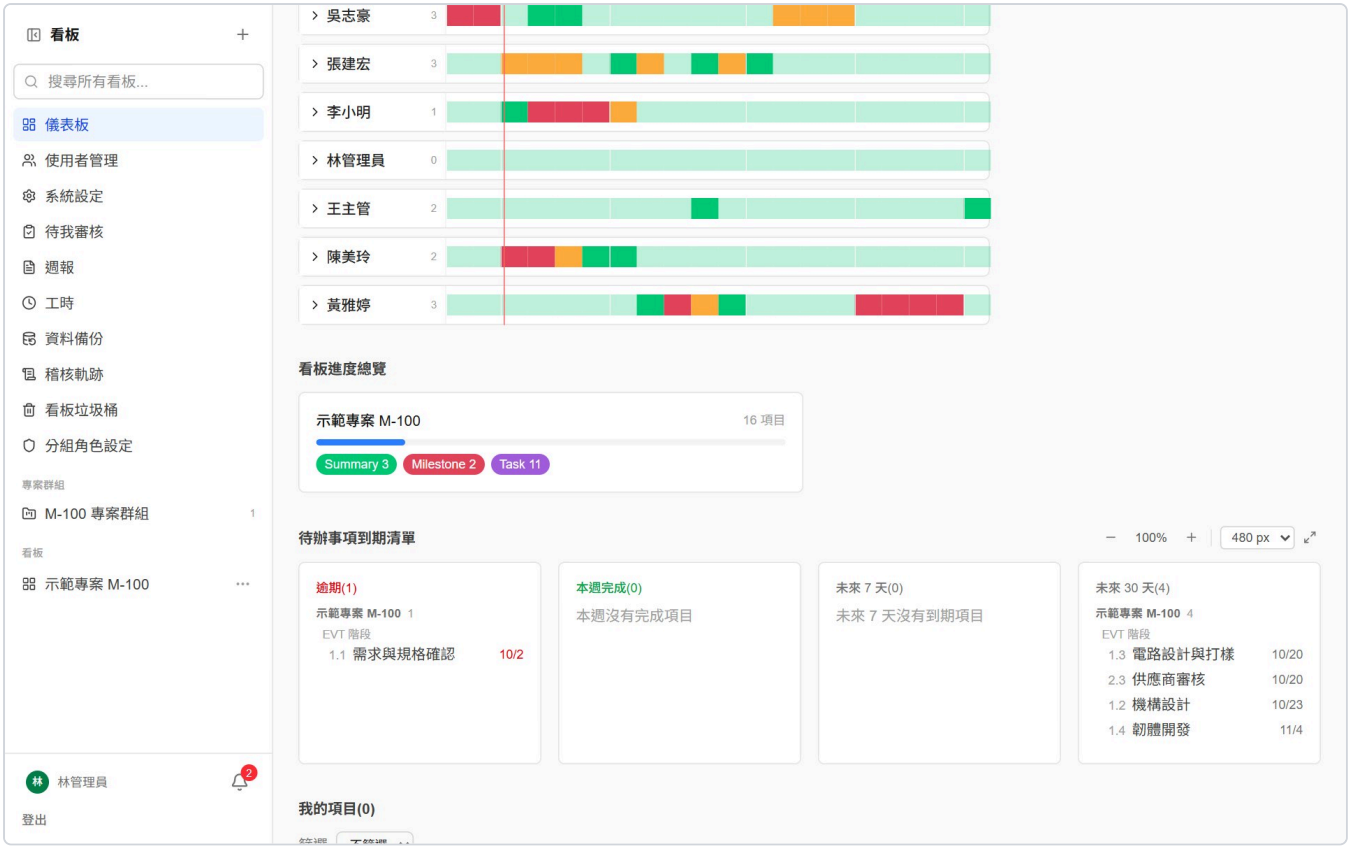

區塊	說明
看板進度總覽	每個看板的平均完成度與各狀態數量
待辦事項到期清單	**逾期 / 本週完成 / 未來 7 天 / 未來 30 天**,可放大縮小、調整清單高度
團隊項目【主管】	部屬被指派的項目
我的項目	指派給你的項目
我的團隊項目	你擔任窗口的資源被指派的項目

「工作量顏色門檻」(幾 % 算偏高、超載)由管理者在系統設定調整。

工作量怎麼算:只算「人員分配」裡設的百分比(第 9.6 節)。只填在「負責人」欄位、沒有人員分配的工作項,那個人仍然是這個項目的負責人(會出現在他的工作項、逾期清單與週報裡),但**不計入工作量與過度配置**——負責人欄位只說明誰負責,沒有百分比。要算工作量,請到該項目的「人員分配」把人加進去並設百分比(最小 1%)。

17. 工時

側邊欄「工時」,有兩個分頁。**專案工時**(掛在工作項上)要主管核准才會計入專案成本;**非專案工時**(會議、突發問題處理...)登記即生效,不計入專案成本。

17.1 我的工時



- 每週一個畫面,用左右箭頭切換週,「回到本週」跳回今天;右上角是本週合計小時。
- 按每一天的「**+ 登記**」,選擇:
  - **專案工作項**:選指派給你的工作項(也可以到項目卡片的「工時與費用」登記),狀態為「待審」。
  - **非專案**:選類別 —— 預設有**例行會議**、**突發問題處理**、**教育訓練**、**行政事務**、**其他**(管理者可以增減類別)。「突發問題處理」可以**連結風險登記冊裡的議題**。
- 每筆都能修改或刪除(專案工時刪除;非專案可修改與刪除)。一天合計不能超過 **24 小時**。

17.2 統計



- 選期間:**本日 / 本週 / 本月**,或自己選起訖日(一次最多 366 天);選「依日 / 依週 / 依月」彙總。
- 勾選「**含待審核的專案工時**」,決定要不要把還沒核准的專案工時算進去。
- 「人員」按鈕選要統計的人。兩張表:**各時段的工時**、**各類別的工時**(專案工作項與各非專案類別)。

看得到誰的工時:自己;直屬主管看自己的部屬;管理者看全部;另外管理者可以在使用者管理替**個別主管**勾選「可以檢視全部成員的工時」。

---

18. 待我審核與請假

側邊欄「待我審核」(有部屬的主管與管理者才看得到)。




- **工時**:你部屬登記的專案工時。**核准**之後才計入成本報表的實際成本(AC);**退回**一定要寫原因,讓對方知道要補什麼。
- **請假**:你部屬登記的休假。核准後那幾天的產能才歸零,「過度配置」才會把排在假期上的工作點出來。休假**不會**移動任何工作項的日期。
- 不能審核自己送出的紀錄,也只能審核你的部屬。

登記請假:目前由管理者在「使用者管理」的「**休假**」分頁替成員登記,填起訖日與事由,送出後狀態為「待主管核准」。

19. 週報

側邊欄「週報」。每週一份,涵蓋範圍跟你登入時看得到的看板一樣。

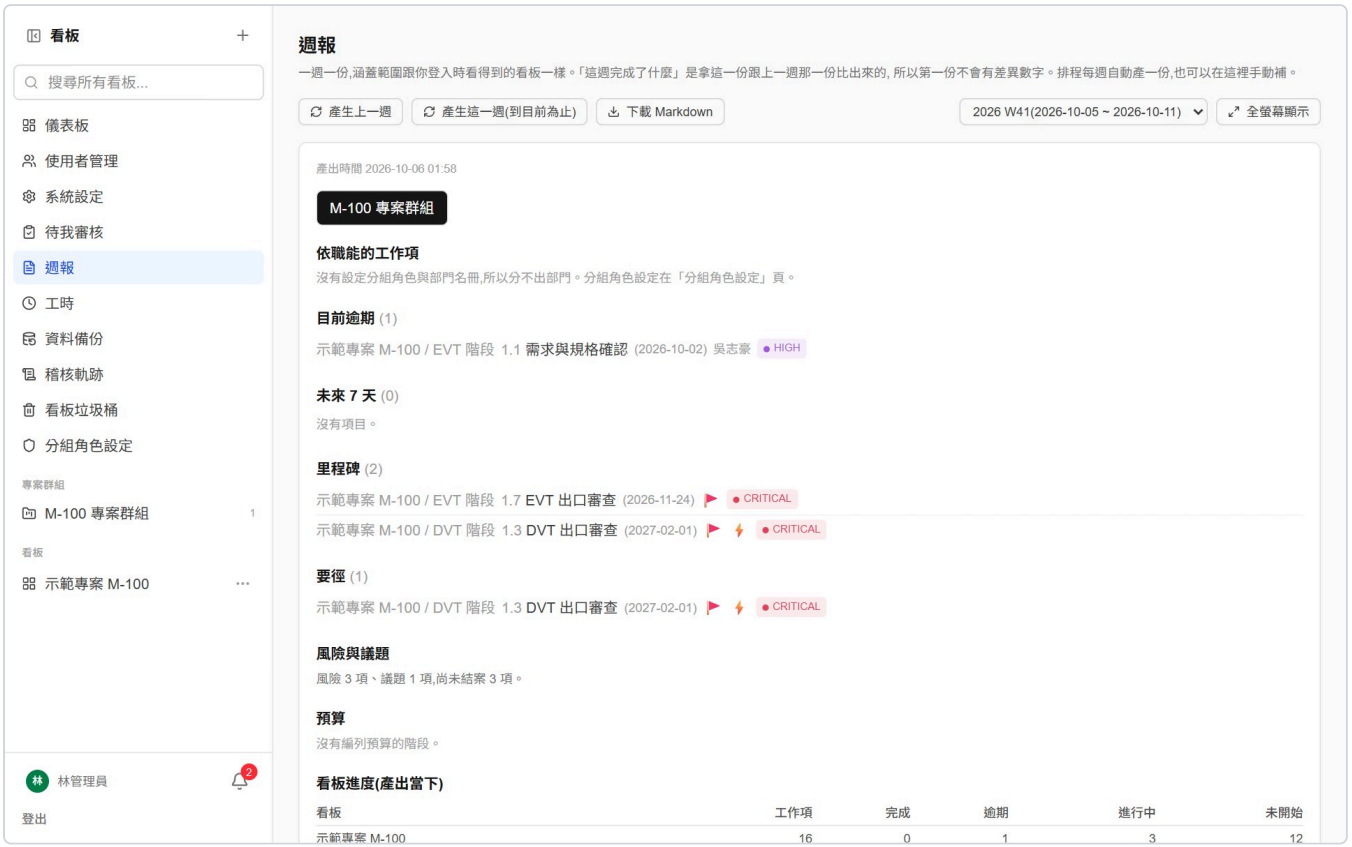


- 「產生上一週」「產生這一週(到目前為止)」可以手動補一份;右上角下拉選單翻歷史週報;「下載 Markdown」存檔;「全螢幕顯示」。
- 內容:依職能的工作項、目前逾期、未來 7 天、里程碑、要徑、風險與議題、預算、各看板進度,以及「這週 vs 上週」的差異(完成、新逾期、狀態更新、時程變化、新增 / 結案的風險)。第一份週報沒有上週可以比,所以沒有差異數字。
- 管理者可以在系統設定排程,每週固定時間為每個專案群組**自動寄**一份給指定收件人(見 21.3)。

20. 搜尋、專案群組、資料備份


20.1 搜尋

側邊欄上方的搜尋框,輸入**至少兩個字**,會搜尋你看得到的所有看板:工作項名稱、留言、附件檔名、風險與議題。

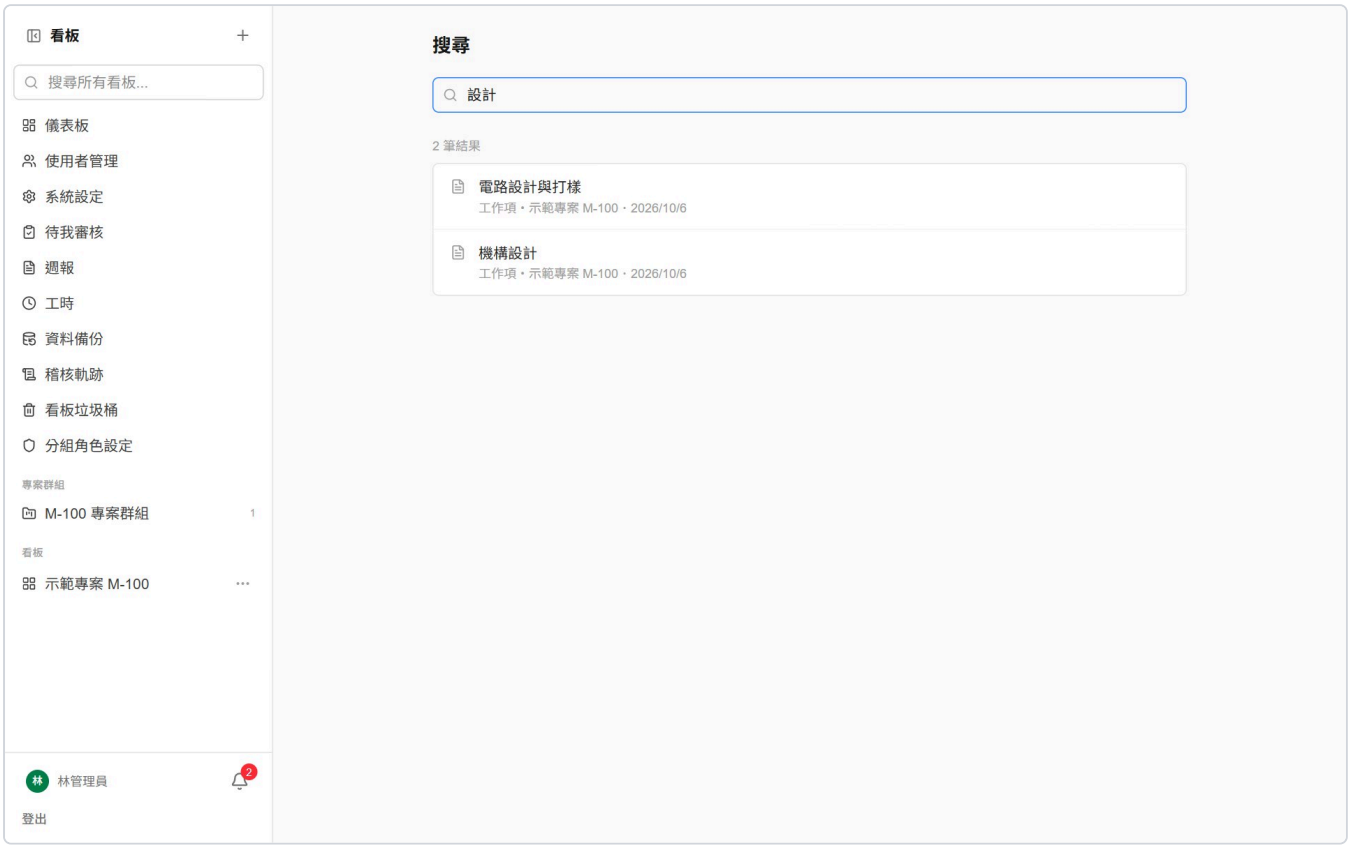

20.2 專案群組

同一個專案拆成幾個看板(例如 POC / EVT / PVT)時,管理者可以把它們放進一個**專案群組**,前置依賴就可以**跨看板**:上一階段的驗證一延,下一階段的開工日跟著移,要徑也會貫穿整個群組一起算。側邊欄「專案群組」進入:

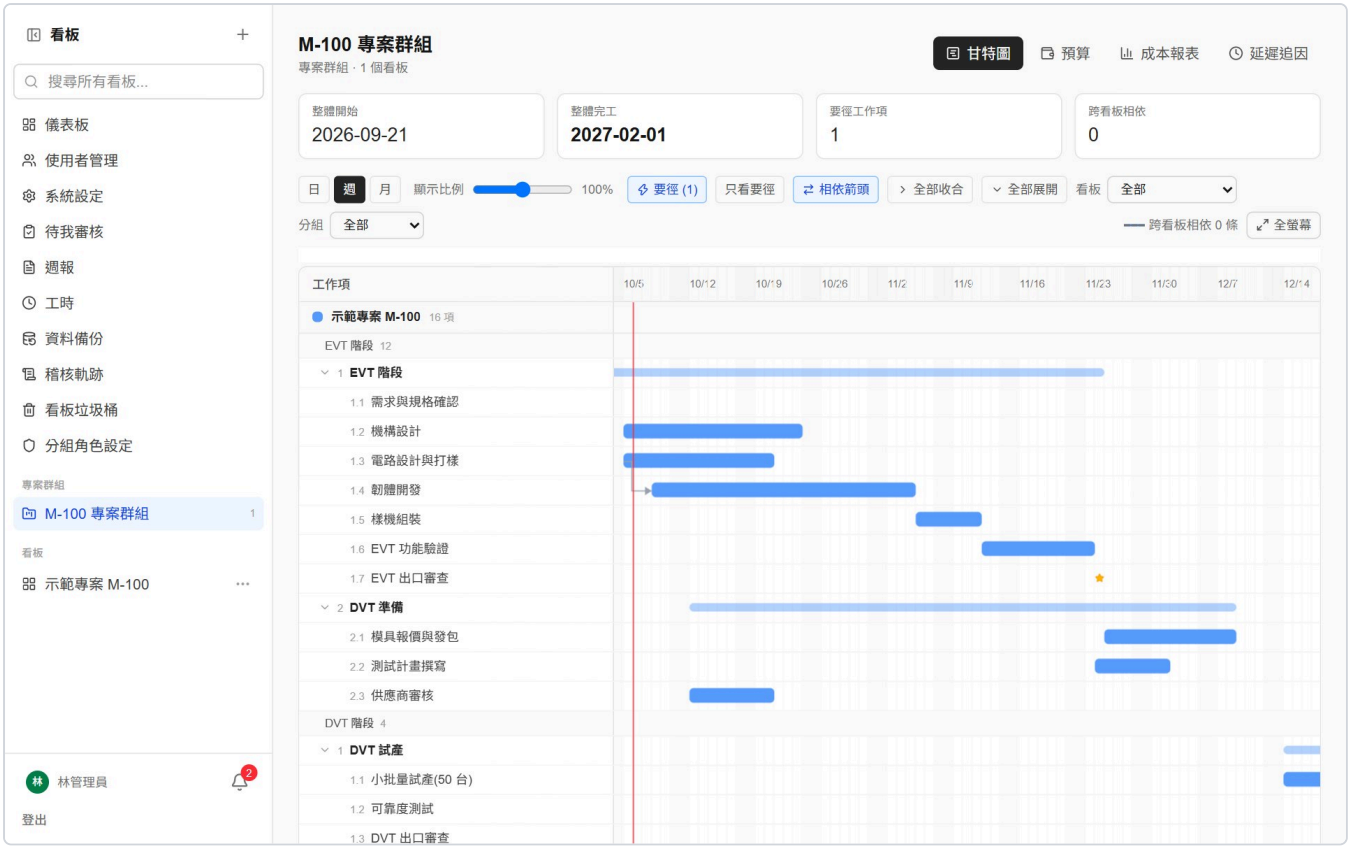

四個分頁:**甘特圖**(整個群組的時程)、**預算**(整個專案的總額)、**成本報表**、**延遲追因**。上方是整體開始 / 完工、要徑工作項數、跨看板相依數。沒有加入群組的看板行為完全不變。設定在「系統設定 → 專案群組」。

20.3 資料備份(每個看板的 CSV)

側邊欄「資料備份」:每個看板一個 **CSV** 檔,涵蓋所有工作項與每個欄位的值。




- **匯出 CSV**:每個看板一鍵匯出,或「全部匯出」。
- **匯入 CSV【管理者】**:改完再匯入是真的往返 —— 既有工作項會被**更新**(不是當新的加進去),CSV 裡沒提到的工作項維持原樣、**不會被刪除**。
- 用 Excel 編輯後,存檔請選「**CSV UTF-8(逗號分隔)**」,否則中文字匯入會變亂碼。
- 範圍不含留言、附件與稽核紀錄;人力表、樣機計畫、樣機 BOM 各自有自己的 Excel 匯出入。

> 這和管理者在「系統設定」做的整個**資料庫備份**(21.4)是兩回事。

---

21. 管理者功能

21.1 使用者管理【管理者】

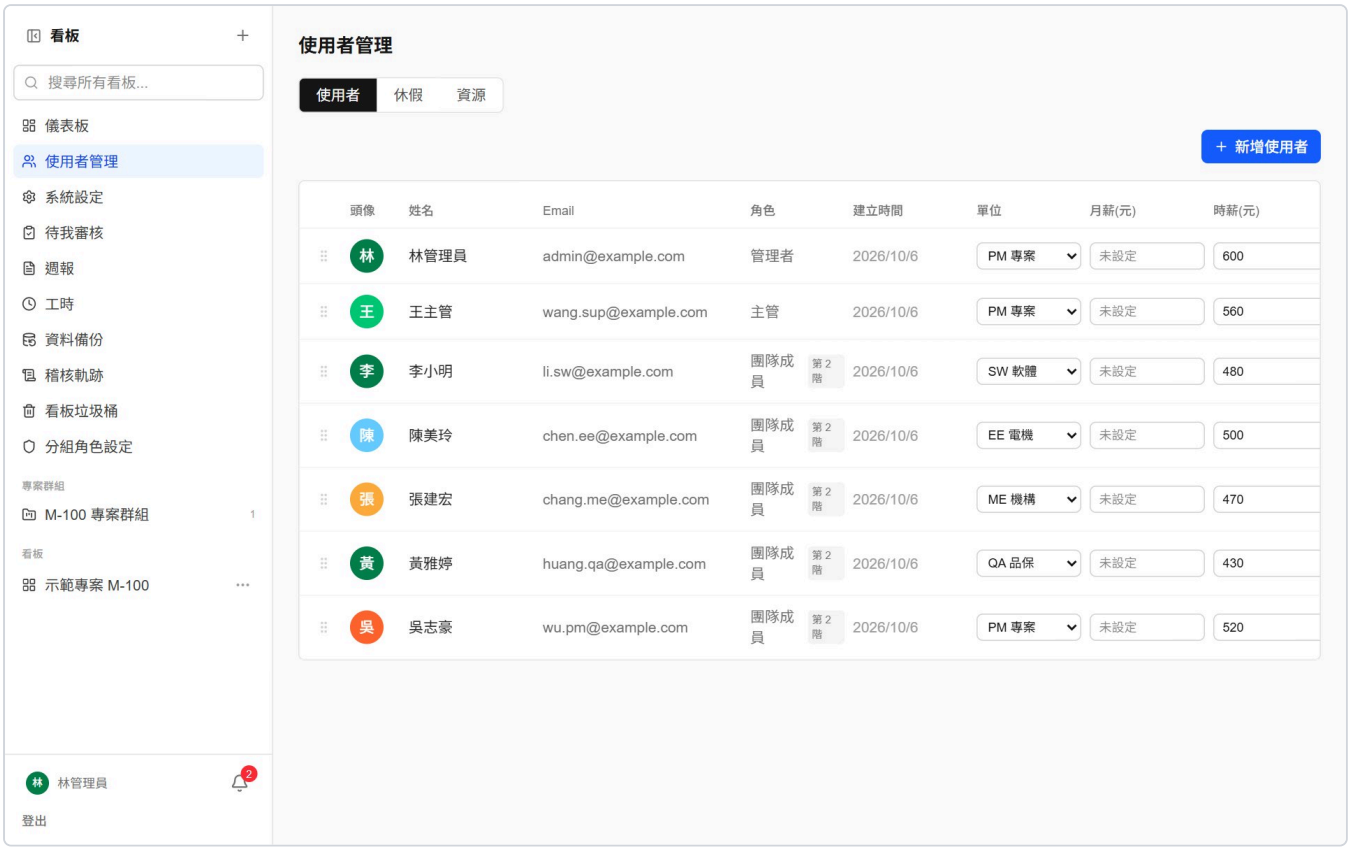

三個分頁:**使用者**、**休假**、**資源**(沒有登入帳號的工具或廠商,有指定的窗口)。

- **新增使用者**:姓名、Email、初始密碼(至少 8 字元)、角色、所屬主管。
- 表格欄位可以直接改:**單位**(SW / EE / ME / QA / FAE / PM...,由「公司組織單位」定義)、**月薪**、**時薪**(成本計算用;時薪有填就優先於月薪)。
- 每列右側:編輯(姓名、Email、角色、所屬主管;角色為主管時可勾「可以檢視全部成員的工時」)、**重設密碼**、**解除鎖定**、刪除(無法復原)。
- 「所屬主管」決定誰能審核這個人的工時與請假,也決定主管的「我的團隊」範圍。
- 拖曳左邊的把手可以調整顯示順序。

21.2 稽核軌跡【管理者】

誰在什麼時候改了什麼:費率、基準線、可見範圍、看板刪除、閘門與變更的決定、工時與請假的審核等。

21.3 系統設定【管理者】



系統設定是一整頁的卡片,由上到下:

卡片	用途
Email 通知	開關。開啟後,指派工作項、觸發自動化時會寄 Email
通知類型	全公司要不要產生某一類通知(關掉就不管個人設定,站內與 Email 都不產生)
甘特圖計算方式	**日曆天**或**工作天**(套用到所有看板)
每日工時	一個工作天算幾小時,用來把「配置 50%、做 10 天」換算成工時與成本
工時類別	非專案工時的類別、是否可連結議題、啟用 / 停用
公司組織單位	人力表欄位、名額單位與使用者所屬單位共用的清單
單位標準月薪與人月換算	每個單位的標準月薪,供人力預算在還不知道是誰做的時候估算金額
匯率	預算的外幣換算(1 單位外幣等於多少台幣)
國定假日	工作天計算時不計入天數的日子
階層顏色	依 Lvl 1–6 設表格整列背景色
甘特圖項目名稱顏色	逾期 / 完成 / 實作中 的名稱顏色
狀態欄位顏色	每個狀態選項的顏色(表格、看板、甘特圖、報表同步變)
Pred 燈號顏色	可開始 / 等待中 / 被阻擋

卡片	用途
工作量顏色門檻	儀表板負載百分比的顏色分界
基準線(Baseline)	把目前所有項目的起訖與天數存成「原始計畫」,之後長條下面會畫出原計畫;可建立新版、切換、改名、刪除版本
專案群組	建立群組、把看板加入或移出(加入時會重算整個群組排程)
專案週報排程	每週哪一天、幾點自動寄專案週報
資料庫備份	見 21.4
專案週報分發	每個專案群組的收件人(現有帳號或外部 Email)與要寄的內容
甘特圖欄位設定	每個看板的開始日期、天數、結束日期、前置依賴、關聯類型、Type、Lag、手動開始 / 天數欄位對應;「重算全部」
新看板預設欄位	之後新增的看板要帶哪些欄位;最省事是從一個排好的看板複製
報表設定	每個看板報表用哪個狀態欄位、每個狀態屬於哪個分類
API / Webhook	唯讀 REST API 金鑰、Webhook(工作項有變動時 POST 到你的網址,以 HMAC 簽章)、MCP 授權
看板分享設定	每個看板公開或限制存取(**看板擁有者也看得到自己看板的這一張**)

21.4 資料庫備份與還原【管理者】



- **排程**:勾「啟用排程」,選每天或每週、時間、保留天數(超過的舊備份自動清掉)。備份涵蓋資料庫與所有上傳的附件,存在伺服器的 `backups/` 資料夾。
- **立即備份**:馬上做一份。
- **現有備份**:列出所有備份與大小,點「還原」。
- **上傳備份檔還原**:把別台機器的備份檔上傳還原,例如搬遷伺服器時。
- ⚠️ **還原會蓋掉現有資料庫**。操作前系統會要求你輸入**指定的確認文字**(該份備份的時間戳記或檔名),並會**先自動存一份「還原前」快照**,萬一選錯還救得回來。請在非上班時間、確認沒人在使用時進行。

21.5 帳號與資料的日常維護建議

- 人員異動:在使用者管理改**所屬主管**與**單位**,工時審核與團隊範圍才會正確。
- 離職:先把項目的負責人與指派轉給別人,再刪除帳號(刪除無法復原)。
- 每個月確認一次備份是否正常產生,並定期把備份檔複製到另一台機器。

---

22. 常見問題

為什麼我拖不動甘特圖的長條?
滑鼠停在長條兩端看提示。常見是:前置依賴決定了日期、這是有子項的父項(範圍由子項統計)、里程碑天數固定,或你沒有調整這個項目時程的權限(只有建立者、管理者、Team Leader / PMD)。

為什麼日期欄位是灰色的、不能改?
它是算出來的:由前置依賴、子項目統計,或(自動排程看板)由 start(set) 加 duration 算出。要改請改它背後的欄位。

父項目的長條比子項目長(或短),為什麼?
父項目的範圍會自動依子項目統計。如果父項目自己有 Pred,就保留依前置排出來的自己的日期,子項目要落在區間內。

刪錯了怎麼辦?
項目:看板「…」→ 垃圾桶 → 還原。整個看板:側邊欄「看板垃圾桶」。剛剛的修改:「上一步」(第 6 章)。

「上一步」按鈕是灰的?
這次開著的畫面還沒有可以復原的修改,或剛換了看板 / 重新整理。復原只記得這次畫面上自己做的修改。

復原時跳出「無法復原」?
代表那個值在你改完之後又被別人(或另一個分頁)改過,系統為了不蓋掉新的修改而擋下來。重新整理畫面看目前的值,再決定要不要手動改。

為什麼我改不了某一筆風險的內容?
只有建立者、審核人與管理者可以改內容。你若是負責人,只能寫進度更新、切換處理狀態、申請結案(第 11 章)。

風險不能直接改成「已結案」?
要由負責人按「申請結案」,再由**所有審核人**同意才會結案。沒有審核人的舊資料,請先補上審核人。

取代名稱取代錯了,或沒改到子項目?
批次取代不能用「上一步」還原,把「尋找」與「取代為」對調再做一次即可。它只改**打勾的項目本身**,想連子項目一起改,請把子項目也勾起來。

複製的項目沒有指派人員?
複製不帶人員分配、留言、附件、待辦與工時,只帶欄位值與階層。請在複本上重新指派。

我登記的工時沒有出現在成本報表?
專案工時要直屬主管在「待我審核」核准後,才會計入實際成本。非專案工時不計入專案成本。

看不到「待我審核」?
只有「有人以你為所屬主管」的主管,以及管理者看得到。

看不到某個看板?
該看板可能是「限制存取」,而你不在名單內。請看板擁有者或管理者在「系統設定 → 看板分享設定」把你加進去。

畫面出現「需要重新整理」或操作一直失敗?
系統剛更新過版本,舊的畫面送出的請求已經對不上。重新整理頁面即可。

帳號被鎖住了?
連續輸入錯誤密碼 5 次會鎖 15 分鐘;請稍等,或請管理者在使用者管理「解除鎖定」。

---

23. 名詞對照

名詞	說明
WBS 編號	項目名稱前的階層編號,例如 1.2.3,由位置自動產生
Summary(摘要)	有子項目的父項,時間範圍由子項目統計
Milestone(里程碑)	重要節點,時間固定為一天,甘特圖上是星形
Pred(前置依賴)	這個工作要等哪些工作
FS / SS / FF / SF	前置與後續的四種關聯:完成→開始、開始→開始、完成→完成、開始→完成
Lag	前置與後續之間要空的天數,負數代表提前
要徑	專案中總浮時為 0 的工作鏈,延一天整個專案就延一天
浮時	一個工作最多可以延幾天而不影響專案完工
基準線	當初計畫的日期快照,用來比較延遲或提前
BAC / AC / EV / PV	完工總預算 / 實際成本 / 實獲值(已完成的工作值多少錢) / 計畫價值(照計畫今天該完成多少)
CPI / SPI	成本效率 / 進度效率,大於 1 是好的
CV / EAC	成本差異 / 完工預估(照目前效率跑完的總花費)
EMV	風險金額 = 機率 × 發生時的金額
準備金	應變準備金(已知風險用)與管理準備金(沒想到的事用),要「動支」才能花
專案群組	把同一專案的幾個看板放在一起,前置依賴可跨看板
分組角色	某個分組的 Team Leader、DM、PMD 等,在該分組內有額外權限
start(set) / duration	自動排程看板的手動開始日與手動天數
