工作管理平台 使用手冊

適用版本:2026-11-06(含「樣機 BOM 每列可勾選:全選、批次升階 / 降階、編輯欄位、移動或複製到別處、刪除」、「資料庫備份可以下載(每一份備份旁的「資料庫」「附件」)」、「樣機 BOM 固定有「BOM LEVEL」欄:改數字或按升階 / 降階調整上下層,父階自動加總子項目的價錢,貼上認得 BOM LEVEL」、「樣機使用時程的樣機欄依名字長度自動調寬、可以拖曳調整」、「比較兩份 BOM(EVT 到 DVT 增減了哪些料、改了什麼、單台成本差多少,可匯出 Excel)」、「樣機 BOM 可以自訂欄位(文字、數字、日期、下拉選單、人員、勾選、連結、檔案附件)、必填提醒、預設值,系統預設 + 各看板調整,Excel 貼上與匯出入跟著走」、「Team Leader 可以把工作項指派給任何人」、「選取畫面上的元素:查手冊或回報問題、回報附上位置資訊」、「儀表板的待辦事項期限也列風險 / 議題的待辦事項」、「看板角色可以設實作成員與 Resource 成員(分組預設沿用)」、「畫面右下角的「?」說明與問題回報、管理者的使用者回報頁」、「週報的工作項資訊更多收「欄位修改」、過期快照提醒」、「週報提醒信只寄給會寄週報的專案的成員、信裡寫專案名稱」、「專案週報分發的預算金額開關、伺服器磁碟空間監控、通知 Email 附連結、樣機選擇的重疊提醒與復原、閒置樣機與一次改好幾台的百分比」、「預算金額可見範圍補上週報與項目直接費用」、「樣機計畫可以直接改產品名稱」、「項目卡片與甘特圖人員分配視窗也能選使用樣機」、「儀表板的樣機使用時程:各樣機被哪些工作項使用、佔用百分比預設 100%」、「Mantis 處理人對應負責人:Email、名稱、手動指定三層比對」、「待辦事項逾期提醒的 Email 附連結,點下去直接開對應畫面」、「預算金額只給有權限的人看(管理者、看板擁有者、Team Leader / PMD / PM DM、看板指名的人、指定組織的主管)」、「Mantis 雙向同步:每個連線的欄位對應設定、存檔即寫回 Mantis」、「錯誤訊息顯示原因」、「Mantis 同步來的問題,在風險清單的類型欄標『問題』」、「風險登記冊的「問題」改稱『議題』(Mantis 的「問題」分頁維持原名)、風險 / 議題點一列就能編輯、待辦事項的備註、改名稱與拖曳排序、樣機計畫的階段欄照時間排並可拖曳調整、用途列可拖曳與改名、使用手冊網頁版(側邊欄「使用手冊」)、對話輸入框打 # 引用工作項 / 風險 / 議題 / 問題」、「# 選單巢狀可收放可搜尋」、「項目視窗的『在對話中討論』」、「轉成待辦事項可更新既有待辦事項的備註」、「儀表板 / 通知點風險直接開那一筆」、「對話附連結與引用工作項 / 風險 / 議題(搜尋加可收放的工作項階層)、轉待辦事項 / 留言時從清單選、待辦事項的處理者、風險 / 議題的待辦事項」、「Team Leader 在分組角色設定指定自己分組(看板層級的 Team Leader 是整個看板)的 DM 與 member」、「週報納入看板頻道對話」、「Summary 的開始 / 結束 / 天數取子項的範圍」、「甘特圖項目名稱旁顯示狀態」、「專案週報排程顯示上次執行結果、全部寄失敗自動重試、立即執行一次」、「專案儀表板(看板名稱-儀表板)」、「看板角色(分組沿用、可逐一覆蓋)」、「副主管看得到我的團隊」、「對話:看板頻道、私訊、群組、檔案與圖片、訊息搜尋、轉成待辦事項 / 留言,即時推送」、「工作項留言即時更新」、「系統設定子項目、組織單位對應架構圖部門」、「組織架構圖與多階簽核(二階、三階主管同意)」、「工時預估對照」、Google 日曆可選每週 / 每月 / 自訂區間、「上一步 / 下一步」、批次複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除、人員選單搜尋、風險與議題的結案審核、工時行事曆與範本、週報分專案寄信與資訊更新、從 Google 日曆匯入工時、工時的「重複」設定、MantisBT 問題同步)

本文所有畫面都是**虛構的示範資料**(示範專案 M-100),不是任何真實專案。

目錄

1. 快速開始
2. 角色與權限
3. 看板的基本概念
4. 表格視圖
5. 項目卡片
6. 上一步 / 下一步
7. 勾選後批次操作:複製、移動、取代名稱、刪除
8. 看板(Kanban)視圖
9. 甘特圖
10. 報表
11. 風險與議題
12. 階段閘門
13. 變更管理
14. 預算
15. 看板的進階功能
16. 儀表板
17. 工時
18. 待我審核與請假
19. 週報
20. 搜尋、專案群組、資料備份
21. 管理者功能
22. 常見問題
23. 名詞對照

角色標示:【全員】所有登入的人都能用;【主管以上】主管與管理者;【管理者】只有管理者;【分組角色】被指定為某分組負責角色的人(只在該分組內有效)。

---

1. 快速開始

1.1 登入

用公司給你的 Email 與密碼登入。

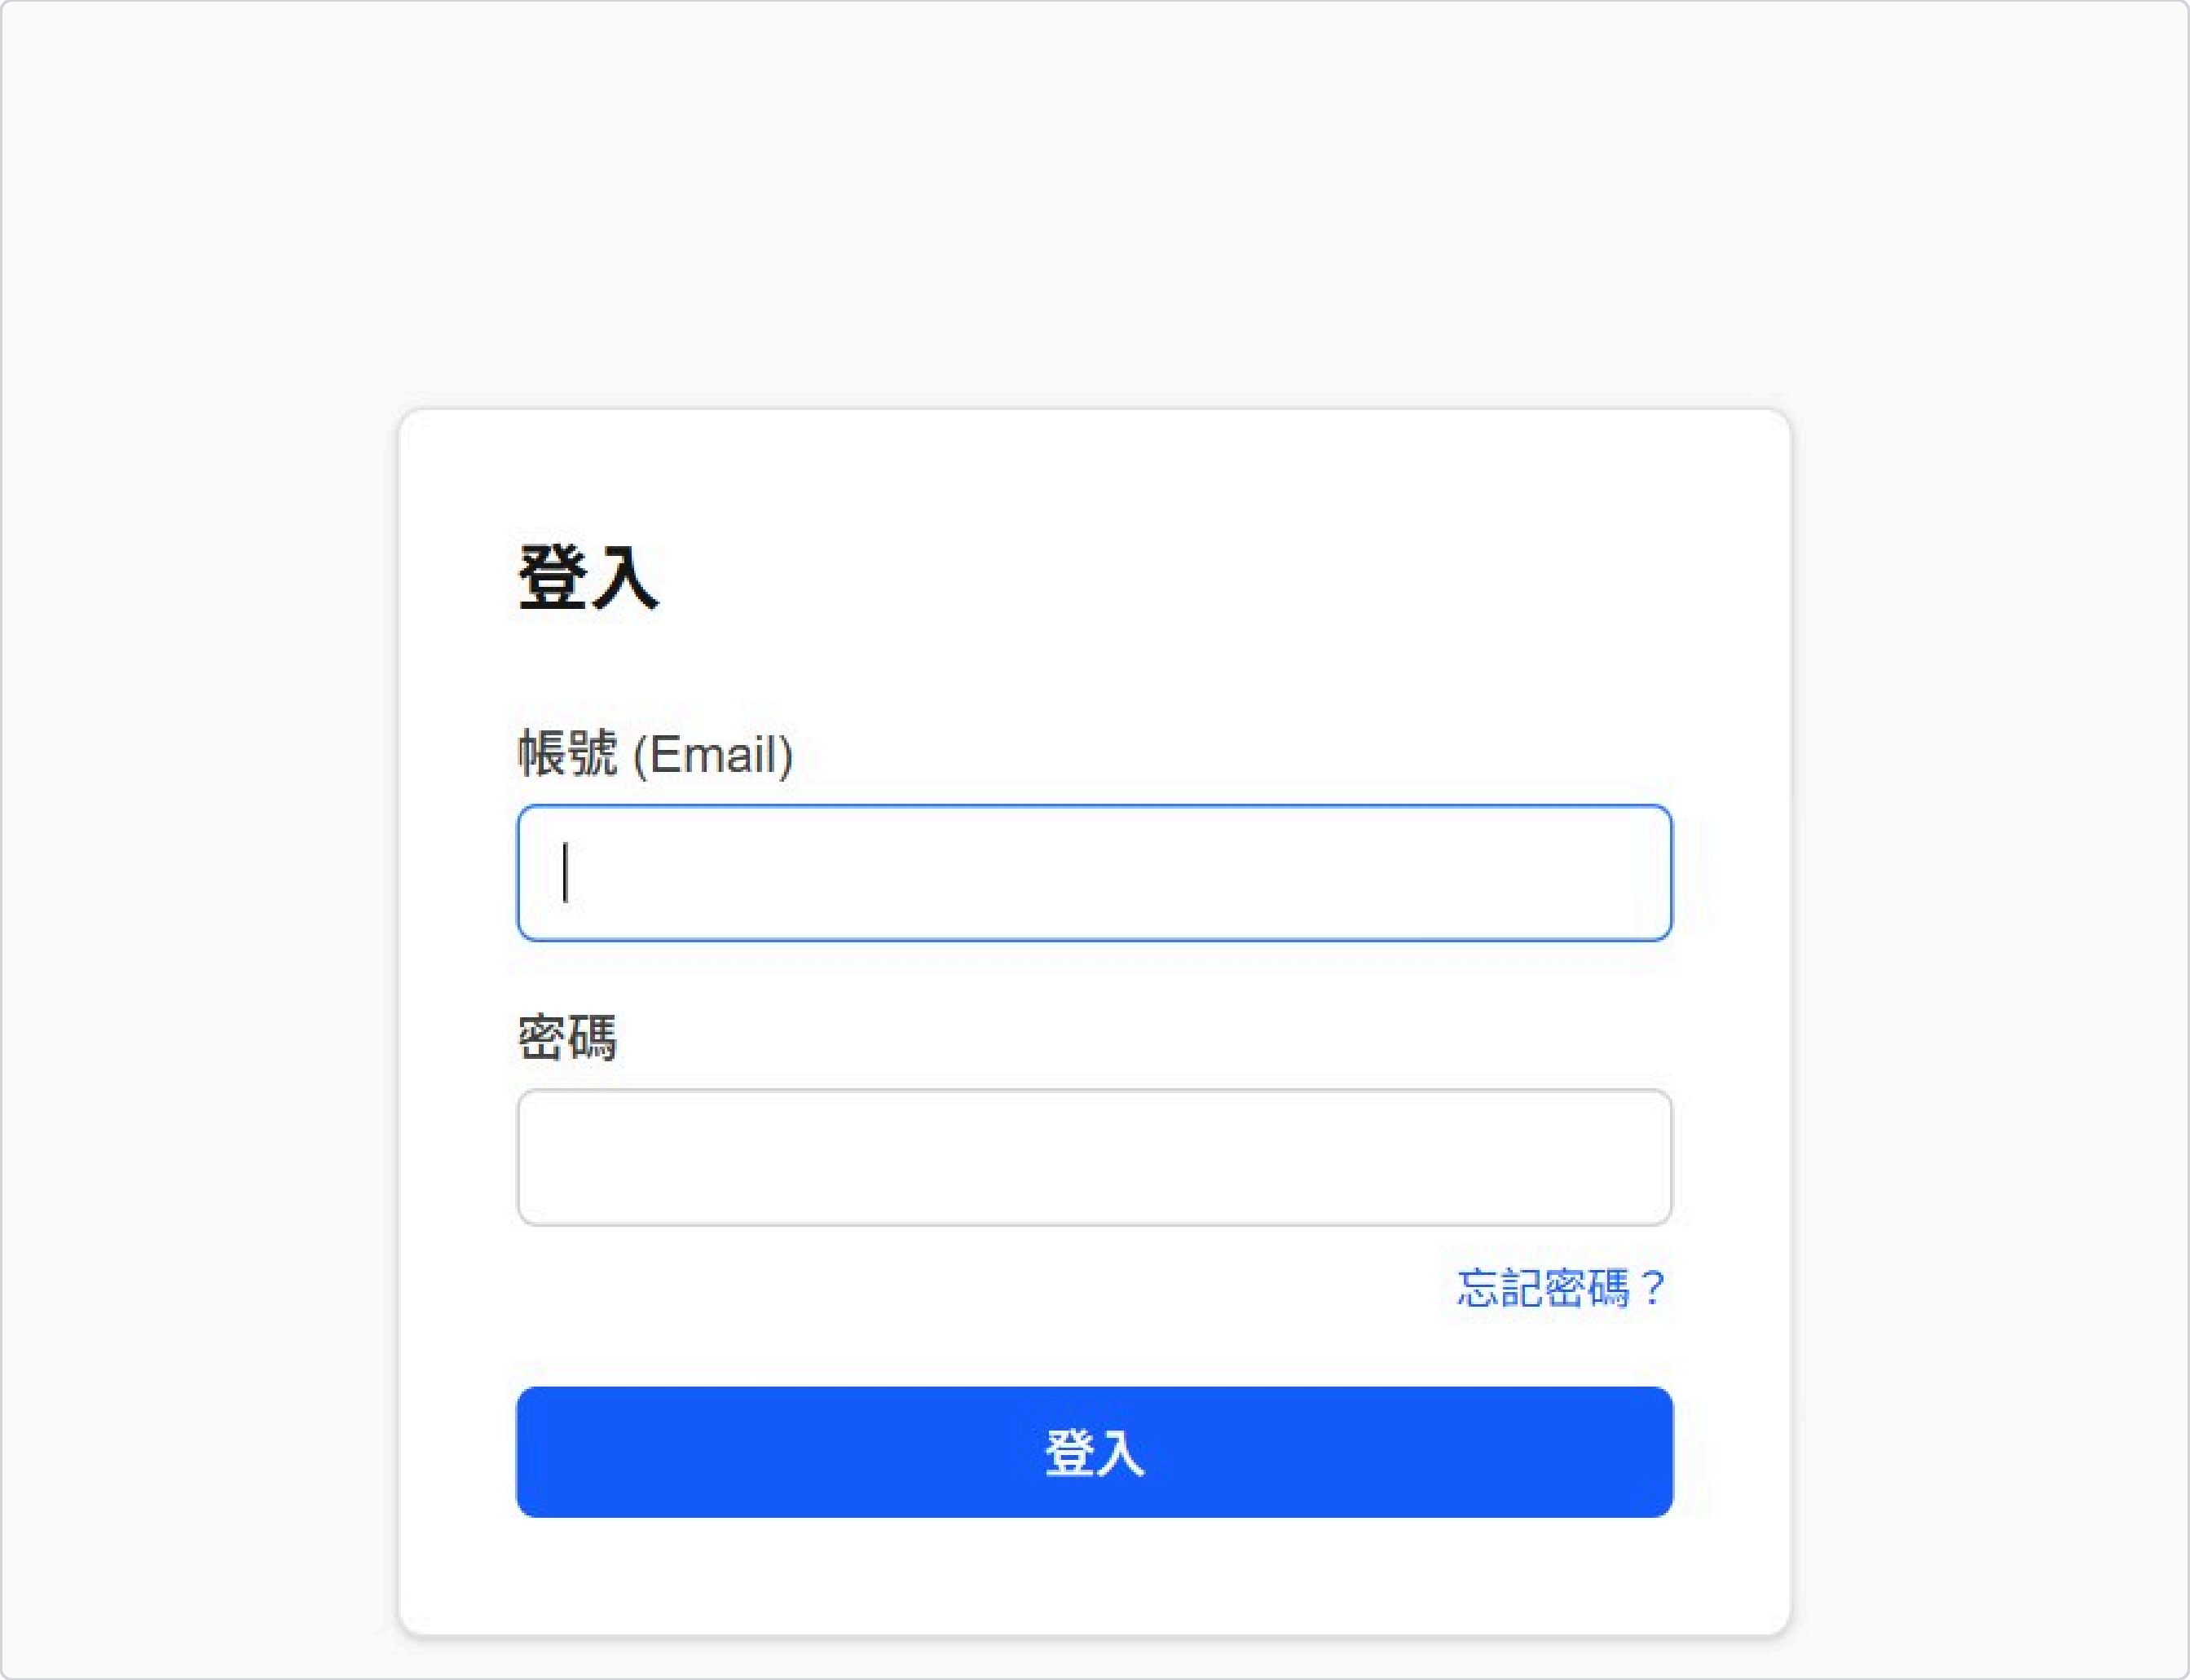

登入
帳號 (Email)
密碼
忘記密碼？
登入

- 連續輸入錯誤 **5 次**,帳號會鎖 **15 分鐘**;管理者可以在「使用者管理」提早幫你解除鎖定。
- 登入狀態會保留 **7 天**,不用天天重新登入。
- 忘記密碼:點「忘記密碼?」,輸入 Email,系統會寄一封重設連結給你(需要系統已設定寄信功能)。

1.2 畫面總覽

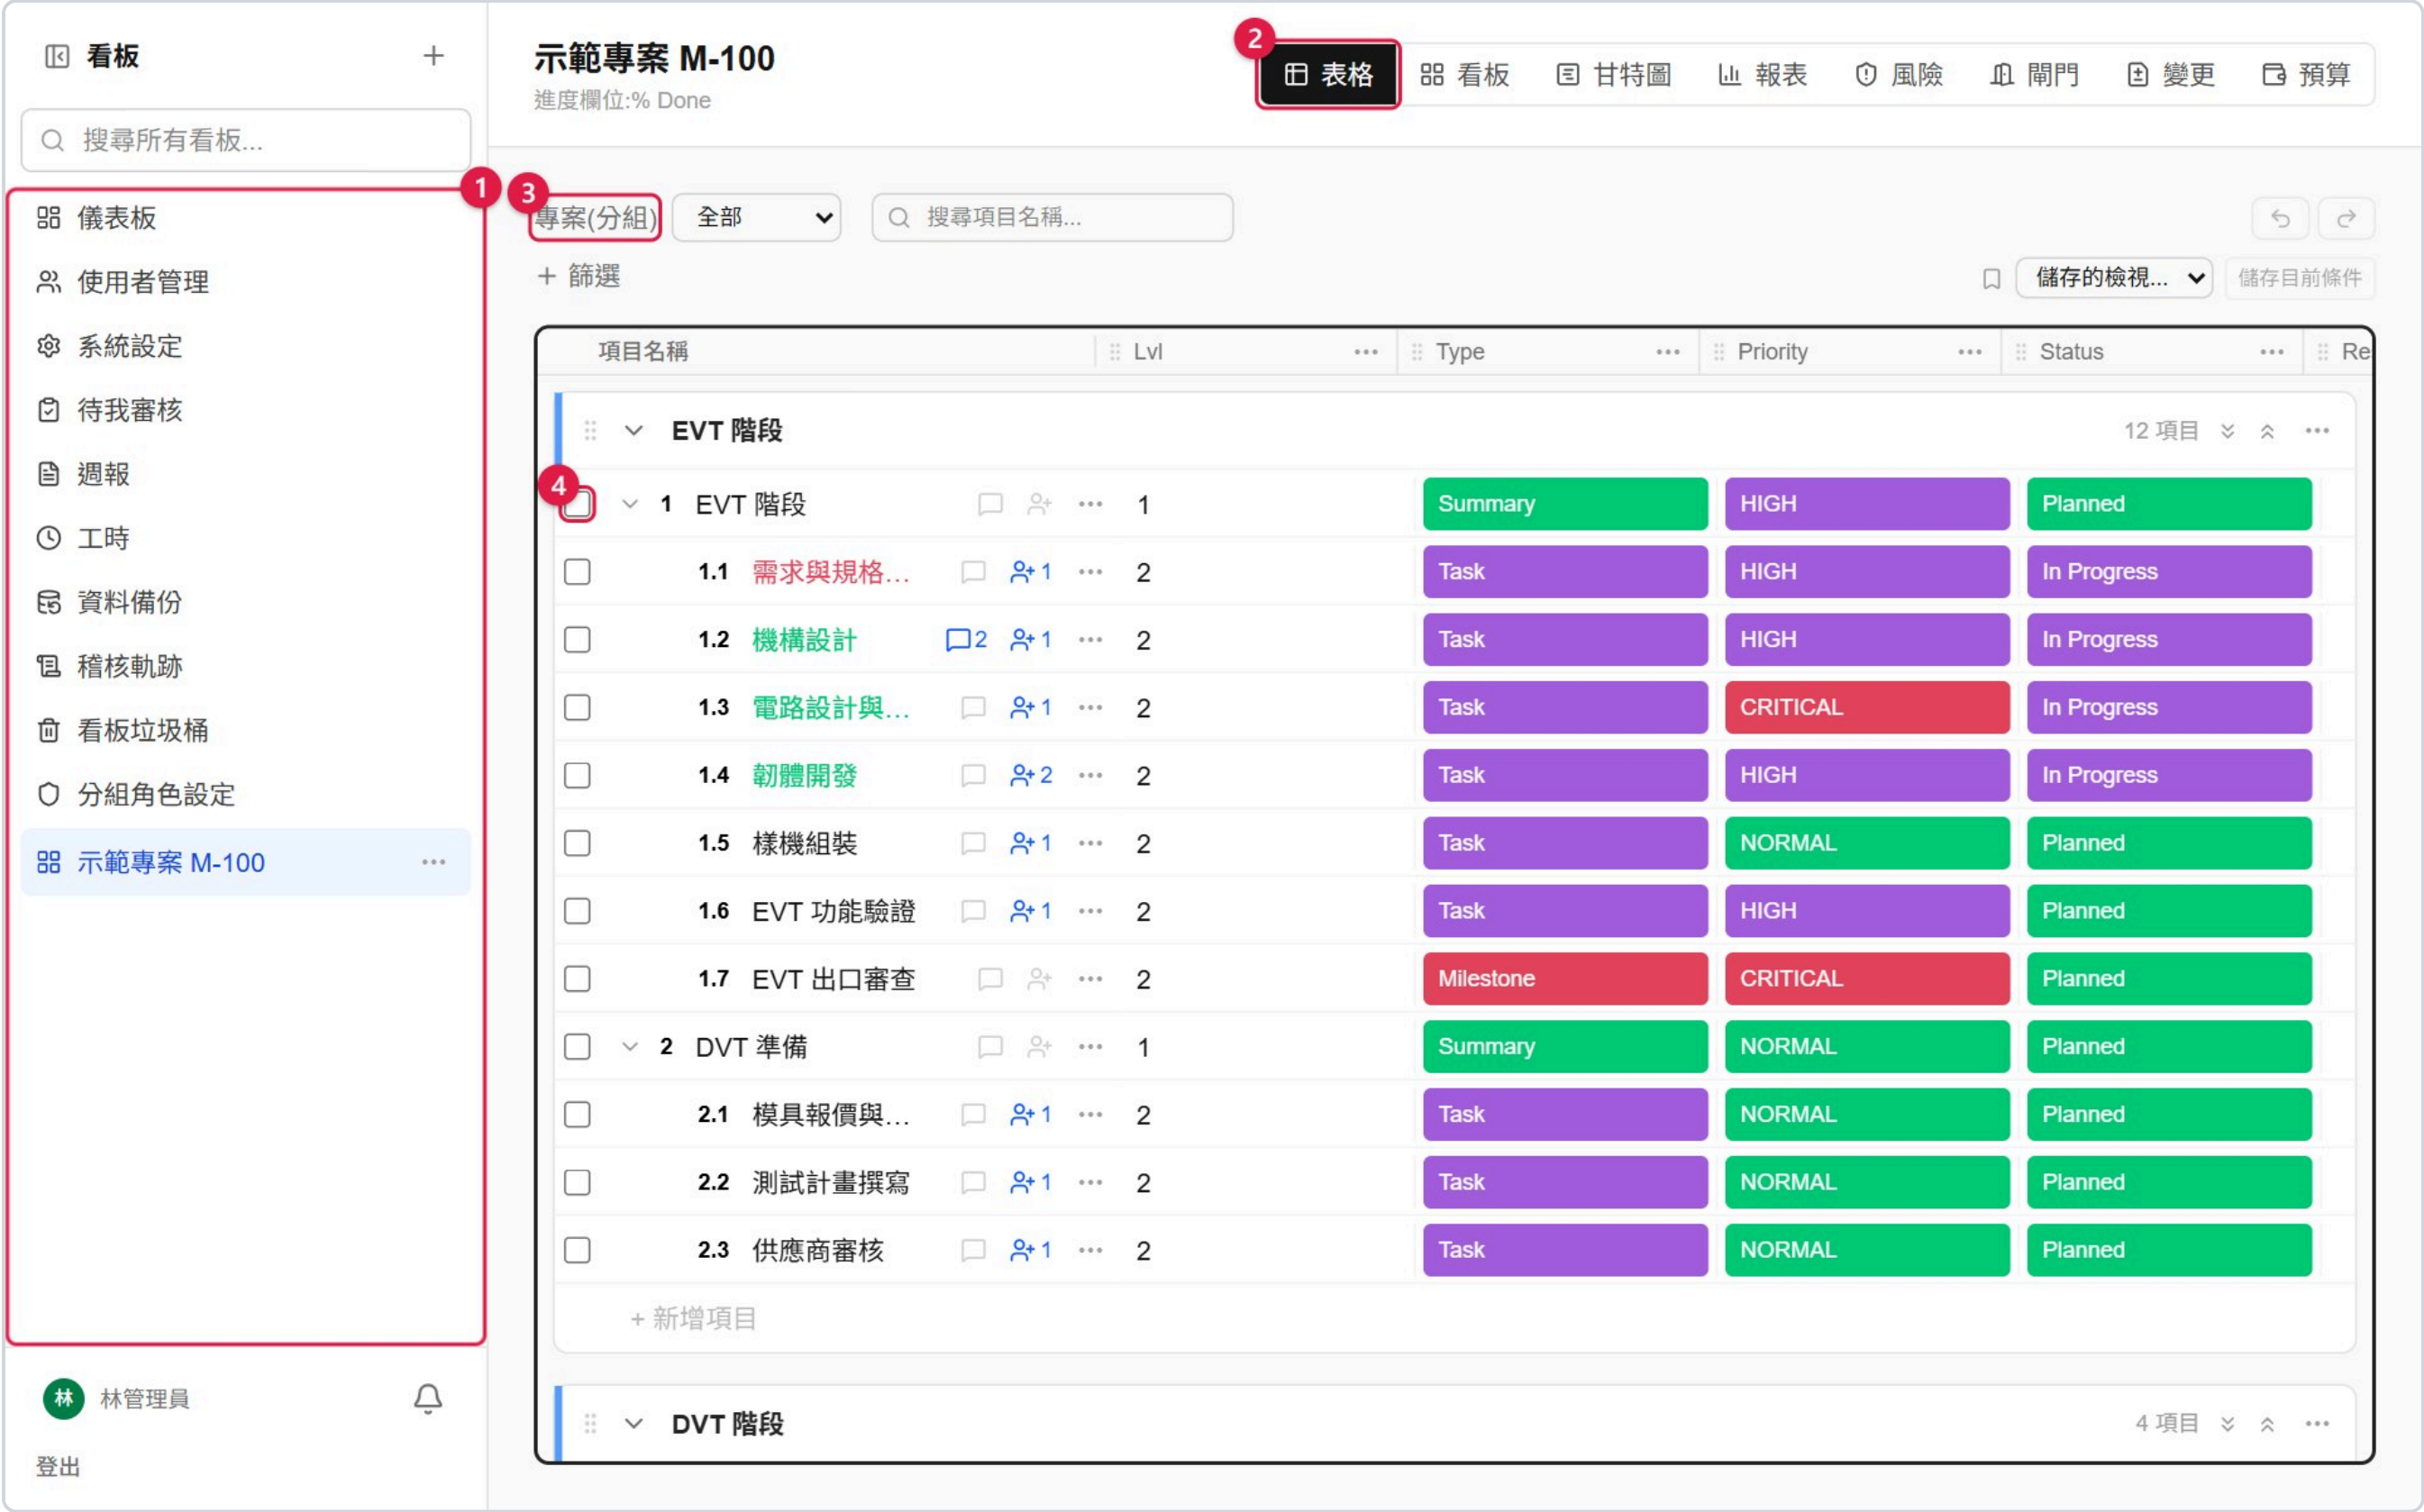
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
示範專案 M-100
林管理員
登出
示範專案 M-100
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
專案(分組)
全部
搜尋項目名稱...
+ 篩選
儲存的檢視...
儲存目前條件
1
2
3
4

項目名稱	Lvl	Type	Priority	Status
EVT 階段 (12 項目)				
1 EVT 階段	1	Summary	HIGH	Planned
1.1 需求與規格...	2	Task	HIGH	In Progress
1.2 機構設計	2	Task	HIGH	In Progress
1.3 電路設計與...	2	Task	CRITICAL	In Progress
1.4 韌體開發	2	Task	HIGH	In Progress
1.5 樣機組裝	2	Task	NORMAL	Planned
1.6 EVT 功能驗證	2	Task	HIGH	Planned
1.7 EVT 出口審查	2	Milestone	CRITICAL	Planned
2 DVT 準備	1	Summary	NORMAL	Planned
2.1 模具報價與...	2	Task	NORMAL	Planned
2.2 測試計畫撰寫	2	Task	NORMAL	Planned
2.3 供應商審核	2	Task	NORMAL	Planned
+ 新增項目				
DVT 階段 (4 項目)				

編號	位置	說明
①	左側邊欄	儀表板、工時、週報、設定,以及你能看到的所有看板
②	視圖切換	同一個看板的 8 種看法:表格、看板、甘特圖、報表、風險、閘門、變更、預算
③	分組篩選與搜尋	只看某個分組,或用名稱搜尋項目
④	勾選框	勾選項目之後,可以批次修改、複製、移動、取代名稱、刪除

1.3 側邊欄

側邊欄會依你的角色顯示不同的項目(見第 2 章)。

項目	誰看得到	用途
搜尋所有看板	全員	搜尋工作項、留言、附件檔名、風險與議題
儀表板	全員	個人與團隊的工作量、逾期清單;你在某個看板上有專案角色(Team Leader、PMD、各職能 DM)時,底下多一個「看板名稱-儀表板」子項(見 16.1)
系統設定	全員(管理者看到全部,其他人只有看板分享設定)	全公司的設定;底下有兩個子項目:

項目	誰看得到	用途
└ 使用者管理	管理者	新增 / 編輯帳號、休假、資源、每個人的組織單位
└ 組織架構圖	全員(只有管理者能編輯)	部門成樹,誰是誰的直屬、二階、三階主管(見 21.1b)
待我審核	有部屬的主管、管理者	核准工時與請假
週報	全員	每週自動產生的進度週報
更新記錄	全員	你看得到的所有看板上,所有人對工作項的更新與變化(見 1.6)
對話	全員	看板頻道、私訊、群組聊天室,訊息即時送達(見 1.7)
工時	全員	登記與統計工時
使用手冊	全員(管理者功能那一章只有管理者看得到)	這份手冊的網頁版:左邊目錄、可以搜尋關鍵字;內容跟著系統一起更新,永遠是目前這一版
資料備份	全員(匯入限管理者)	每個看板匯出 / 匯入 CSV
稽核軌跡	管理者	誰在什麼時候改了什麼
看板垃圾桶	主管以上	還原被刪除的看板
分組角色設定	管理者;分組的 Team Leader 只看得到自己負責的分組	指定每個分組的 Team Leader、DM 等(Team Leader 只能指定自己分組的 DM 與各職能 member)
專案群組	有群組時	把同一專案的幾個看板放在一起看
看板列表	全員	你能開啟的看板;主管以上可用「+」新增

「系統設定」右邊的小箭頭可以收合或展開它的子項目(人在子項目那一頁時不會被收起來)。側邊欄左上角的按鈕可以**收合**,邊緣可以**拖寬**;手機畫面會變成左上角的選單按鈕。

專案群組與看板的順序可以自己排:在側邊欄用滑鼠把「專案群組」或「看板」的那一列往上或往下拖,放開就存好,下次登入還是這個順序。順序是**每個人各排各的**,不影響別人;新建立的看板或群組會接在最後面。管理者代操作別人的帳號時不能改對方的順序。管理者在「系統設定」的「專案群組」清單,拖曳群組左邊的把手也能排,跟側邊欄同一份順序。

使用手冊(網頁版):側邊欄的「使用手冊」(①)打開這份手冊。左邊是目錄,管理者功能那一章只有管理者看得到。在搜尋框(②)輸入關鍵字(**至少兩個字**)按 **Enter**,結果(③)列出符合的章節與有幾處、前後文,關鍵字標黃,點章名跳到那一章。

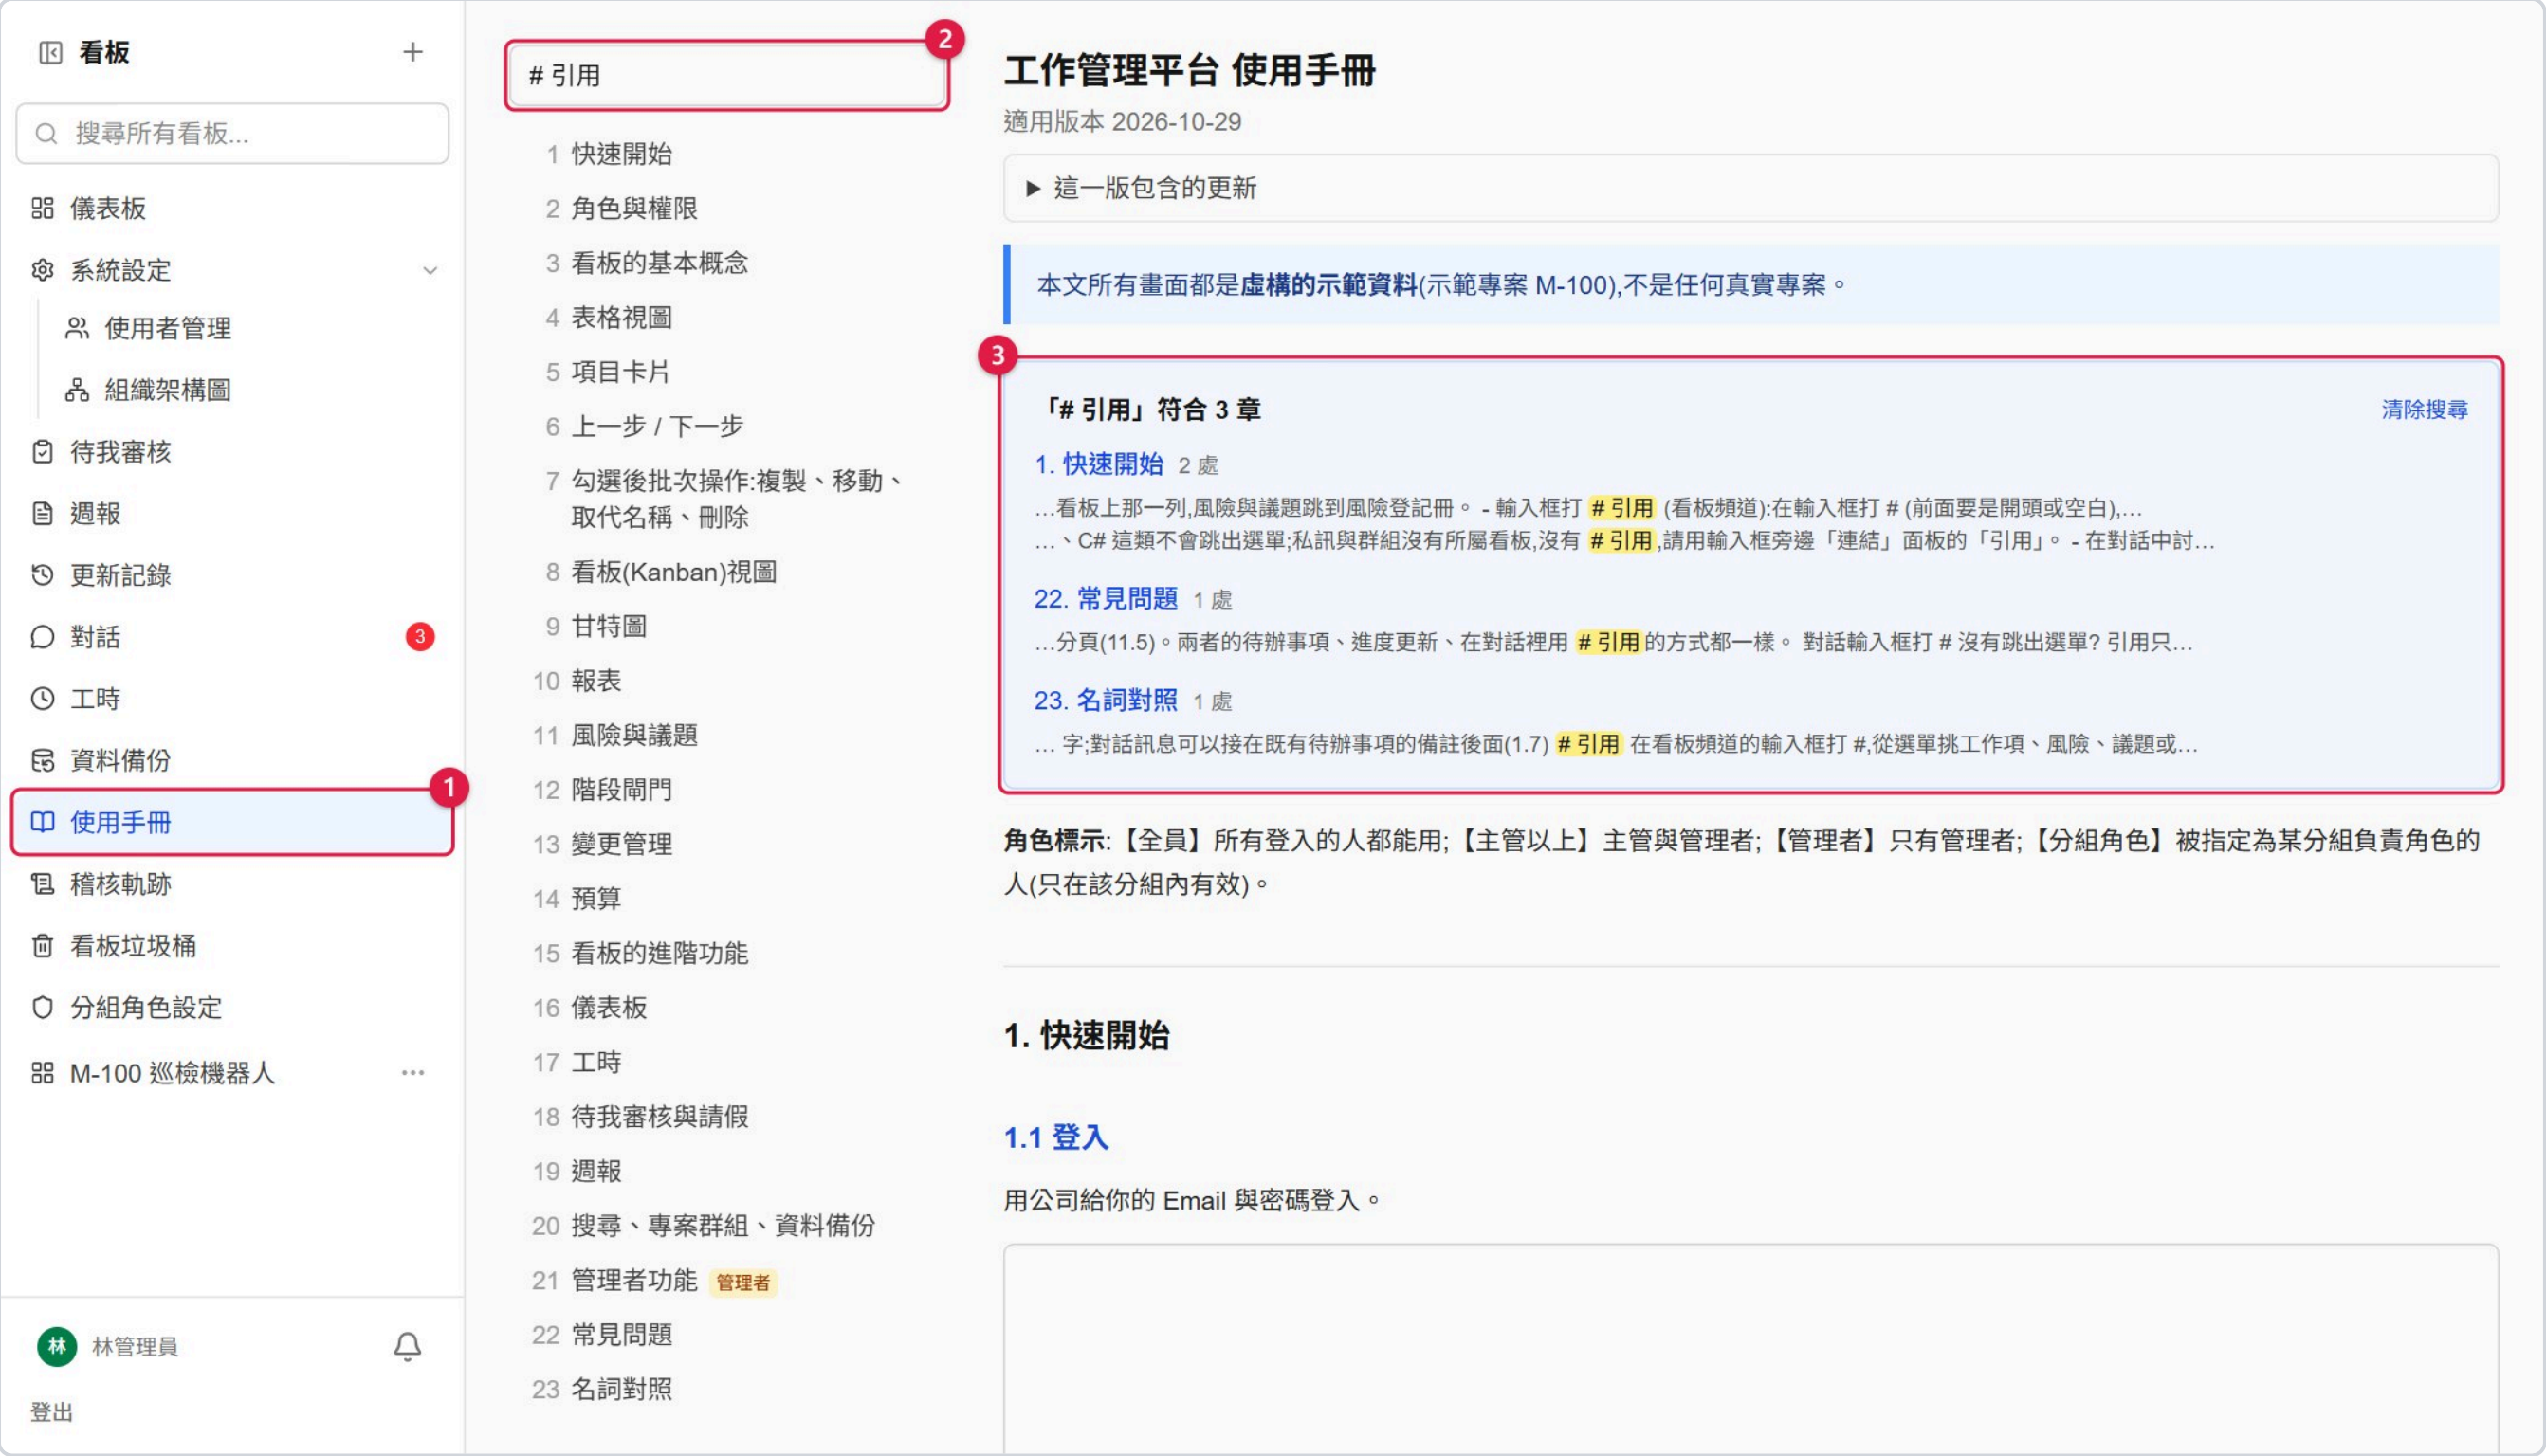
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
對話
3
工時
資料備份
使用手冊
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
林管理員
登出
1
2
# 引用
1 快速開始
2 角色與權限
3 看板的基本概念
4 表格視圖
5 項目卡片
6 上一步 / 下一步
7 勾選後批次操作:複製、移動、取代名稱、刪除
8 看板(Kanban)視圖
9 甘特圖
10 報表
11 風險與議題
12 階段閘門
13 變更管理
14 預算
15 看板的進階功能
16 儀表板
17 工時
18 待我審核與請假
19 週報
20 搜尋、專案群組、資料備份
21 管理者功能 管理者
22 常見問題
23 名詞對照
3
清除搜尋

工作管理平台 使用手冊

適用版本 2026-10-29

▶ 這一版包含的更新

本文所有畫面都是**虛構的示範資料**(示範專案 M-100),不是任何真實專案。

「# 引用」符合 3 章

1. 快速開始 2 處

...看板上那一列,風險與議題跳到風險登記冊。 - 輸入框打 # 引用 (看板頻道):在輸入框打 # (前面要是開頭或空白),...

...、C# 這類不會跳出選單;私訊與群組沒有所屬看板,沒有 # 引用,請用輸入框旁邊「連結」面板的「引用」。 - 在對話中討...

22. 常見問題 1 處

...分頁(11.5)。兩者的待辦事項、進度更新、在對話裡用 # 引用 的方式都一樣。 對話輸入框打 # 沒有跳出選單? 引用只...

23. 名詞對照 1 處

... 字;對話訊息可以接在既有待辦事項的備註後面(1.7) # 引用 在看板頻道的輸入框打 #,從選單挑工作項、風險、議題或...

角色標示:【全員】所有登入的人都能用;【主管以上】主管與管理者;【管理者】只有管理者;【分組角色】被指定為某分組負責角色的人(只在該分組內有效)。

1. 快速開始

1.1 登入

用公司給你的 Email 與密碼登入。

1.4 個人資料與外觀

點側邊欄左下角你的名字或頭像:

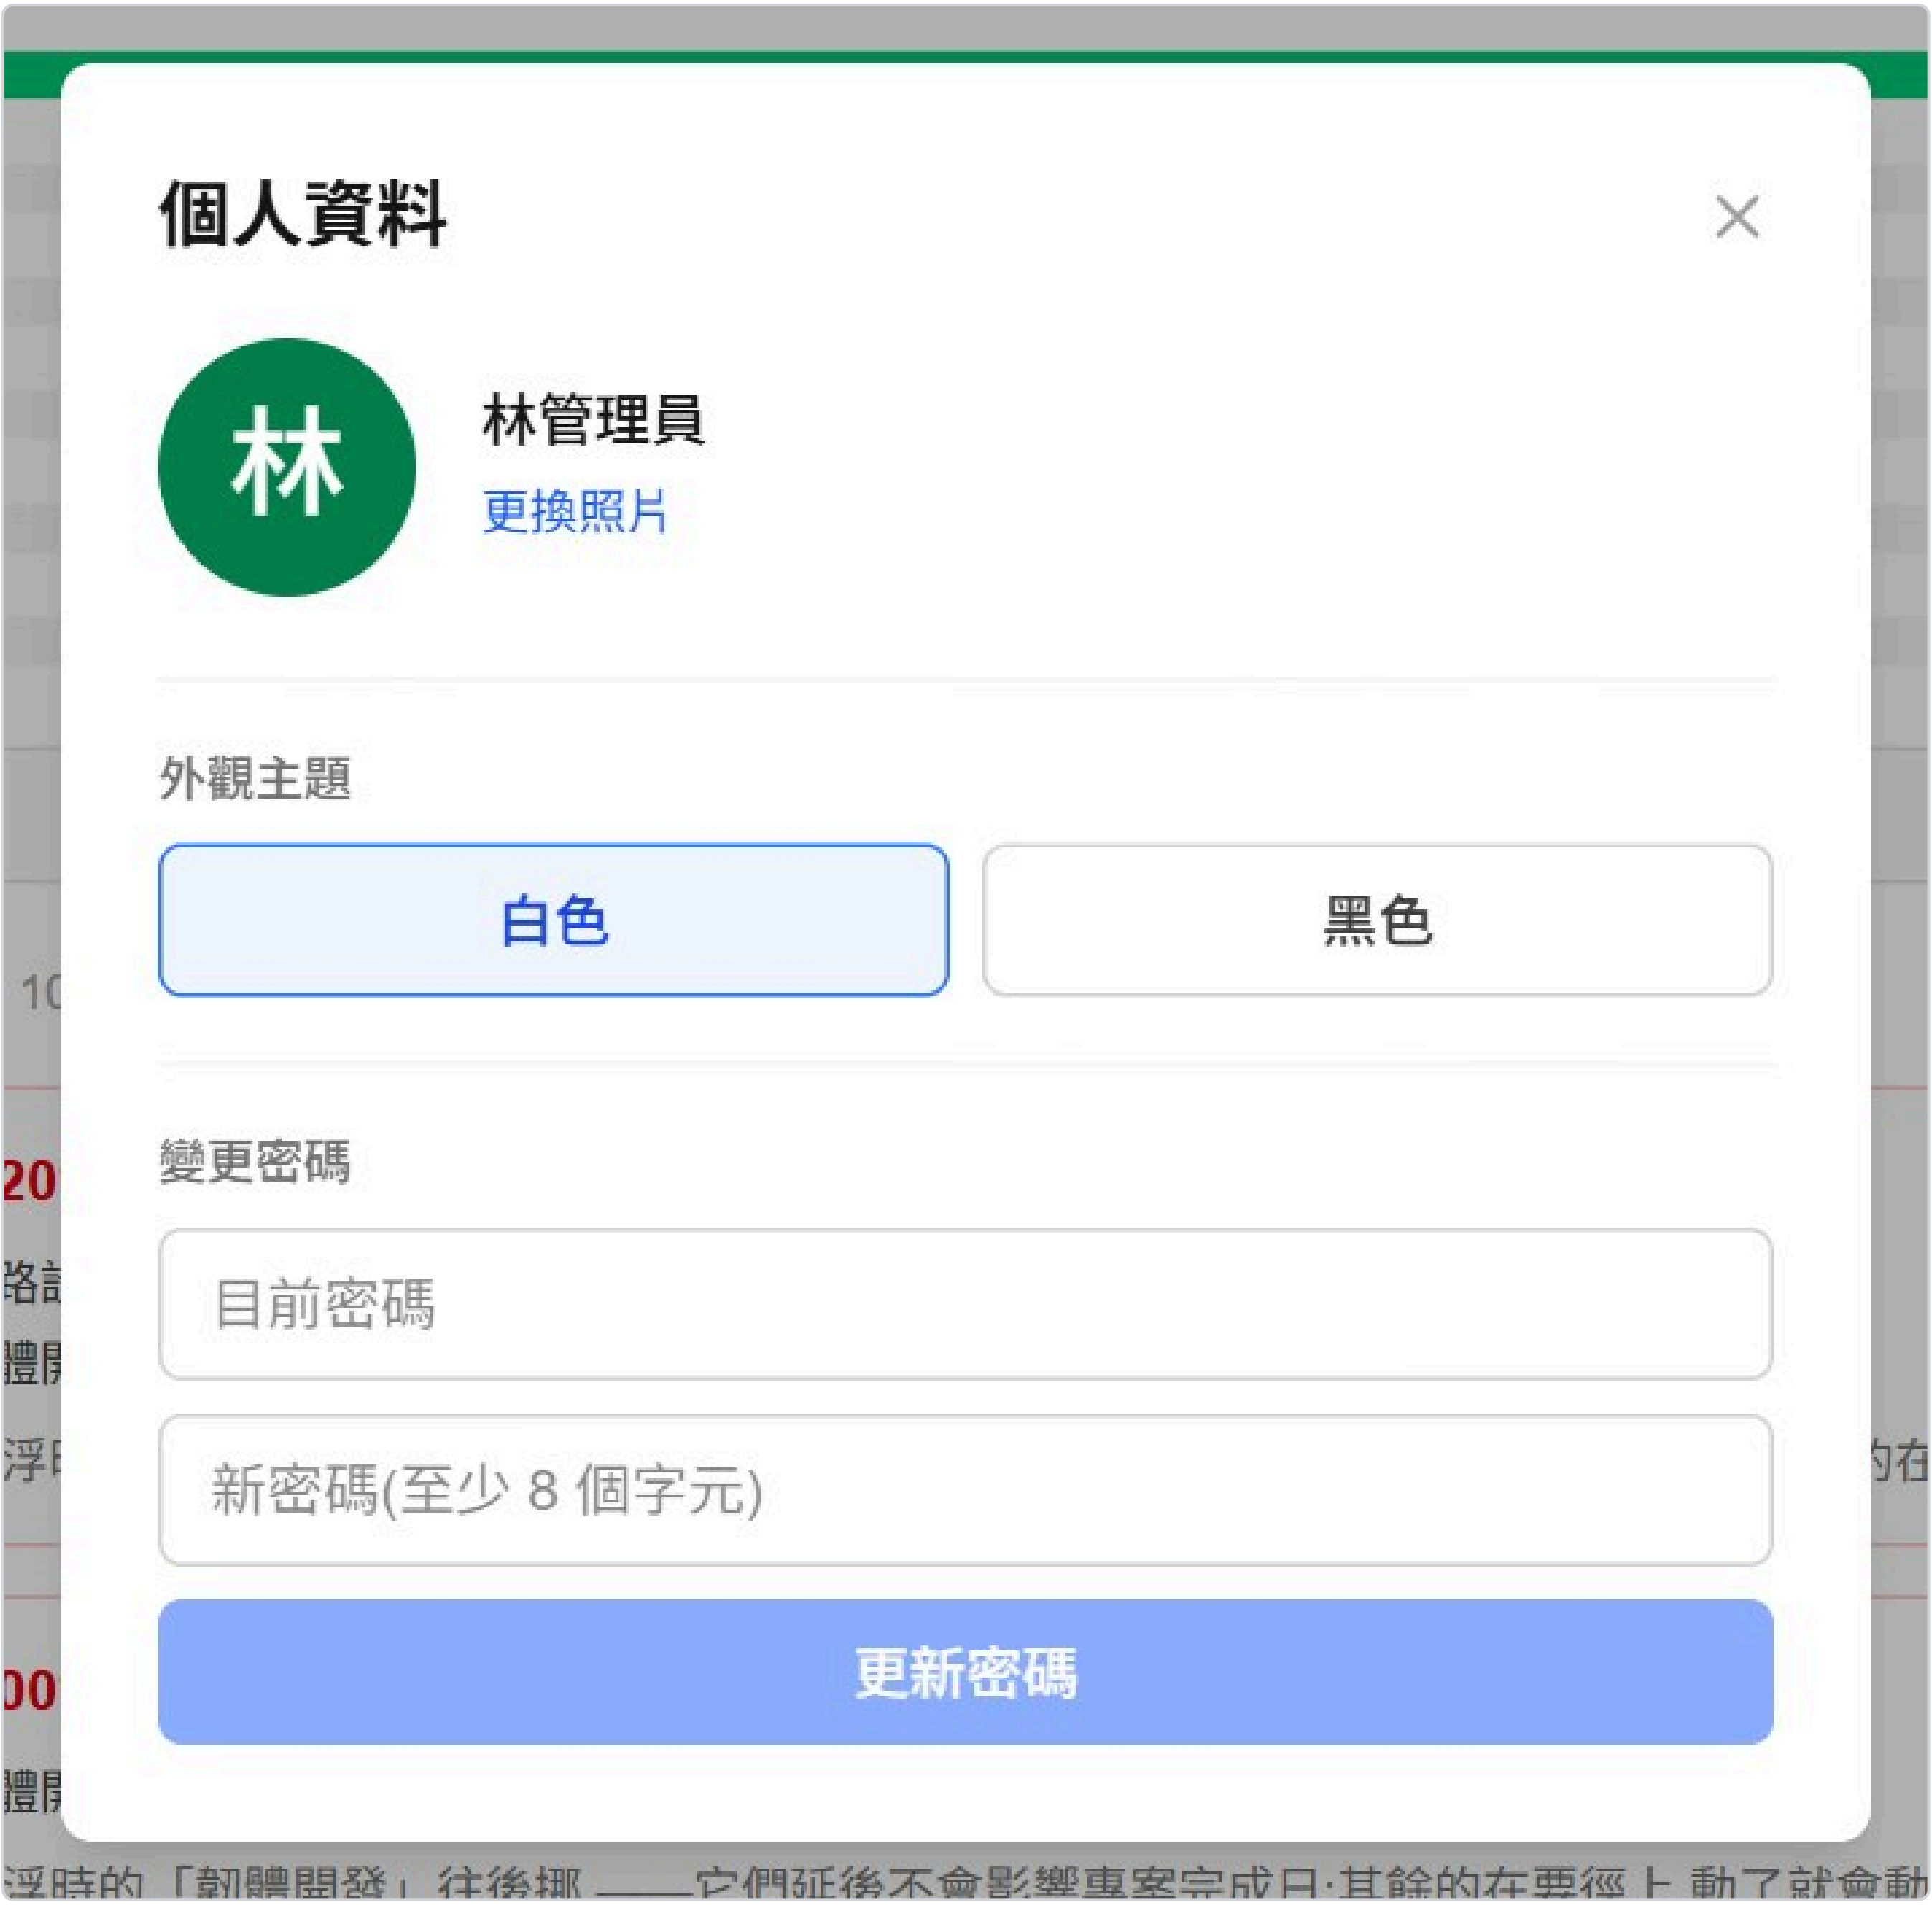

個人資料

林管理員

更換照片

外觀主題

變更密碼

目前密碼

新密碼(至少 8 個字元)

- **更換照片**:上傳頭像,畫面上各處都會用這張。
- **外觀主題**:白色或黑色。
- **變更密碼**:輸入目前密碼與新密碼(至少 8 個字元)。

切換使用者視角(只有管理者看得到):要重現某位同仁遇到的問題(「為什麼我改不了這格?」「為什麼我看不到這個看板?」),不用借他的密碼——

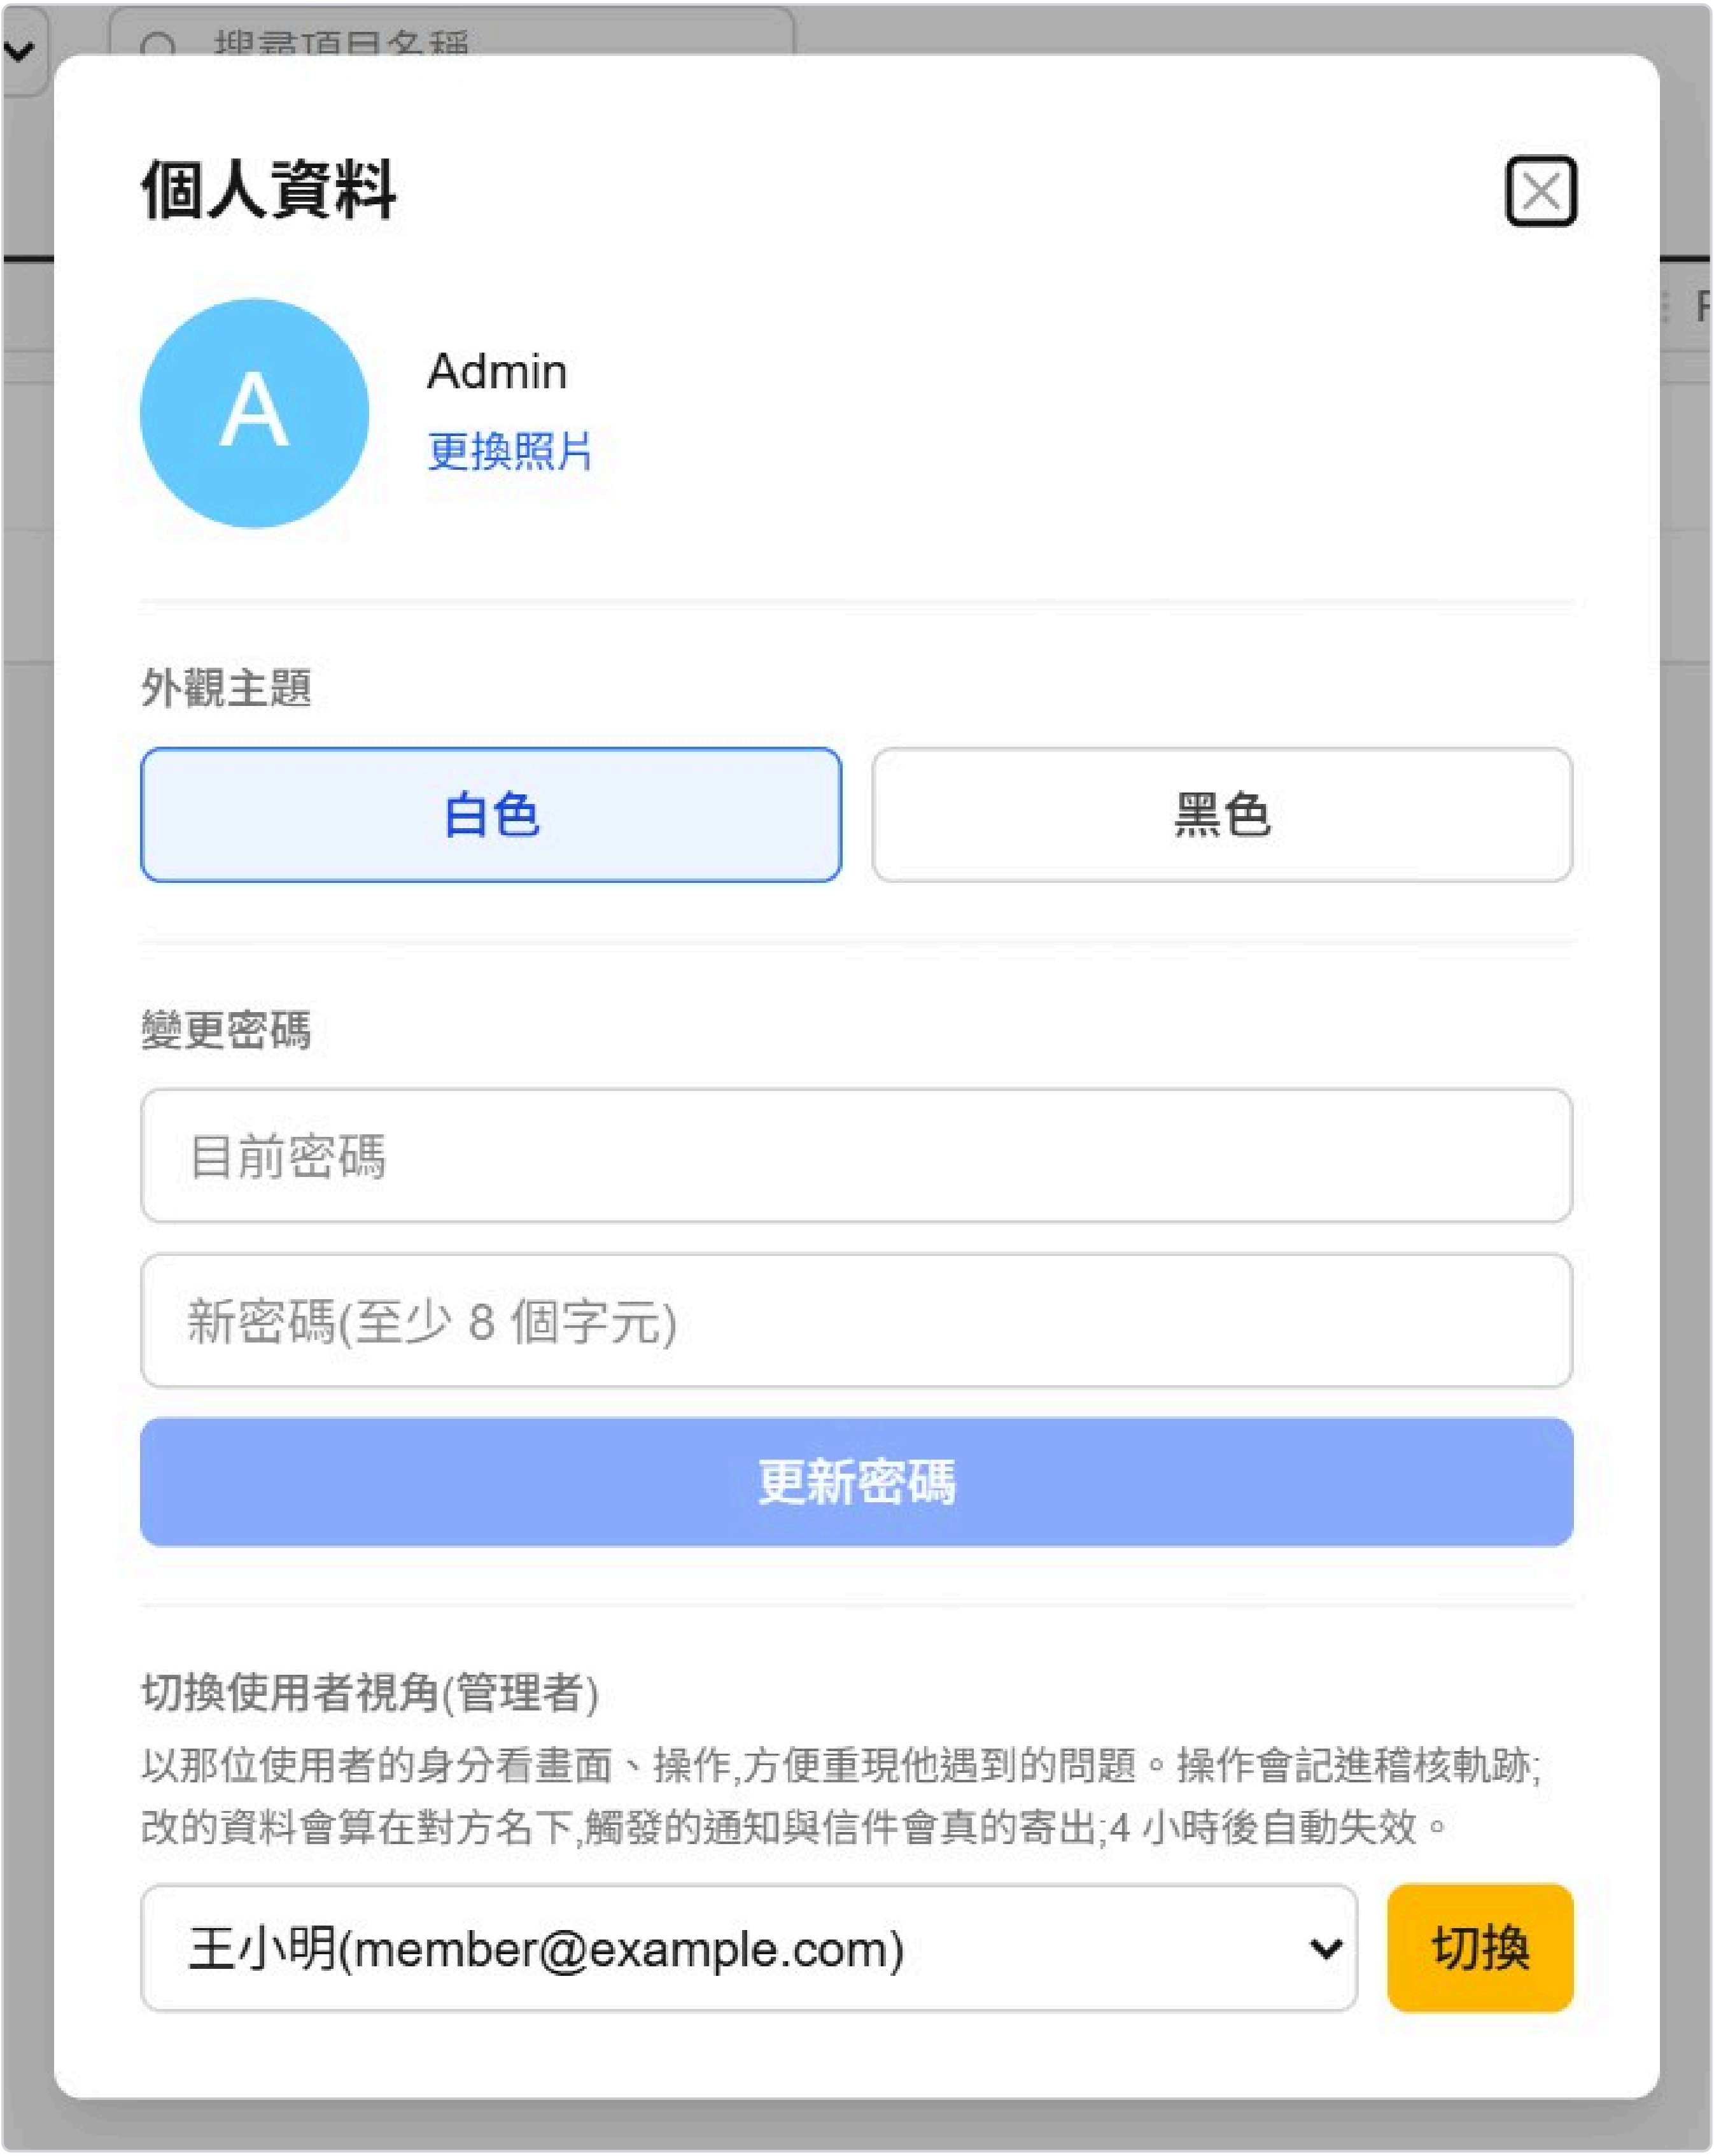

個人資料

Admin

更換照片

外觀主題

白色 黑色

變更密碼

目前密碼

新密碼(至少 8 個字元)

更新密碼

切換使用者視角(管理者)

以那位使用者的身分看畫面、操作,方便重現他遇到的問題。操作會記進稽核軌跡;改的資料會算在對方名下,觸發的通知與信件會真的寄出;4 小時後自動失效。

王小明(member@example.com)

切換

- 個人資料最下面選一位使用者(不含自己),按「**切換**」,整頁重新載入,**畫面、權限、按鈕、能做的事都跟那位使用者一模一樣**。
- 畫面最上方會有一整條黃色提示「正在以「王小明」的身分檢視(管理者 Admin 代操作)」,按「**退出**」(或個人資料裡的「退出,回到我自己」)回到自己。



正在以「王小明」的身分檢視(管理者 Admin 代操作,操作會記進稽核軌跡)

退出
看板
搜尋所有看板...
M-100 巡檢機器人
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算

- **可以實際操作**,所以要留意:
    - 改的資料(新增項目、風險、留言、工時……)**算在被檢視者名下**。
    - 觸發的通知與信件(例如被指派、核准)**會真的寄給相關的人**。
    - **稽核軌跡**會記下「開始 / 結束以某某的身分檢視」;切換期間有寫進稽核軌跡的操作,**操作者記的是管理者本人**,訊息尾端註記「〔管理者以「王小明」的身分操作〕」。留言、工時、核准這類本來就沒有稽核紀錄的資料,只會看到作者是被檢視者,**看不出是代操作**。
- **不能做**:更換對方的照片與密碼、替對方授權外部應用程式(MCP 連接器);代操作中不能再切換成第三個人,要先退出。
- **4 小時後自動失效**(要重新登入),忘了退出也不會一直掛著;按「登出」會連代操作一起結束。
- 其他人看不到這個功能;伺服器也會再確認呼叫的人在資料庫裡**現在**是管理者。

1.5 通知

名字旁邊的鈴鐺會顯示未讀數量。

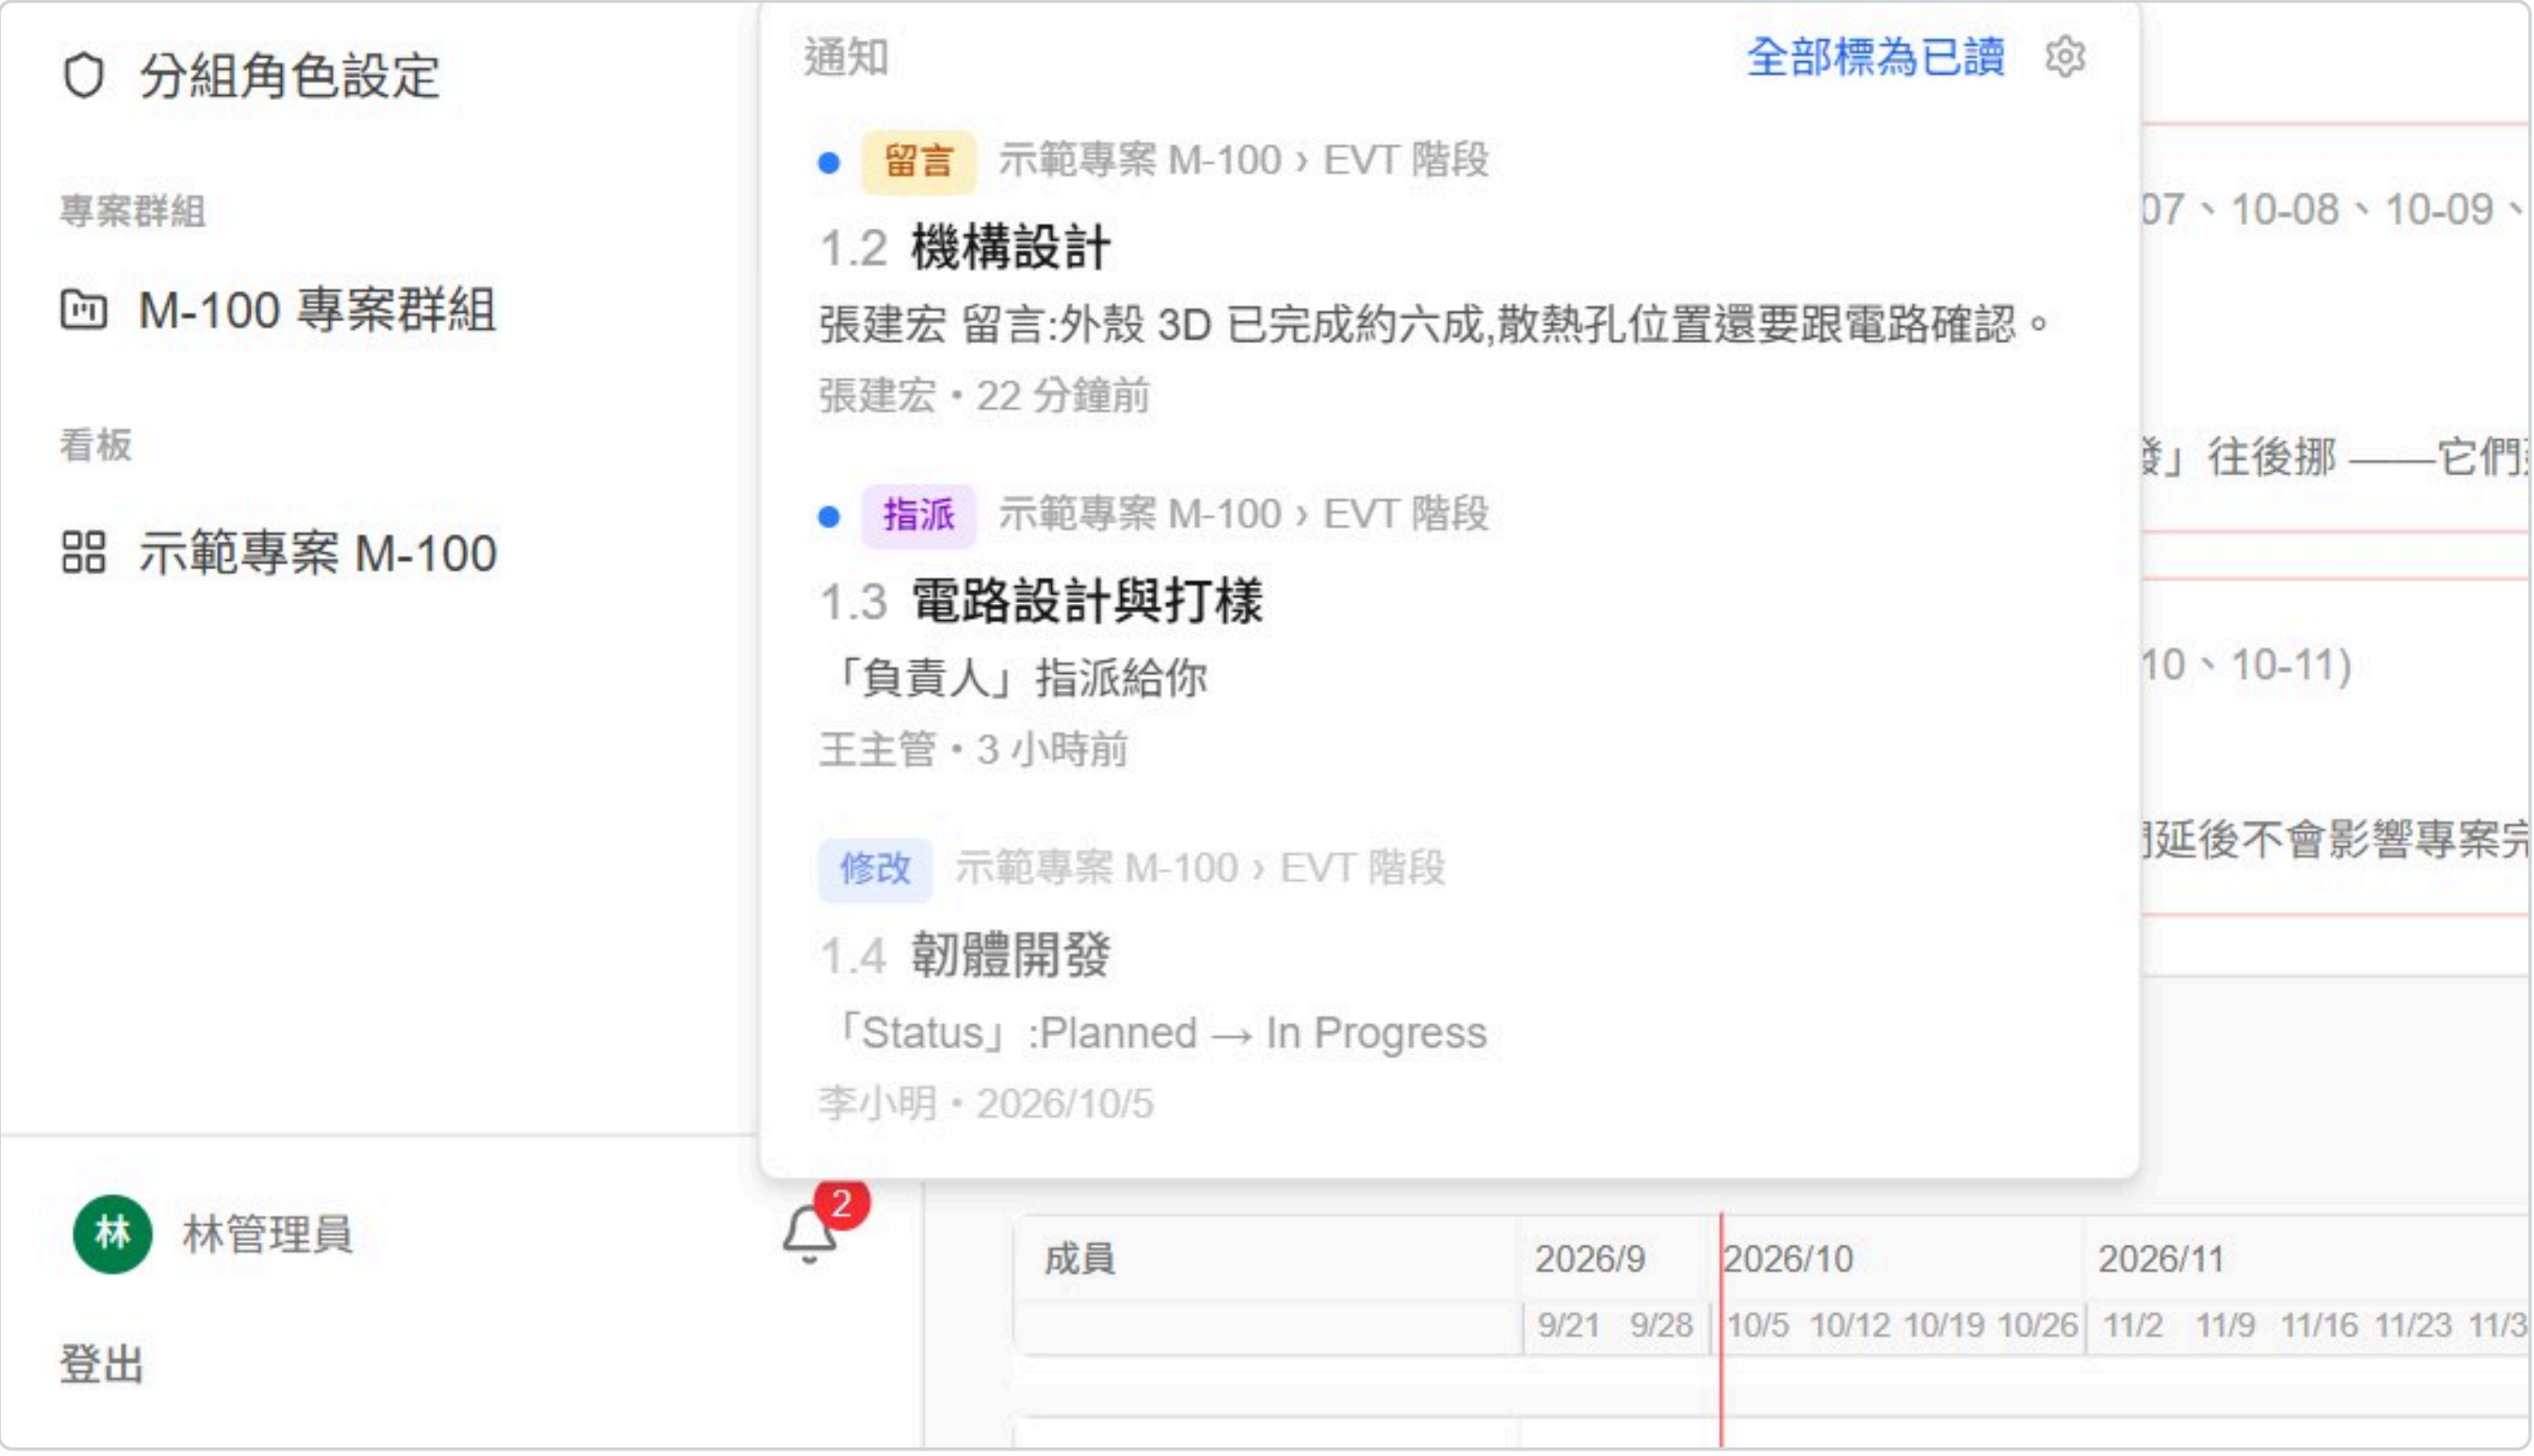

通知

留言 示範專案 M-100 › EVT 階段
1.2 機構設計
張建宏 留言:外殼 3D 已完成約六成,散熱孔位置還要跟電路確認。
張建宏 · 22 分鐘前

指派 示範專案 M-100 › EVT 階段
1.3 電路設計與打樣
「負責人」指派給你
王主管 · 3 小時前

修改 示範專案 M-100 › EVT 階段
1.4 韌體開發
「Status」:Planned → In Progress
李小明 · 2026/10/5

全部標為已讀
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
看板
示範專案 M-100
林
林管理員
2
登出
成員
2026/9
2026/10
2026/11
9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/23

- 通知類型:**新增**、**刪除**、**修改**、**指派**、**留言**、**自動化**、**待辦事項期限提醒**、**對話**。點通知會直接跳到那個項目(對話的通知跳到那一間對話,見 1.7)。
- **風險 / 議題被指派**:被指派為**負責人**或**審核人**的人,鈴鐺會收到一則「指派」通知(Email 照你的通知設定),標示看板與它是風險、議題或 Mantis #編號;點下去跳到那個看板的**風險**分頁。從 Mantis 同步來的議題,Mantis 上的處理人換成你(處理人的 Email 要跟你的帳號 Email 一樣)也會通知你。自己指派自己不會通知。
- 「全部標為已讀」清掉未讀;右上的齒輪可以**設定每一種通知要不要顯示在鈴鐺、要不要另外寄 Email**。
- 管理者可以在系統設定整個關掉某些類型(全公司都不會收到),或關掉 Email 通知。

- **Email 裡有連結**:被指派、留言提到你、對話、自動化規則觸發、工作交接、前置工作完成、風險 / 議題被指派的通知 Email,最下面都附一行「**開啟:網址**」,點下去直接跳到那個工作項(留言提到你的停在項目視窗的「更新」分頁)、那一筆風險 / 議題或那一間對話,跟你點鈴鐺跳到的是同一個地方,不必自己再去找。待辦事項的到期提醒本來就有。

1.6 更新記錄頁

通知只在「被指派、被提到」那一刻提醒你。想隨時看**工作項與風險、議題**發生了什麼事,用側邊欄的「**更新記錄**」:

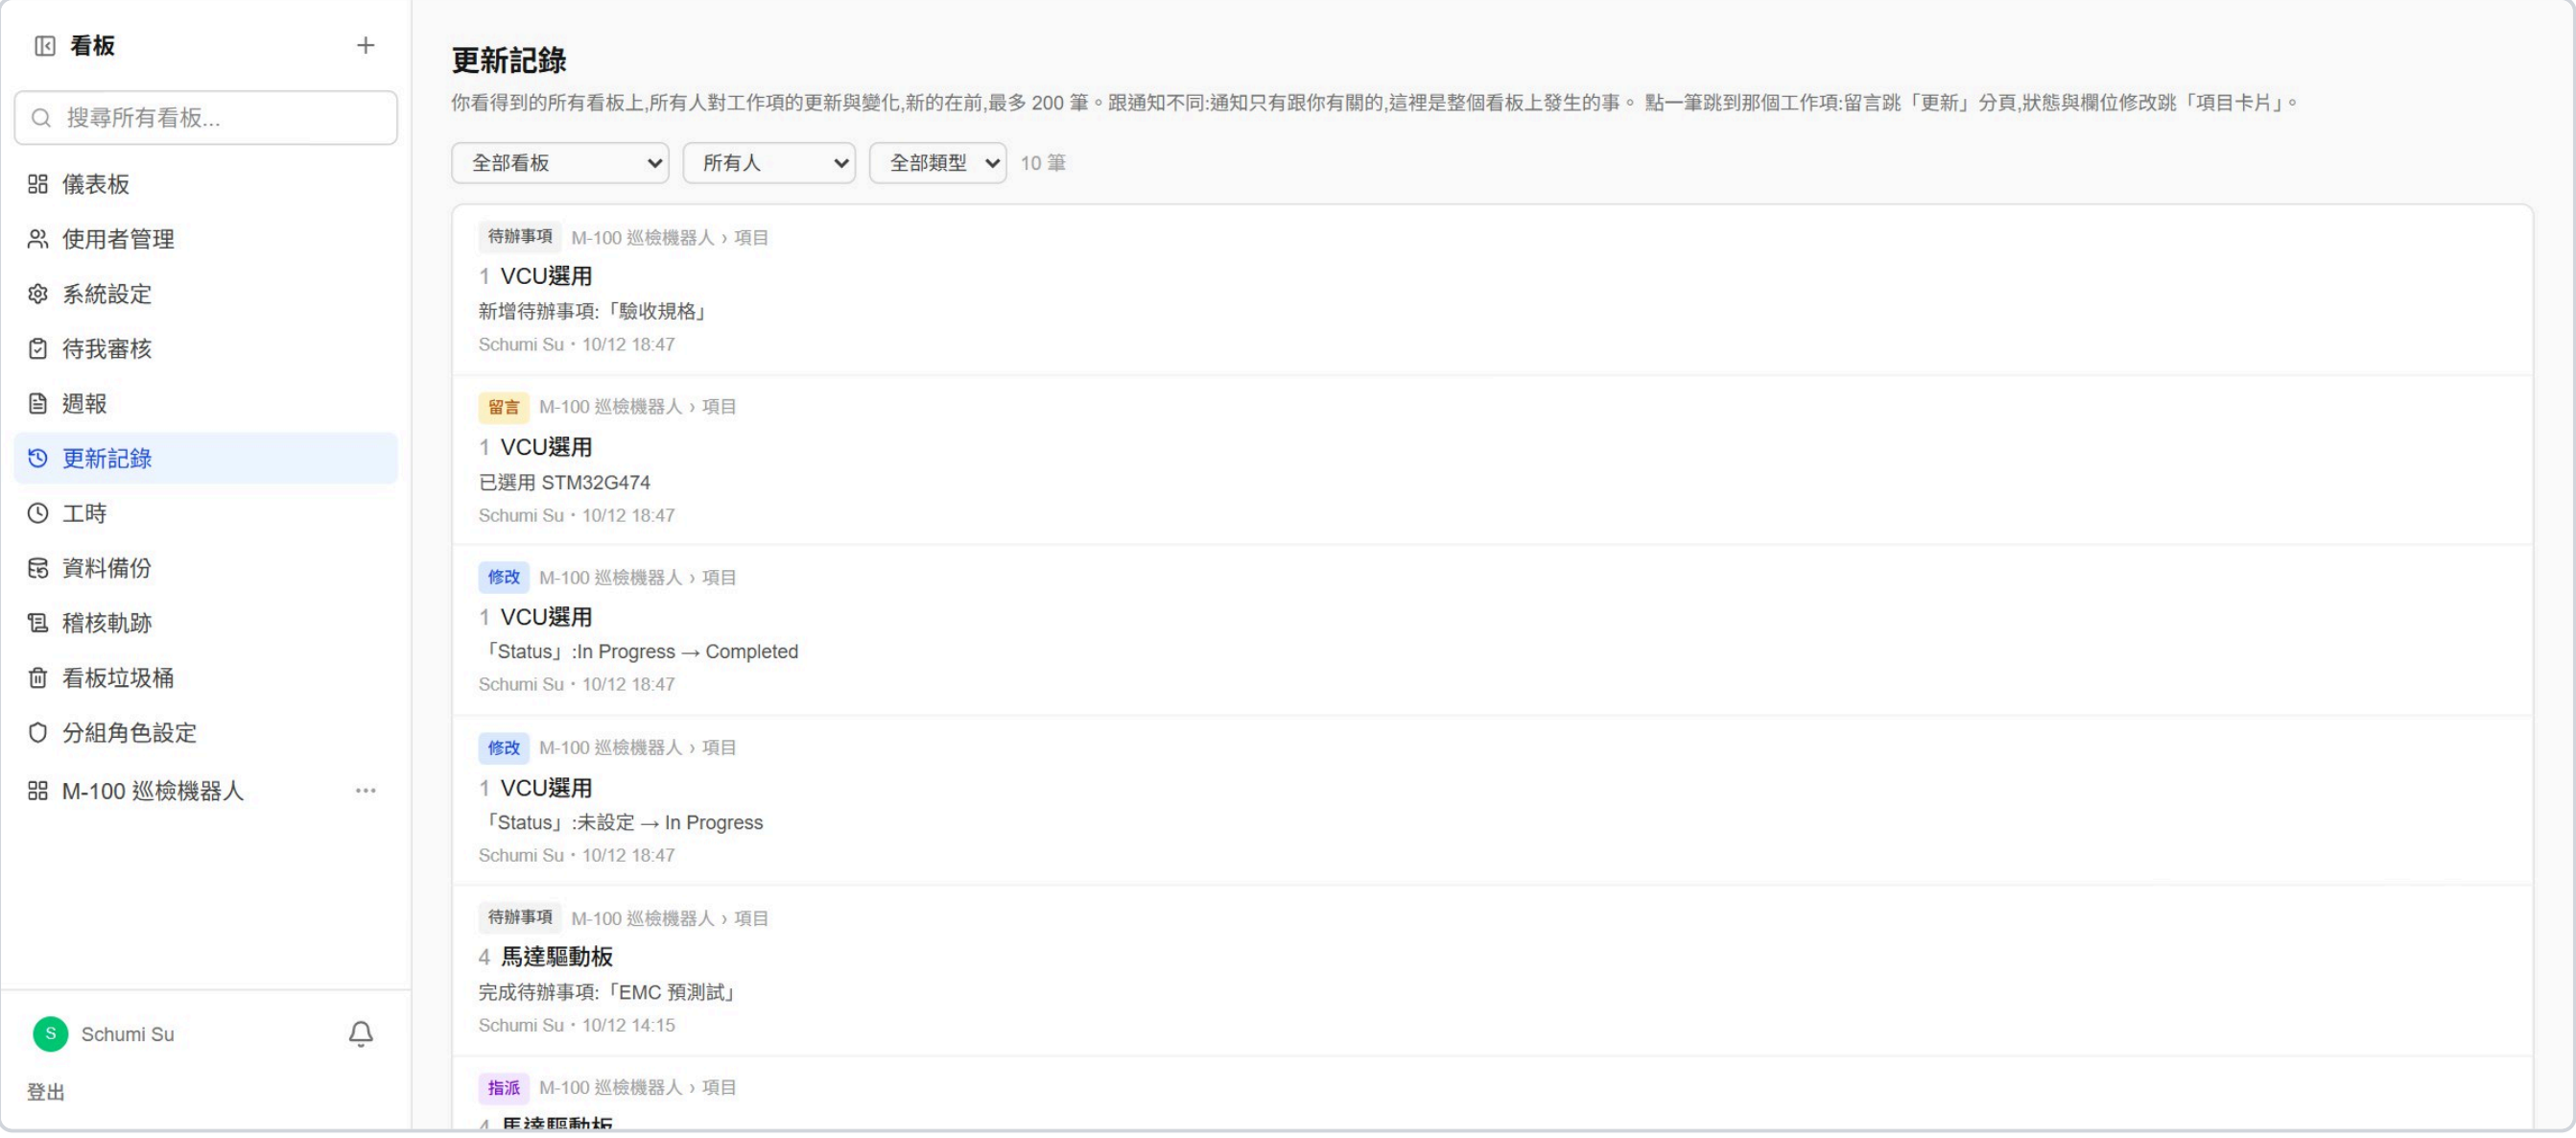

更新記錄

你看得到的所有看板上,所有人對工作項的更新與變化,新的在前,最多 200 筆。跟通知不同:通知只有跟你有關的,這裡是整個看板上發生的事。 點一筆跳到那個工作項:留言跳「更新」分頁,狀態與欄位修改跳「項目卡片」。

待辦事項 M-100 巡檢機器人 › 項目
1 VCU選用
新增待辦事項:「驗收規格」
Schumi Su · 10/12 18:47

留言 M-100 巡檢機器人 › 項目
1 VCU選用
已選用 STM32G474
Schumi Su · 10/12 18:47

修改 M-100 巡檢機器人 › 項目
1 VCU選用
「Status」:In Progress → Completed
Schumi Su · 10/12 18:47

修改 M-100 巡檢機器人 › 項目
1 VCU選用
「Status」:未設定 → In Progress
Schumi Su · 10/12 18:47

待辦事項 M-100 巡檢機器人 › 項目
4 馬達驅動板
完成待辦事項:「EMC 預測試」
Schumi Su · 10/12 14:15

指派 M-100 巡檢機器人 › 項目

- **預設只看「與我有關」的**(以你目前登入的帳號為準):你做的、發生在**指派給你**的工作項上的、發生在你**負責或審核**的風險與議題上的。上面按「**全部**」可以看整個看板上所有人的。管理者代操作(切換使用者視角)時,看到的就是被檢視者的。
- 一筆一筆列出你**看得到的所有看板**上的更新與變化,新的在前:**工作項**的狀態切換、留言、連結、待辦事項、其他欄位修改;**風險與議題**(含 Mantis 同步來的)的**新增、指派、變更、申請結案與審核**(標籤:新增綠色、指派紫色、修改藍色)。每一筆的格式跟通知一樣:類型標籤、「看板 › 分組(風險 / 議題 / Mantis # 編號)」、WBS 編號與項目名稱(風險寫標題)、改了什麼、誰・什麼時候。
- 上面三個下拉選單可以依**看板、人、類型**篩選,右邊顯示符合的筆數。
- **點一筆**:工作項**就地跳出該項目的詳細資訊**,不離開更新記錄頁、也不會跳到看板表格,停在對應的分頁——留言跳「更新」,連結、待辦事項跳各自的分頁,狀態與其他欄位修改跳「項目卡片」,並且把**改到的那個欄位**用琥珀色外框標出來、捲到畫面中間(幾秒後自己消掉)。關掉視窗就回到原本的更新記錄頁。風險與議題沒有項目詳細資訊,仍然跳到那個看板的「**風險**」分頁。
- 看得到什麼跟看板畫面一致:私人項目、「系統設定」裡 DM 的可見範圍擋掉的項目,以及已刪除(在垃圾桶)的項目,都不會出現。

1.7 對話

側邊欄的「**對話**」是同事之間的聊天室:訊息一送出,對方的畫面**馬上**出現,不用重新整理。左邊是對話清單,右邊是選到的那一間。

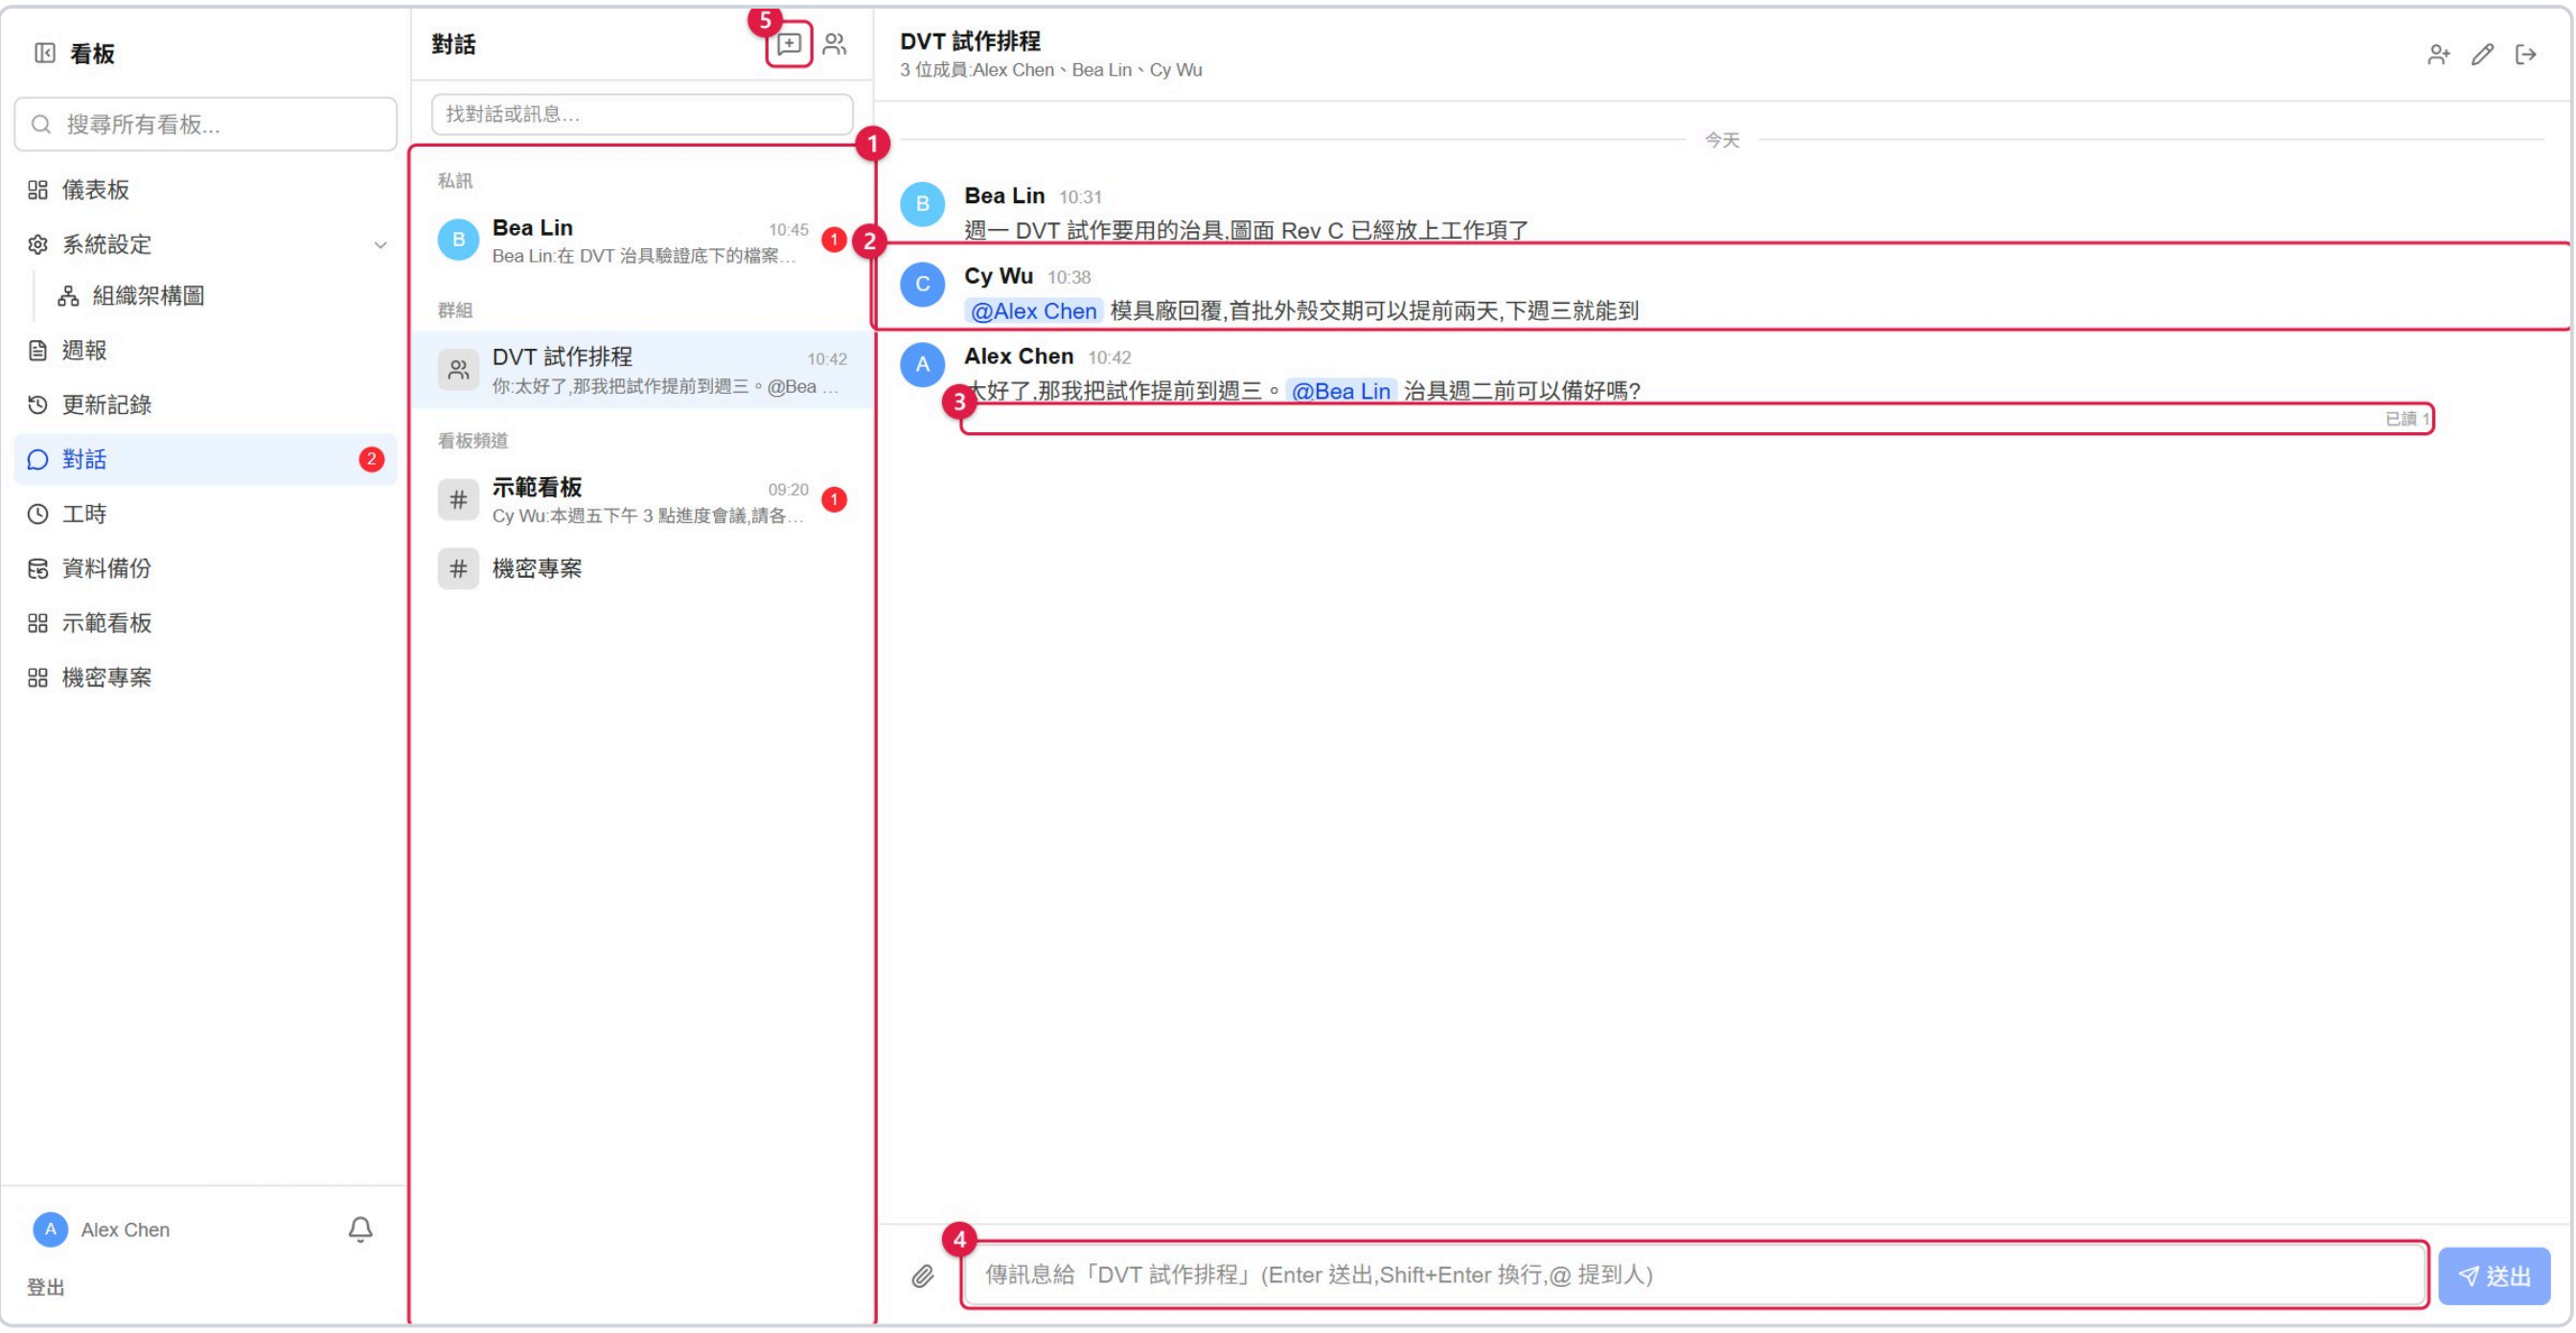

Bea Lin 10:45 Bea Lin:在 DVT 治具驗證底下的檔案… 1

DVT 試作排程 10:42 你:太好了,那我把試作提前到週三。@Bea …

示範看板 09:20 Cy Wu:本週五下午 3 點進度會議,請各… 1

機密專案

DVT 試作排程
3 位成員:Alex Chen、Bea Lin、Cy Wu

Bea Lin 10:31
週一 DVT 試作要用的治具,圖面 Rev C 已經放上工作項了

Cy Wu 10:38
@Alex Chen 模具廠回覆,首批外殼交期可以提前兩天,下週三就能到

Alex Chen 10:42
太好了,那我把試作提前到週三。@Bea Lin 治具週二前可以備好嗎?
已讀 1

傳訊息給「DVT 試作排程」(Enter 送出,Shift+Enter 換行,@ 提到人)

編號	位置	說明
①	對話清單	私訊、群組、看板頻道三區;每一間顯示最後一則的摘要、時間,有未讀的亮紅色數字(側邊欄「對話」旁是全部加起來的總數)
②	訊息	被 @ 到的人名用藍色標出;連續同一個人在 5 分鐘內發的訊息併在一起
③	已讀	自己最後一則底下顯示對方讀到了沒(私訊「已讀」、群組「已讀 N」)
④	輸入框	Enter 送出;左邊的迴紋針傳檔案與圖片,旁邊的連結圖示附連結
⑤	新私訊 / 新群組	清單上方的兩個按鈕

- **看板頻道**:每個看板一間,**看得到那個看板的人**都在裡面(公開看板是所有人;受限看板是擁有者、成員、分組角色與分組成員,以及管理者)。看板的擁有者、成員、分組角色與分組成員自動算在頻道裡,有新訊息會亮未讀;公開看板的其他人要自己打開過那一間,才開始計未讀。看板進了垃圾桶,頻道就一起關起來,還原後恢復。

- **私訊**:一對一。按清單上方的「**新私訊**」,挑一個人(全公司任何人都可以);同一對人永遠是同一間。對方還沒收到任何訊息、你也沒發過的空私訊,不會出現在對方的清單。

- **群組**:按「**新群組**」,取名字、挑成員(你自動加入)。群組裡的人可以**加成員**、**改名**、**離開**;最後一個人離開,群組連同訊息就消失。

- **發訊息**:Enter 送出,Shift+Enter 換行(中文輸入法選字時按 Enter 不會送出)。一則最多 4000 字。

- **@ 提到人**:輸入 @ 會跳出人名選單,↑ ↓ 選、Enter 或 Tab 帶入。群組只能 @ 群組成員;看板頻道可以 @ 任何人,但**看不到那個看板的人不會收到通知**。

- **未讀**:清單上每一間顯示未讀數,側邊欄「對話」旁顯示總數。打開那一間、而且分頁在前景時,算讀到最新;分頁在背景時來的訊息會留成未讀,切回來才算讀到。

- **已讀**:私訊在你最後一則底下顯示「**已讀**」;群組顯示「**已讀 N**」(讀到的人數)。看板頻道人多,不顯示。

- **傳檔案與圖片**:按輸入框左邊的**迴紋針**挑檔案,或把檔案**直接拖進對話視窗**、或在輸入框**貼上截圖**(Ctrl+V)。送出前會列在輸入框上方,可以按 ✕ 移除;一則訊息最多 **10 個檔案**、每個最多 **25MB**(更大的請貼雲端硬碟連結)。只傳檔案不打字也可以。**圖片**(PNG、JPG、GIF、WebP)直接顯示在訊息裡,點一下用新分頁看原圖;**其他檔案**(含 SVG)顯示成檔名與大小,點了是下載。檔案只有看得到那間對話的人拿得到,沒登入或不在那間對話裡的人,即使有網址也是「找不到檔案」。

- **搜尋**:清單上方的搜尋框,輸入就即時篩對話名稱;**打兩個字以上**,還會搜你看得到的所有對話裡的**訊息內容**(私訊與群組是你在的、看板頻道是你看得到的看板;收回的訊息不搜),結果列在清單下方「訊息」區,最多 30 筆、新的在前。點一筆會打開那間對話、**一頁頁往前載到那一則**、捲到畫面中間並用琥珀色框標幾秒。

- **附連結**:輸入框迴紋針旁邊的**連結圖示**,打開一個小面板,有兩種:**貼上網址**(例如雲端硬碟、設計文件;沒寫 https 會自動補,可以取一個顯示的名稱,只收 http / https 網址),以及**引用工作項 / 風險 / 議題 / 問題**——面板**直接展開**,上面是**搜尋框**,下面是清單,直接挑;**清單是這間對話所屬看板的**(看板頻道就是那個看板;私訊與聊天室沒有所屬看板,先選一個你看得到的看板)。清單分成**四個類別**,各自有標題與筆數,也可以用上方的類別標籤只看其中一類:**工作項**(依階層**巢狀**縮排顯示,前面是 WBS 代號;分組不只一個時依分組分段。**可以收放**:有子項的前面有箭頭,按一下**收起 / 展開整個項目**;預設展開最上層、更深的收著;標題旁有「全部展開 / 全部收合」)、**風險**與**議題**(這兩類是在風險登記冊自己登記的),以及**問題**(從 MantisBT 同步來的問題單,附 Mantis 編號,就是看板上「問題」分頁裡的那些)。搜尋時符合的工作項會**連同它的上層一起顯示**(上層用淡色,不受收放影響),才看得出在階層裡的位置;你看不到的私人工作項不會列出。挑好的連結會跟檔案一樣列在輸入框上方,可以按 ✕ 移除;一則訊息最多 **10 個連結**,只附連結不打字也可以。訊息裡顯示成藍色的連結卡片,點了用新分頁開啟;引用的工作項會直接跳到看板上那一列,風險與議題跳到風險登記冊。

- **輸入框打 # 引用**(看板頻道):在輸入框打 **#**(前面要是開頭或空白),馬上跳出這個看板的**選單**,跟「附連結」面板的「引用」同一個樣子:**工作項、風險、議題、問題**四個類別各一段,每段標題有筆數。**工作項依階層巢狀**,有子項的前面有箭頭——最上層預設展開、更深的收著;按**箭頭**或用鍵盤 →(展開)、←(收合)收放,收起上層就連底下各層一起收起來;類別標題也可以按一下整段收起。**打字就是搜尋**:接著打幾個字(名稱、WBS 代號、Mantis 編號都找得到),符合的工作項會**連同它的所有上層**一起顯示(上層用淡色,不受收放影響),沒有符合的類別就不出現。用 ↑ ↓ 選(淡色的上層會跳過)、**Enter** 或 **Tab** 挑,也可以用滑鼠點,**Esc** 關掉選單;收放、點箭頭都不會讓輸入框失去焦點。挑好後輸入框裡是 **#名稱**,同時自動附上對應的連結;送出後,訊息裡的 **#名稱** 是藍紫色、點得開的連結,點了在新分頁開到那個工作項(風險、議題、問題開到風險登記冊),已經畫成連結的就不再另外放一張連結卡。@ 提到人照舊,兩個符號可以混著用。網址裡的 #錨點、C# 這類不會跳出選單;私訊與群組沒有所屬看板,沒有 # 引用,請用輸入框旁邊「連結」面板的「引用」。

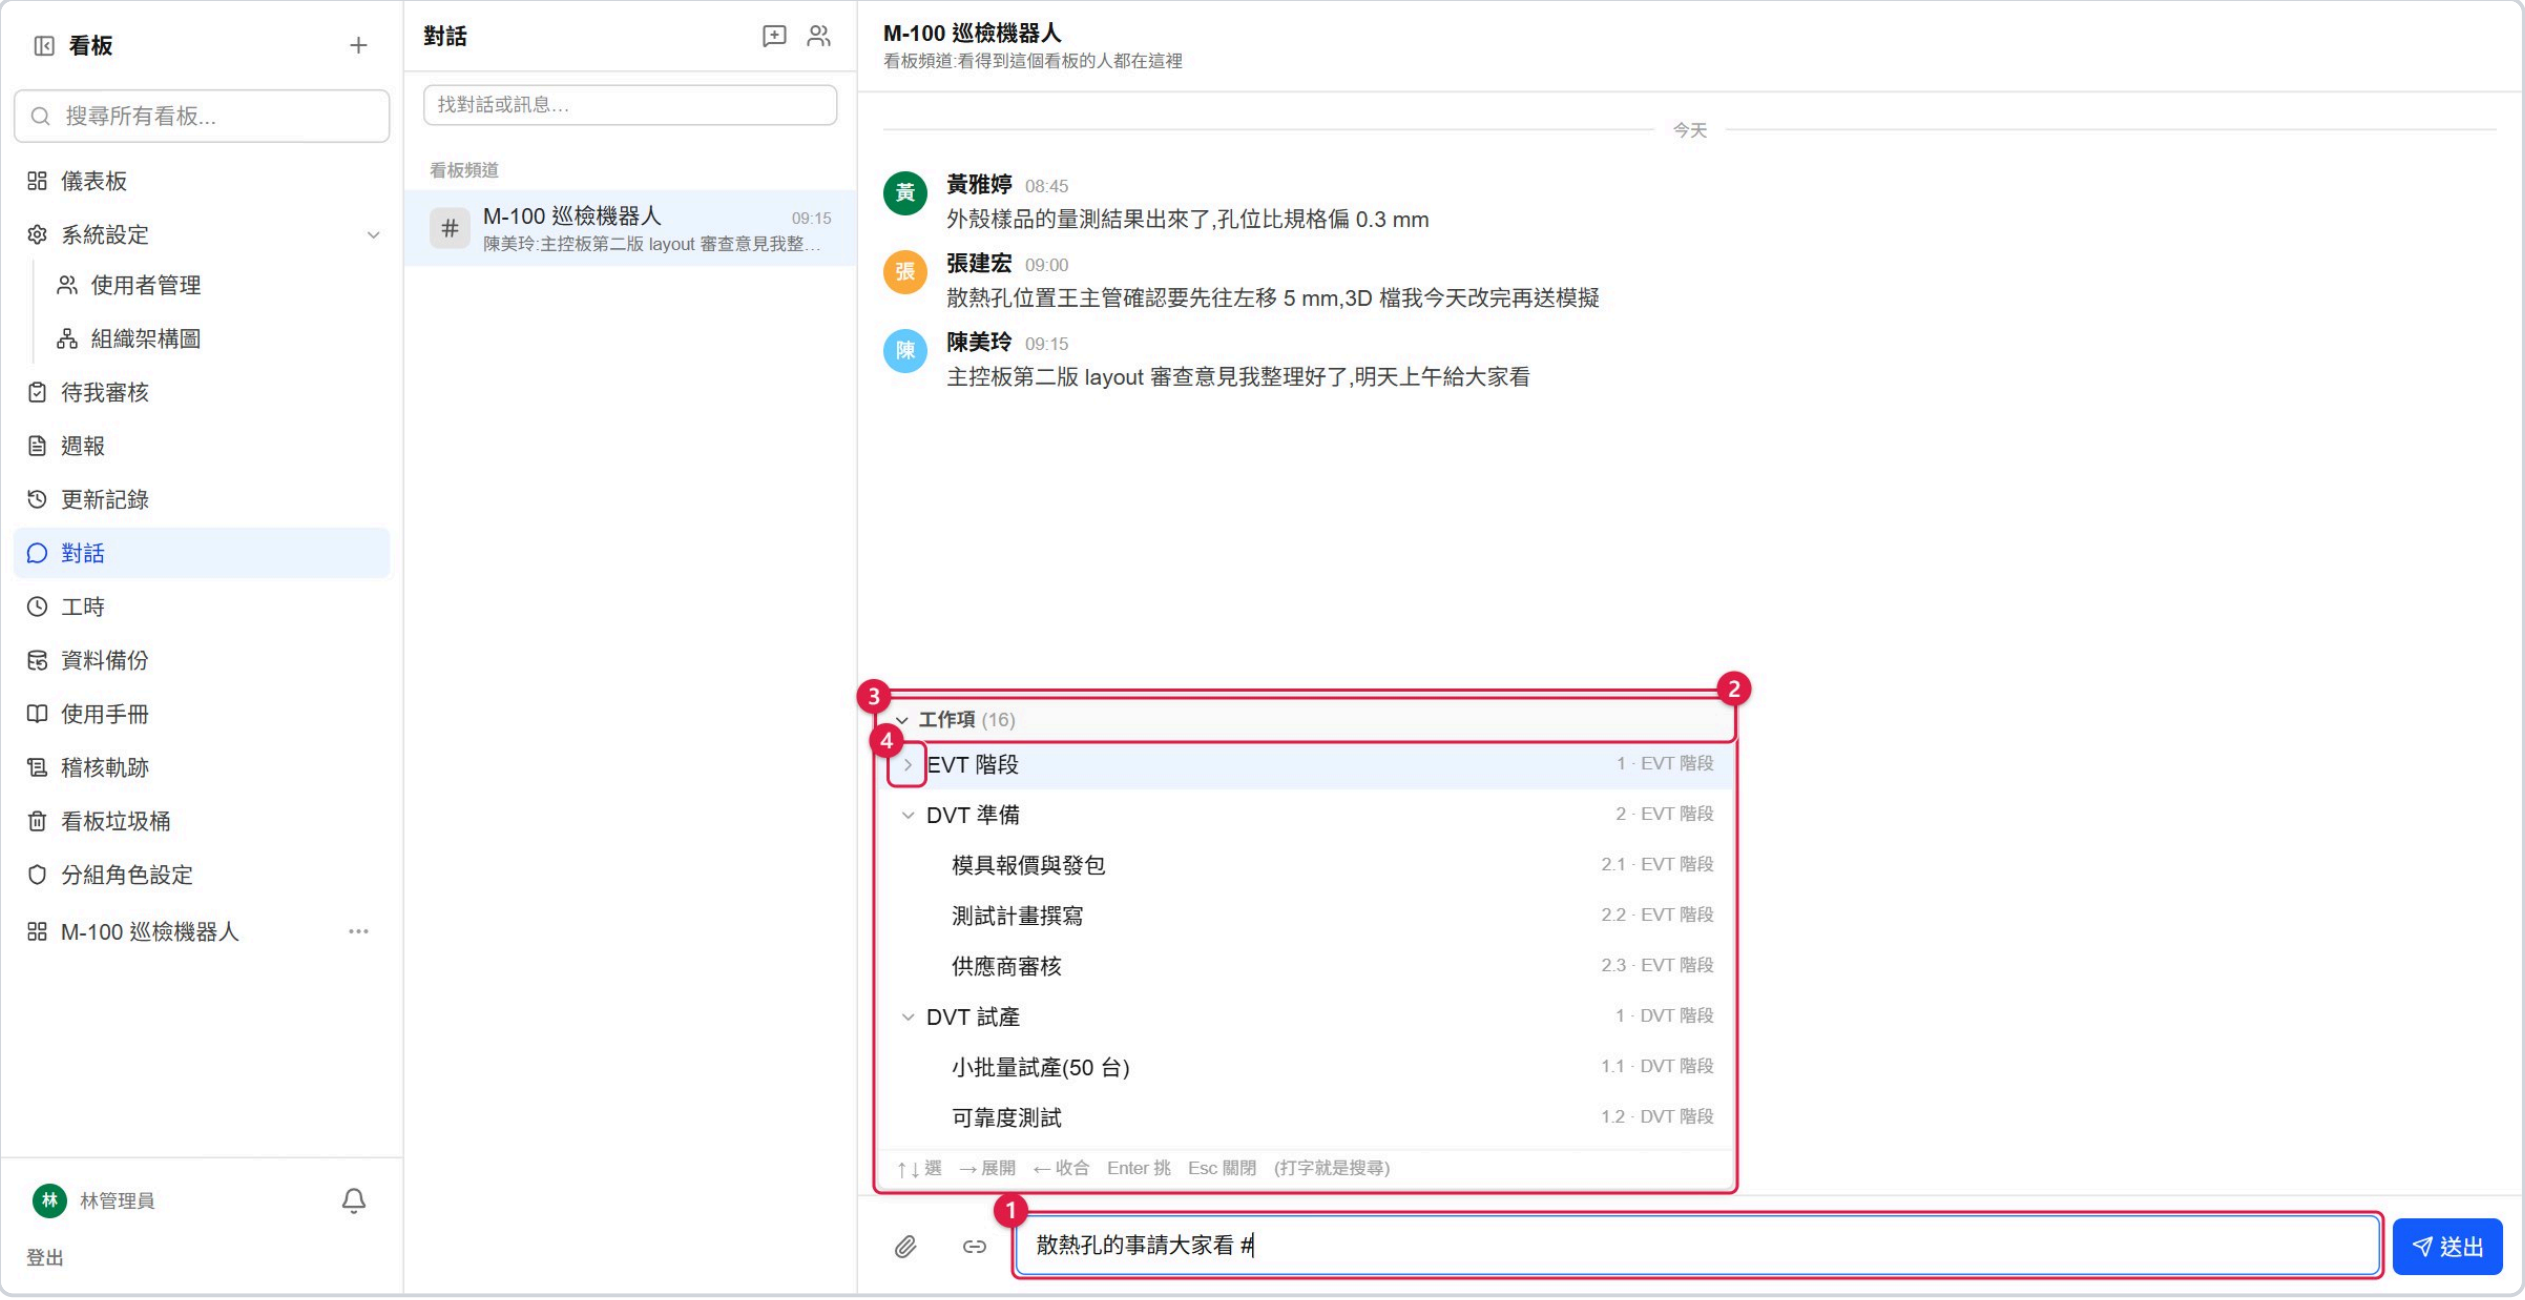
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
對話
工時
資料備份
使用手冊
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
林管理員
登出
對話
找對話或訊息...
看板頻道
M-100 巡檢機器人 09:15
陳美玲:主控板第二版 layout 審查意見我整...
今天
①
②
③
④
↑↓ 選 → 展開 ← 收合 Enter 挑 Esc 關閉 (打字就是搜尋)
送出

M-100 巡檢機器人

看板頻道:看得到這個看板的人都在這裡

黃雅婷 08:45
外殼樣品的量測結果出來了,孔位比規格偏 0.3 mm

張建宏 09:00
散熱孔位置王主管確認要先往左移 5 mm,3D 檔我今天改完再送模擬

陳美玲 09:15
主控板第二版 layout 審查意見我整理好了,明天上午給大家看

工作項 (16)	
EVT 階段	1 · EVT 階段
DVT 準備	2 · EVT 階段
模具報價與發包	2.1 · EVT 階段
測試計畫撰寫	2.2 · EVT 階段
供應商審核	2.3 · EVT 階段
DVT 試產	1 · DVT 階段
小批量試產(50 台)	1.1 · DVT 階段
可靠度測試	1.2 · DVT 階段

散熱孔的事請大家看 #

① 輸入框打 #;② 跳出的選單;③ 「工作項」區塊標題,點一下整區收放(往下捲還有**風險**、**議題**、**問題**三區);④ 工作項前面的箭頭,點一下收放底下的子項(圖中「EVT 階段」已收起來)。

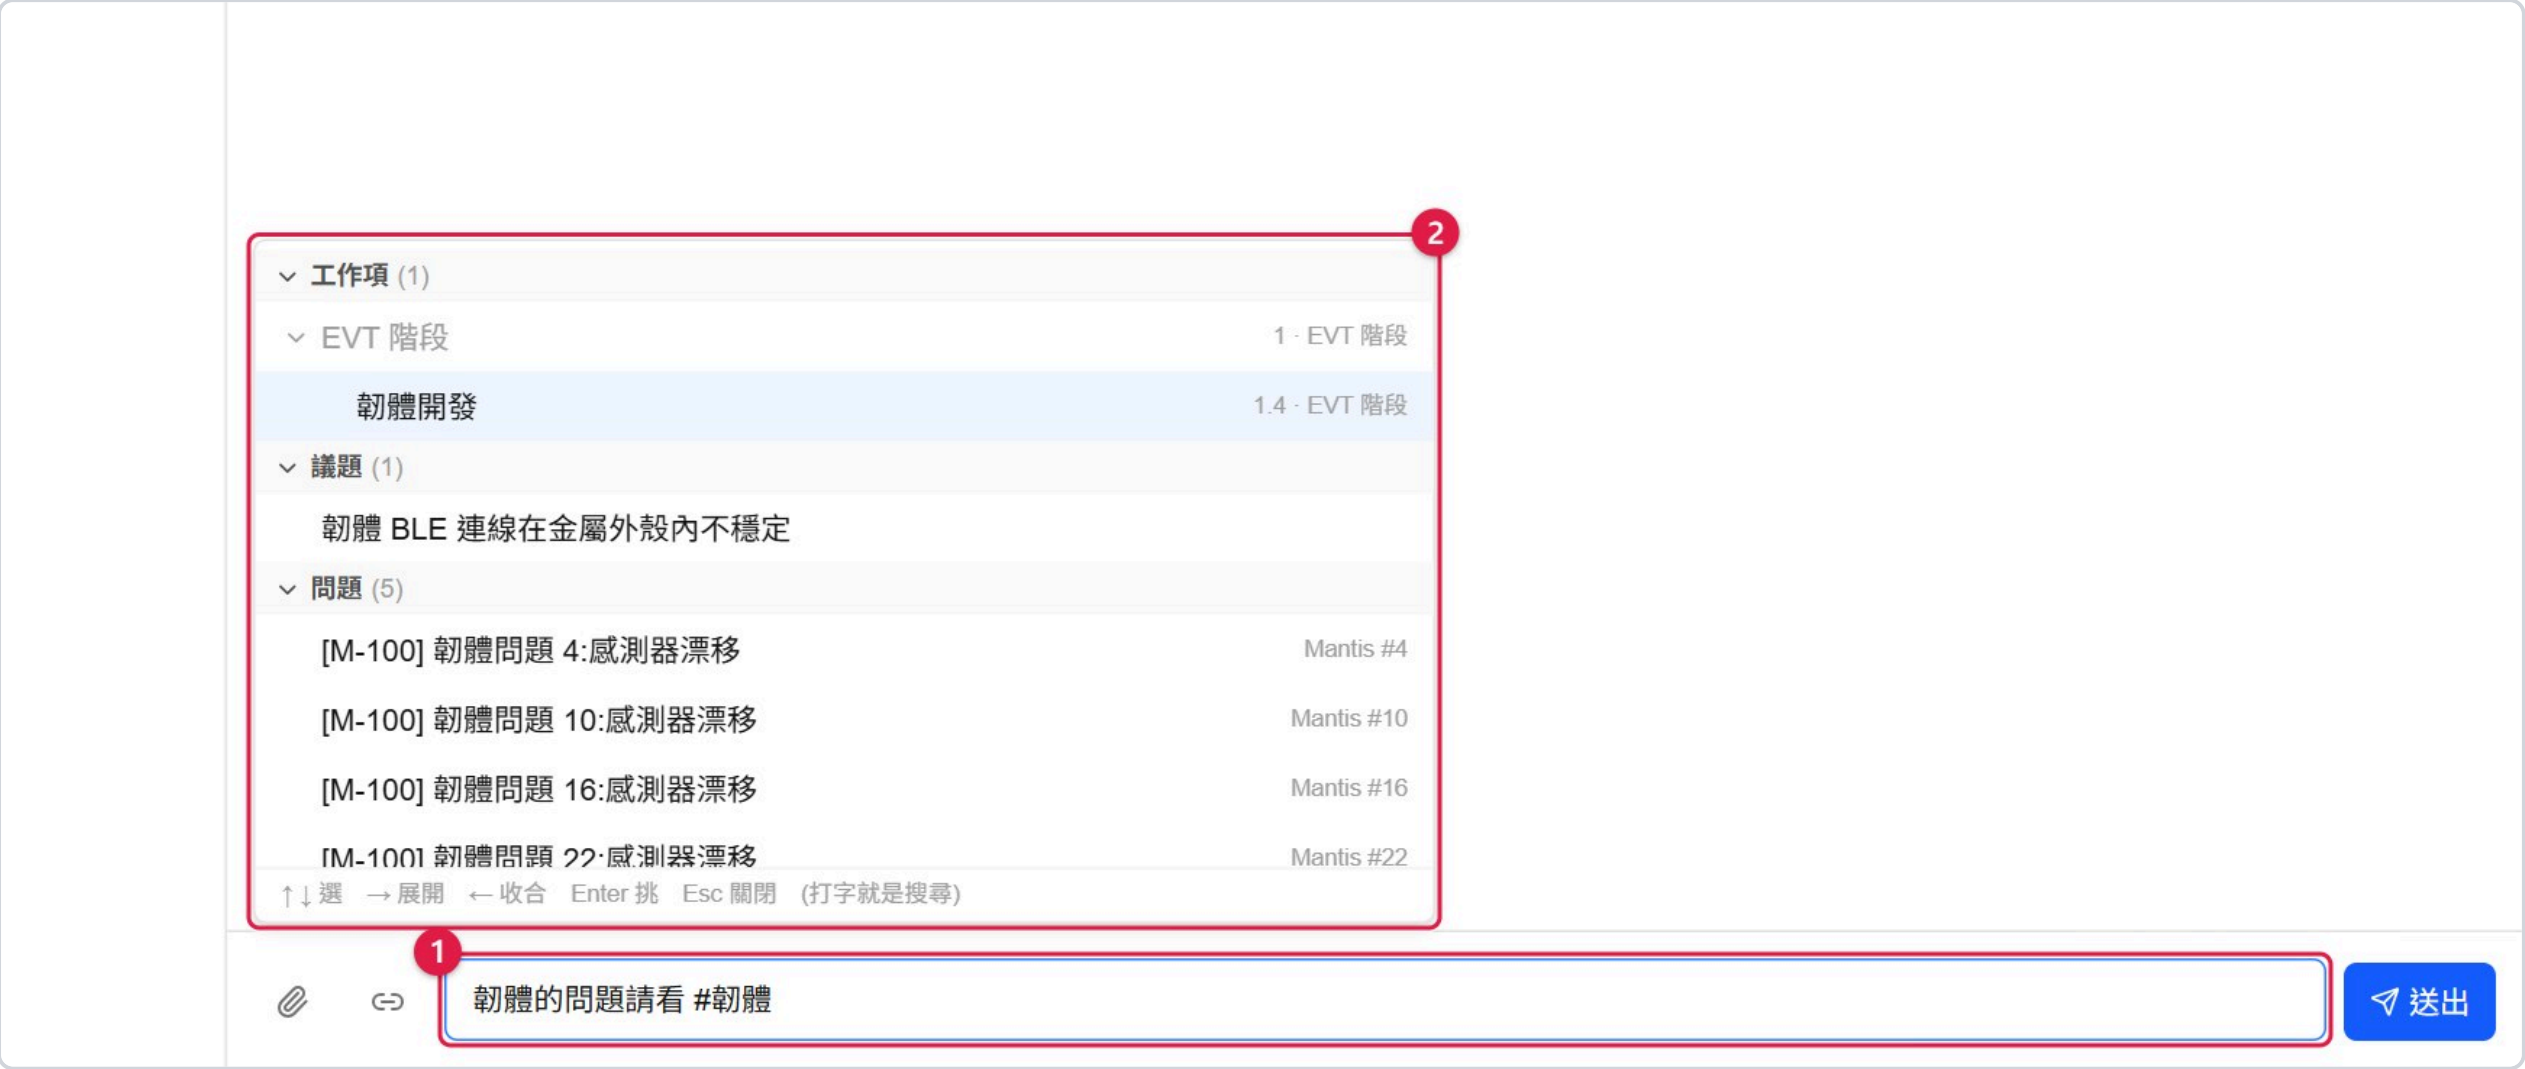
①
②
↑↓ 選 → 展開 ← 收合 Enter 挑 Esc 關閉 (打字就是搜尋)
送出

工作項 (1)	
EVT 階段	1 · EVT 階段
韌體開發	1.4 · EVT 階段
議題 (1)	
韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定	
問題 (5)	
[M-100] 韌體問題 4:感測器漂移	Mantis #4
[M-100] 韌體問題 10:感測器漂移	Mantis #10
[M-100] 韌體問題 16:感測器漂移	Mantis #16
[M-100] 韌體問題 22:感測器漂移	Mantis #22

韌體的問題請看 #韌體

接著打字就是搜尋(圖中打了「#韌體」):四區一起篩,符合的工作項會連同上層一起列出(上層是灰字);沒有符合的區(這裡是風險)就不出現。

- **在對話中討論**:工作項視窗、風險 / 議題 / 問題視窗的右上角有「**在對話中討論**」。按下去會跳到這個看板的**對話頻道**(頻道還沒開過會先開起來),輸入框已經帶好 **#項目名稱** 與對應的連結,游標在輸入框裡,直接打字就能留言;送出後訊息裡的 #名稱 就是點得開的連結,同事點了回到那個項目。只有剛跳過來時會帶,之後從對話清單進同一個頻道,輸入框是空的。

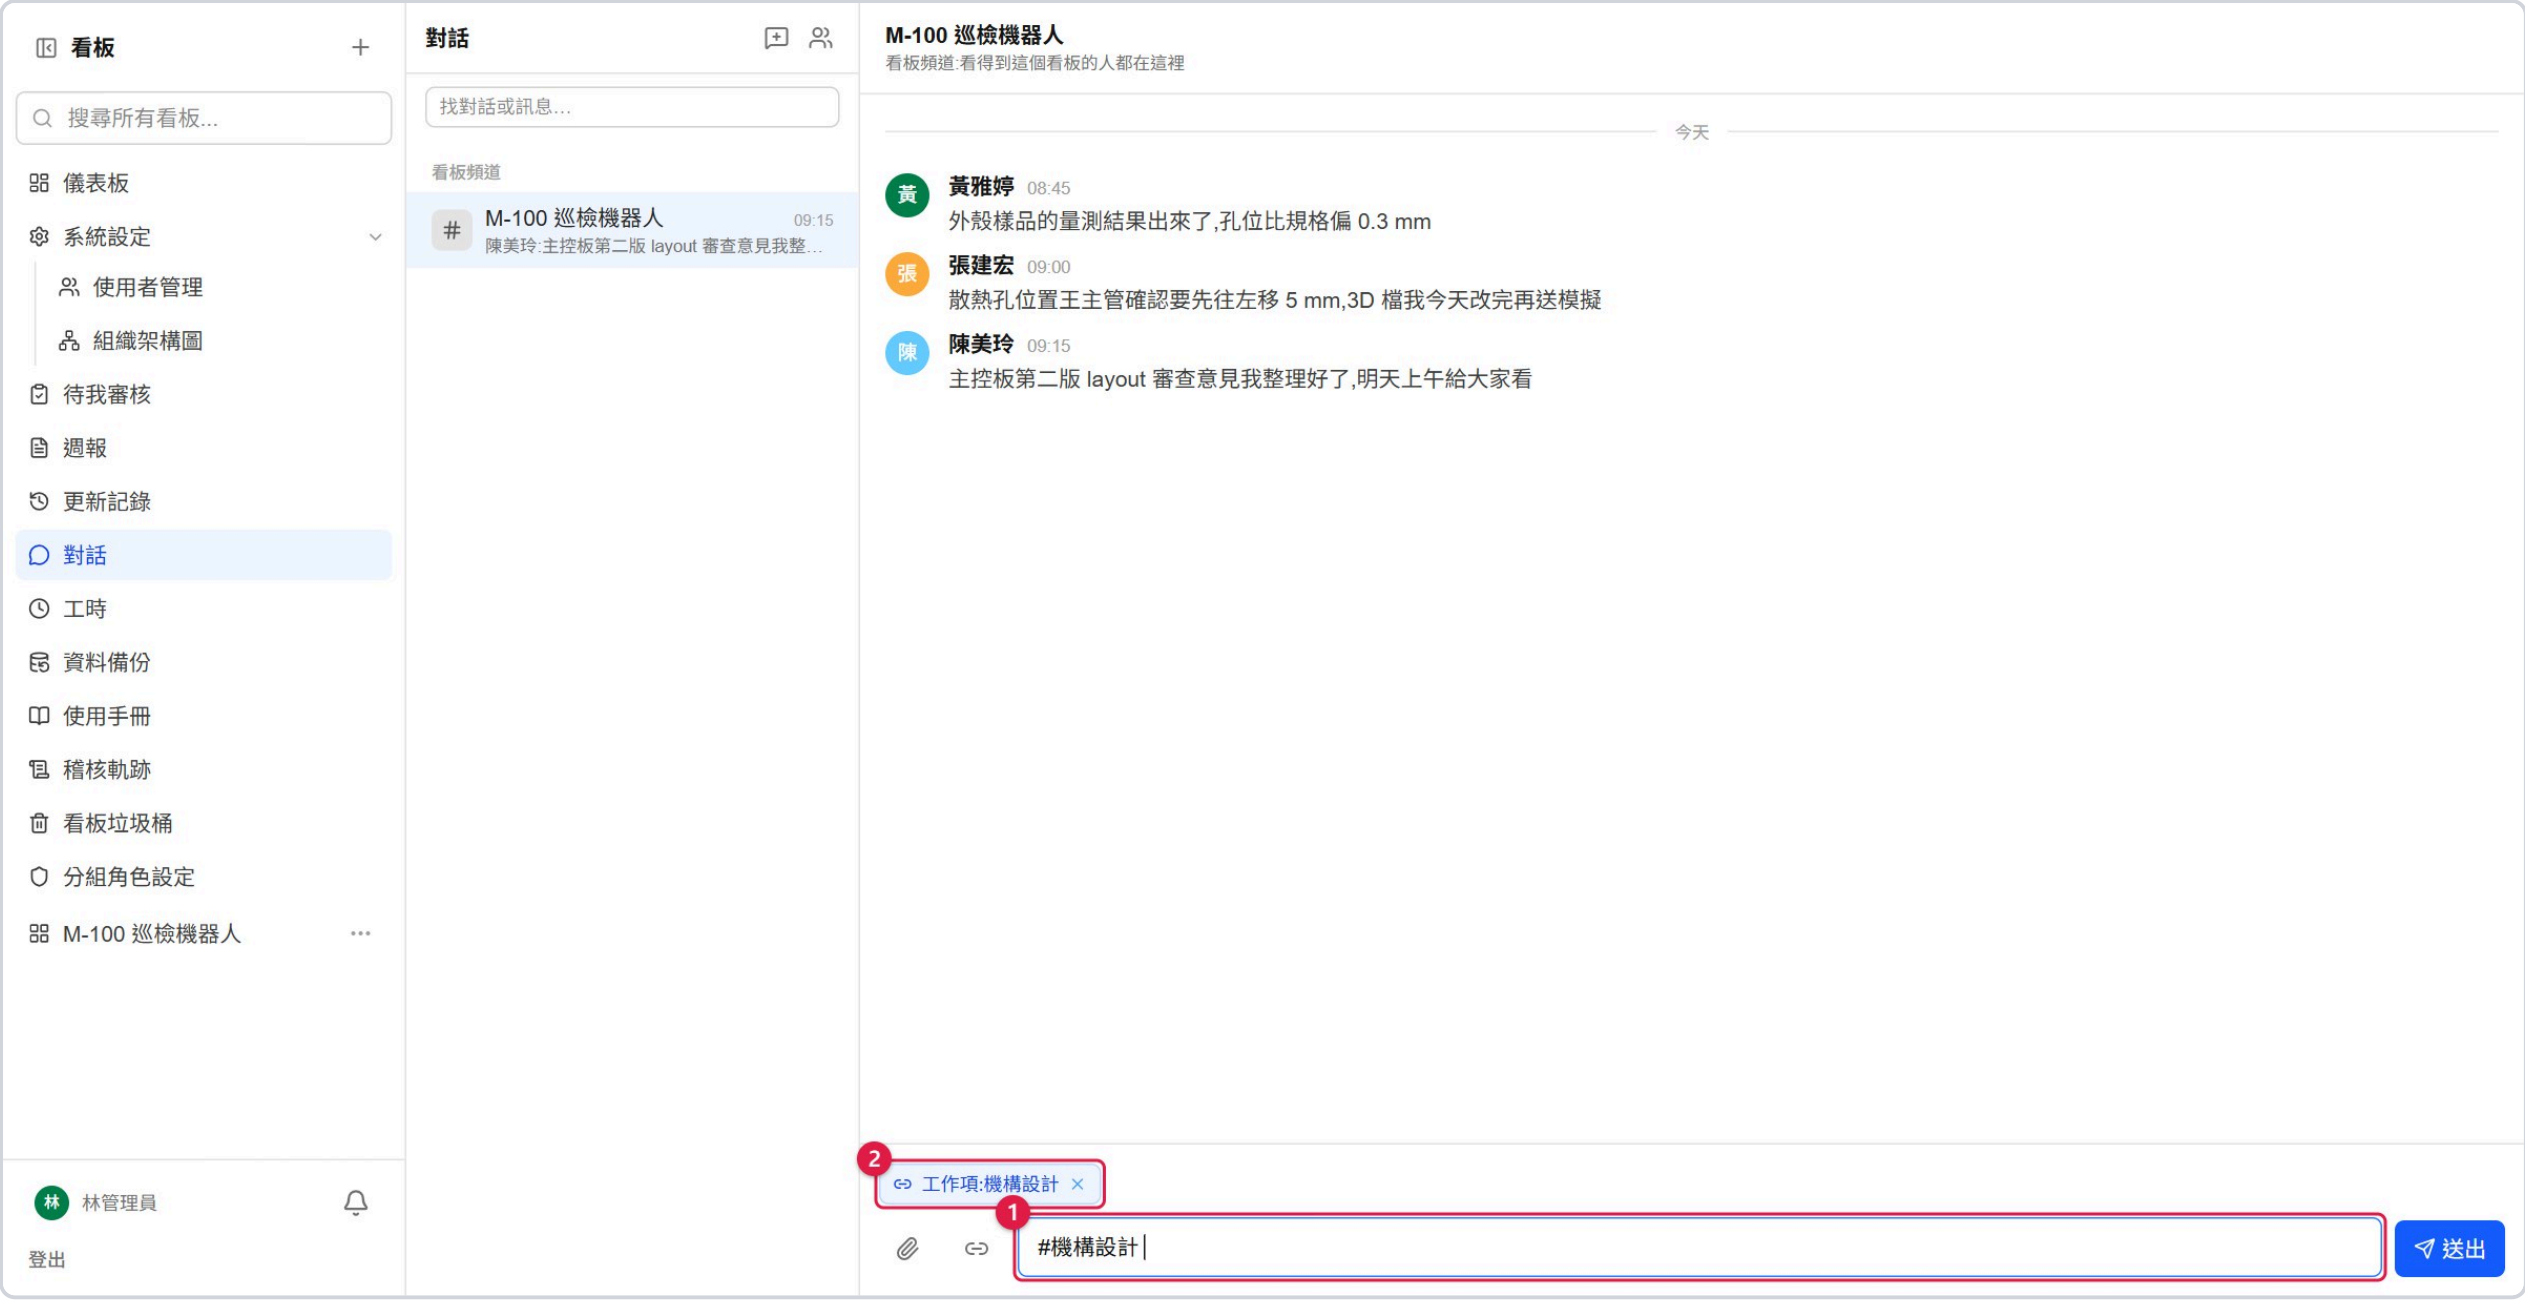
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
對話
工時
資料備份
使用手冊
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
林管理員
登出
對話
找對話或訊息...
看板頻道
M-100 巡檢機器人
09:15
陳美玲:主控板第二版 layout 審查意見我整...
M-100 巡檢機器人
看板頻道:看得到這個看板的人都在這裡
今天
2
工作項:機構設計 ×
1
送出

黃雅婷 08:45
外殼樣品的量測結果出來了,孔位比規格偏 0.3 mm

張建宏 09:00
散熱孔位置王主管確認要先往左移 5 mm,3D 檔我今天改完再送模擬

陳美玲 09:15
主控板第二版 layout 審查意見我整理好了,明天上午給大家看

#機構設計

① 輸入框已經帶好 **#機構設計**;② 輸入框上方的小標籤是這個工作項的連結(按 ✕ 可以拿掉)。直接打字、按送出,就是一則帶連結的留言。

- **轉成待辦事項 / 留言**:滑鼠移到一則有文字的訊息,右邊有兩個圖示——「**轉成待辦事項**」與「**轉成工作項留言**」。跳出視窗讓你(先改一下文字、)選定要加到哪個項目——**直接是清單**(沒有另外的選項要切),跟「附連結」同一個挑選區:搜尋框、**工作項 / 風險 / 議題 / 問題**四個類別、可收放的工作項階層。**待辦事項與留言在四個類別上都能加,畫面一樣,差別只在待辦事項多了「期限」與「處理者」**:加在風險、議題、問題上的**待辦事項**就是它們自己的「待辦事項」那一頁(見 11.3b);加在它們上面的**留言**叫**進度更新**(要有寫進度更新的權限:負責人、建立者、審核人或管理者)。

  處理者(這個待辦事項由誰完成,到期提醒會通知他)預設這樣帶入,都可以再改:① 訊息裡有 **@ 誰**,就是被 @ 的人(**即使項目已經有負責人**;@ 好幾位取第一位);② 沒有 @ 就是項目的**負責人**;③ 工作項沒有負責人:取**人員分配裡工作量比例最高**的人(比例一樣就看誰登記的工時比較多);④ 還是沒有:取**登記工時最多**的人;都沒有就不指定。風險、議題、問題的預設是 ① 與它的負責人。換一個目標,預設會跟著換成新目標的。按下去就跟你在項目視窗手動新增一模一樣(權限、活動紀錄、通知都照常;你得有那個看板的權限,看不到的私人項目搜不到)。討論出結論時用它,不用複製貼上。

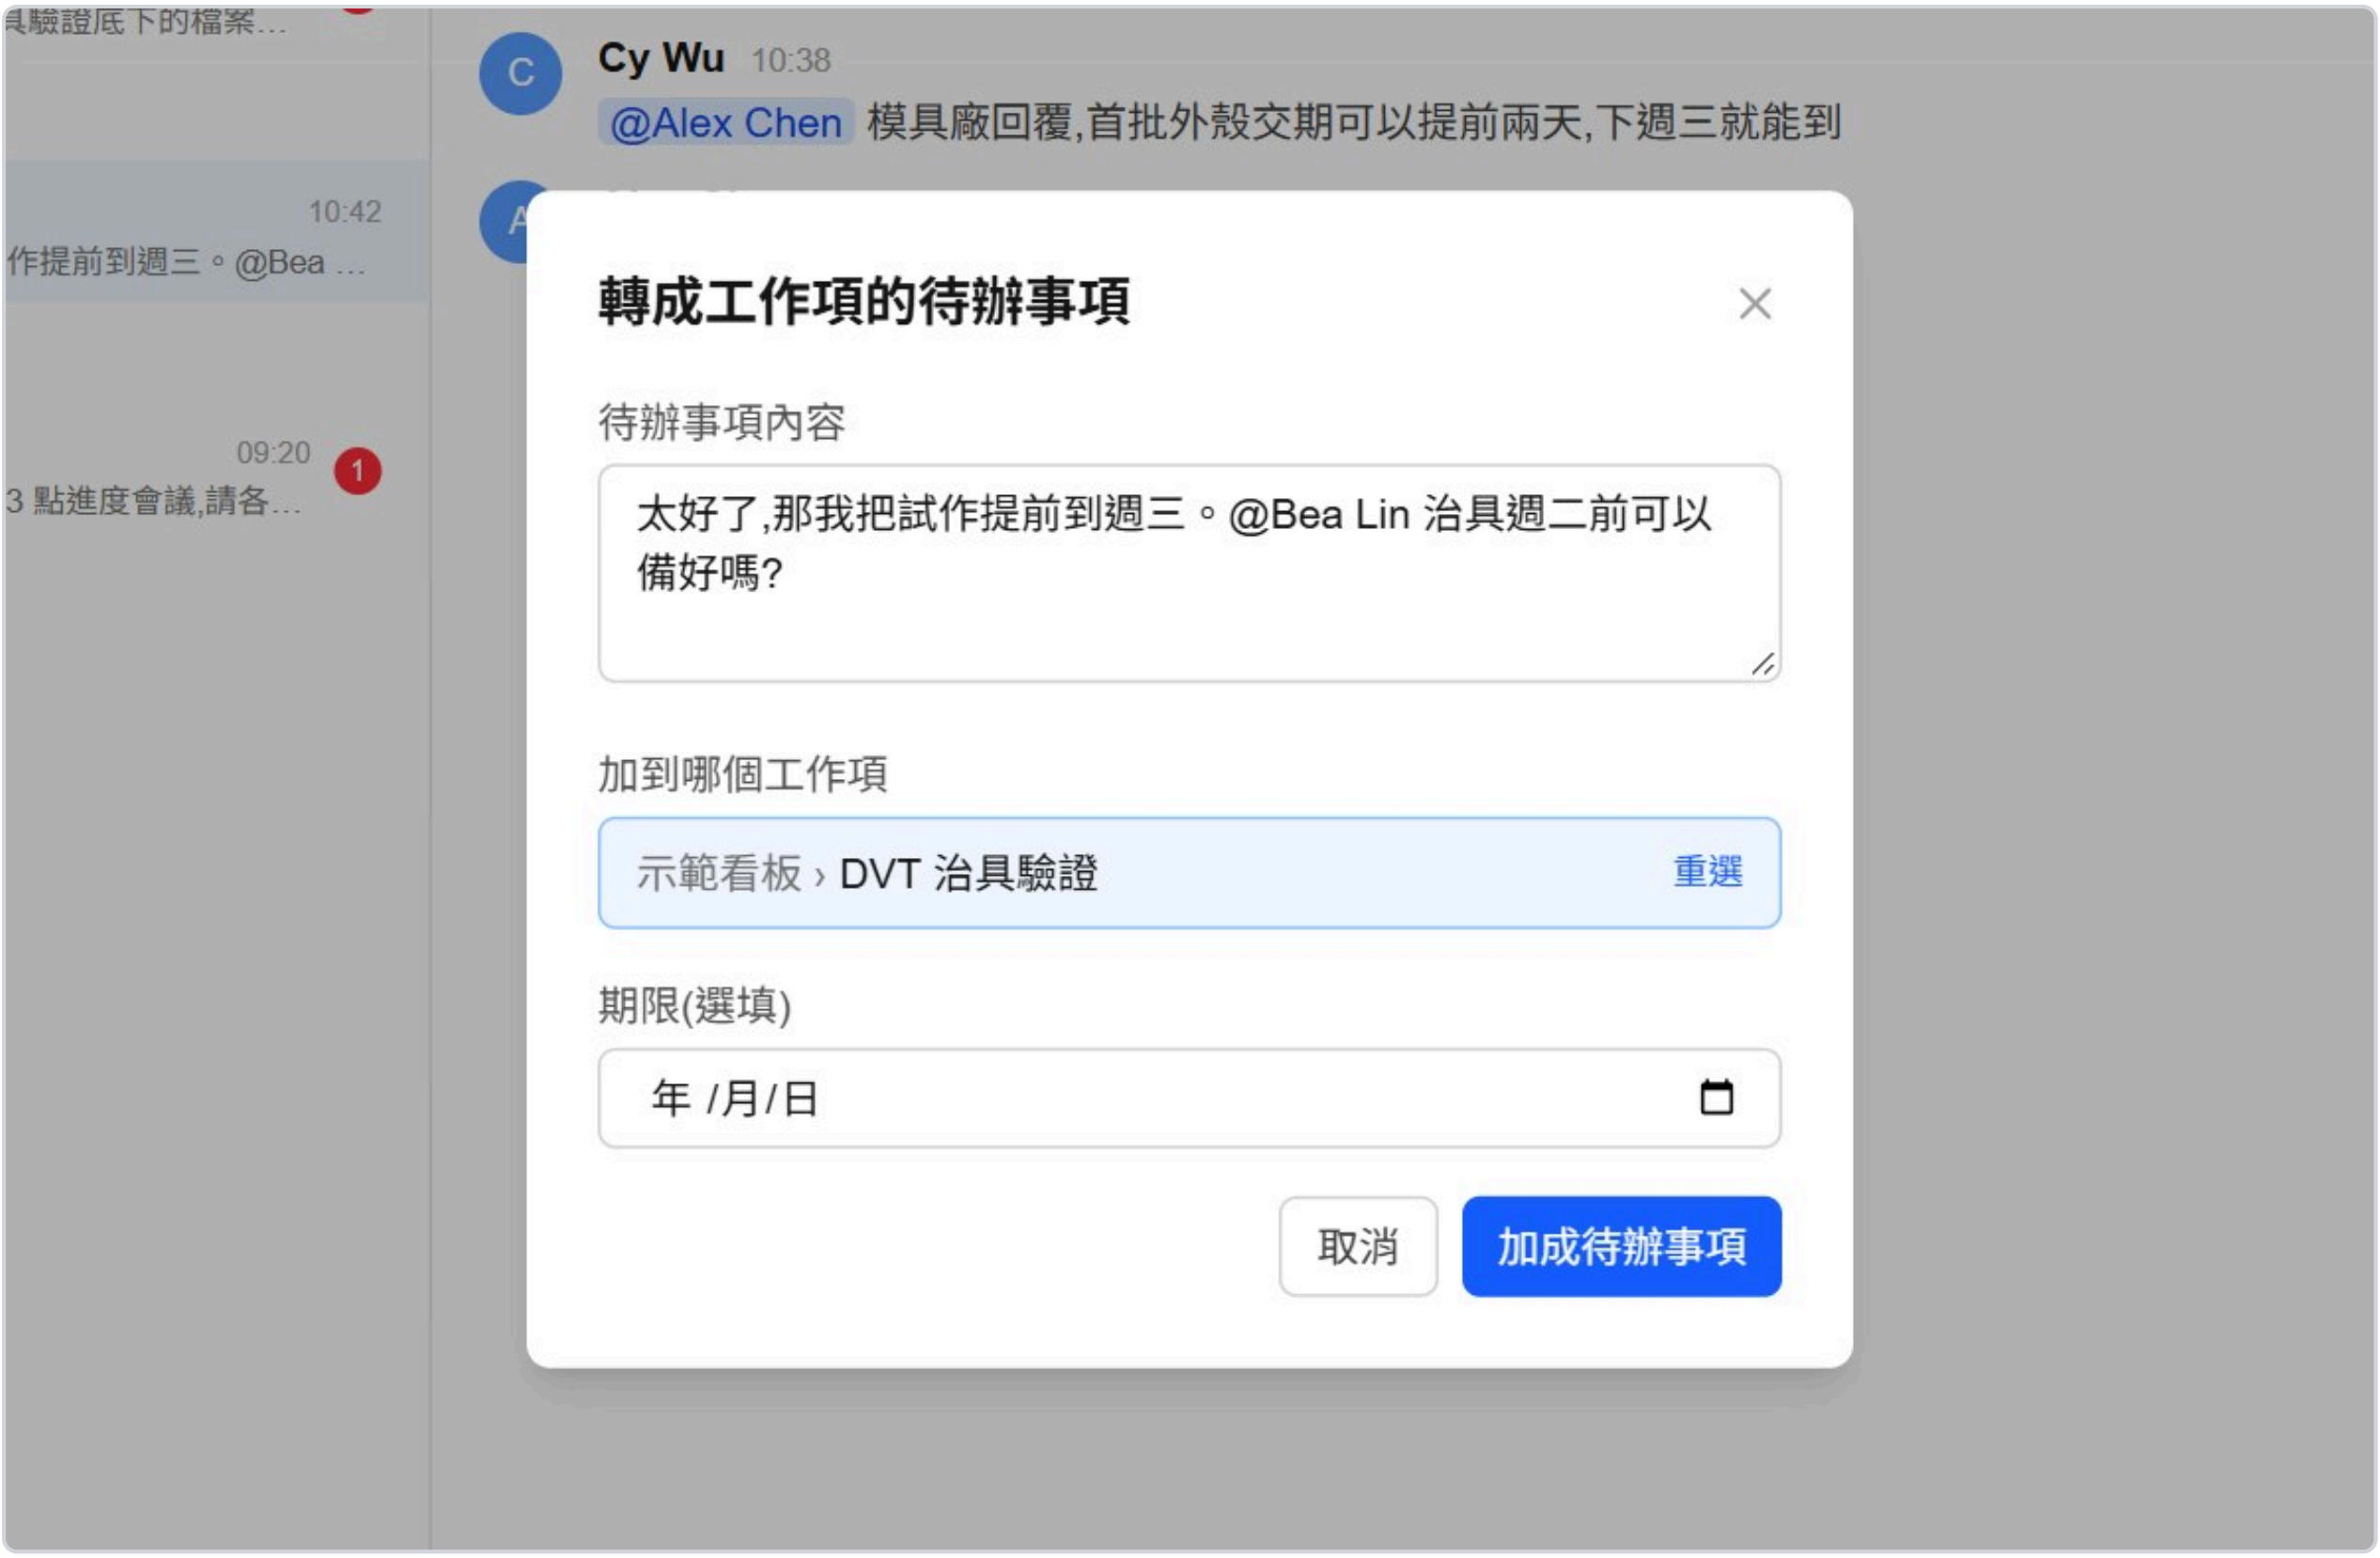
具驗證底下的檔案…
10:42
作提前到週三。@Bea …
09:20
1
3 點進度會議,請各…

Cy Wu 10:38
@Alex Chen 模具廠回覆,首批外殼交期可以提前兩天,下週三就能到

轉成工作項的待辦事項

待辦事項內容
太好了,那我把試作提前到週三。@Bea Lin 治具週二前可以備好嗎?

加到哪個工作項
示範看板 › DVT 治具驗證

期限(選填)
年 /月/日

×
重選
取消
加成待辦事項

更新既有待辦事項的備註:轉成待辦事項的視窗,挑好項目之後有兩個選項——「**加成新的待辦事項**」(預設)與「**更新既有待辦事項的備註**」。選後者,下面會列出這個項目(工作項、風險、議題、問題都可以)**已經有的待辦事項**,連它們現有的備註一起顯示,選一筆,訊息內容就**接在那一筆備註的後面**(換一行,原本的備註保留;文字可以先改,例如加上日期)。用來記錄某件待辦談到哪、結果如何。沒有待辦事項的項目會提示改選「加成新的」;加進去之後備註會超過 1000 字時會擋下並說明,資料不變。這個選項只在轉成待辦事項時有,轉成留言沒有。更動一樣記在項目 / 風險的紀錄。

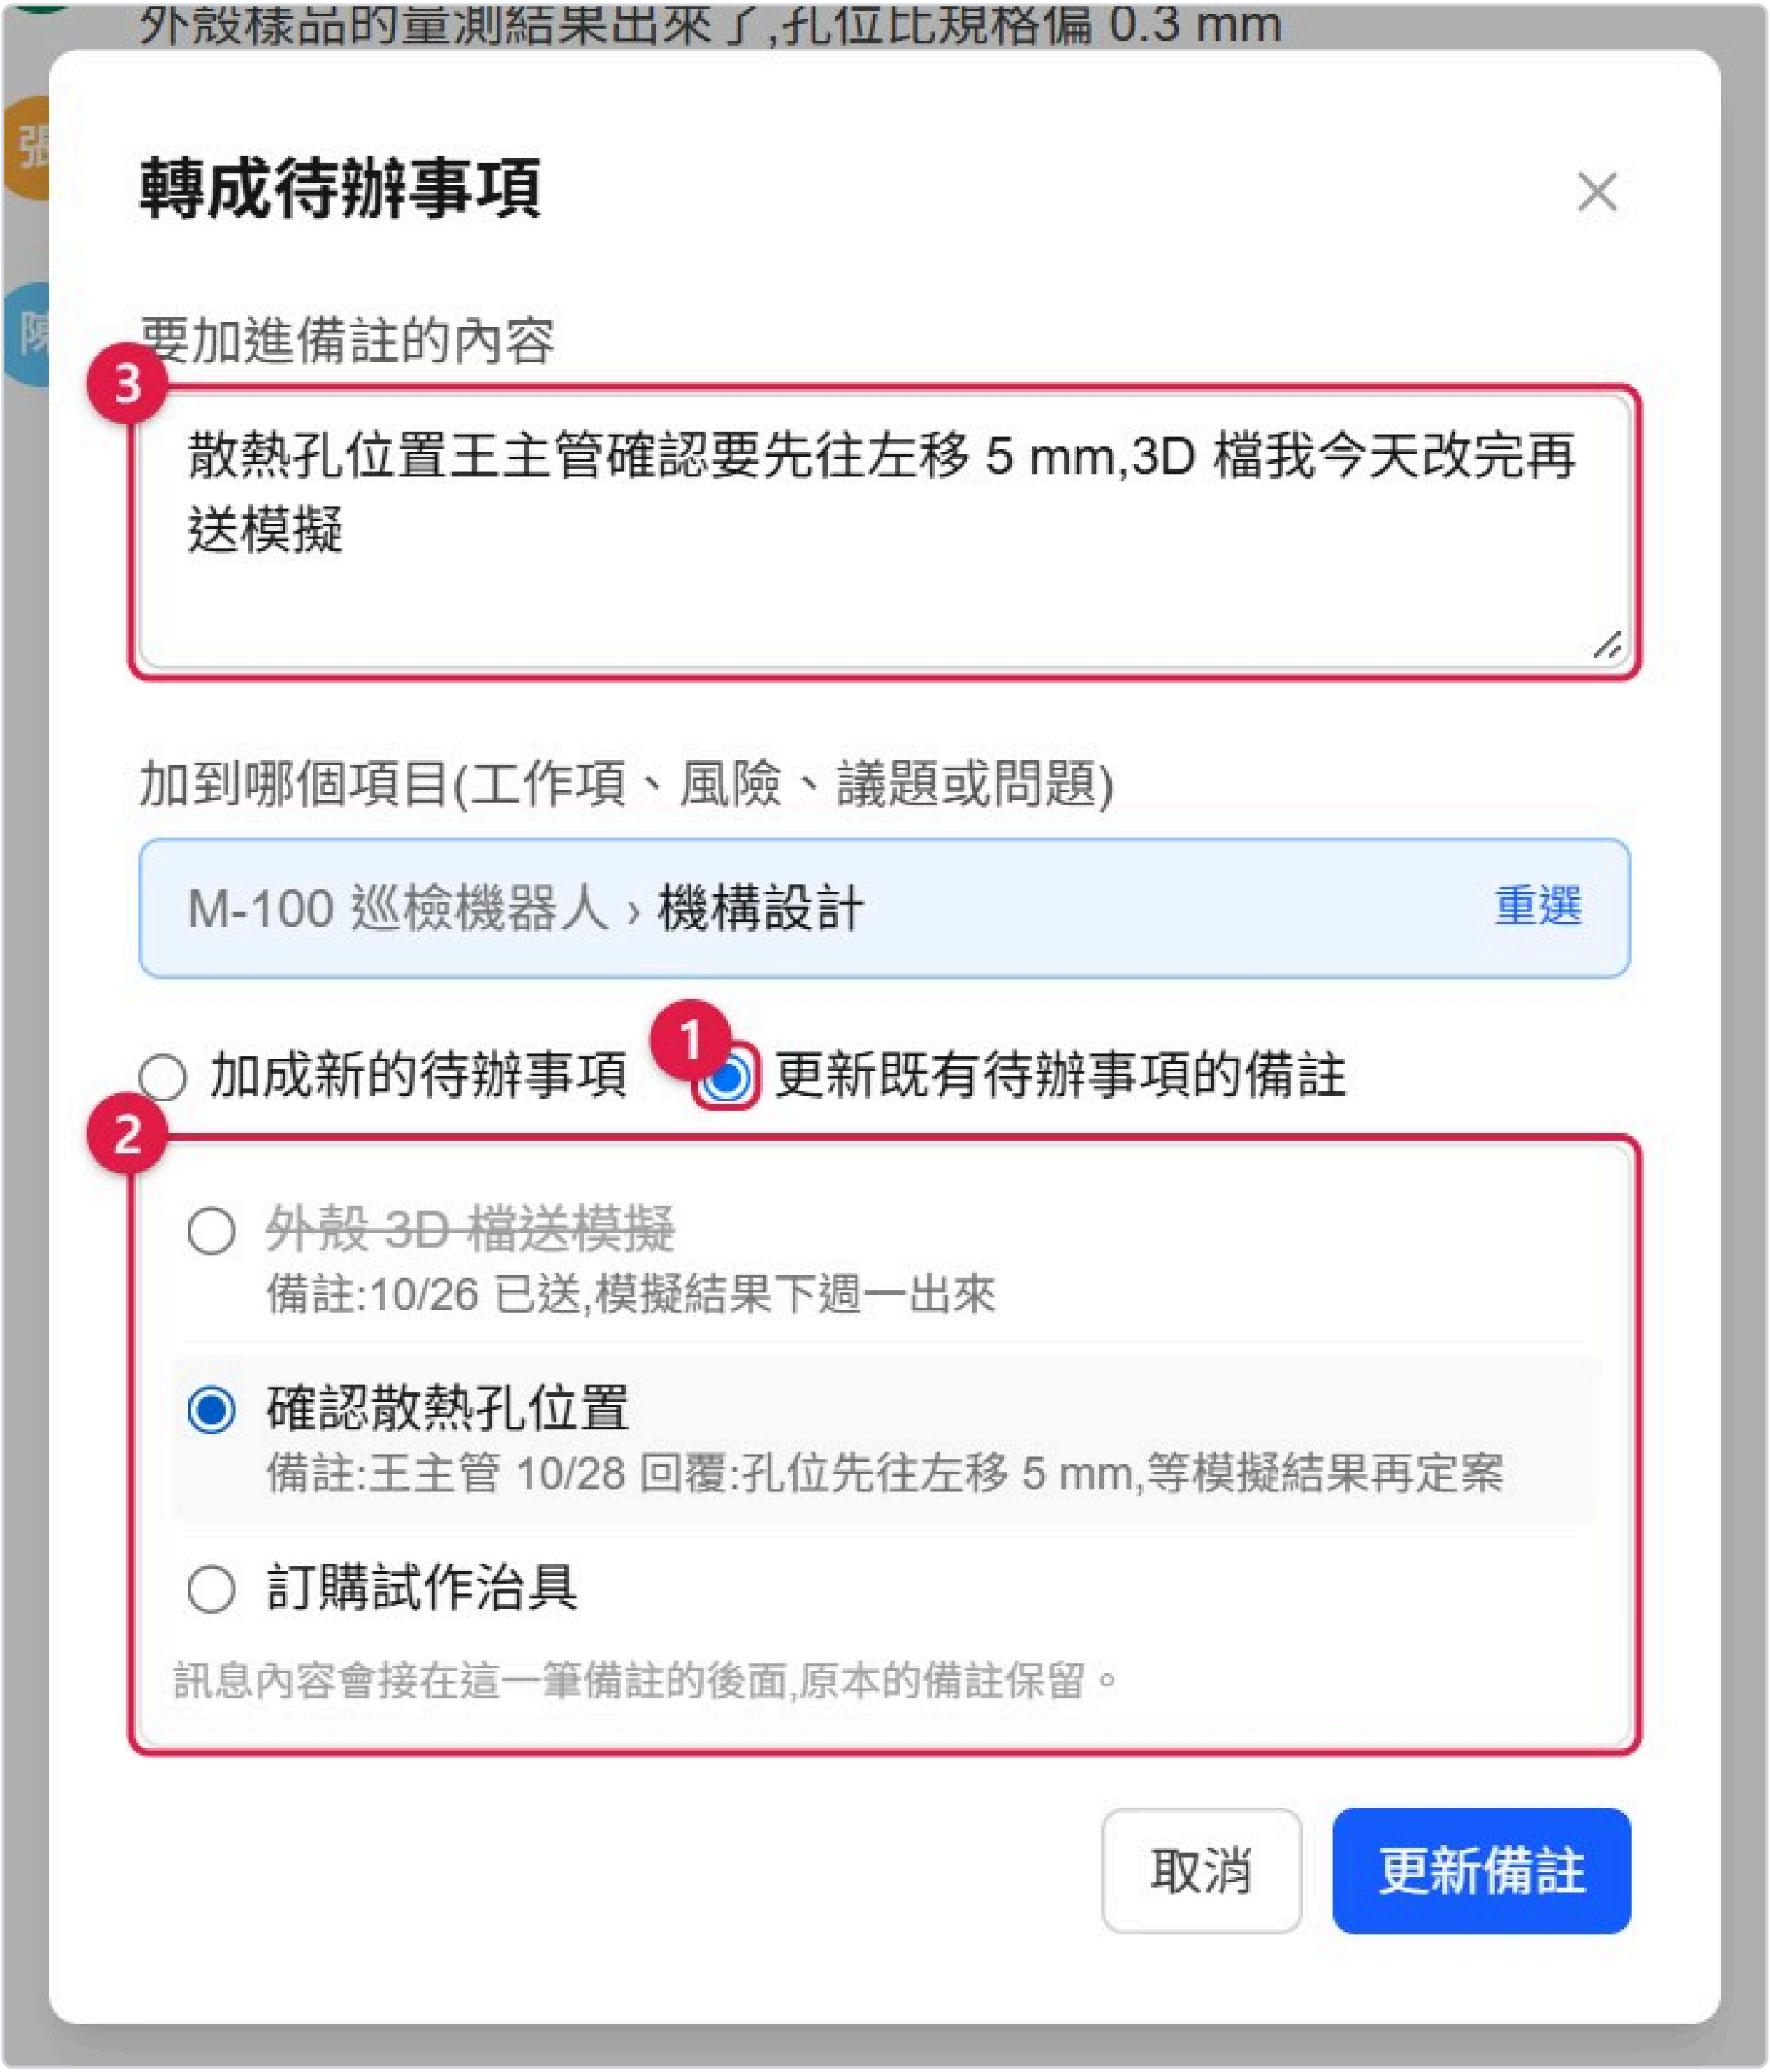

外殼樣品的量測結果出來了,孔位比規格偏 0.3 mm

轉成待辦事項

要加進備註的內容

散熱孔位置王主管確認要先往左移 5 mm,3D 檔我今天改完再送模擬

加到哪個項目(工作項、風險、議題或問題)

M-100 巡檢機器人 › **機構設計** 重選

○ 加成新的待辦事項 ● 更新既有待辦事項的備註

○ ~~外殼 3D 檔送模擬~~
備註:10/26 已送,模擬結果下週一出來

● 確認散熱孔位置
備註:王主管 10/28 回覆:孔位先往左移 5 mm,等模擬結果再定案

○ 訂購試作治具

訊息內容會接在這一筆備註的後面,原本的備註保留。

① 選「**更新既有待辦事項的備註**」;② 列出這個項目已有的待辦事項與它們目前的備註,點選要接在哪一筆後面;③ 要加進備註的內容,可以先改。

- **收回**:滑鼠移到自己的訊息,按右邊的垃圾桶圖示。訊息的位置還在,內容換成「訊息已收回」,所有人都看不到原文,**附的檔案也會一起刪掉**。只能收回自己的。

- **通知**:被 @ 到一定通知;私訊與群組有新訊息也通知,但**同一段未讀只通知第一次**(你還沒看之前,對方再傳十則也不會再通知);看板頻道只通知被 @ 到的人。通知出現在鈴鐺(標籤「對話」,點下去直接進那一間)並照通知設定寄 Email;每個人可以在鈴鐺的齒輪裡關掉「對話」這一類的站內或 Email 通知,管理者也能在系統設定整個關掉。打開那一間時,它的通知自動標成已讀。

- **隱私**:私訊與群組只有成員看得到,其他人拿到網址也進不去;管理者**也看不到**別人的私訊。管理者「**切換使用者視角**」(代操作,見 1.4)時**不能使用對話**——發出去的訊息會變成對方說的話,私訊內容也不該讓代操作的人看到。
- 訊息與檔案會一直保留,沒有自動刪除舊的。管理者刪除某個帳號時,他發過的對話訊息會一起刪掉;群組最後一個人離開時,群組的訊息與檔案一起消失。
- **工作項的留言也是即時的**:兩個人同時開著同一個工作項的「更新」分頁,一個人留言,另一個人的畫面馬上多一則,不用關掉重開;打到一半的字不會被洗掉。看不到那個看板的人不會收到。(留言本身的功能——@ 提到、彙整進週報——見第 5 章,沒有改變。)
- 如果公司網路或代理伺服器擋掉即時推送,對話清單會改成每 15 秒自動更新一次,功能照用,只是慢一點。

1.8 說明與問題回報

每個畫面的**右下角**有一顆圓形的「**?**」按鈕。不知道怎麼用、有疑問的時候按它:

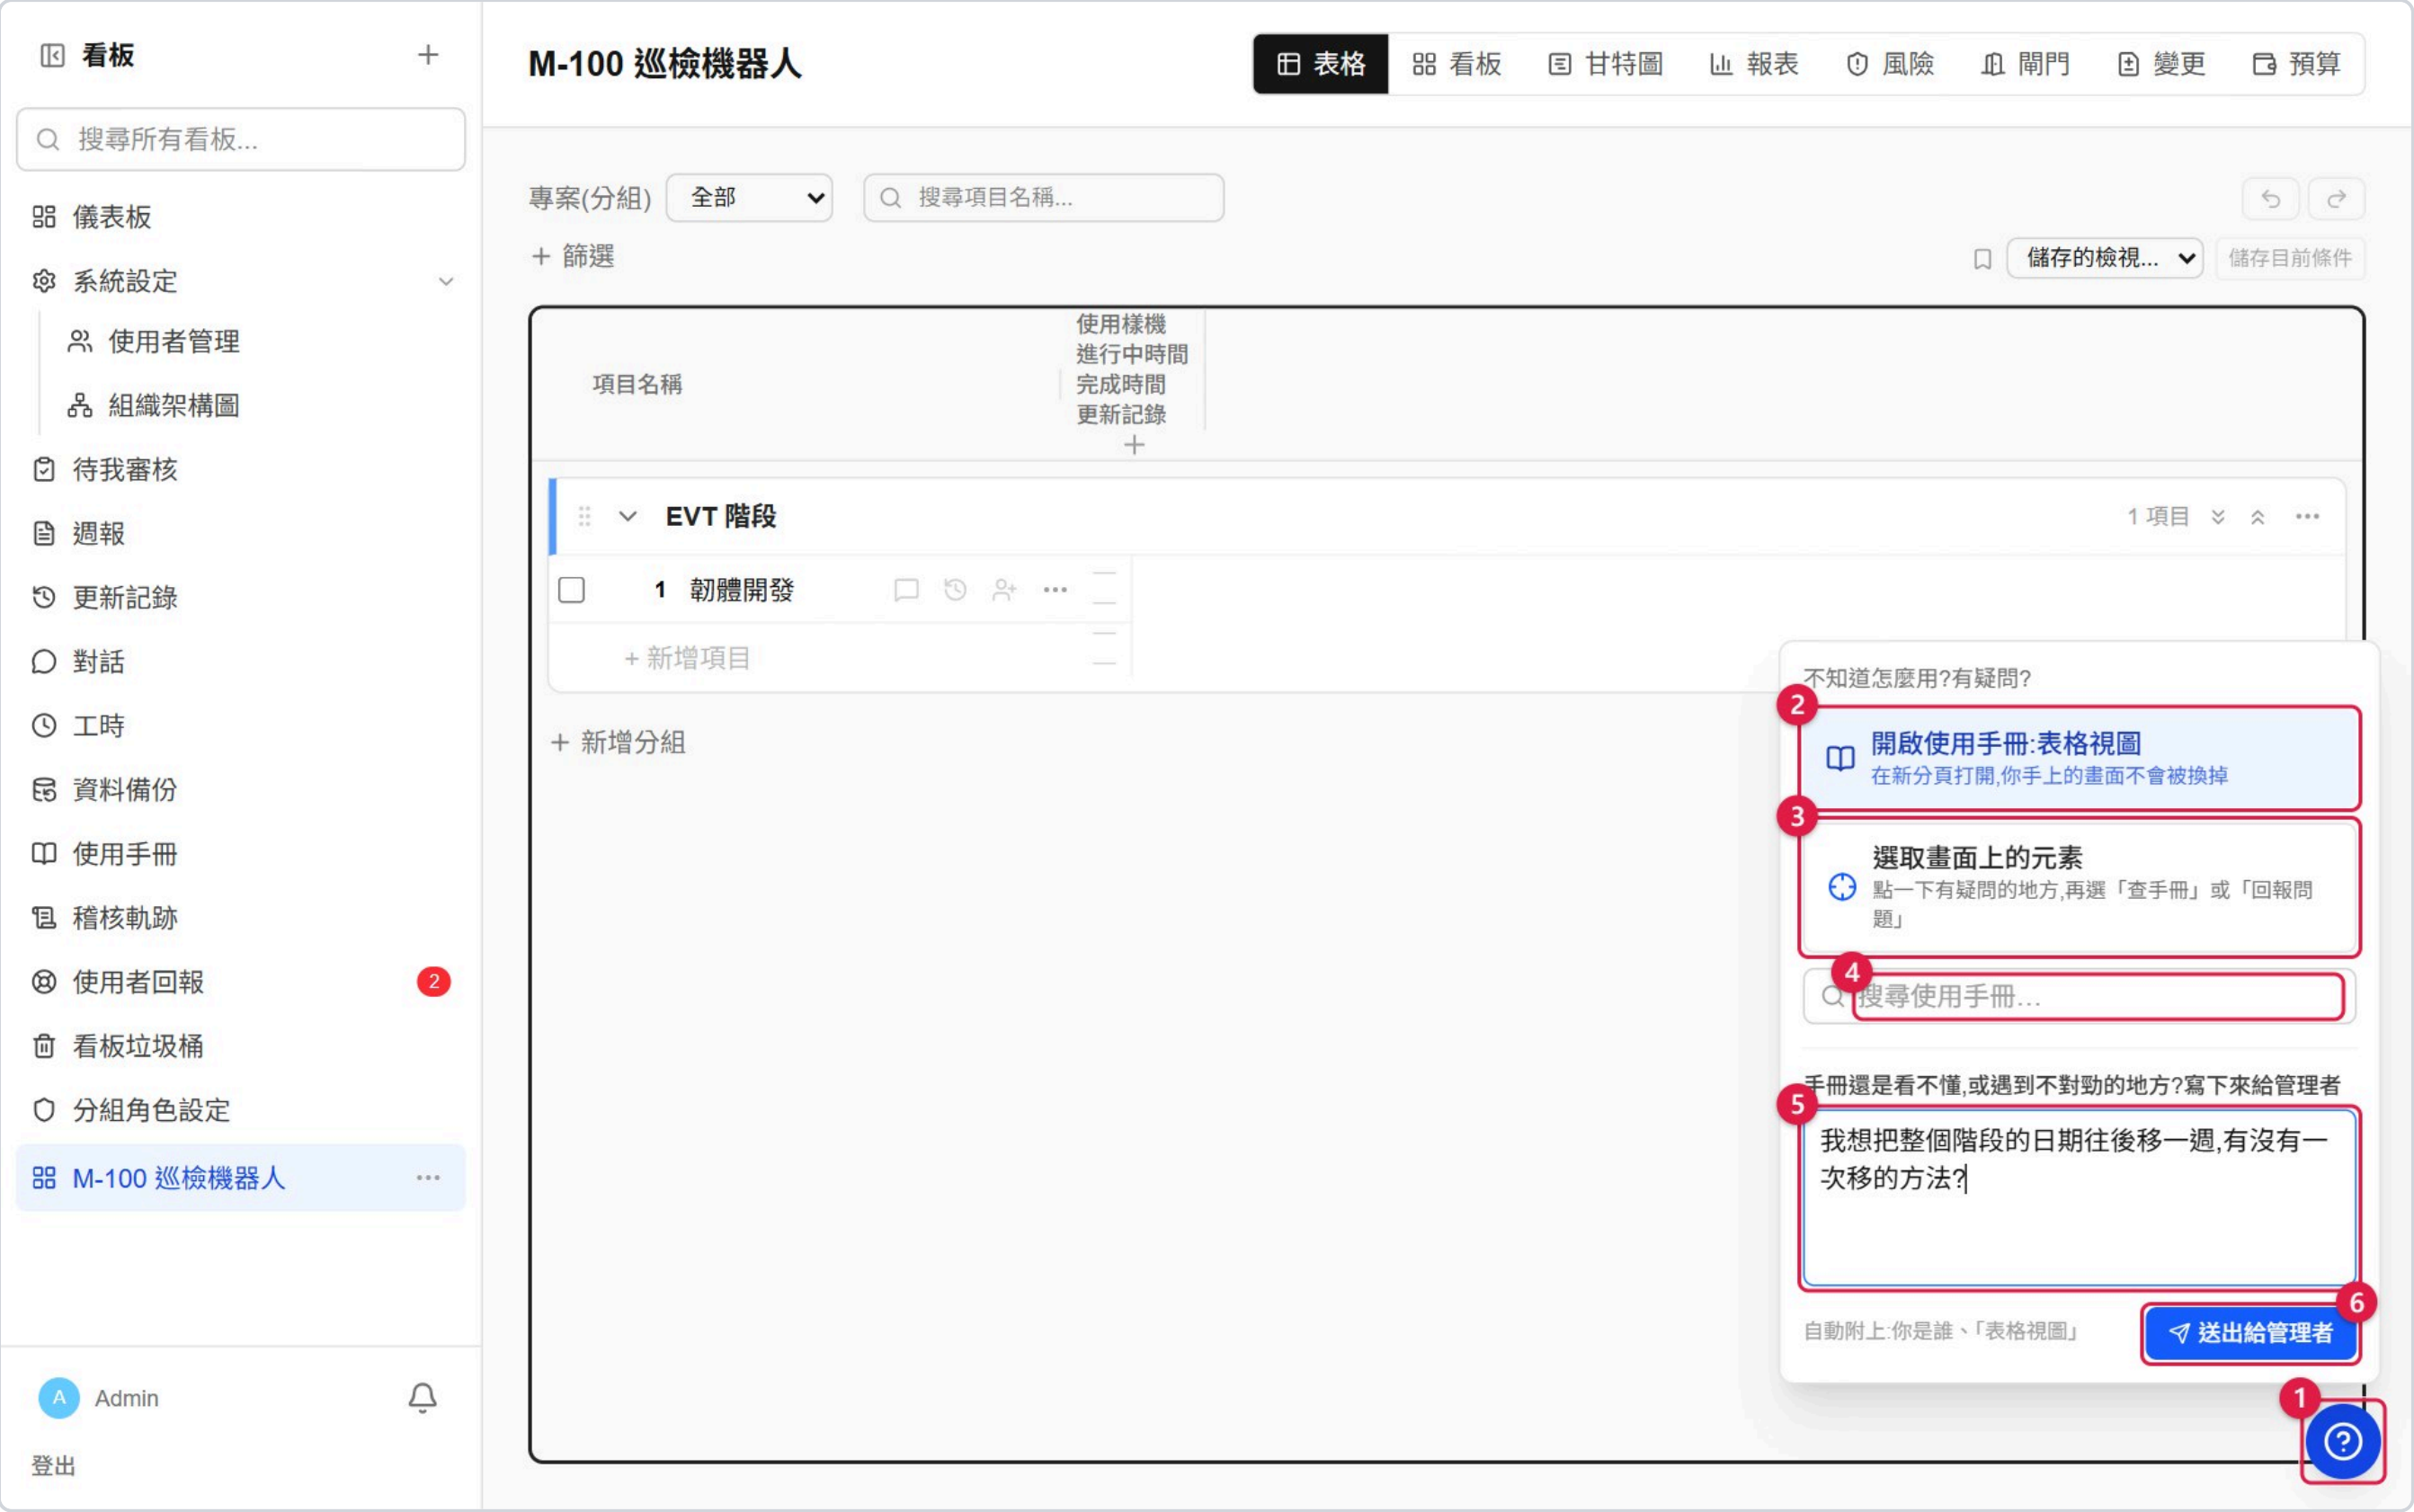
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
對話
工時
資料備份
使用手冊
稽核軌跡
使用者回報
2
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
Admin
登出
M-100 巡檢機器人
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
專案(分組)
全部
搜尋項目名稱...
篩選
儲存的檢視...
儲存目前條件
項目名稱
使用樣機
進行中時間
完成時間
更新記錄
EVT 階段
1 項目
1
韌體開發
新增項目
新增分組
1
2
3
4
5
6
開啟使用手冊:表格視圖
選取畫面上的元素
搜尋使用手冊...
送出給管理者

不知道怎麼用?有疑問?

在新分頁打開,你手上的畫面不會被換掉

點一下有疑問的地方,再選「查手冊」或「回報問題」

手冊還是看不懂,或遇到不對勁的地方?寫下來給管理者

我想把整個階段的日期往後移一週,有沒有一次移的方法?

自動附上:你是誰、「表格視圖」

- ① **開啟「...」的說明**:按鈕最上面寫出你現在所在的畫面(例如「甘特圖」「項目卡片」「週報」),按下去會**在新分頁**打開使用手冊裡對應的那一章,你手上的畫面不會被換掉。看板上切到哪個分頁(表格、甘特圖、預算...)、開著項目卡片或人員分配視窗時,它會跟著指到對的章節。
- ② **選取畫面上的元素**:不確定是「哪裡」有問題,或想問畫面上某個按鈕、欄位是做什麼的,就按這一項,然後**直接點畫面上那個地方**(下一段細說)。
- ③ **搜尋手冊**:對不上章節就打關鍵字(至少兩個字),按 Enter 直接到手冊的搜尋結果。

- ④ **寫下你的問題**:手冊還是看不懂,或遇到不對勁的地方,寫在下面的框裡(最多 2000 字),按「送出給管理者」。系統會**自動附上你是誰、送出時在哪個畫面**,不用再另外說明是哪裡。送出之後管理者在側邊欄的「使用者回報」(21.2b)統一看與處理。 **選取畫面上的元素:查手冊或回報問題**

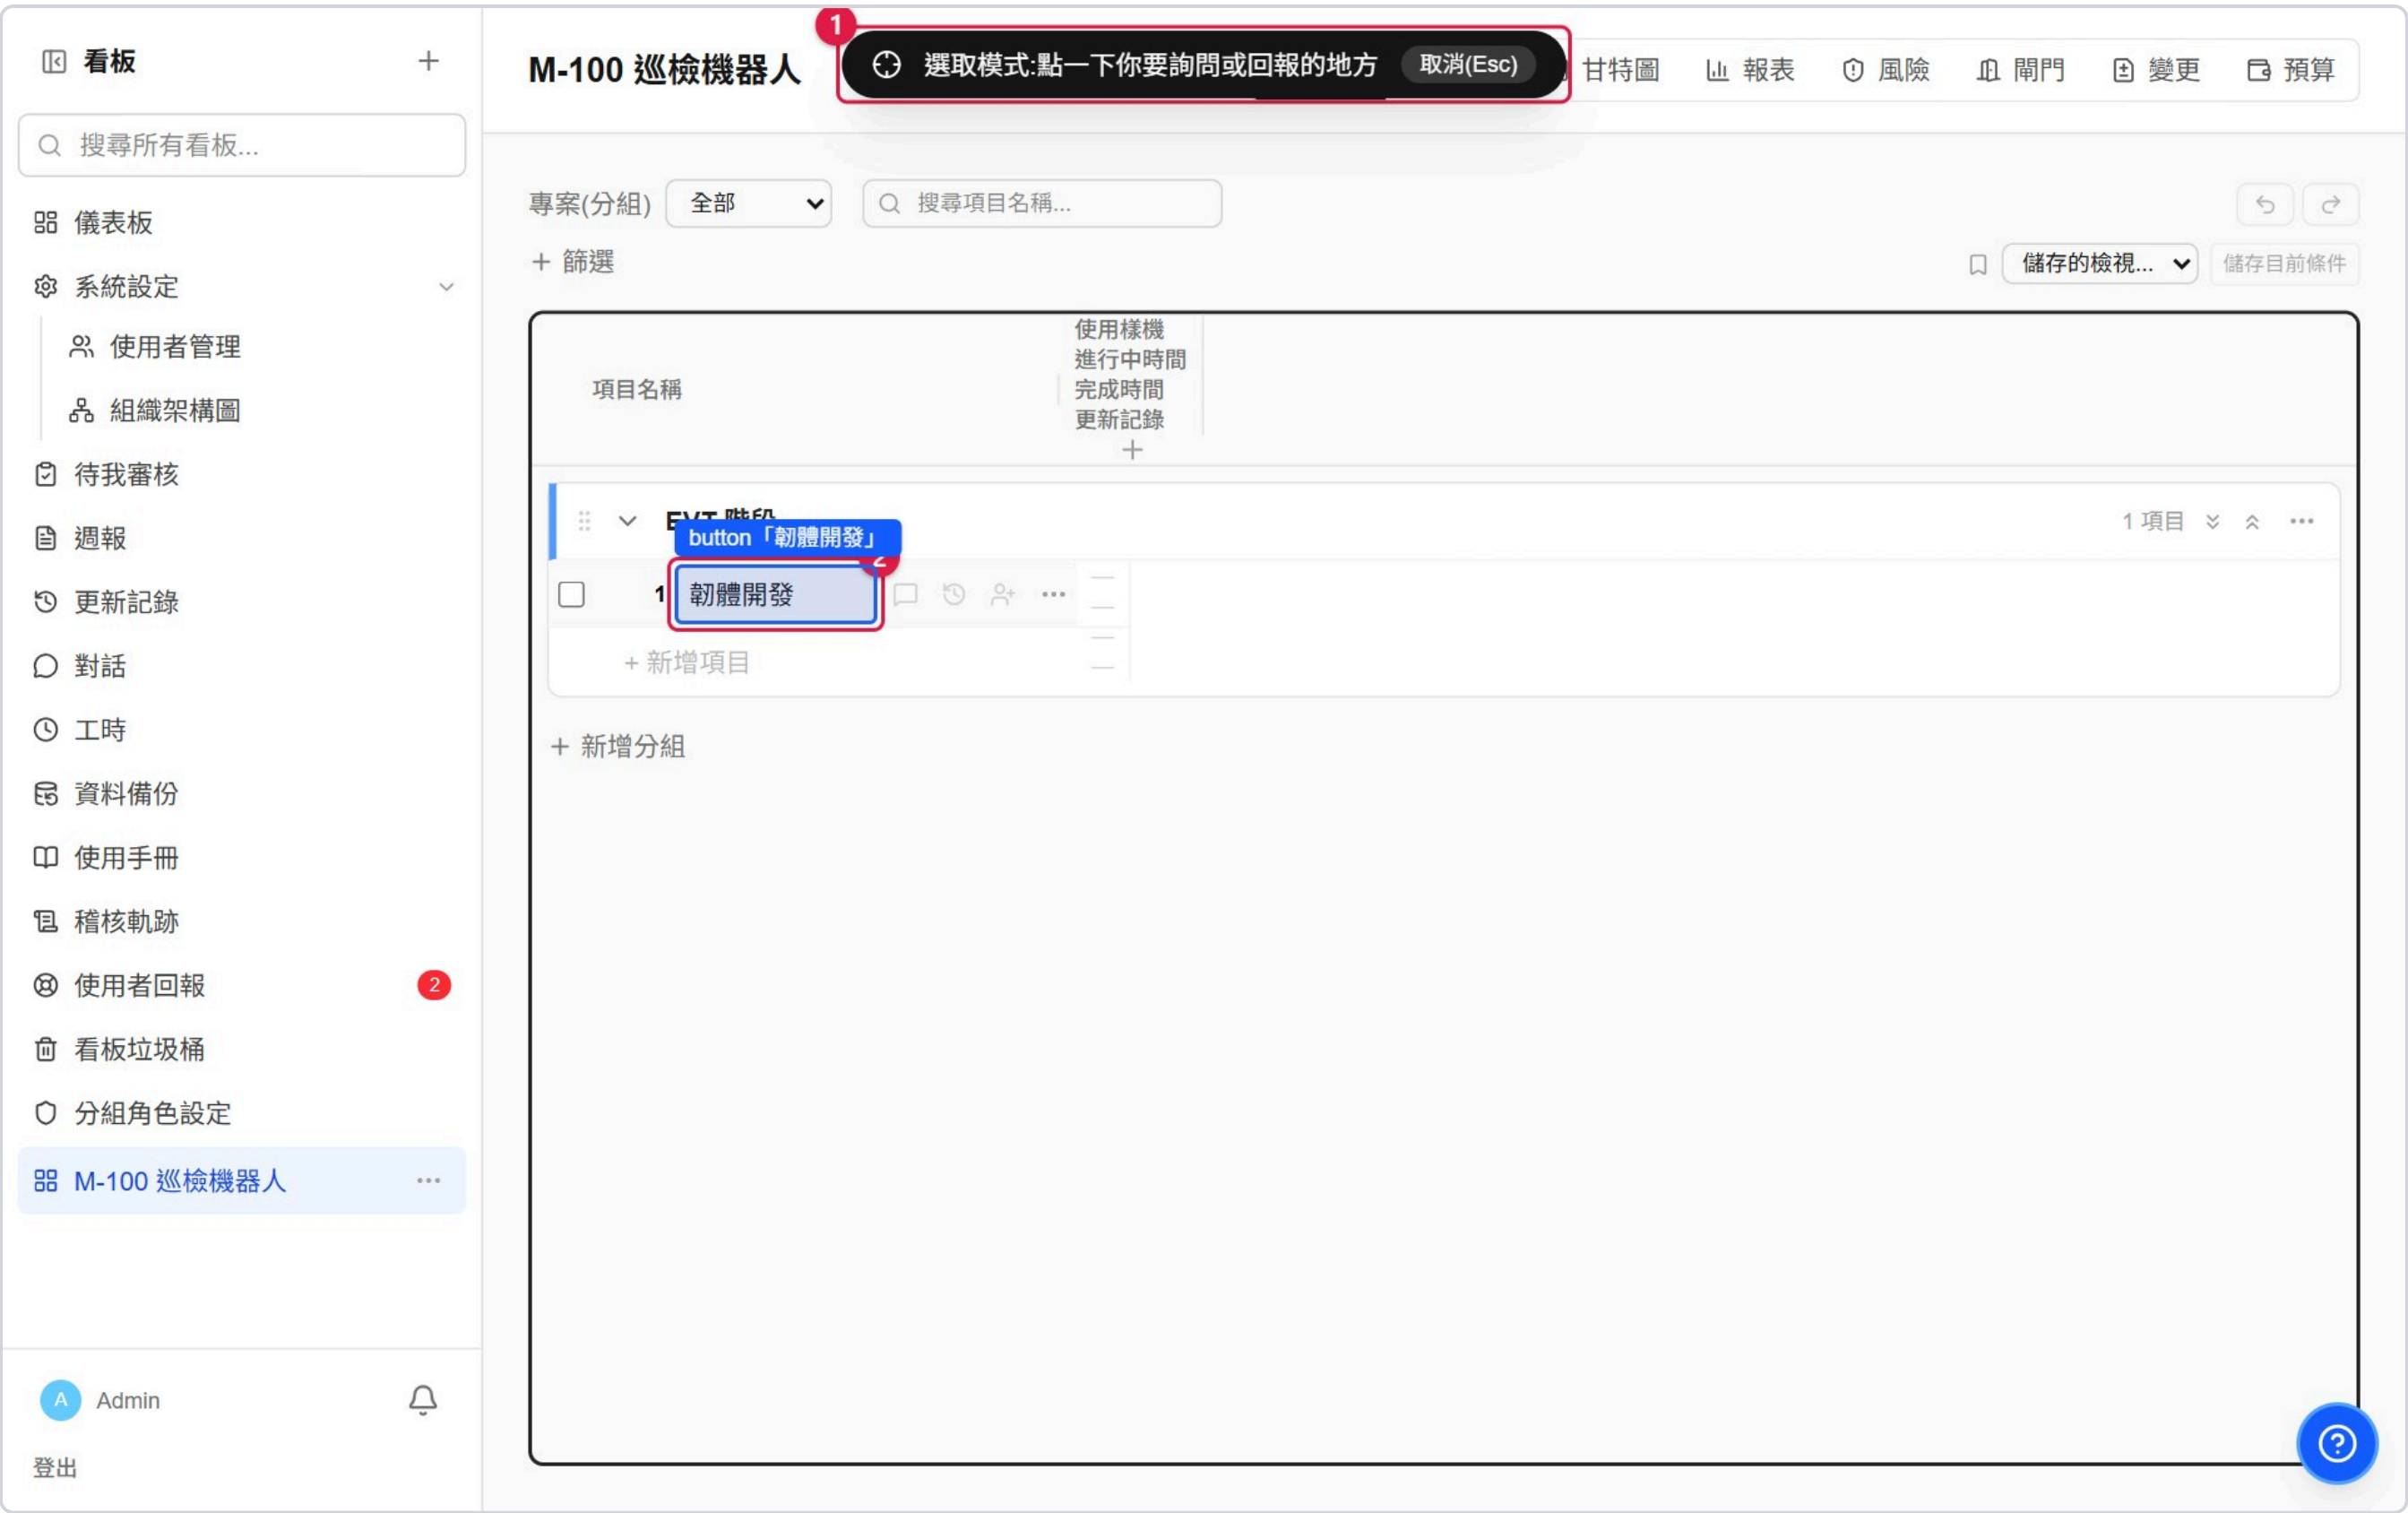
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
對話
工時
資料備份
使用手冊
稽核軌跡
使用者回報
2
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
Admin
登出
M-100 巡檢機器人
1
選取模式:點一下你要詢問或回報的地方
取消(Esc)
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
專案(分組)
全部
搜尋項目名稱...
+ 篩選
儲存的檢視...
儲存目前條件
項目名稱
使用樣機
進行中時間
完成時間
更新記錄
EVT 階段
button「韌體開發」
2
1 項目
韌體開發
+ 新增項目
+ 新增分組

1. 按「?」→「**選取畫面上的元素**」。項目卡片這類視窗開著的時候,外面的「?」點不到,視窗**標題列**有一個瞄準圖示,按它一樣能開始選,選視窗裡的東西。
2. 畫面上方出現「選取模式」,滑鼠移到的地方會用**藍框**框起來,旁邊標出它是什麼。**點一下**就選它——這一下**不會真的按到**那個按鈕。想離開按 Esc 或橫幅上的「取消」。
3. 跳出「選取的地方」視窗,寫著你選了什麼,上面有兩個分頁:

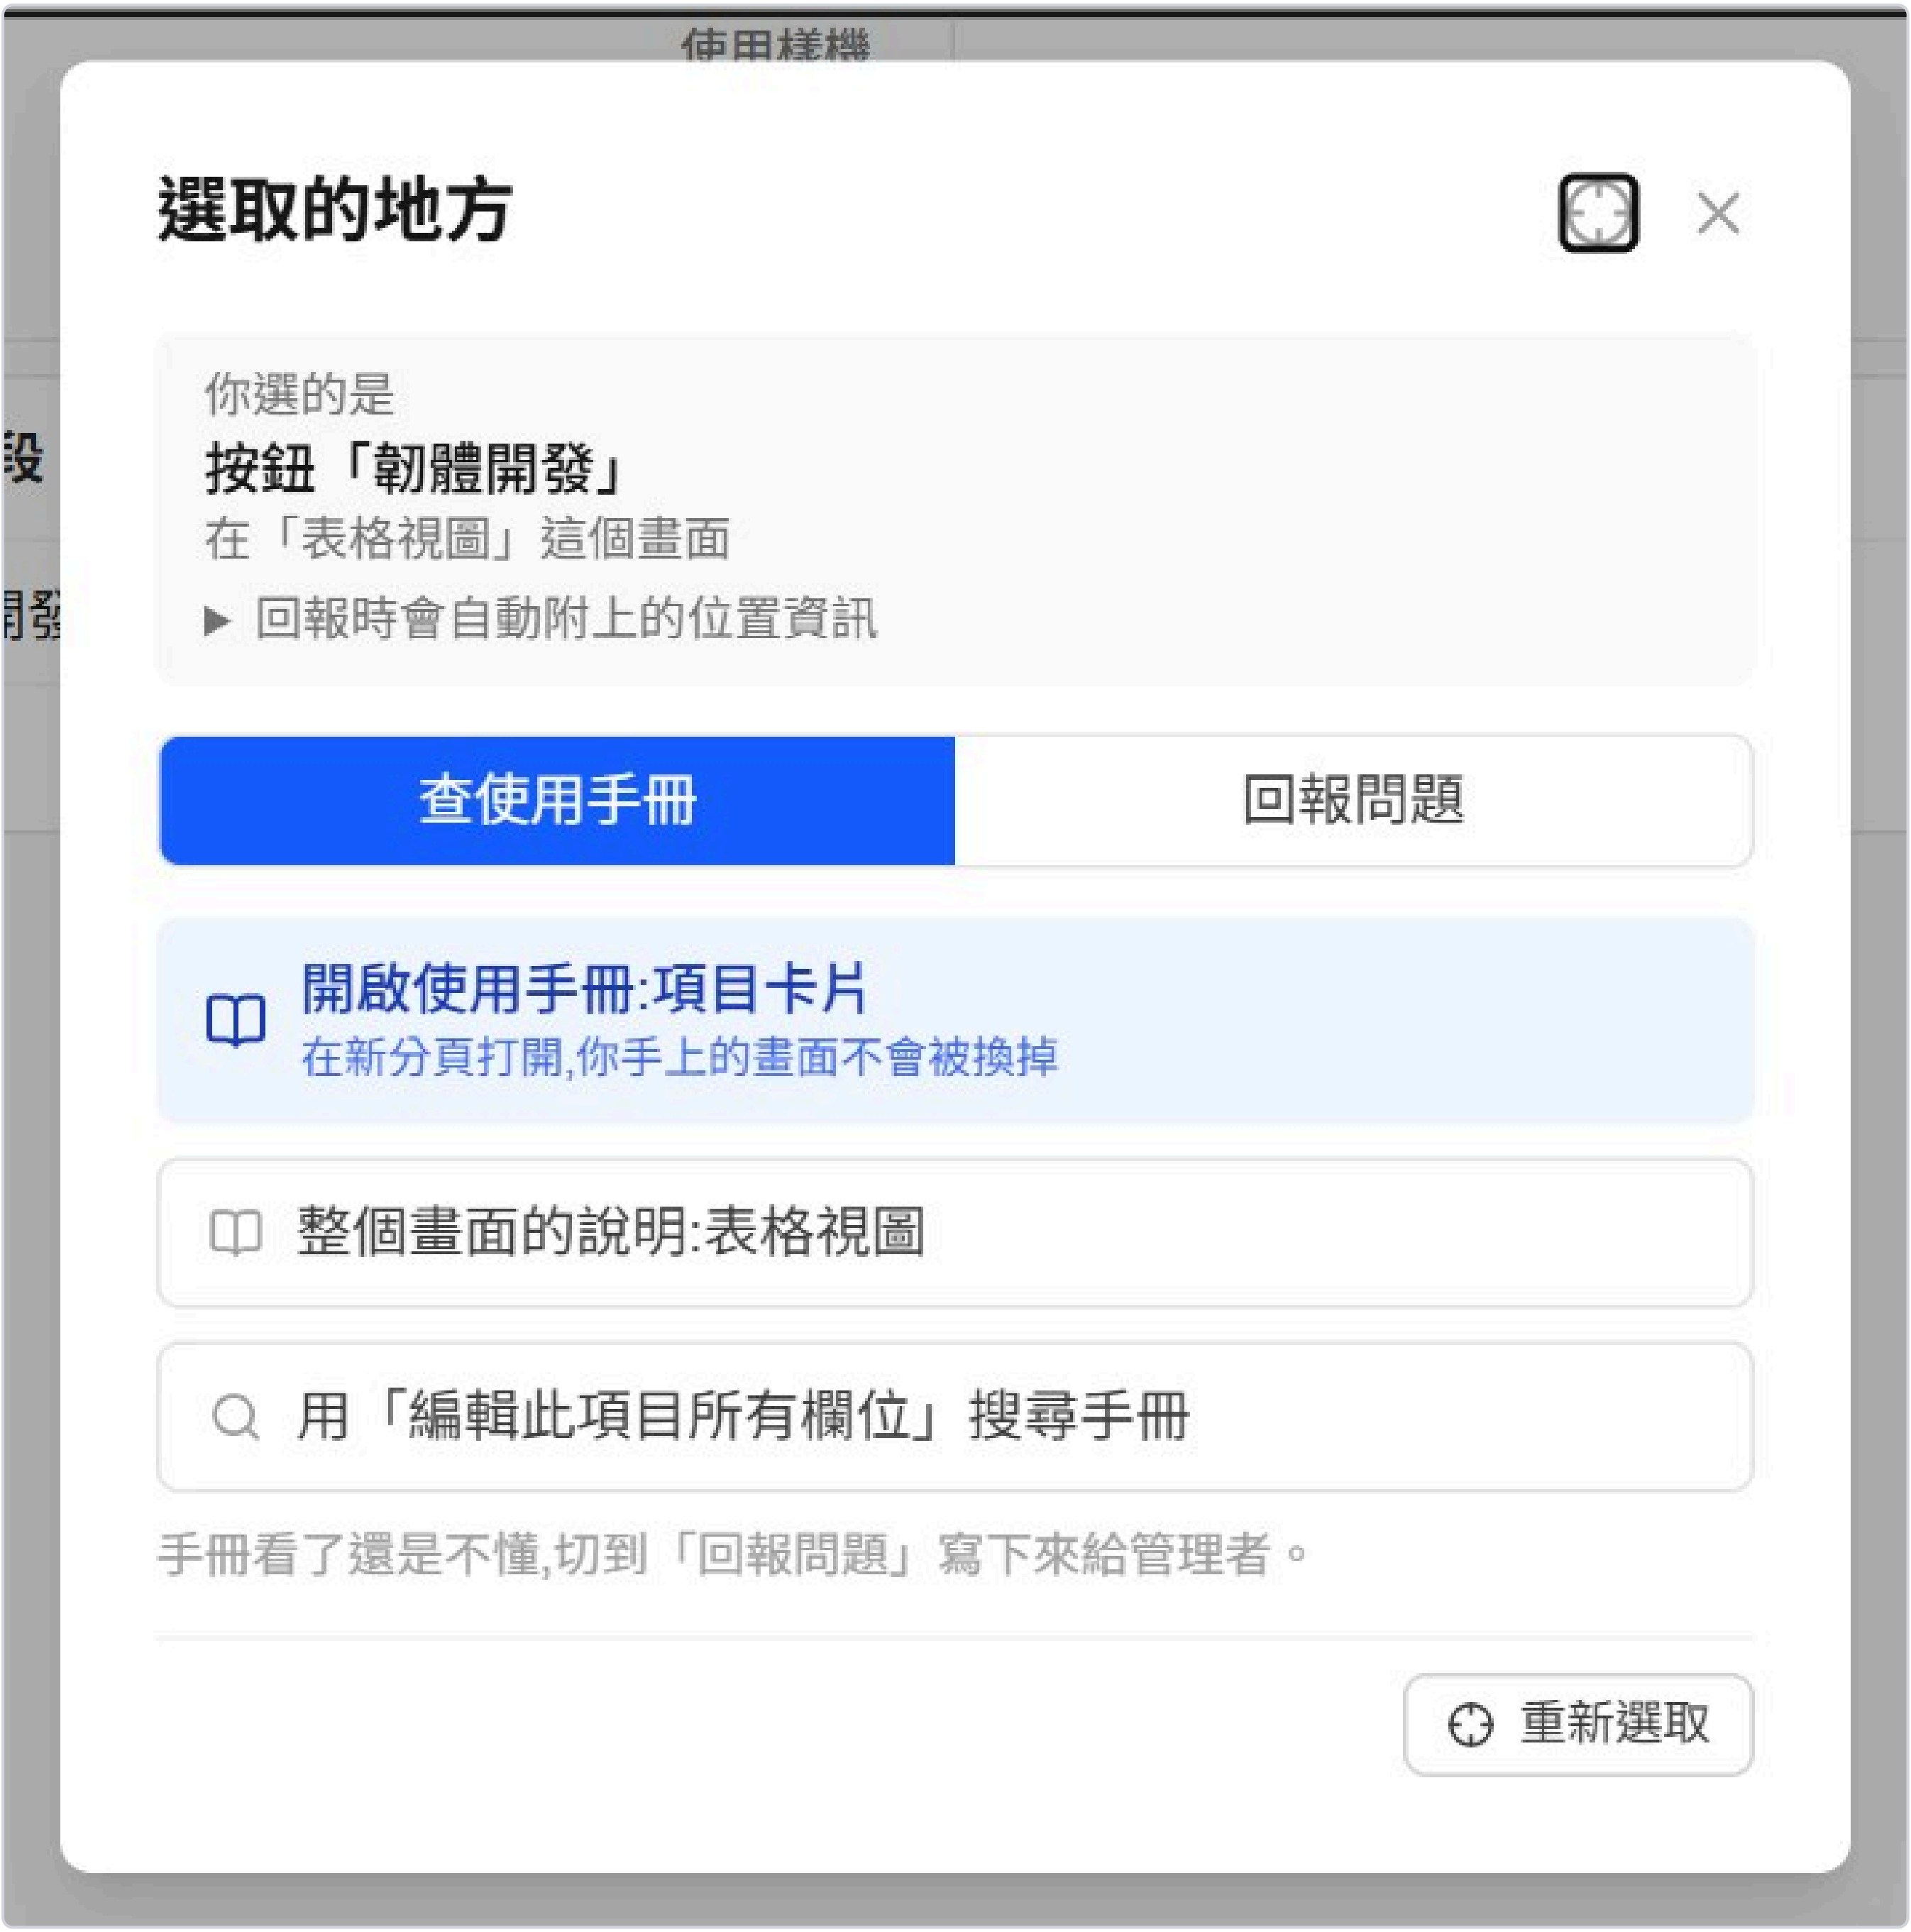

選取的地方

你選的是

按鈕「韌體開發」

在「表格視圖」這個畫面

▶ 回報時會自動附上的位置資訊

開啟使用手冊:項目卡片

在新分頁打開,你手上的畫面不會被換掉

整個畫面的說明:表格視圖

用「編輯此項目所有欄位」搜尋手冊

手冊看了還是不懂,切到「回報問題」寫下來給管理者。

- **查使用手冊**:開啟那個地方對應的章節(沒有專屬章節就開整個畫面的章節),也能拿那個地方上面的字去搜尋手冊。都在新分頁打開。
- **回報問題**:寫下哪裡有問題(最多 2000 字),按「送出給管理者」。系統會自動附上**你選到的元素的位置資訊**:它是什麼元素、上面的字、在畫面上的位置、HTML 片段,以及你的瀏覽器視窗大小。管理者交給維護程式的人(或 Claude Code),就能直接找到是哪一塊程式出了問題。**輸入框裡打的內容不會被收進去**。
- 選錯了按視窗下面的「**重新選取**」。
- 一個人一天最多送 20 則。管理者**代操作**別人的帳號時不能送(會變成那個人說的)。你寫的內容只有管理者看得到。

2. 角色與權限

帳號分三種角色,由管理者在「使用者管理」設定:

	管理者	**主管**	**團隊成員**
看到的選單	全部	少了使用者管理(系統設定底下)、稽核軌跡、分組角色設定	只有儀表板、系統設定(看板分享設定、組織架構圖)、週報、工時、資料備份
新增看板	✓	✓	
新增 / 插入 / 改名 / 搬移 / 複製項目	✓	✓	
改任何儲存格	✓	✓	只能改**自己被指派的項目**的「狀態」與進度欄位
改日期、天數、拖甘特長條	✓	自己建立的項目	不行
刪除項目	✓	自己建立的項目	不行
匯入 / 匯出 / Resource 對應	✓		
自動化、專案範本、垃圾桶	✓	✓	
看板重新命名 / 刪除	✓	自己建立的看板	

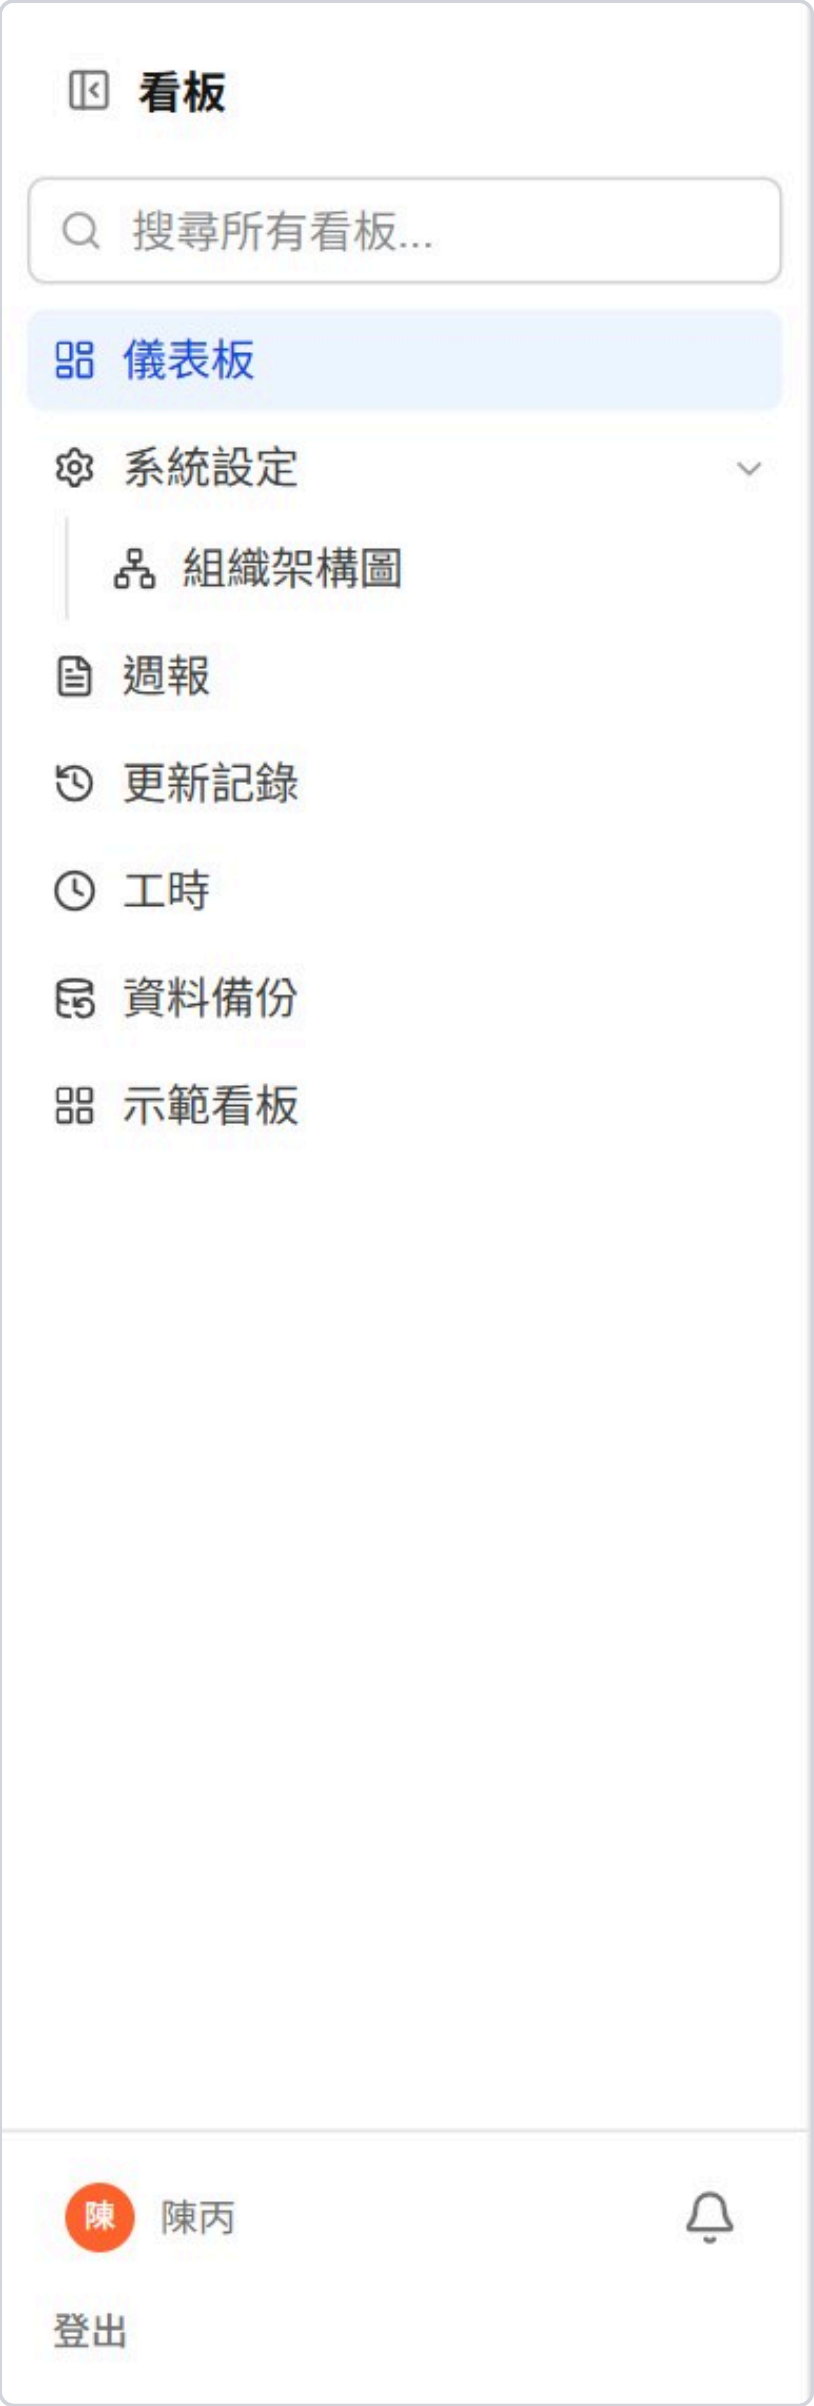 看板 搜尋所有看板... 儀表板 系統設定 組織架構圖 週報 更新記錄 工時 資料備份 示範看板 陳 陳丙 登出	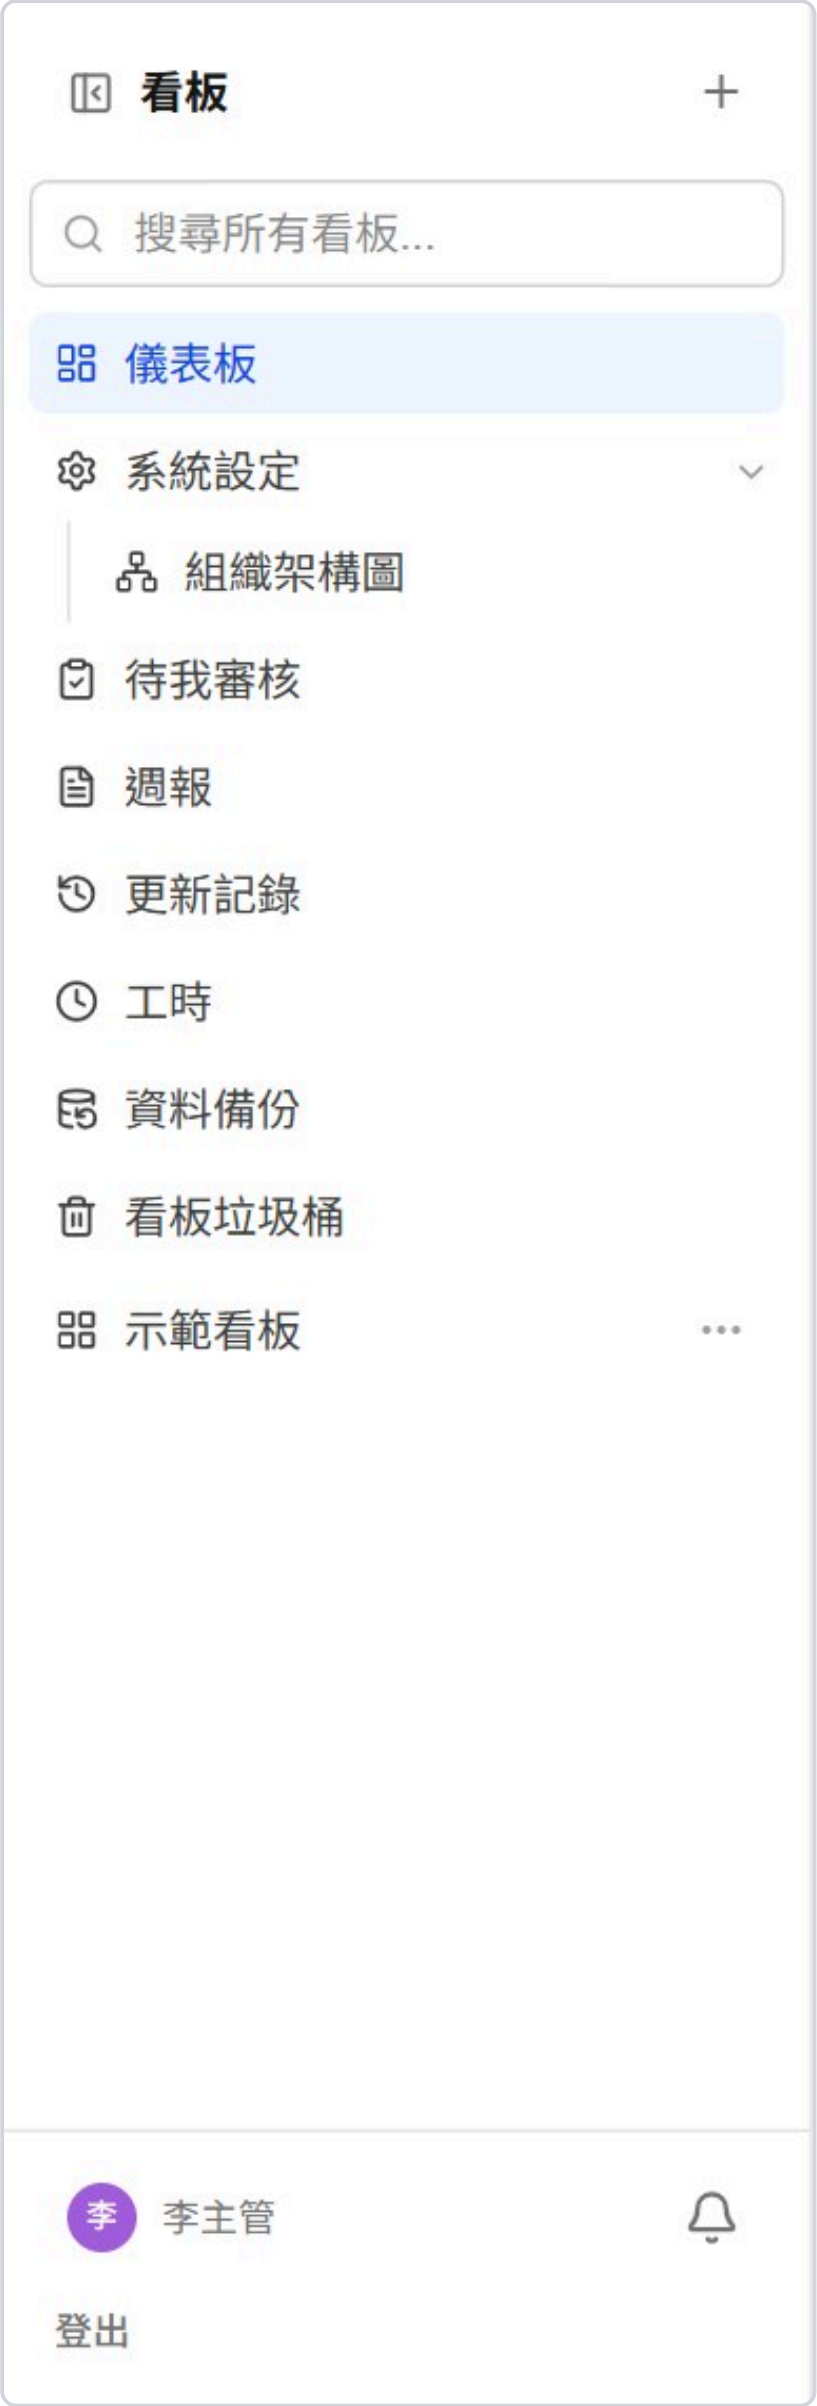 看板 搜尋所有看板... 儀表板 系統設定 組織架構圖 待我審核 週報 更新記錄 工時 資料備份 看板垃圾桶 示範看板 李 李主管 登出	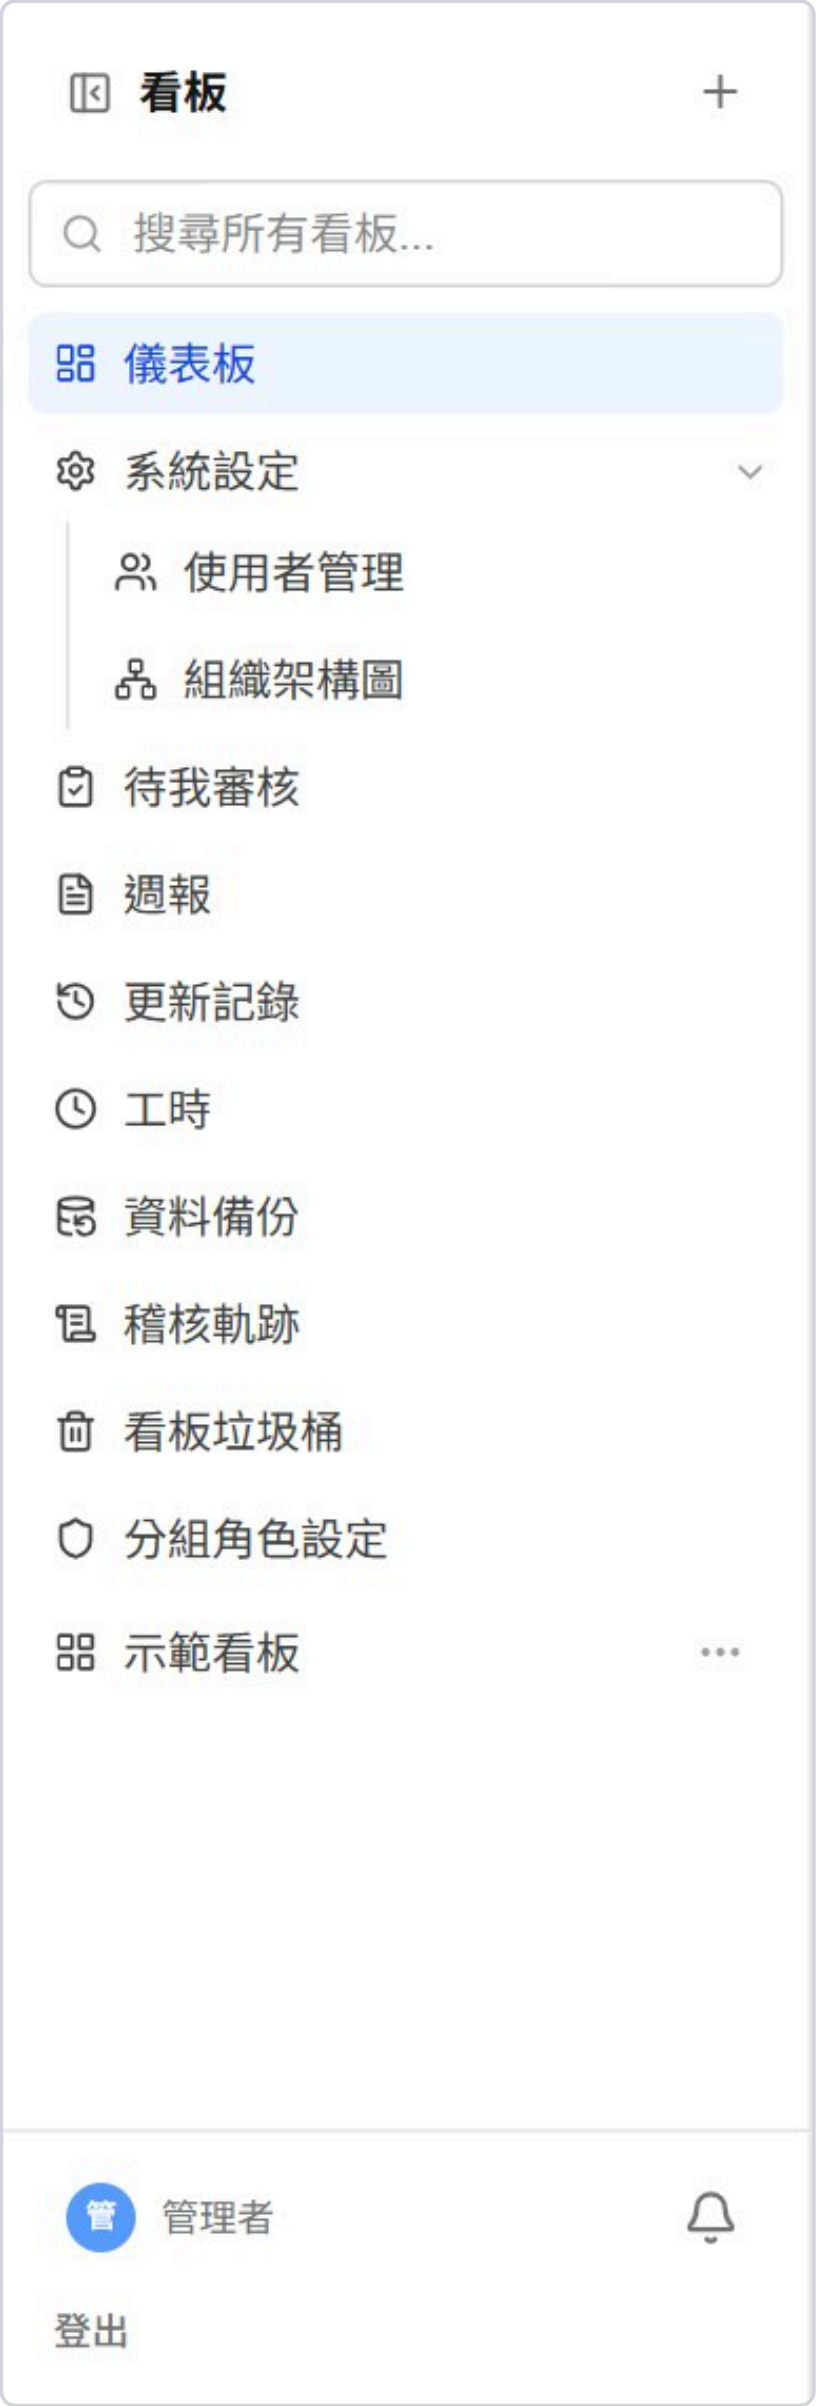 看板 搜尋所有看板... 儀表板 系統設定 使用者管理 組織架構圖 待我審核 週報 更新記錄 工時 資料備份 稽核軌跡 看板垃圾桶 分組角色設定 示範看板 管 管理者 登出
團隊成員	主管	管理者

看板的存取範圍

每個看板可以設成**公開**(所有登入的人都能開)或**限制存取**(只有擁有者、管理者與被指定的成員)。限制存取的看板標題旁會有「限制存取」標籤。在「系統設定 → 看板分享設定」調整;看板擁有者可以調整自己的看板。

被指定為某分組任何角色(Team Leader、DM、QA...)或實作成員的人,不用另外加進名單也一定看得到該看板。

預算金額的可見範圍

看得到看板,不等於看得到預算。「預算」分頁裡的金額——階段預算、NRE 報價單、樣機 BOM、人力規劃彙總——以及報表的「成本與 EVM」、儀表板的「預算警示」、匯出的 Excel 預算分頁、MCP / API 的預算、**週報裡的預算段落**、**項目卡片「工時與費用」分頁的「直接費用」**(項目上填的預算與實際),只給下面這些人看:

誰	說明
管理者、看板擁有者	一律看得到
這個看板上任一分組的 Team Leader、PMD、PM DM	專案負責人那一層的角色(在「分組角色設定」指定)
看板**指名**的人	在「系統設定 → 看板分享設定」,每個看板底下的「**可以看預算金額的人**」指名;看板擁有者與管理者可以設
指定組織的主管	在「系統設定」的「**預算可見範圍**」勾選組織(例如研發處,或最上層的公司),被勾的組織的**主管**對**所有看板**都看得到預算(預設);組織與主管看「組織架構圖」

其他人——包含只是被加進成員名單的人、各職能 DM(SW / HW / ME)、QA、PMM、一般主管——**看不到金額**。沒有權限的人點進「預算」分頁,**分頁還在**,但只剩「人力表」與「樣機計畫」(兩者都不是金額,照舊讓相關的人使用);階段預算、NRE 報價單、樣機 BOM、人力規劃彙總這幾頁整個不放,報表的成本與 EVM 會說明沒有權限,儀表板的預算警示也不會列出這個看板。

- PM DM 同時還受「DM 的可見範圍」的預算開關管:管理者在那裡把 PM 職能的預算限制打開,PM DM 就看不到(除非他同時是上面其他身分)。
- 「**編輯**預算」是另一件事:只有管理者、看板擁有者、Team Leader 能編(見第 14 章)。看得到不代表能改。
- **週報**:你自己的週報(週報頁面、「立即產生」)依你的權限:看不到預算的看板,預算段落不列金額,寫「預算金額僅限有權限的人檢視」(只看得到其中幾塊看板的預算時,列出看得到的,並註明有的沒列入),其他內容照常。存下來的那一份也不含金額。
- **項目的直接費用**:項目卡片「工時與費用」分頁最上面的「直接費用」(預算、實際)跟預算金額同一個規則;沒有權限的人整段看不到,也不能填,連送到瀏覽器的項目資料裡都不帶這兩個數字。下面的「實際工時」是小時數,不是金額,大家照舊看得到。
- **專案週報分發**(系統設定的「專案週報分發」)是以系統身分產生、寄給管理者指定的收件人(含沒有帳號的外部信箱),沒辦法逐一問權限,所以改由管理者在**每個專案**的設定裡用「**預算金額**」開關決定:**預設勾選**(跟以前一樣,內容含預算段落);取消勾選,寄出的週報就不列預算金額(寫「預算金額僅限有權限的人檢視」),摘要也不報「預算異動」,其他內容照常。

分組角色【管理者設定】

某個分組的負責人,可以在**那個分組**內擁有額外的權限,不需要升成主管。在側邊欄「分組角色設定」選看板與分組,按「設定角色」:

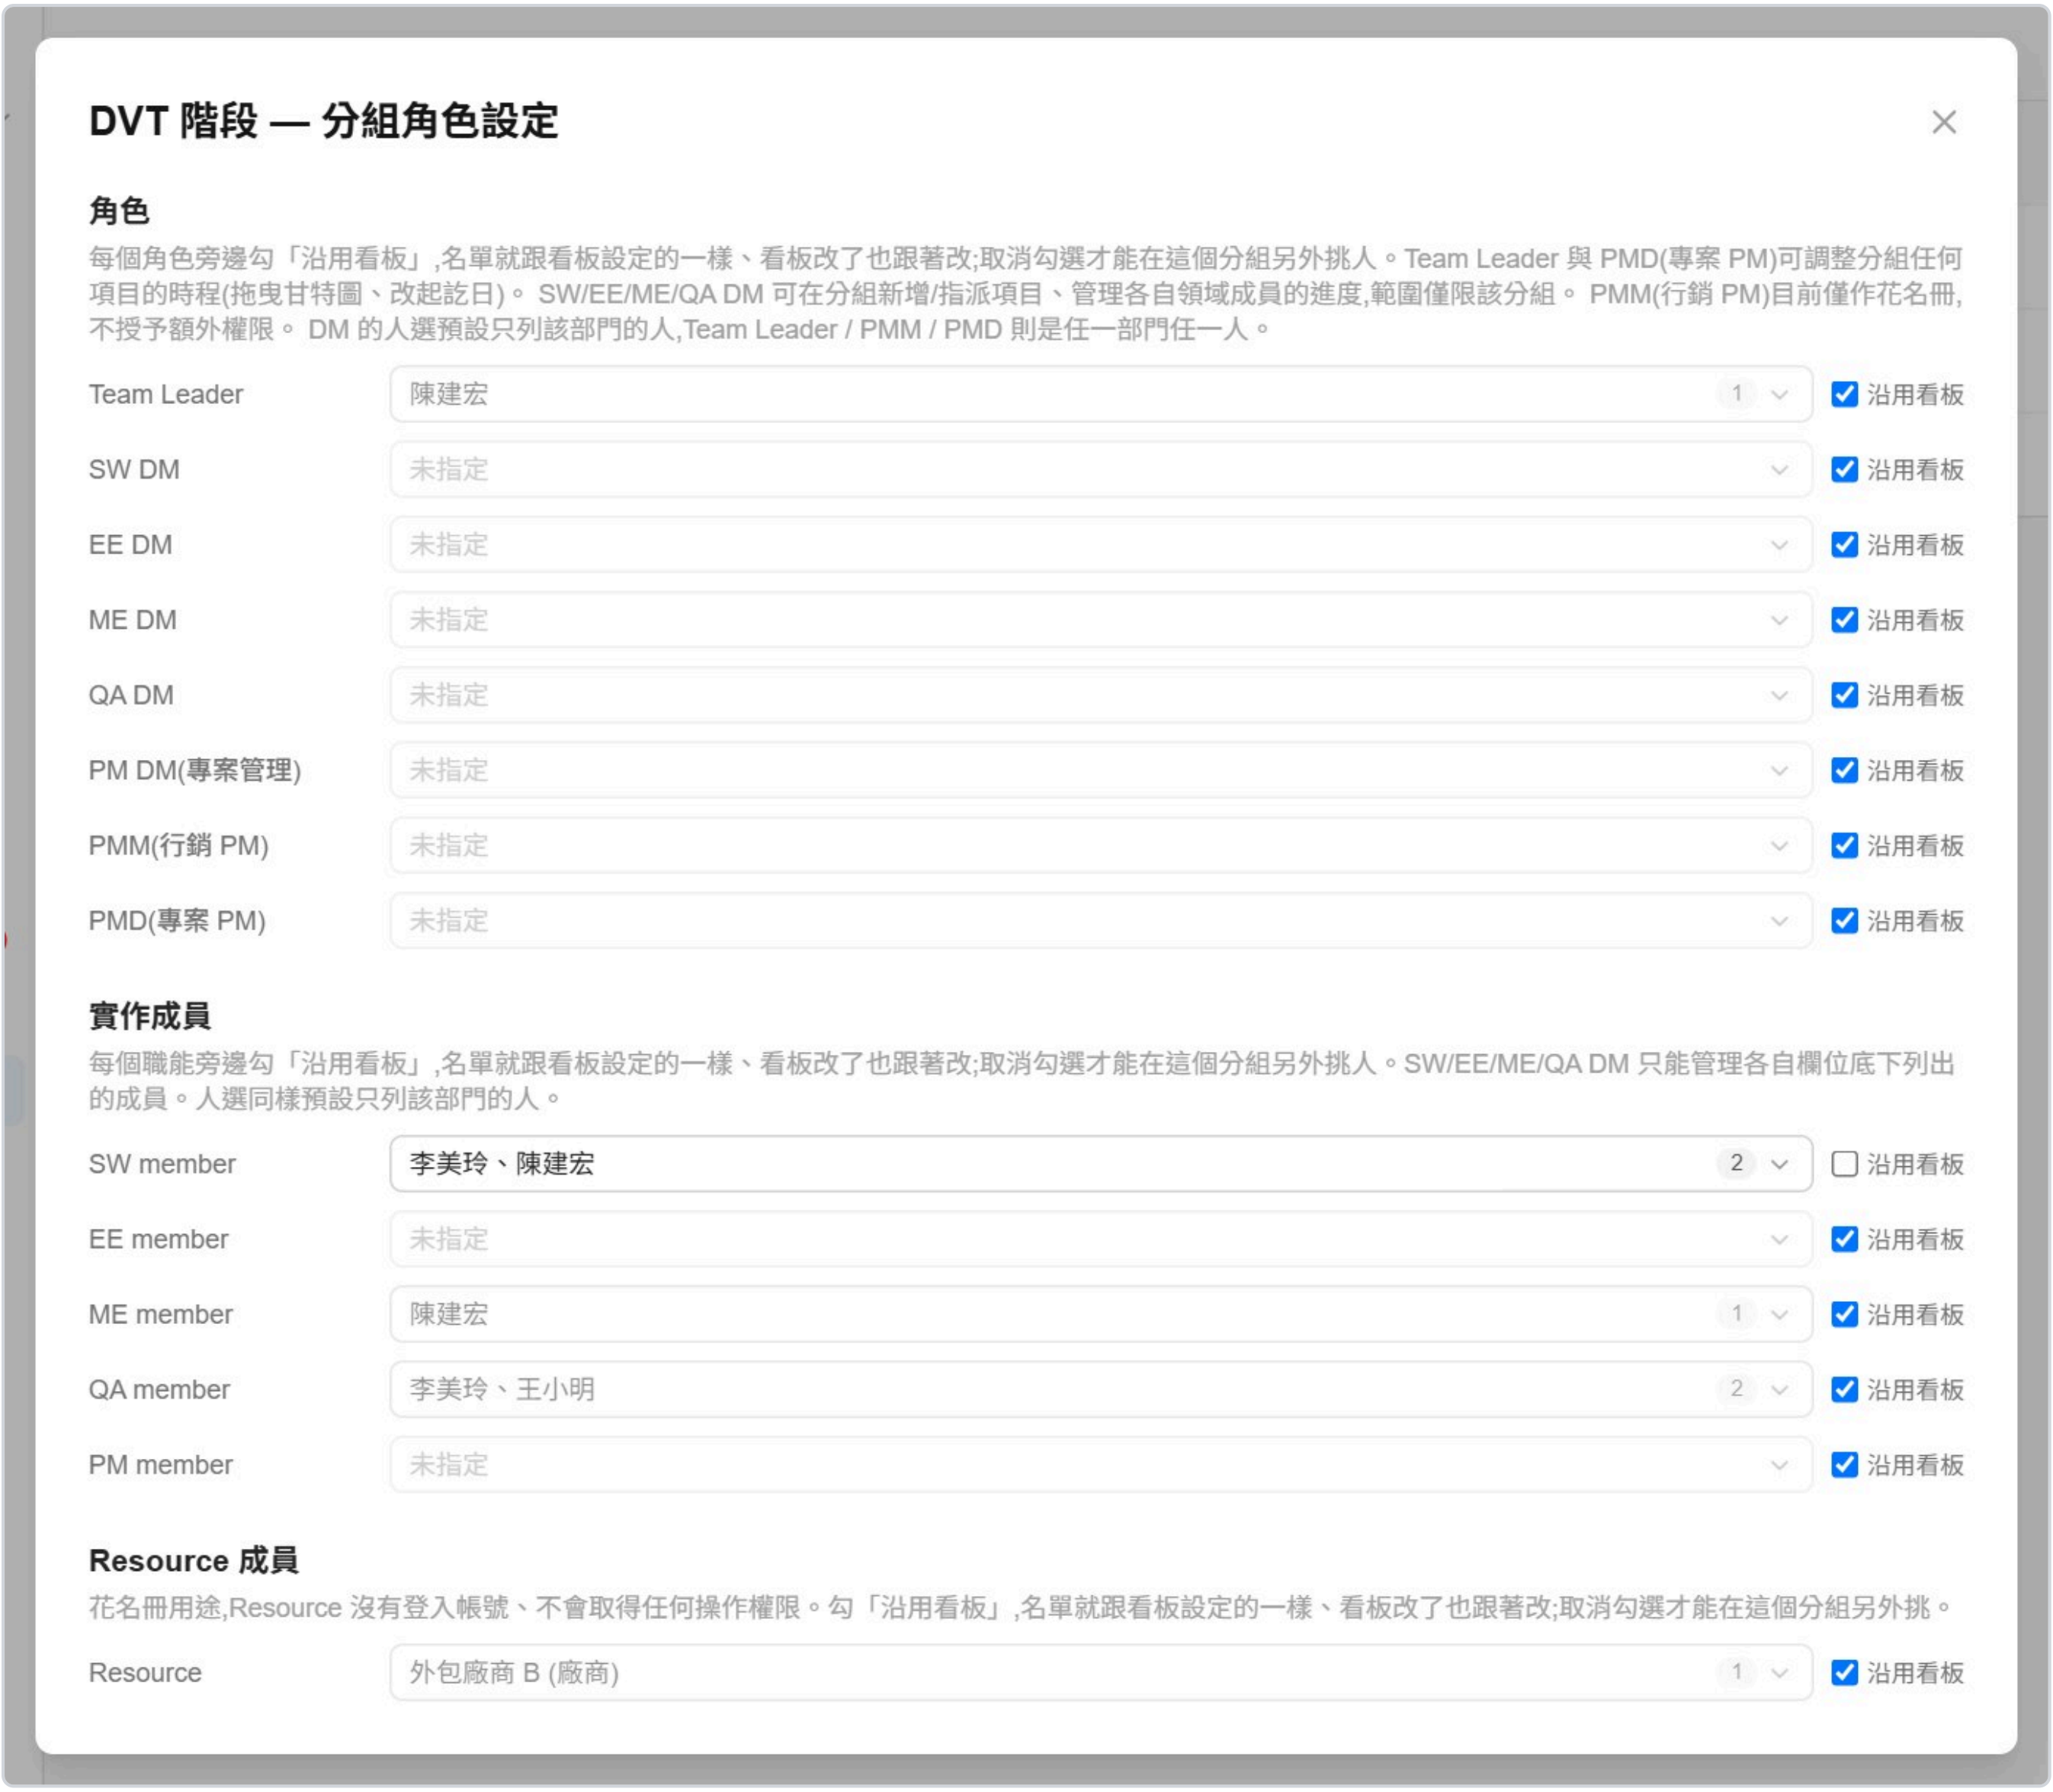

DVT 階段 — 分組角色設定

角色

每個角色旁邊勾「沿用看板」,名單就跟看板設定的一樣、看板改了也跟著改;取消勾選才能在這個分組另外挑人。Team Leader 與 PMD(專案 PM)可調整分組任何項目的時程(拖曳甘特圖、改起訖日)。 SW/EE/ME/QA DM 可在分組新增/指派項目、管理各自領域成員的進度,範圍僅限該分組。 PMM(行銷 PM)目前僅作花名冊,不授予額外權限。 DM 的人選預設只列該部門的人,Team Leader / PMM / PMD 則是任一部門任一人。

Team Leader　陳建宏　1　☑ 沿用看板
SW DM　未指定　☑ 沿用看板
EE DM　未指定　☑ 沿用看板
ME DM　未指定　☑ 沿用看板
QA DM　未指定　☑ 沿用看板
PM DM(專案管理)　未指定　☑ 沿用看板
PMM(行銷 PM)　未指定　☑ 沿用看板
PMD(專案 PM)　未指定　☑ 沿用看板

實作成員

每個職能旁邊勾「沿用看板」,名單就跟看板設定的一樣、看板改了也跟著改;取消勾選才能在這個分組另外挑人。SW/EE/ME/QA DM 只能管理各自欄位底下列出的成員。人選同樣預設只列該部門的人。

SW member　李美玲、陳建宏　2　☐ 沿用看板
EE member　未指定　☑ 沿用看板
ME member　陳建宏　1　☑ 沿用看板
QA member　李美玲、王小明　2　☑ 沿用看板
PM member　未指定　☑ 沿用看板

Resource 成員

花名冊用途,Resource 沒有登入帳號、不會取得任何操作權限。勾「沿用看板」,名單就跟看板設定的一樣、看板改了也跟著改;取消勾選才能在這個分組另外挑。

Resource　外包廠商 B (廠商)　1　☑ 沿用看板

角色	權限(僅限這個分組)
Team Leader、PMD(專案 PM)	調整此分組任何項目的時程(拖甘特圖、改起訖日);新增 / 指派項目
SW / EE / ME / QA / PM DM	在此分組新增、指派項目,並管理自己部門成員的進度
PMM(行銷 PM)	目前只是名冊,不授予額外權限
實作成員	供各部門 DM 管理範圍使用(DM 只能管理自己部門名單內的人);看板層級設一次,各分組沿用

DM 的人選預設只列該部門的人(部門在「使用者管理」的「單位」欄設定);Team Leader、PMM、PMD 可以是任何人。

看板角色:設一次,每個分組沿用【管理者與看板擁有者設定】:同一個專案的幾個分組通常是同一批人帶,不用每個分組各設一遍。八個角色(Team Leader 就是「專案負責人」),以及各職能的**實作成員**、**Resource 成員**(花名冊),都可以直接設在**整個看板**上,底下每個分組**預設沿用**:

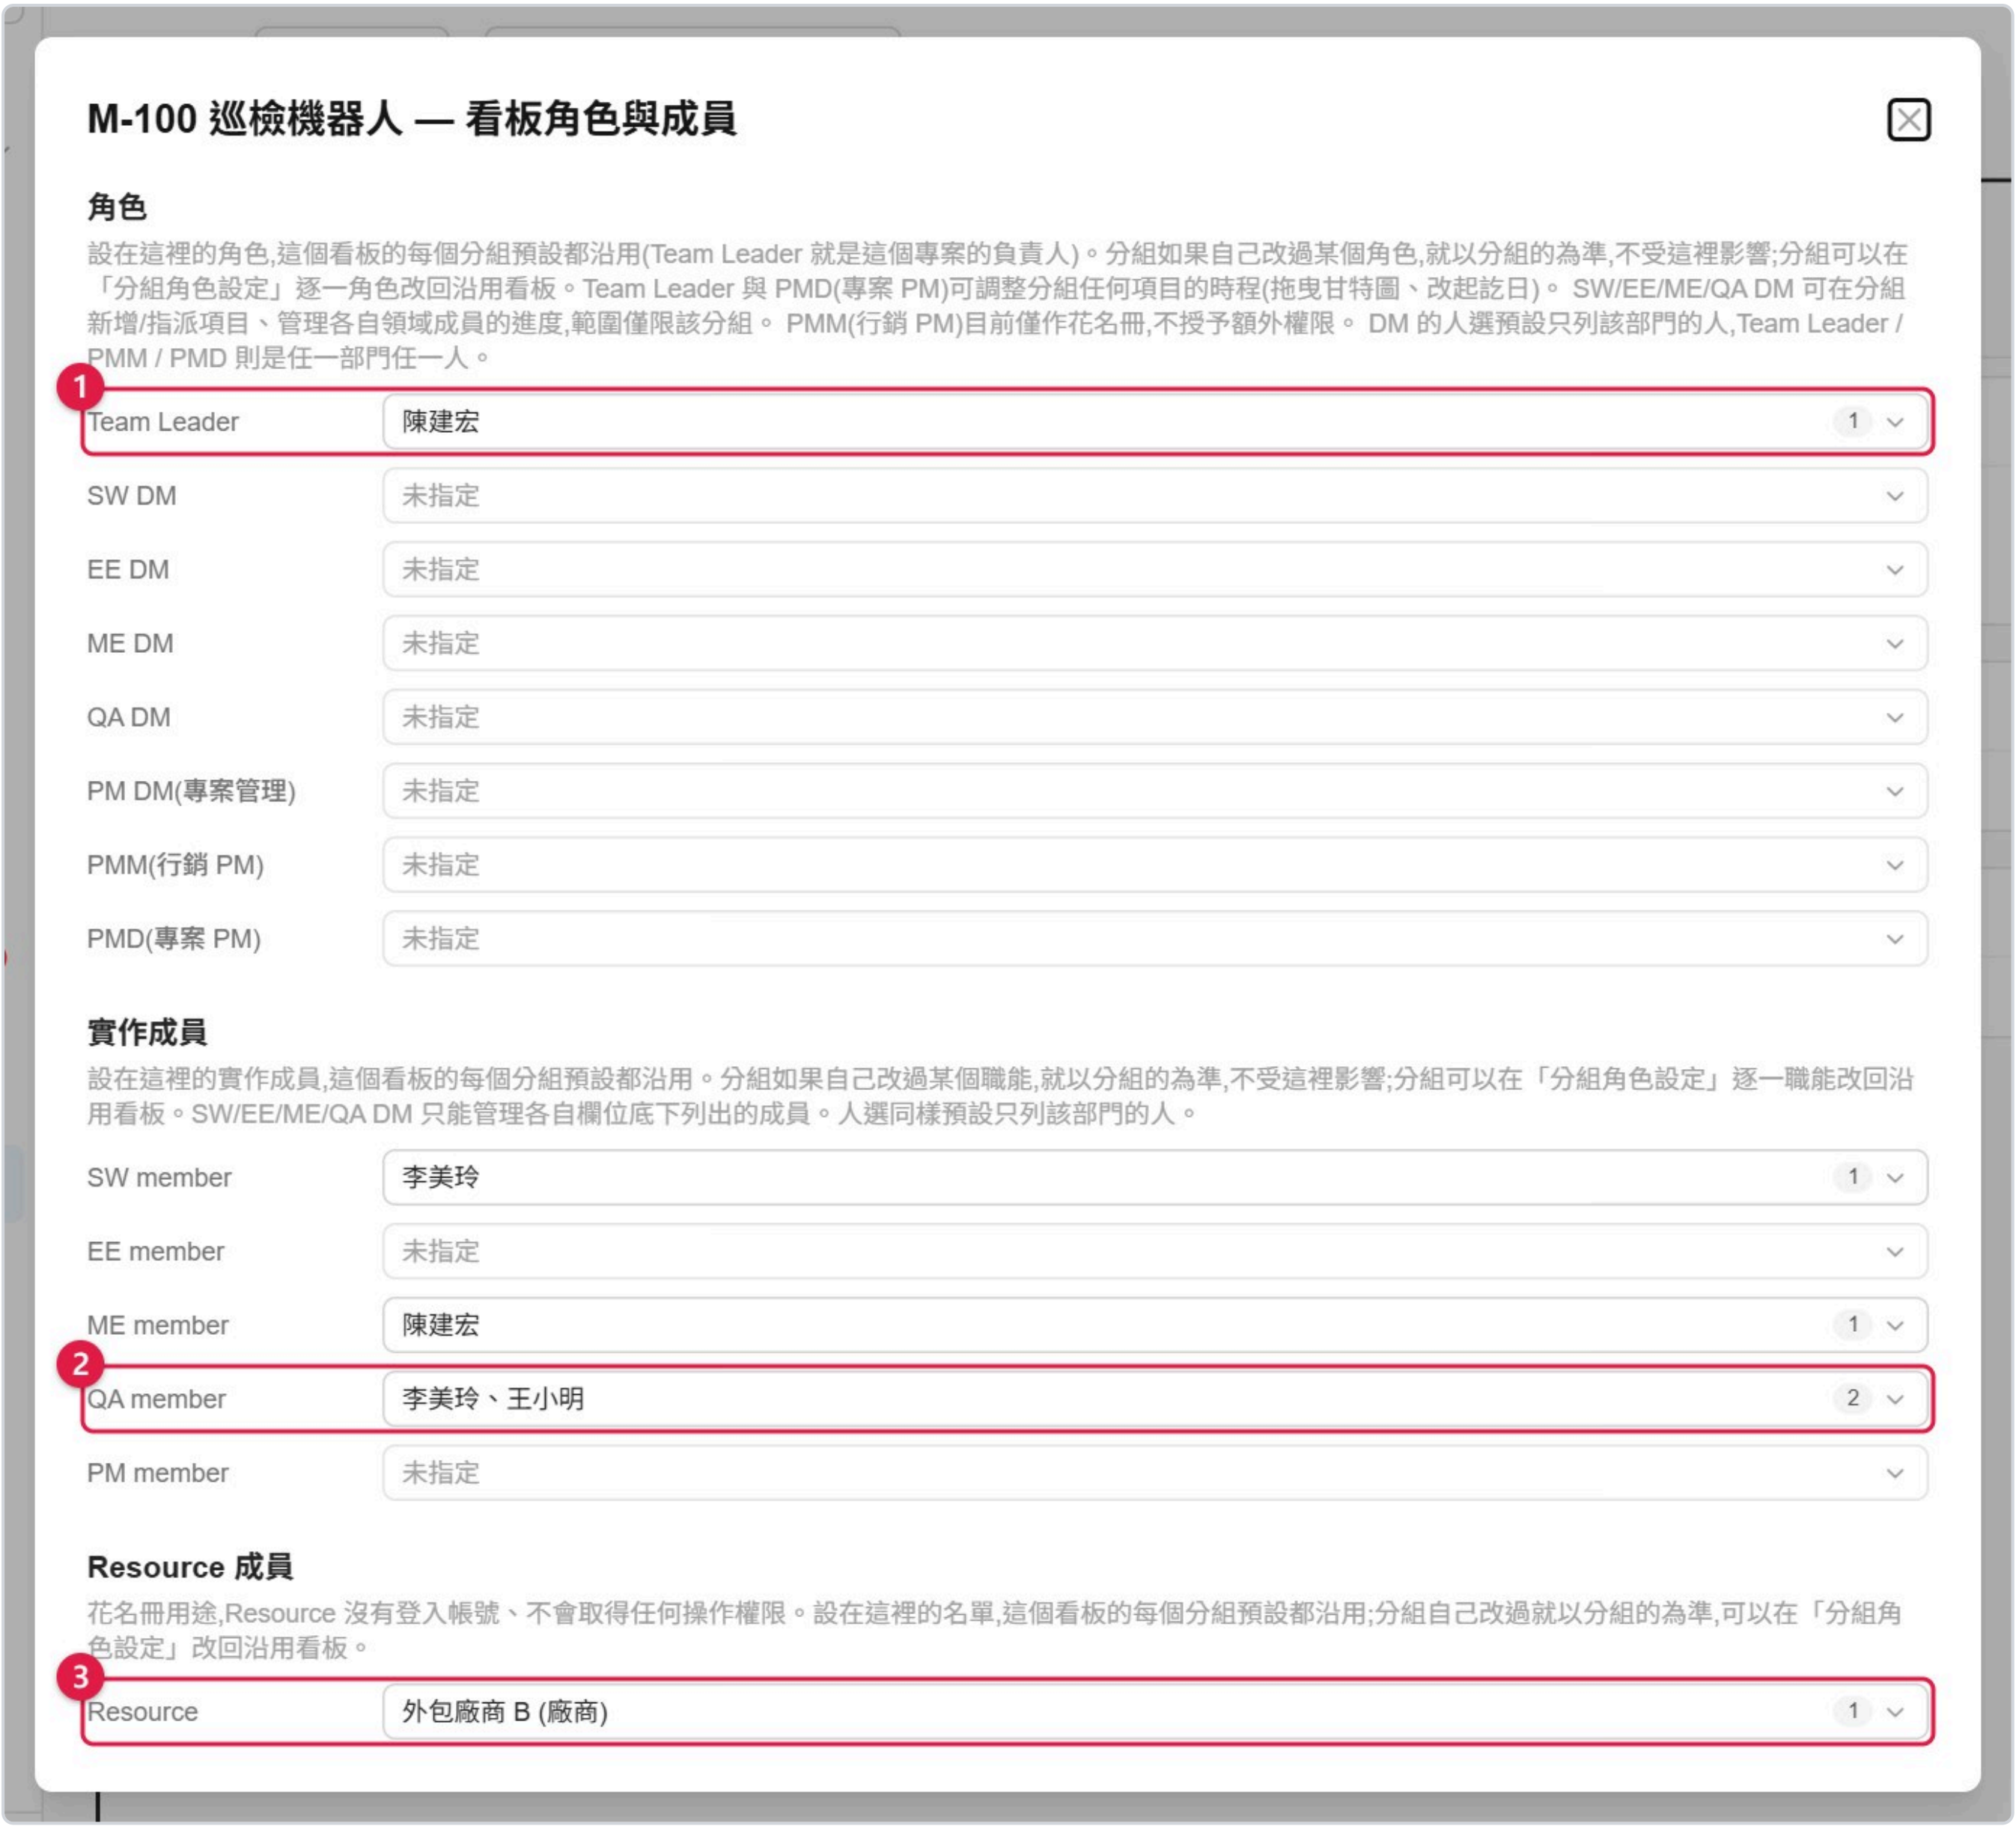

M-100 巡檢機器人 — 看板角色與成員

角色

設在這裡的角色,這個看板的每個分組預設都沿用(Team Leader 就是這個專案的負責人)。分組如果自己改過某個角色,就以分組的為準,不受這裡影響;分組可以在「分組角色設定」逐一角色改回沿用看板。Team Leader 與 PMD(專案 PM)可調整分組任何項目的時程(拖曳甘特圖、改起訖日)。 SW/EE/ME/QA DM 可在分組新增/指派項目、管理各自領域成員的進度,範圍僅限該分組。 PMM(行銷 PM)目前僅作花名冊,不授予額外權限。 DM 的人選預設只列該部門的人,Team Leader / PMM / PMD 則是任一部門任一人。

Team Leader	陳建宏	1
SW DM	未指定	
EE DM	未指定	
ME DM	未指定	
QA DM	未指定	
PM DM(專案管理)	未指定	
PMM(行銷 PM)	未指定	
PMD(專案 PM)	未指定	

實作成員

設在這裡的實作成員,這個看板的每個分組預設都沿用。分組如果自己改過某個職能,就以分組的為準,不受這裡影響;分組可以在「分組角色設定」逐一職能改回沿用看板。SW/EE/ME/QA DM 只能管理各自欄位底下列出的成員。人選同樣預設只列該部門的人。

SW member	李美玲	1
EE member	未指定	
ME member	陳建宏	1
QA member	李美玲、王小明	2
PM member	未指定	

Resource 成員

花名冊用途,Resource 沒有登入帳號、不會取得任何操作權限。設在這裡的名單,這個看板的每個分組預設都沿用;分組自己改過就以分組的為準,可以在「分組角色設定」改回沿用看板。

Resource	外包廠商 B (廠商)	1

- **Team Leader(專案負責人)自己指定 DM 與 member**:擔任某個分組 Team Leader 的人,側邊欄也會有「分組角色設定」,進去**只看得到自己負責的分組**。按「設定角色」可以從公司所有人員裡指定這個分組的 **SW / EE / ME / QA / PM DM**,以及各職能的 **member**(實作成員);DM 的人選預設只列該部門的人,要挑別的部門可勾「顯示其他部門的人」。**Team Leader / PMM / PMD 這幾個管整個分組(或整個看板)的角色仍然只有管理者能設**:管理者把某人設成 Team Leader 之後,在他自己的畫面上這個角色是**鎖住**的(唯讀),他改不了自己或別人的 Team Leader / PMM / PMD。Team Leader 改過的 DM 名單就是這個分組自己設定的,之後看板角色再怎麼改都不會蓋掉它。
- **看板層級的 Team Leader 管整個看板**:管理者在「整個看板」(看板角色)設的 Team Leader——例如整個專案的負責人——進「分組角色設定」會看到**自己那個看板的「整個看板」列與看板底下的每一個分組**。在「整個看板」按「看板角色」指定的各職能 DM,沒有自己另外設定的分組就**立刻跟著沿用**;每個分組也都可以按「設定角色」指定 DM 與各職能 member。只是某個分組的 Team Leader(不是整個看板)則只有那個分組,沒有「整個看板」,也進不了別的分組。Resource 成員仍然不給 Team Leader 動。
- **怎麼設**:管理者在「分組角色設定」頁,每個看板最上面多一列「**整個看板**」,按「**看板角色**」;看板擁有者(通常是建立看板的主管)則是在側邊欄那塊看板右邊的「...」選「**看板角色**」。視窗跟分組的角色視窗一樣:八個角色、SW / EE / ME / QA / PM 各職能的**實作成員**、**Resource 成員**。整個看板的 Team

Leader 可以設實作成員(跟在分組裡一樣);Resource 成員只有管理者與看板擁有者能設。
- **沿用是即時的**:看板的名單改了,所有「沿用看板」的分組跟著換;新增的分組一建立就沿用。
- **分組可以逐一改成自己的【管理者】**:在分組的角色視窗,每個角色、每個職能的實作成員、Resource 成員旁邊都有「**沿用看板**」勾選。勾著,名單跟看板一樣、鎖住不能改;**取消勾選**就是這個分組自己挑人(名單先維持原樣,之後各改各的,看板再怎麼改都不會動到它);再**勾回去**,名單立刻換成看板的。每個角色各自決定,例如 Team Leader 沿用看板、SW DM 在這個分組另外挑人;實作成員按職能各自決定(SW member 沿用、QA member 自己挑),Resource 成員整份一起決定。直接在分組裡改某個角色、職能或 Resource 的名單,也會自動變成「自己設定」。
- 這個功能上線之前就已經在分組裡設好的角色、實作成員、Resource 成員,一律視為「自己設定」,**什麼都不會變**;還沒設過的一開始是空的。
- 權限照原來的算:沿用來的 Team Leader / PMD,跟在分組裡直接設的一樣,能調整那個分組的時程。**要注意**:看板擁有者可以設看板角色,等於能一次決定所有沿用分組的 Team Leader——這是刻意的(看板擁有者本來就是專案的主管)。
- **工作交接**(使用者管理)遇到看板角色:交接清單多一列「整個看板(沿用的分組一起換)」,轉過去之後所有沿用的分組一起換人;沿用看板的分組列只是複本,不會單獨列出來;分組自己設定的角色仍然單獨一列。

DM 的可見範圍【管理者設定】:預設 DM 跟其他成員一樣看得到整塊看板。要讓某個職能的 DM **只看得到跟自己職能相關的內容**,到「系統設定」的「**DM 的可見範圍**」,在那個職能的那一列勾選(每個勾選當下就存,三項各自開關,預設都不勾):

勾選項目	被限制的 DM 看到什麼
工作項	只看得到**指派給自己與同職能組員**的工作項,加上它們的**上層項目**(這樣在階層裡才找得到位置);沒有指派任何人的項目不算相關,看不到(自己建立的除外)。表格、看板、甘特圖、儀表板、搜尋、匯出 CSV 與 MCP 都照這個範圍
人力表與人力規劃彙總	只看得到**同職能單位**的名額、人月與欄位(SW DM 只看 SW;HW DM 看 EE 與 HW),合計也只算這些單位
預算金額	看不到階段預算、NRE 報價單、樣機 BOM 的金額(那幾個分頁不顯示)。人力表上的金額跟著「人力表」那一項,不受這一項影響

- 「同職能組員」指「分組角色設定」裡那個職能的組員名單;被限制的 DM 在同一塊看板上看到的範圍,是**自己所有職能**的聯集——同時是 SW DM 與 HW DM 的人,**兩個職能都勾了**那一項才限制。
- **不受影響**:管理者、看板建立者、Team Leader、PMD(身兼這些的 DM 不受限)。**預算金額**另有一套規則(見上面「預算金額的可見範圍」):預設只有管理者、擁有者、Team Leader / PMD / PM DM 等看得到,所以這個設定裡「預算金額」的開關現在只對 **PM DM** 還有作用。
- 這只是縮小「看得到」的範圍;DM 本來能做的事(新增、指派項目、編輯自己單位的名額)不變。私人項目的規則仍然照舊,兩個規則疊加,只會更少、不會更多。
- 這個設定不影響排程計算:看不到的項目照樣參與日期推算,只是不顯示。
- **沒涵蓋的地方**:系統定時寄出的專案週報分發是以系統身分產生的,不套用這個限制;匯出甘特圖 Excel 帶的是整個看板與預算,所以被限制的 DM 不能匯出;項目卡片「工時與費用」的「直接費用」跟著第 2 章「預算金額的可見範圍」走,不看這裡的開關。

私人項目與私人分組

分組或單一項目可以設成**私人**:只有指定的人、建立者、被指派到的人與管理者看得到。分組標題或項目列的「...」選單 → **可見範圍**。私人項目名稱旁會有鎖頭圖示;私人項目的子項目一起隱藏。只有建立者或管理者能改這個設定。

---

3. 看板的基本概念

看板 → 分組 → 工作項(可以一層一層往下)

- **看板**:一個專案或一個團隊的工作清單。
- **分組**:看板裡的大段落,例如「EVT 階段」「DVT 階段」。每個分組各自從 1 開始編號。
- **工作項**:一筆工作,可以有**子項目**,形成階層。編號會自動依階層與順序產生,稱為 **WBS 編號**(例如 1.2.3),畫面上項目名稱前面那個數字。
- 新增子項目時,上一層會**自動變成 Summary(摘要)**;它的起訖日期由底下子項目統計出來。底下的子項目全部刪光,會還原成原本的 Type。
- **Summary 的 Start / Finish / Days 是子項的範圍**(甘特圖用「一律自己計算」的看板,也就是有 start(set) 與 duration 欄位的看板):**開始 = 所有子項最早的開始日,結束 = 所有子項最晚的結束日,Days = 這一段的天數**(依看板的日曆天 / 工作天算法)。子項改了日期、新增、搬移、刪除,上面每一層 Summary 都會跟著重算,表格、甘特圖、儀表板與接在它後面的項目讀到的是同一份。這些欄位是唯讀的,要改請改子項。**Summary 自己設了 Pred(前置依賴)時,以它自己的排程規則為準**,不跟子項走。以前就存在、日期還是建立當天那個值的 Summary,到「系統設定 → 甘特圖欄位設定」對那個看板按一次「**重算全部**」就會修正。

預設欄位

新看板預設有這些欄位(管理者可以在系統設定改預設,也可以在每個看板新增或刪除欄位):

欄位	類型	用途
Lvl	數字	階層數字,會依位置自動維護
Type	狀態	**Task**(一般工作)、**Summary**(摘要,由子項統計)、**Milestone**(里程碑,時間固定為一天)
Priority	狀態	CRITICAL / HIGH / NORMAL
Status	狀態	Planned / In Progress / Completed
Resource	文字	負責的資源名稱
Pred	文字	前置依賴:這個工作要等誰做完(或開始)才能做
Link	狀態	前置的關聯類型:FS / FF / SS / SF
Lag	數字	前置之間要空幾天(負數代表提前)
Comment	文字	備註
Start / Days / Finish	日期 / 數字 / 日期	開始日、天數、結束日
% Done	數字	完成百分比(進度欄位)

> **有子項目的項目,進度是子項目的平均**(沒填的子項目算 0%),不是它自己填的數字——表格、項目卡片、儀表板都一樣,只顯示、不能直接輸入。要改請到子項目填進度。沒有子項目的項目才能直接輸入。

欄位類型有五種:**文字、狀態、人員、日期、數字**。表格最右邊欄位標題列的「+」新增欄位;欄位標題的「...」可以**設為進度欄位**或**刪除欄位**;拖曳欄位標題可以調整順序,拖曳項目名稱欄的邊界可以調整寬度。**項目名稱欄(表格與甘特圖都一樣)一打開就會依名稱的字數調成看得到全名的寬度**——連收合著的子項目、縮排與 WBS 編號都算進去;名稱太長時最寬停在畫面寬度的一半(最多 720 像素),不會把資料欄或時間軸擠沒,更長的再自己拖寬。

> 刪除欄位是永久的。Lvl、Type、Pred、Link、Start、Days、Finish 等欄位會被排程計算用到,請不要刪除。

表格最右邊三個自動記錄的欄位(唯讀,不能編輯、也不能刪除)——橫向捲到最右邊就看得到:

欄位	內容
進行中時間	最近一次把「狀態」切成 **In Progress / 進行中** 的時間
完成時間	最近一次把「狀態」切成 **Completed / 完成** 的時間;再切回別的狀態就清掉
更新記錄	這個工作項**最近一筆更新或變化**,寫法跟名字旁邊鈴鐺的通知(見 1.5)一樣:一個類型標籤(**修改**藍色、**指派**紫色、**留言**黃色,連結與待辦事項是灰色)、改了什麼,下面一行是「誰 · 什麼時候」

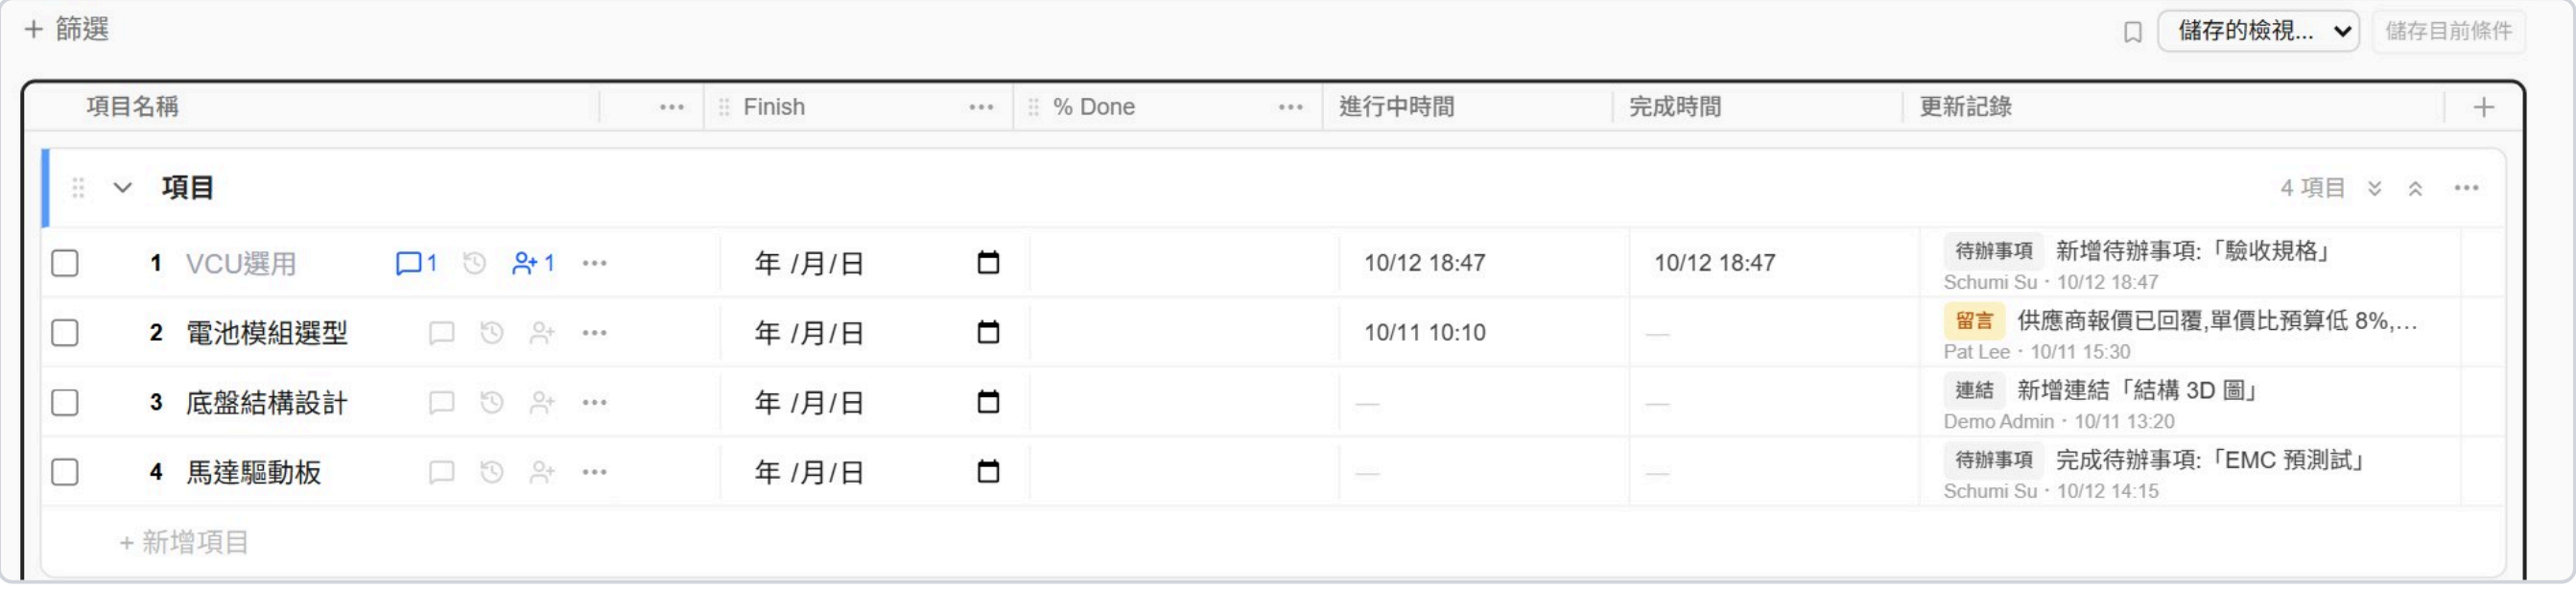

項目名稱	Finish	% Done	進行中時間	完成時間	更新記錄
1 VCU選用	年 /月/日		10/12 18:47	10/12 18:47	待辦事項 新增待辦事項:「驗收規格」 Schumi Su · 10/12 18:47
2 電池模組選型	年 /月/日		10/11 10:10	—	留言 供應商報價已回覆,單價比預算低 8%,... Pat Lee · 10/11 15:30
3 底盤結構設計	年 /月/日		—	—	連結 新增連結「結構 3D 圖」 Demo Admin · 10/11 13:20
4 馬達驅動板	年 /月/日		—	—	待辦事項 完成待辦事項:「EMC 預測試」 Schumi Su · 10/12 14:15

「使用樣機」欄(可以編輯,排在這三個自動記錄欄位的前面):這個工作項(例如測試項目)用到**樣機計畫排出來的哪幾台樣機**。點一下開選單,依「產品 / 階段」分組勾要用的樣機(可以搜尋),**關掉選單時存檔**;格子顯示第一台的名字,多台寫「等 N 台」,滑鼠停上去看全部。**不一定要捲到表格最右邊找這一欄**:打開工作項的「**項目卡片**」(在「人員分配」上面),或在甘特圖點長條跳出的「**人員分配**」視窗(在「人員分配」下面),都有「使用樣機」可以選,三個地方是同一份資料(在儀表板開的項目卡片也一樣)。樣機計畫(預算 → 樣機計畫)還沒排台數的看板,這一欄是空的。誰能改:管理者、主管,或被指派到這個工作項的人;其他人只看得到。選好之後,儀表板的「樣機使用時程」就看得到各台樣機什麼時候被哪些工作項使用(第 16 章)。樣機從哪來、台數改了會怎樣,見「預算 → 樣機計畫」。

- **點「更新記錄」跳出對應的項目**:是「留言」就直接跳到項目視窗的「**更新**」分頁;「連結」跳「連結」、「待辦事項」跳「待辦事項」;狀態切換與其他欄位修改跳「**項目卡片**」。點「進行中時間」「完成時間」也是跳項目卡片。

- **看這個工作項所有的更新與變化**:左邊「項目名稱」那一欄,每個項目的名稱右邊有一顆時鐘圖示(滑鼠停上去寫「更新記錄」)。點下去跳出「**更新記錄:項目名稱**」視窗,新的在前,最多 100 筆,格式跟表格那一欄一樣;點其中一筆,視窗會關掉並打開這個項目,停在對應的分頁(規則同上)。

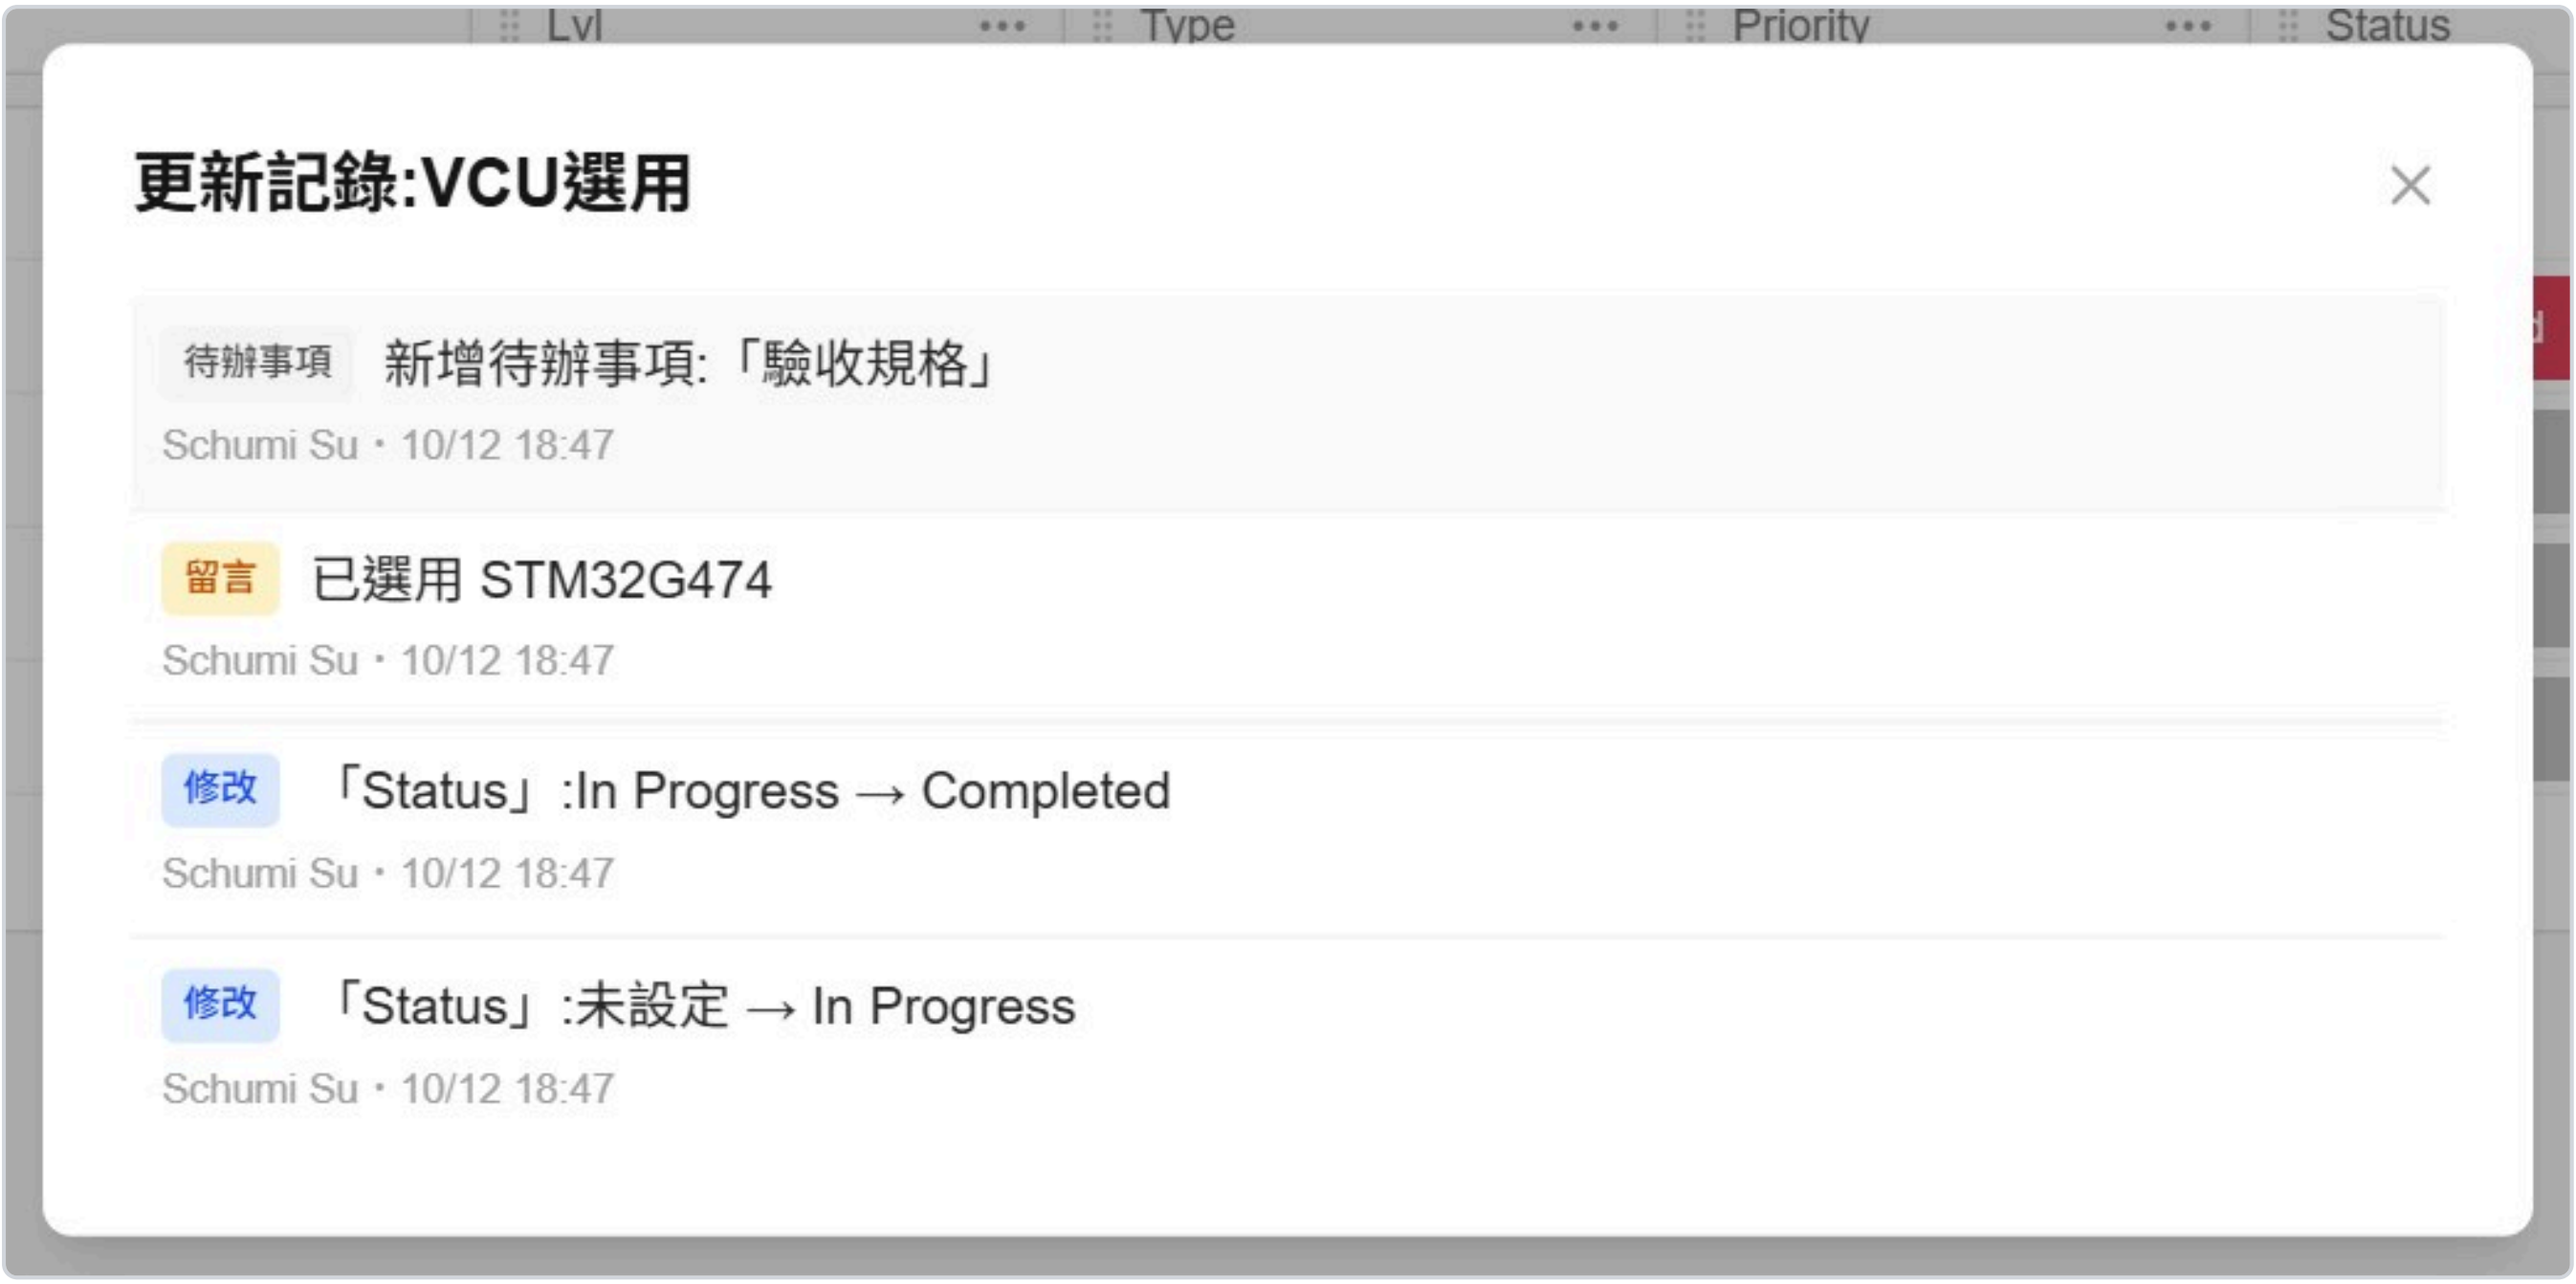

更新記錄:VCU選用

待辦事項 新增待辦事項:「驗收規格」
Schumi Su · 10/12 18:47

留言 已選用 STM32G474
Schumi Su · 10/12 18:47

修改 「Status」:In Progress → Completed
Schumi Su · 10/12 18:47

修改 「Status」:未設定 → In Progress
Schumi Su · 10/12 18:47

- **看整個看板上發生的事**:側邊欄的「**更新記錄**」頁,見 1.6。
- 時間記的是**狀態欄**(名叫 Status 的那一欄,沒有就第一個狀態欄)切換的當下,台灣時間;完成、進行中的判斷看狀態選項的名稱(Completed / Done / 完成 / 已完成;In Progress / 進行中 / 實作中 / 處理中)或看板「報表設定」裡指定的完成選項。
- 以前已經發生的切換也補進來了(從舊的活動紀錄的文字認出來);認不出來的、不是靠狀態欄完成的,這兩欄是空白。

---

4. 表格視圖

4.1 新增與整理項目

- **新增項目**:分組底下的「+ 新增項目」輸入名稱後按 Enter。
- **新增子項目 / 在上方或下方插入**:項目列右邊的「...」選單。

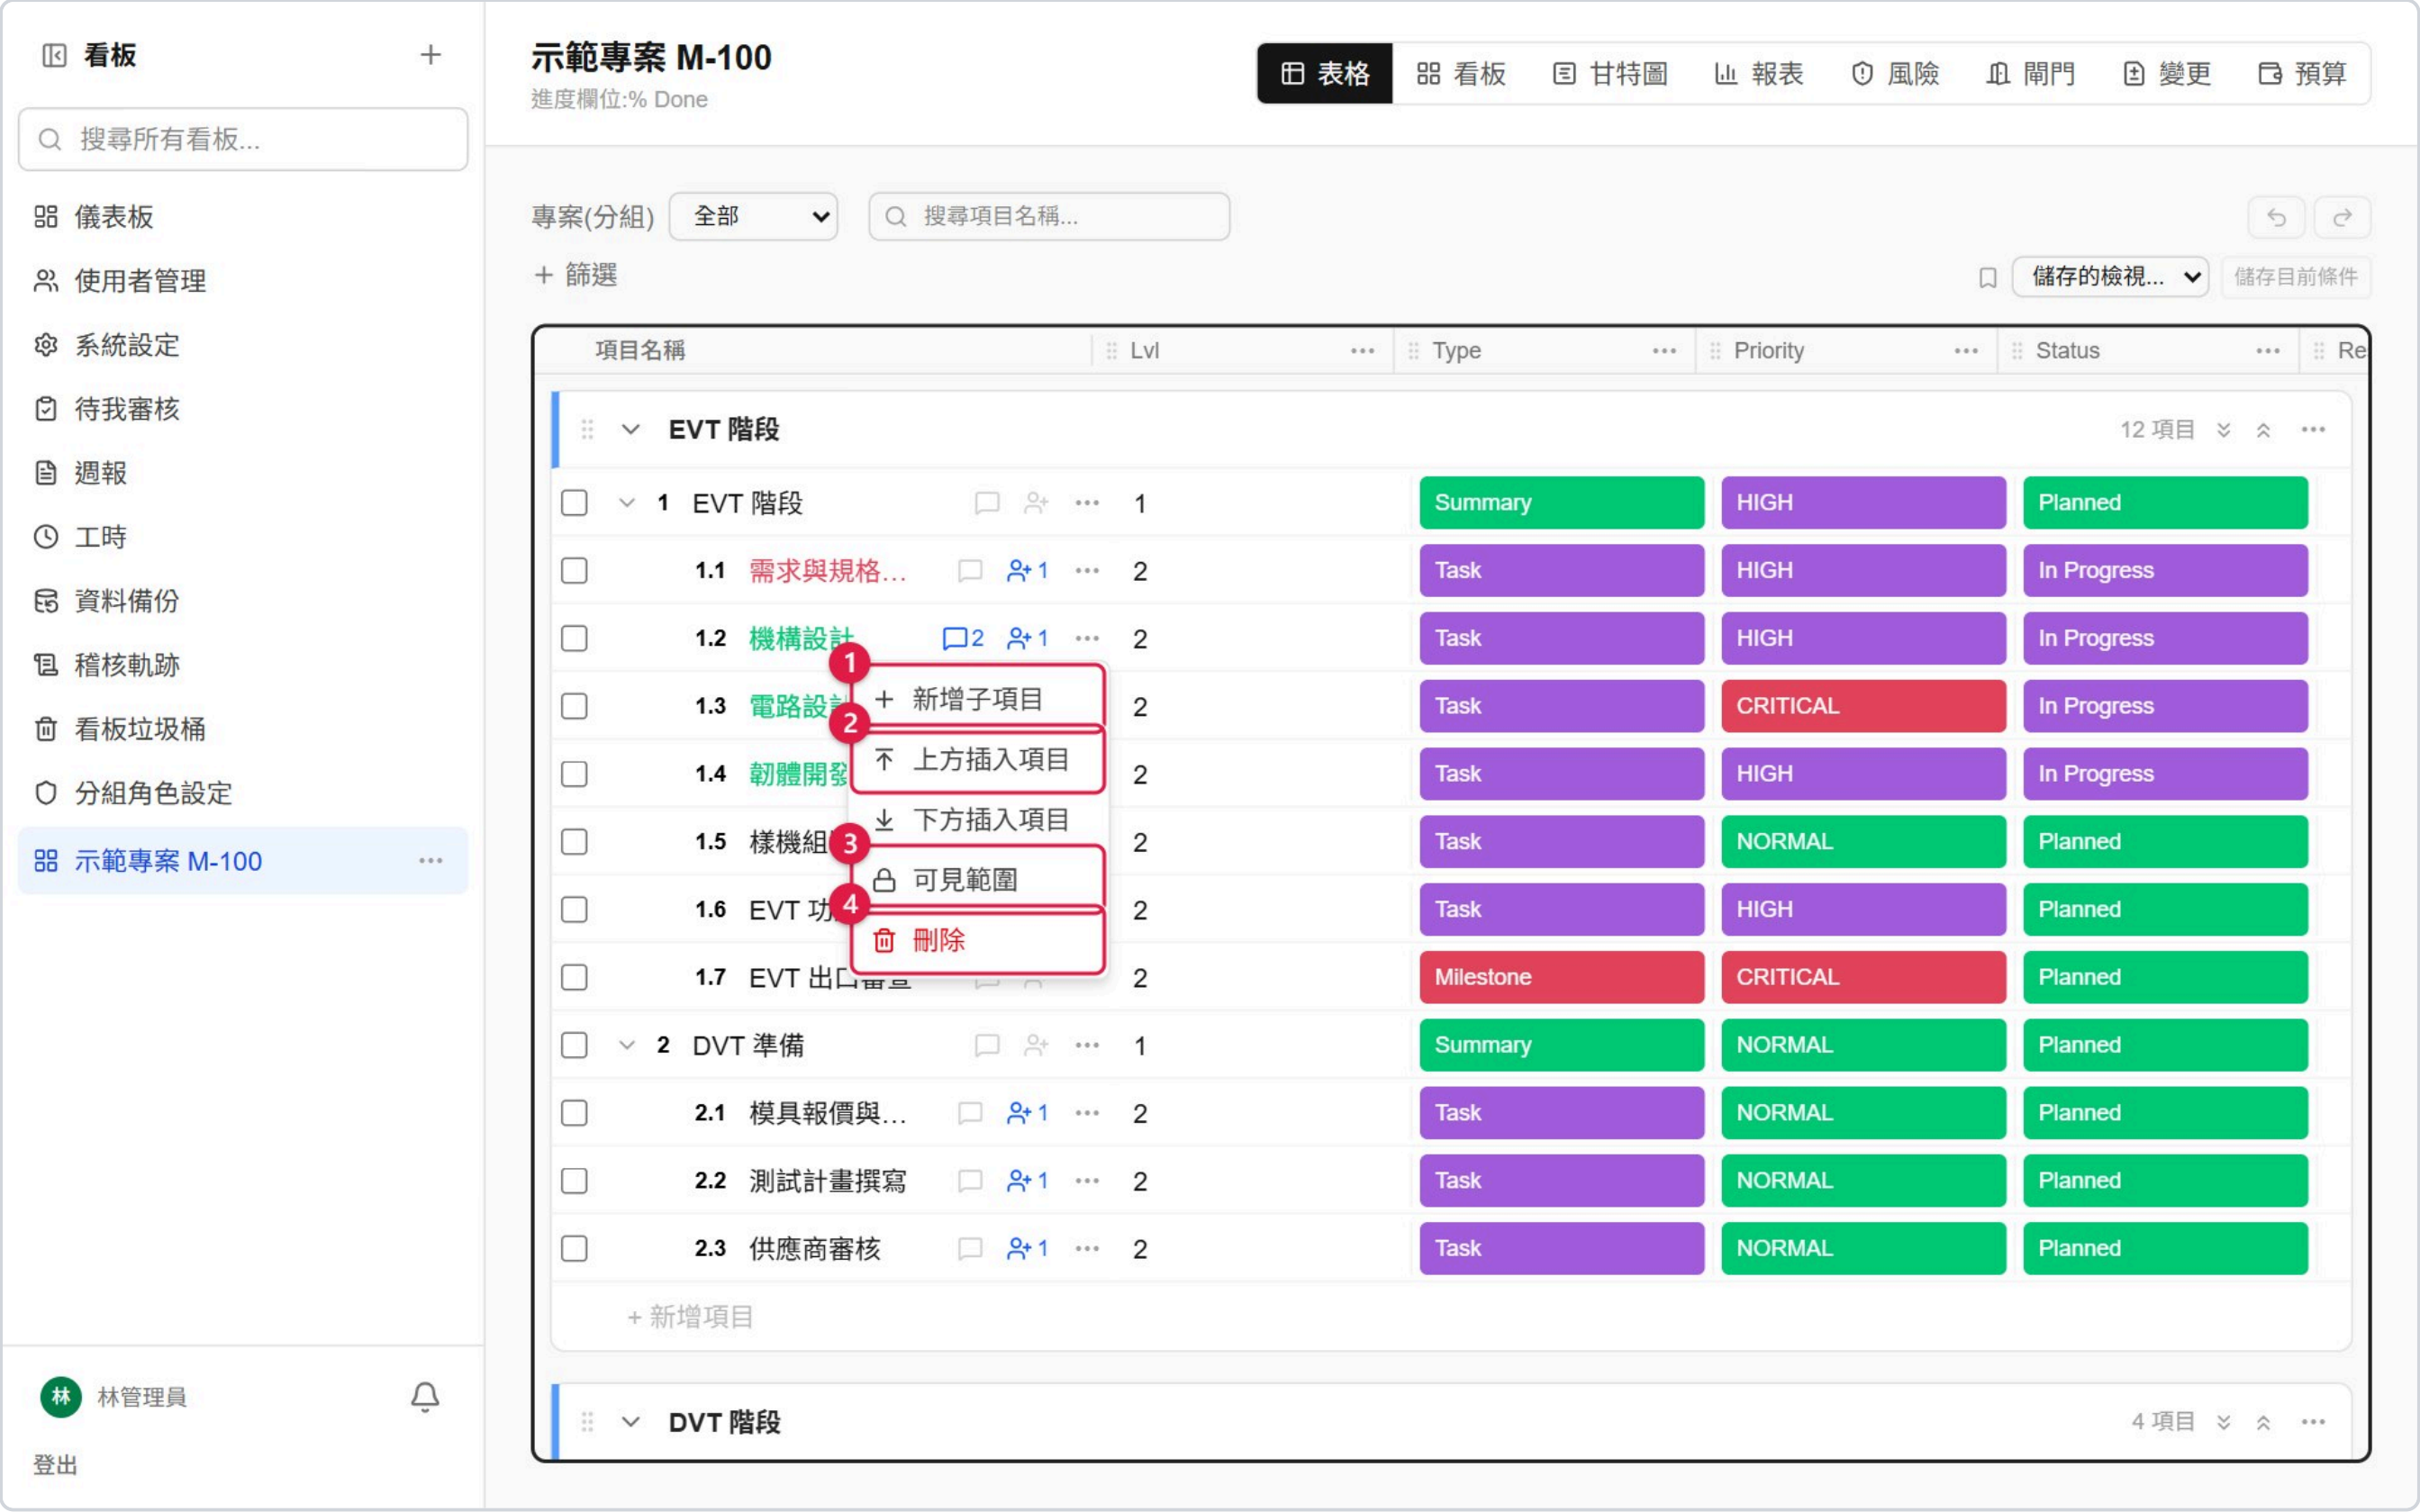

看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
示範專案 M-100
林管理員
登出
示範專案 M-100
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
專案(分組)
全部
搜尋項目名稱...
+ 篩選
儲存的檢視...
儲存目前條件
EVT 階段
12 項目
新增子項目
上方插入項目
下方插入項目
可見範圍
刪除
1
2
3
4
+ 新增項目
DVT 階段
4 項目

項目名稱	Lvl	Type	Priority	Status
1 EVT 階段	1	Summary	HIGH	Planned
1.1 需求與規格...	2	Task	HIGH	In Progress
1.2 機構設計	2	Task	HIGH	In Progress
1.3 電路設	2	Task	CRITICAL	In Progress
1.4 韌體開	2	Task	HIGH	In Progress
1.5 樣機組	2	Task	NORMAL	Planned
1.6 EVT 功	2	Task	HIGH	Planned
1.7 EVT 出口	2	Milestone	CRITICAL	Planned
2 DVT 準備	1	Summary	NORMAL	Planned
2.1 模具報價與...	2	Task	NORMAL	Planned
2.2 測試計畫撰寫	2	Task	NORMAL	Planned
2.3 供應商審核	2	Task	NORMAL	Planned

編號	功能
① 新增子項目	在這個項目底下加一個子項目
② 上方插入項目	在這個項目前面插入同階的新項目
③ 可見範圍	設成私人項目
④ 刪除	移到垃圾桶(可還原)

- **新增分組**:表格最底下的「+ 新增分組」;分組標題可以直接改名,標題左邊的把手可以拖曳調整順序;分組標題右邊的雙箭頭可以把整個分組**全部展開 / 全部收合**。
- **名稱旁的小圖示**:留言數、指派的人數(點開可以直接分配)。

4.2 直接編輯儲存格

直接點儲存格就能改:

- 文字、數字:輸入後按 **Enter** 或點旁邊就會儲存。
- 日期:點選日期欄位。
- 狀態、人員:從下拉選單選。**人員**與**工作項**的下拉選單(例如工時登記的專案工作項、批次設定負責人、甘特圖的父項目篩選)最上面都有搜尋框,輸入關鍵字就會即時過濾,可以用空白隔開多個關鍵字(例如「AMR poc-3」),按 Enter 選第一個符合的(見 9.6)。
- **灰底的日期欄位**是被鎖住的,表示它由前置依賴或子項目統計算出來,不能手動改(游標移上去會說明原因)。要改請改它的「天數」、「前置依賴」或子項目。

貼上(Ctrl+V):一次新增很多項目、或整欄取代

從 Excel、Google 試算表複製一段儲存格,可以直接貼進表格,不必一格一格打。

新增很多項目:複製一欄(或好幾欄)內容,點分組底下的「+ 新增項目」,按 **Ctrl+V**。

- 每一列建一個項目,放在這個分組的最上層。**第一欄是項目名稱**;名稱是空的那一列不會建。
- 如果複製的是**多欄**,第 2、3... 欄會**依序對應到表格由左到右的欄位**(第 2 欄對應表格第 1 個欄位,依此類推)。貼上前會先跳出視窗,**列出每一欄對應到哪個欄位、哪些格子轉不過去**,按「建立」才會真的建。
- 各欄位的格式:狀態欄貼選項的名稱(不分大小寫);負責人欄貼姓名或 Email;日期欄貼 2026-10-08 或 2026/10/8;進度欄貼 50 或 50%;數字與文字欄照貼。轉不過去的格子會留空,項目照建。
- **Pred(前置依賴)與 Lvl 這兩欄不能貼**——Pred 存的是工作項的關係、Lvl 由項目的位置自動維護,貼上時會自動略過。
- 一次最多 300 列;一批一批建立,輸入框會顯示進度。

整欄取代已存在的資料:先**框選同一欄的一段儲存格**,再按 **Ctrl+V**。

1. 框選:在某一欄的儲存格上**往上或往下拖曳**,或先點一格、再按住 **Shift** 點另一格。框到的格子會變淡藍,畫面底下顯示「已框選 N 格」。(單純點一下仍然是進去編輯;按 Esc 或點別處可以取消框選。)
2. 按 Ctrl+V:跳出視窗說明會換成什麼,按「貼上」才會寫入。框選的格子**由上到下**對應貼上的**每一行**;只貼一行的話,框選的每一格都填同樣的值。行數跟格數不一樣時,取較少的那邊,其餘的不動,並說明。
3. 權限與鎖定照原本的規則:你沒有權限改的格子、被前置依賴鎖住的日期、有子項目的進度,都會略過並說明原因,不影響其他格。
4. 貼上之後可以按看板的「**上一步**」復原整批。(用貼上新增的項目不在上一步裡,要刪請用刪除。)

注意:這跟一格一格手動改一樣,**會通知被指派的人、套用自動化規則**;框選取代只取複製內容的第一欄,項目名稱要批次改請用「取代名稱」。

4.3 拖曳:重新排列與改階層

按住項目列的**空白處**(不是名稱或按鈕)往上下拖曳,放開時依位置決定結果,**拖曳途中就會看到放開後的新 WBS 編號**:

放開的位置	結果
目標列的上半部(中間)	成為目標的**子項目**
目標列的下緣	變成目標的**同階**項目(放在它後面)

放開的位置	結果
目標列的下緣、而且滑鼠往左偏	**外移一層**,變成目標父項的同階項目

規則:只能在**同一個分組**內拖曳;不能拖進自己的子孫底下。需要結構權限(管理者、主管、或該分組的負責角色)。搬移後會自動重新編號,Lvl 與 Summary 狀態也會一起處理。

不想拖曳時,用升階 / 降階(表格與甘特圖都有):

做法	結果
滑過項目列,按名稱旁的 **降階**(→)小按鈕;或項目的「...」選單 → 降階;或在名稱上按 Tab	變成**上一個同階項目的最後一個子項**,它自己的子項目跟著走;下面的同階項目編號往前補
按 **升階**(←)小按鈕;或「...」選單 → 升階;或在名稱上按 Shift+Tab	**提升一階**,變成父項的同階項目、緊接在父項後面;**原本排在它後面的同階項目變成它的子項**(接在它原本的子項後面)

例子(這一組本來是 1.1 底下的 1.1.14 ~ 1.1.18):

- **升階 1.1.16**:它變成 **1.2**(1.1 的下一個同階項目),原本的 1.1.17、1.1.18 變成它的子項 **1.2.1**、**1.2.2**;原本的 1.2 往後變 1.3。**清單上的位置不動**,只有階層變了——不會跑到原本下面那幾個的後面。
- **降階 1.1.16**:它變成 **1.1.15.1**(1.1.15 的子項),下面的 1.1.17 編號往前補成 1.1.16。
- 排在最後一個的項目升階,下面沒有人可以接管,就只是變成父項的下一個同階項目。
- 第一個同階項目前面沒有誰可以當父項,所以沒有降階;最上層的項目沒有升階。做不到的那個方向不會出現。
- 升階接管了子項,它就變成 Summary(跟其他有子項的項目一樣);「上一步」會連同接管來的子項一起放回去,它的類型也還原。用拖曳「往左拖外移一層」不接管下面的項目(那是你自己指定放在哪)。
- 降階進一個收合的父項時,它會自動展開。用鍵盤 Tab / Shift+Tab 搬完,游標還停在這個項目上,可以連續按。
- 效果跟拖曳完全一樣:WBS 編號、Lvl、Summary 狀態會一起處理,也能用「上一步 / 下一步」復原。需要的權限也跟拖曳一樣。

4.4 篩選與儲存的檢視

按「+ 篩選」新增一個條件,可以疊加多個:

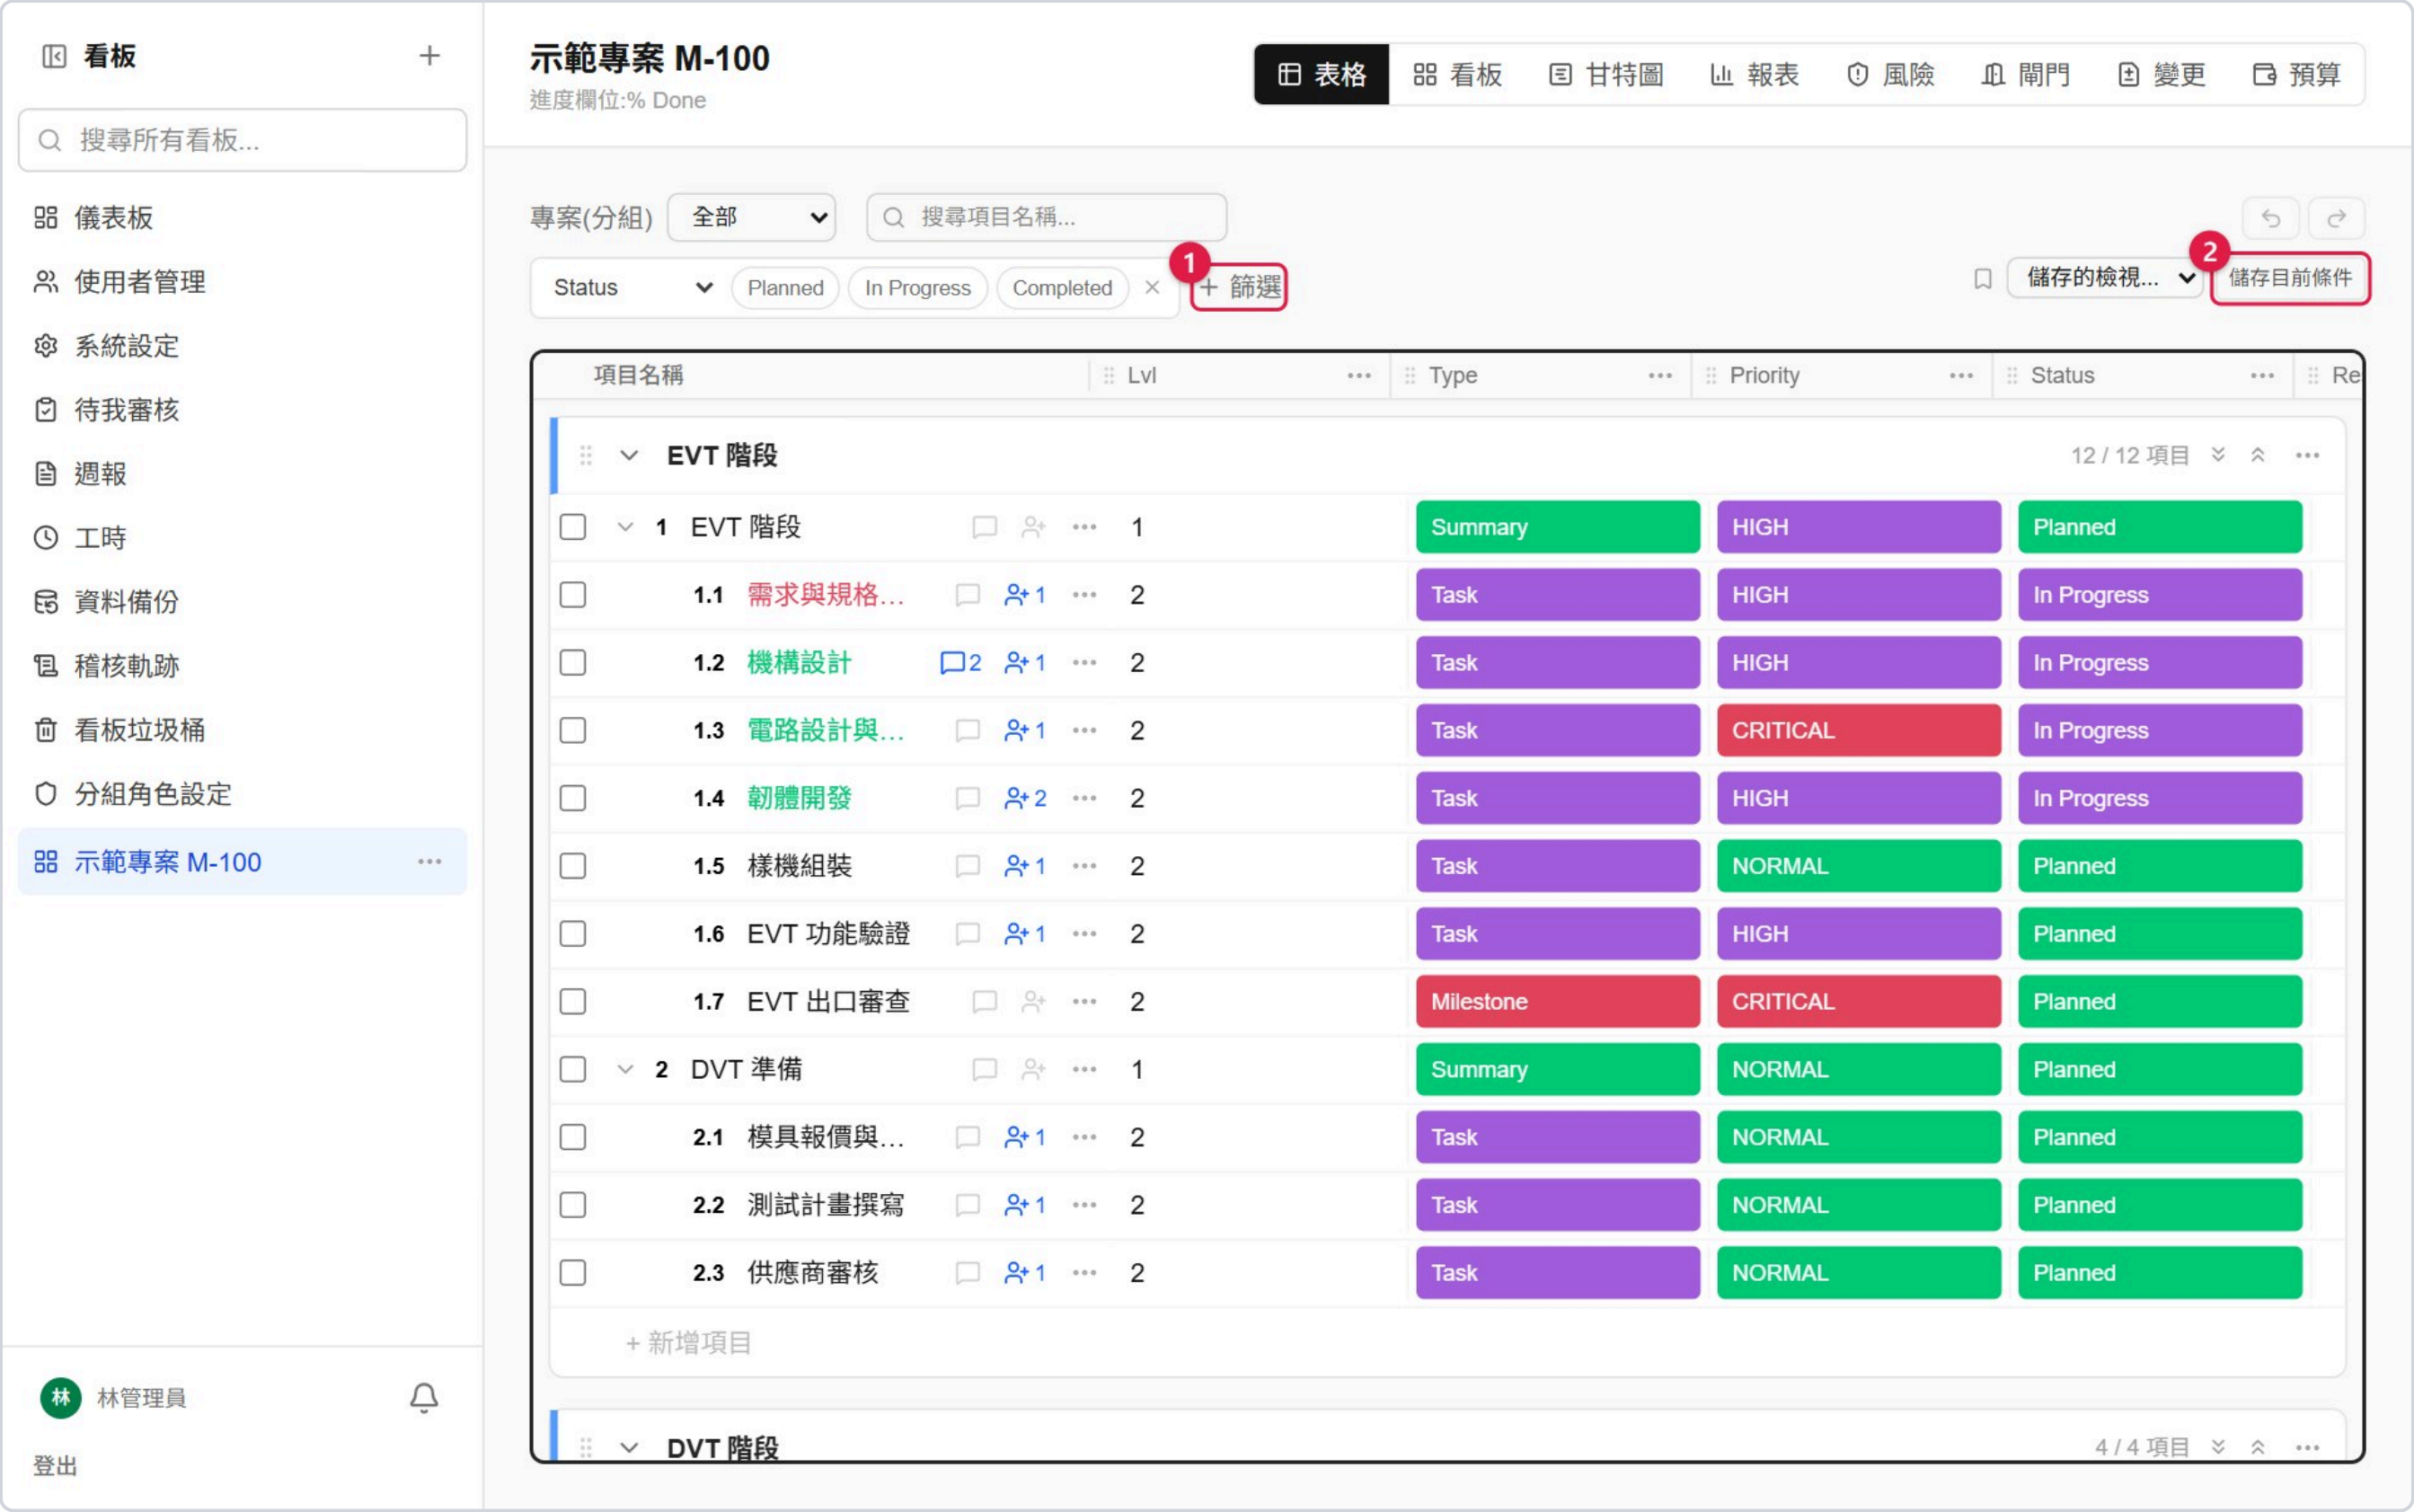
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
示範專案 M-100
林管理員
登出
示範專案 M-100
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
專案(分組)
全部
搜尋項目名稱...
Status
Planned
In Progress
Completed
1
+ 篩選
儲存的檢視...
2
儲存目前條件
EVT 階段
12 / 12 項目
+ 新增項目
DVT 階段
4 / 4 項目

項目名稱	Lvl	Type	Priority	Status
1 EVT 階段	1	Summary	HIGH	Planned
1.1 需求與規格…	2	Task	HIGH	In Progress
1.2 機構設計	2	Task	HIGH	In Progress
1.3 電路設計與…	2	Task	CRITICAL	In Progress
1.4 韌體開發	2	Task	HIGH	In Progress
1.5 樣機組裝	2	Task	NORMAL	Planned
1.6 EVT 功能驗證	2	Task	HIGH	Planned
1.7 EVT 出口審查	2	Milestone	CRITICAL	Planned
2 DVT 準備	1	Summary	NORMAL	Planned
2.1 模具報價與…	2	Task	NORMAL	Planned
2.2 測試計畫撰寫	2	Task	NORMAL	Planned
2.3 供應商審核	2	Task	NORMAL	Planned

- 依欄位類型提供不同的篩選:文字(包含)、狀態(選項)、人員、日期(區間;可選「今天」,存成檢視後每天自動跟著今天走)、數字(最小–最大)。
- 另外還有兩個特殊條件:**任務分派者**、**任務新增時間**。
- 設好條件後按「儲存目前條件」,取名後存成**檢視**;可以勾選「共用給看板成員」。之後從「儲存的檢視...」下拉選單切換。
- 篩選條件在表格與甘特圖各自獨立,但儲存的檢視兩邊都能套用。

5. 項目卡片

點項目名稱,會打開這個項目的卡片,上面有七個分頁:

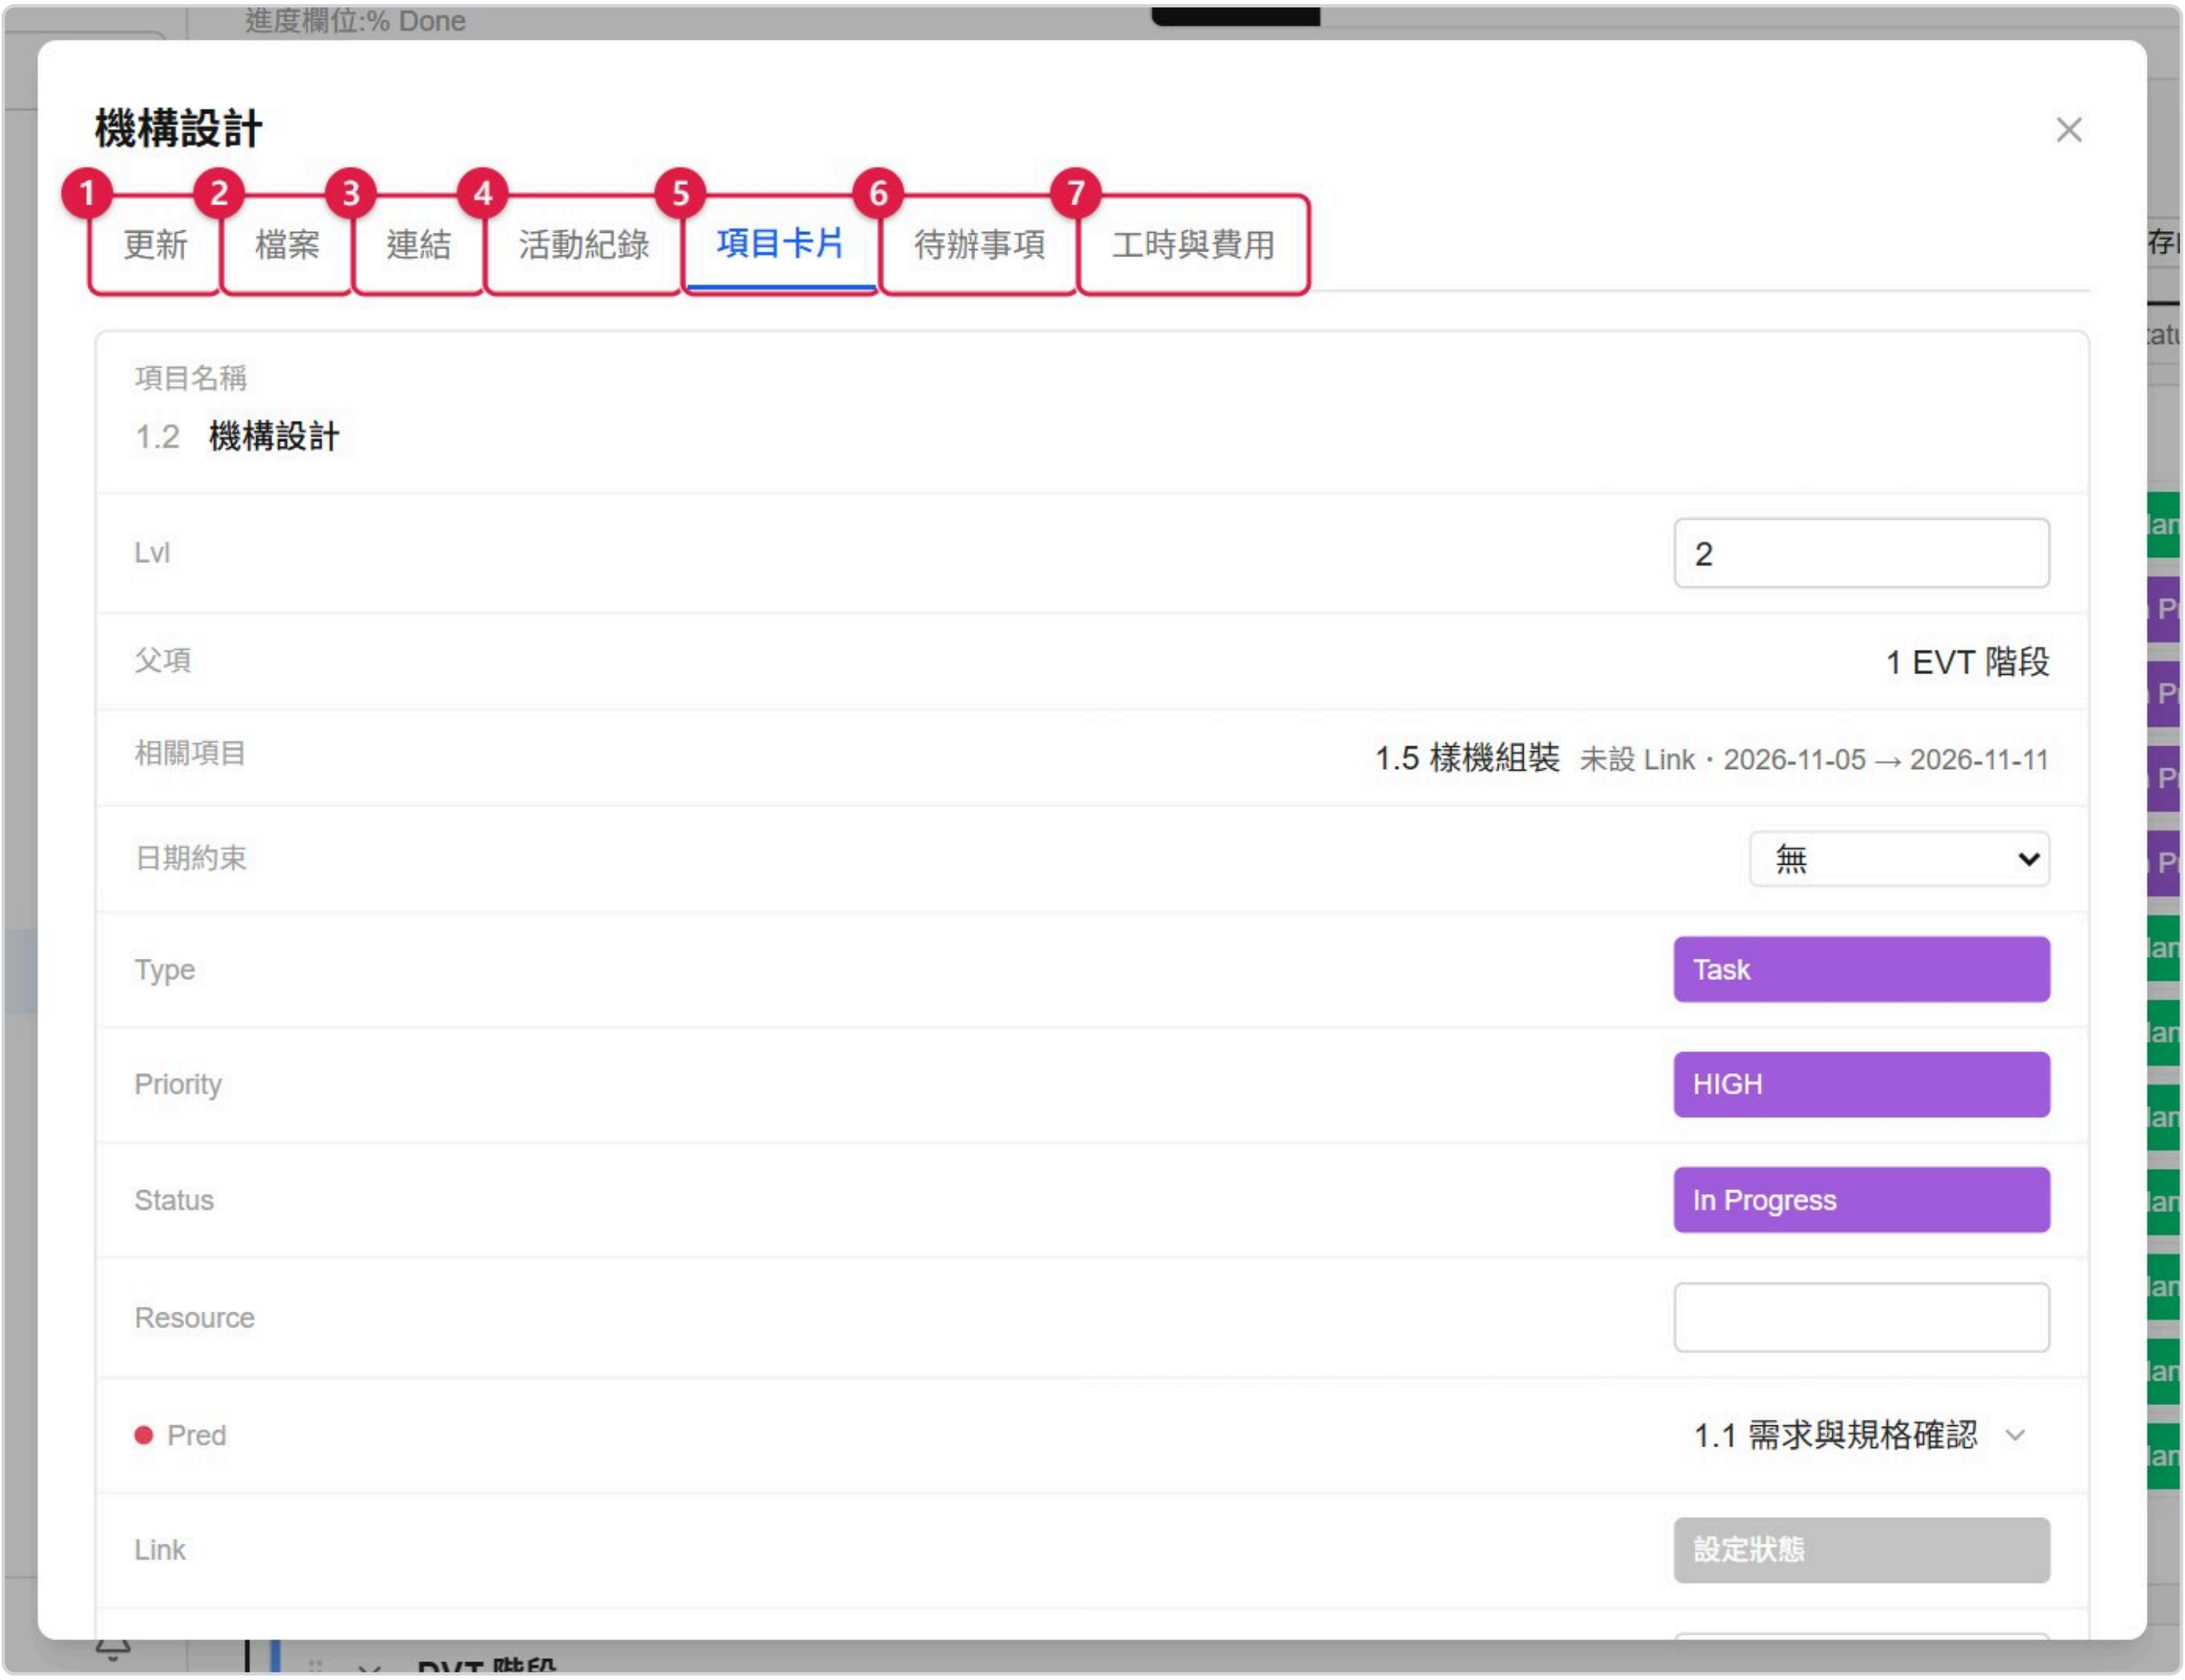
進度欄位:% Done
1 更新
2 檔案
3 連結
4 活動紀錄
5 項目卡片
6 待辦事項
7 工時與費用
DVT 階段

機構設計

項目名稱	1.2 **機構設計**
Lvl	2
父項	1 EVT 階段
相關項目	1.5 樣機組裝 未設 Link · 2026-11-05 → 2026-11-11
日期約束	無
Type	Task
Priority	HIGH
Status	In Progress
Resource	
● Pred	1.1 需求與規格確認
Link	設定狀態

分頁	內容
① 更新	留言討論,輸入 @ 可以提及成員(他會收到通知)
② 檔案	上傳這個項目的檔案
③ 連結	貼上雲端硬碟、Google Sheet、外部文件的網址,可以取顯示名稱
④ 活動紀錄	這個項目所有被修改的歷史:誰、什麼時候、改了什麼;最上面是任務派遣人與派遣時間
⑤ 項目卡片	所有欄位、父項、相關項目、日期約束、浮時、基準線、人員分配
⑥ 待辦事項	這個項目底下的小清單,可以勾選完成
⑦ 工時與費用	直接費用與實際工時

更新分頁:

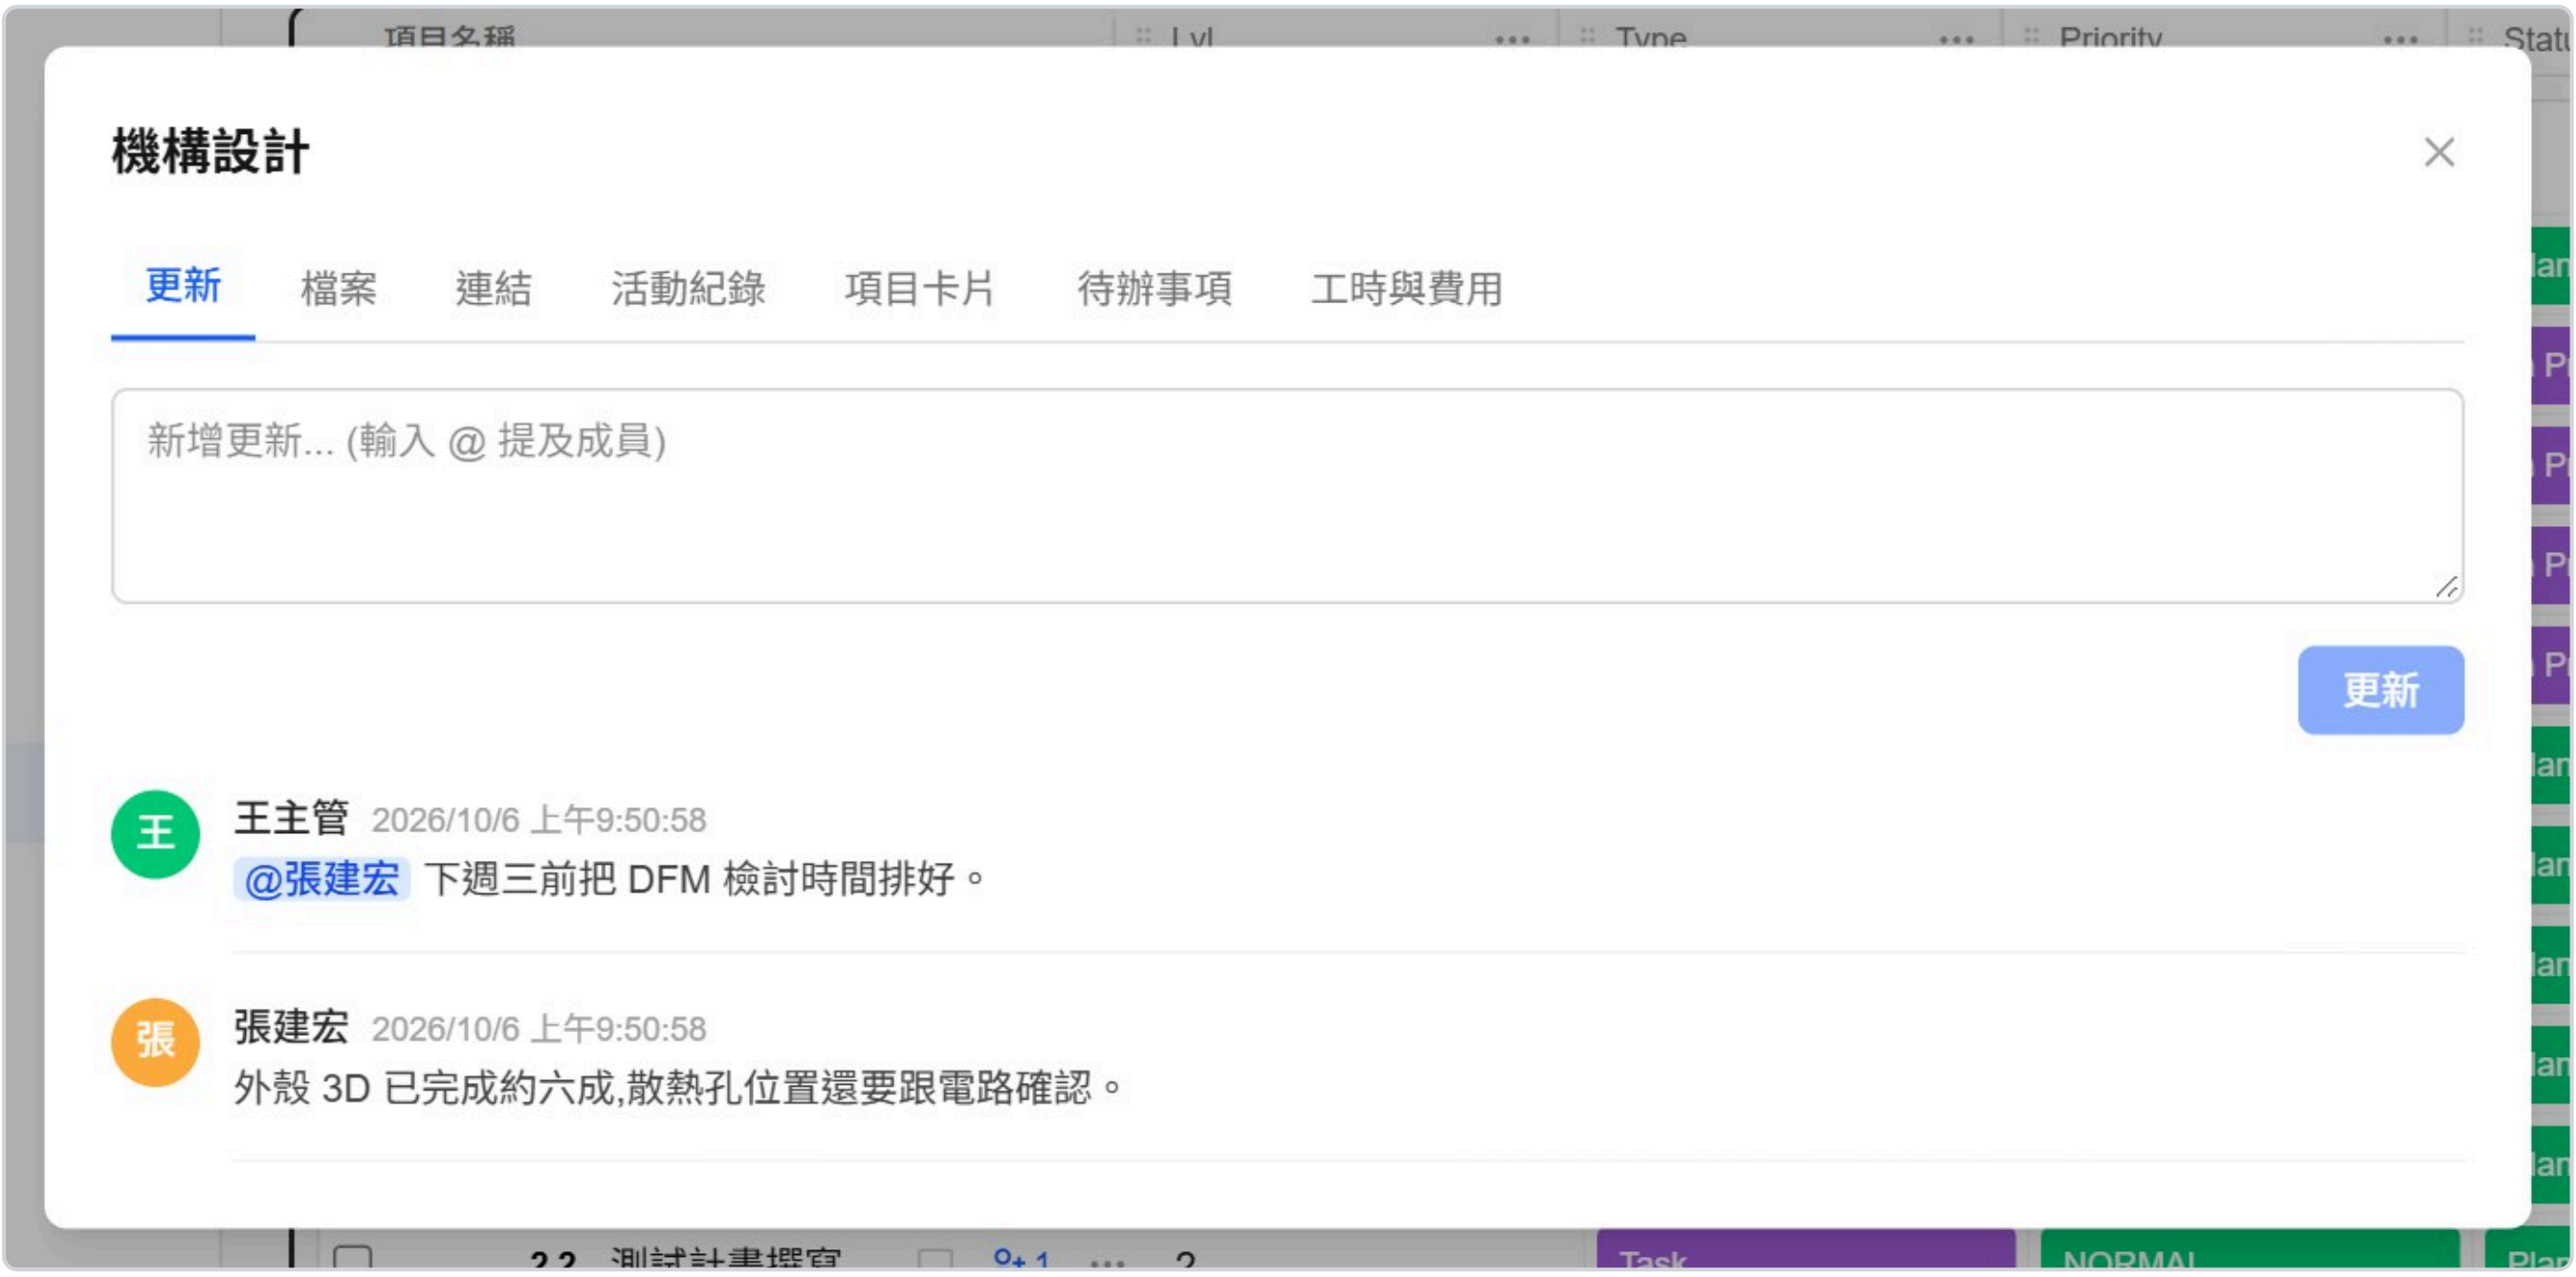
機構設計
更新
檔案
連結
活動紀錄
項目卡片
待辦事項
工時與費用
新增更新... (輸入 @ 提及成員)
更新

王主管 2026/10/6 上午9:50:58
@張建宏 下週三前把 DFM 檢討時間排好。

張建宏 2026/10/6 上午9:50:58
外殼 3D 已完成約六成,散熱孔位置還要跟電路確認。

視窗右上角有「**在對話中討論**」:跳到這個看板的對話頻道,輸入框已經帶好這個工作項的 #引用,直接打字留言(見 1.7)。

待辦事項分頁:

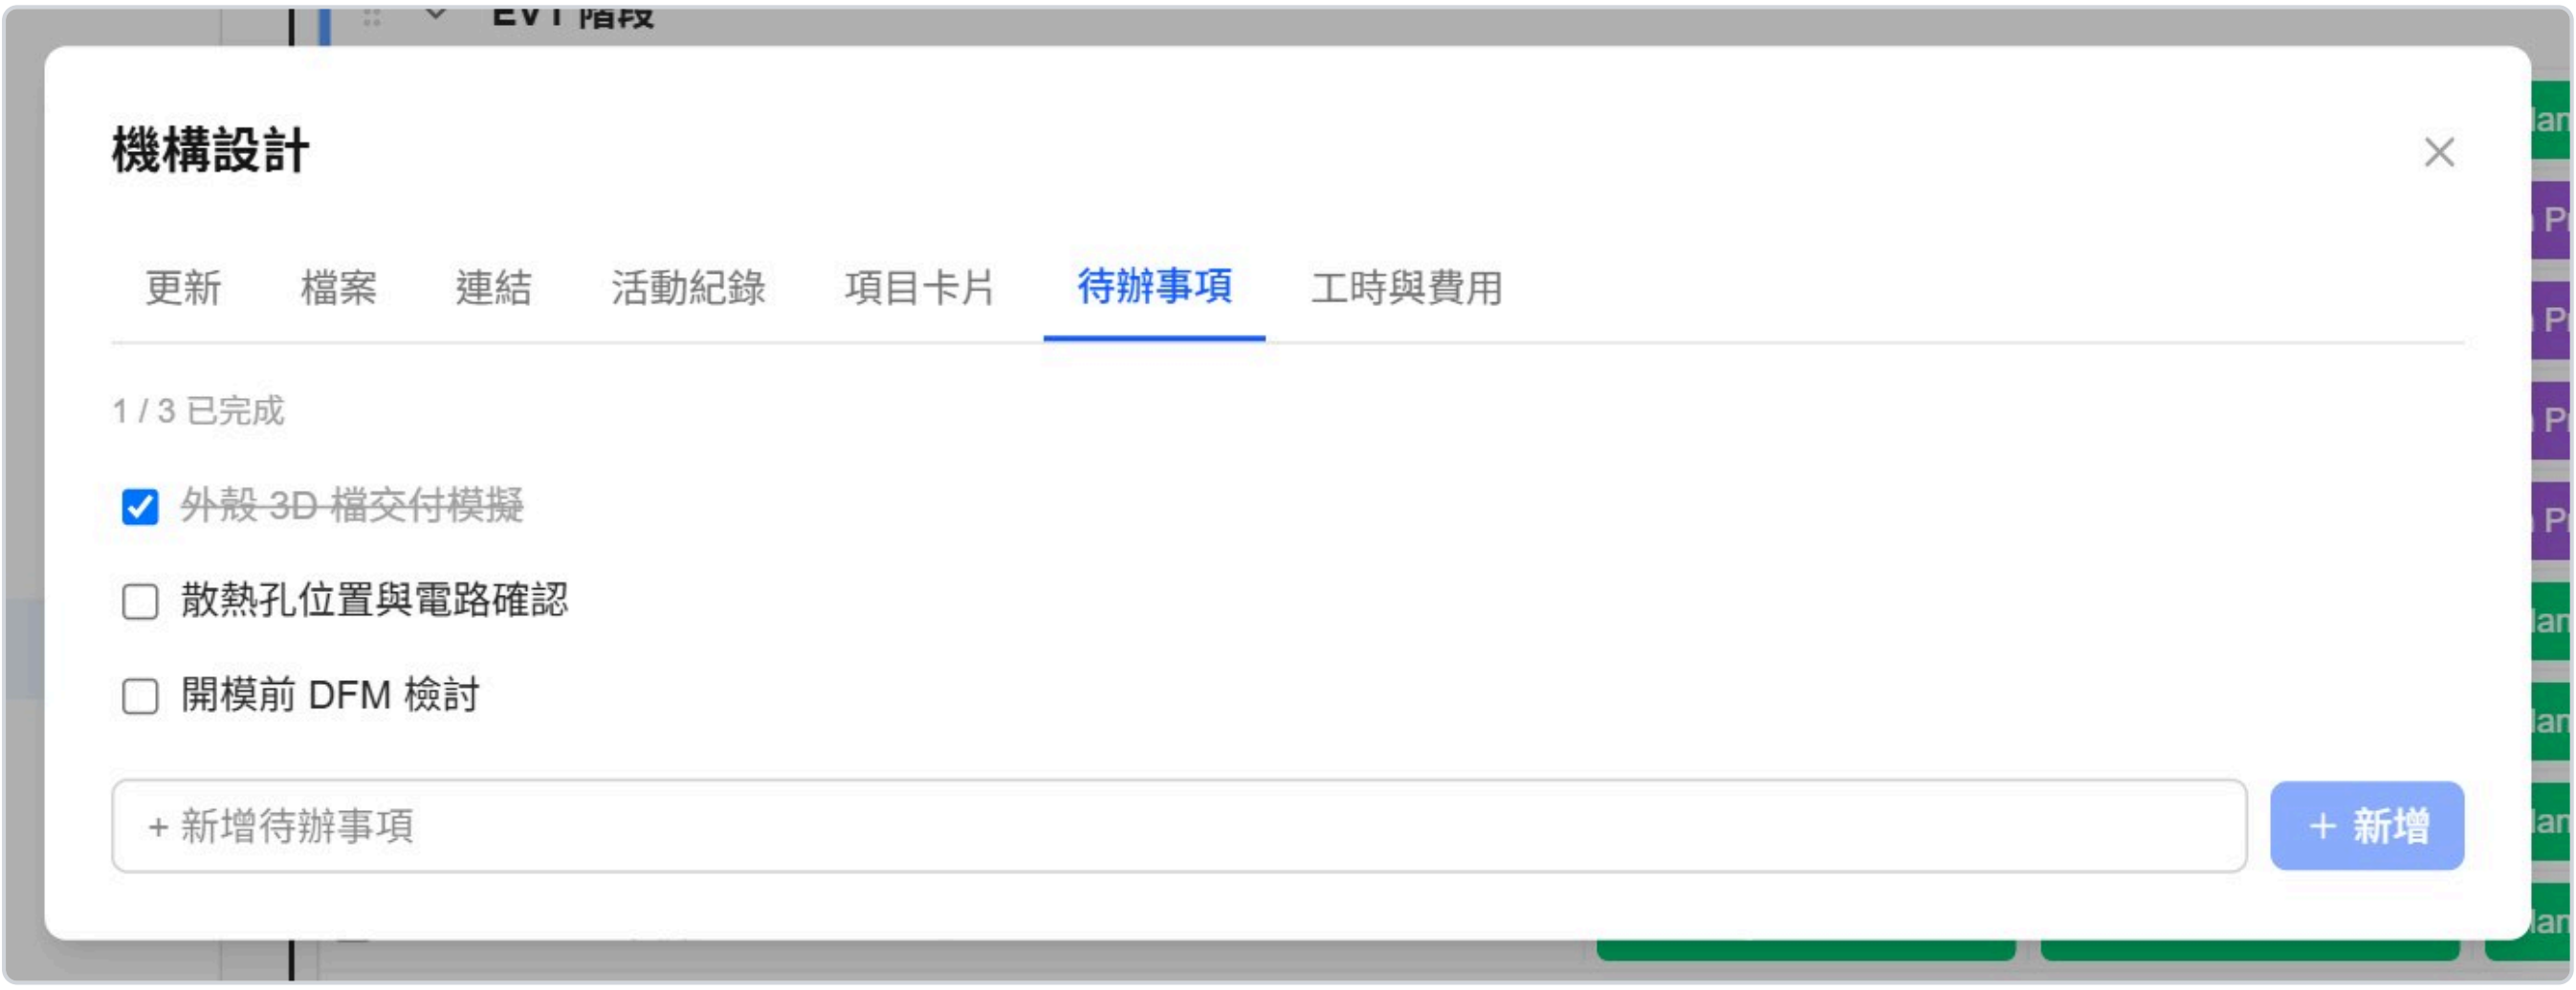
機構設計
更新
檔案
連結
活動紀錄
項目卡片
待辦事項
工時與費用
+ 新增待辦事項
+ 新增

1 / 3 已完成

☑ ~~外殼 3D 檔交付模擬~~
☐ 散熱孔位置與電路確認
☐ 開模前 DFM 檢討

- **每一筆待辦事項可以設期限(DEADLINE)**:新增時在輸入框旁的「**期限**」選日期(選填);已經有的,滑鼠移到那一列、點日曆圖示也能補上。有期限的那一列會顯示「**10/28 · 明天到期**」,依遠近上色——**逾期紅、今天到期橘、明天到期黃、其餘灰**;點日期可以改,旁邊的 ✕ 清除。完成的待辦事項只留日期、不再標顏色。期限是**台北的日曆日**,「今天到期」是今天過完之前。
- **改名稱、調順序**:點待辦事項的**文字**就能直接改名稱(按 Enter 或點別處存檔;不能留空,要拿掉請刪除這一筆),改名會記在更新記錄。每一列**最左邊的 ⠿ 把手**可以上下拖曳調整順序,放開就存;新增的待辦事項接在最後面。風險、議題的待辦事項也一樣(見 11.3b)。
- **每一筆可以寫備註**:待辦事項的文字下面有「**+ 備註**」,點一下就能記錄目前的**處理狀態**、**結果**(例如「已請廠商報價,等回覆」);已經有備註的,點備註的文字修改。點別處或按 Ctrl+Enter 存檔,全部刪掉再存就是清空;上限 1000 字,可以換行。誰改了備註會記在更新記錄。風險、議題的待辦事項也一樣(見 11.3b)。

- **到期前會提醒**:還沒完成的待辦事項,系統在**到期前一天、當天、逾期之後各提醒一次**(不是天天催),在台北**早上 9 點之後**送出,時間點太晚才設的會在下一輪檢查(每 5 分鐘一次)馬上補上。改了期限就重新計算——延後的會重新提醒,標成完成的不再提醒。**提醒的 Email 底下附一條連結**(「開啟:...」),點下去直接開那個工作項目的「待辦事項」分頁;風險 / 議題的待辦事項則是直接開那一筆風險 / 議題。
- **提醒給誰**:這個工作項目的**負責人**(負責人欄位與人員分配)加上**新增這筆待辦事項的人**;不含看板擁有者。通知類型是「**待辦事項期限提醒**」,鈴鐺的標籤是橘色「期限」,Email 也會寄(預設開;右上齒輪可以各自關掉,管理者也可以在系統設定的「通知類型」整個關掉)。

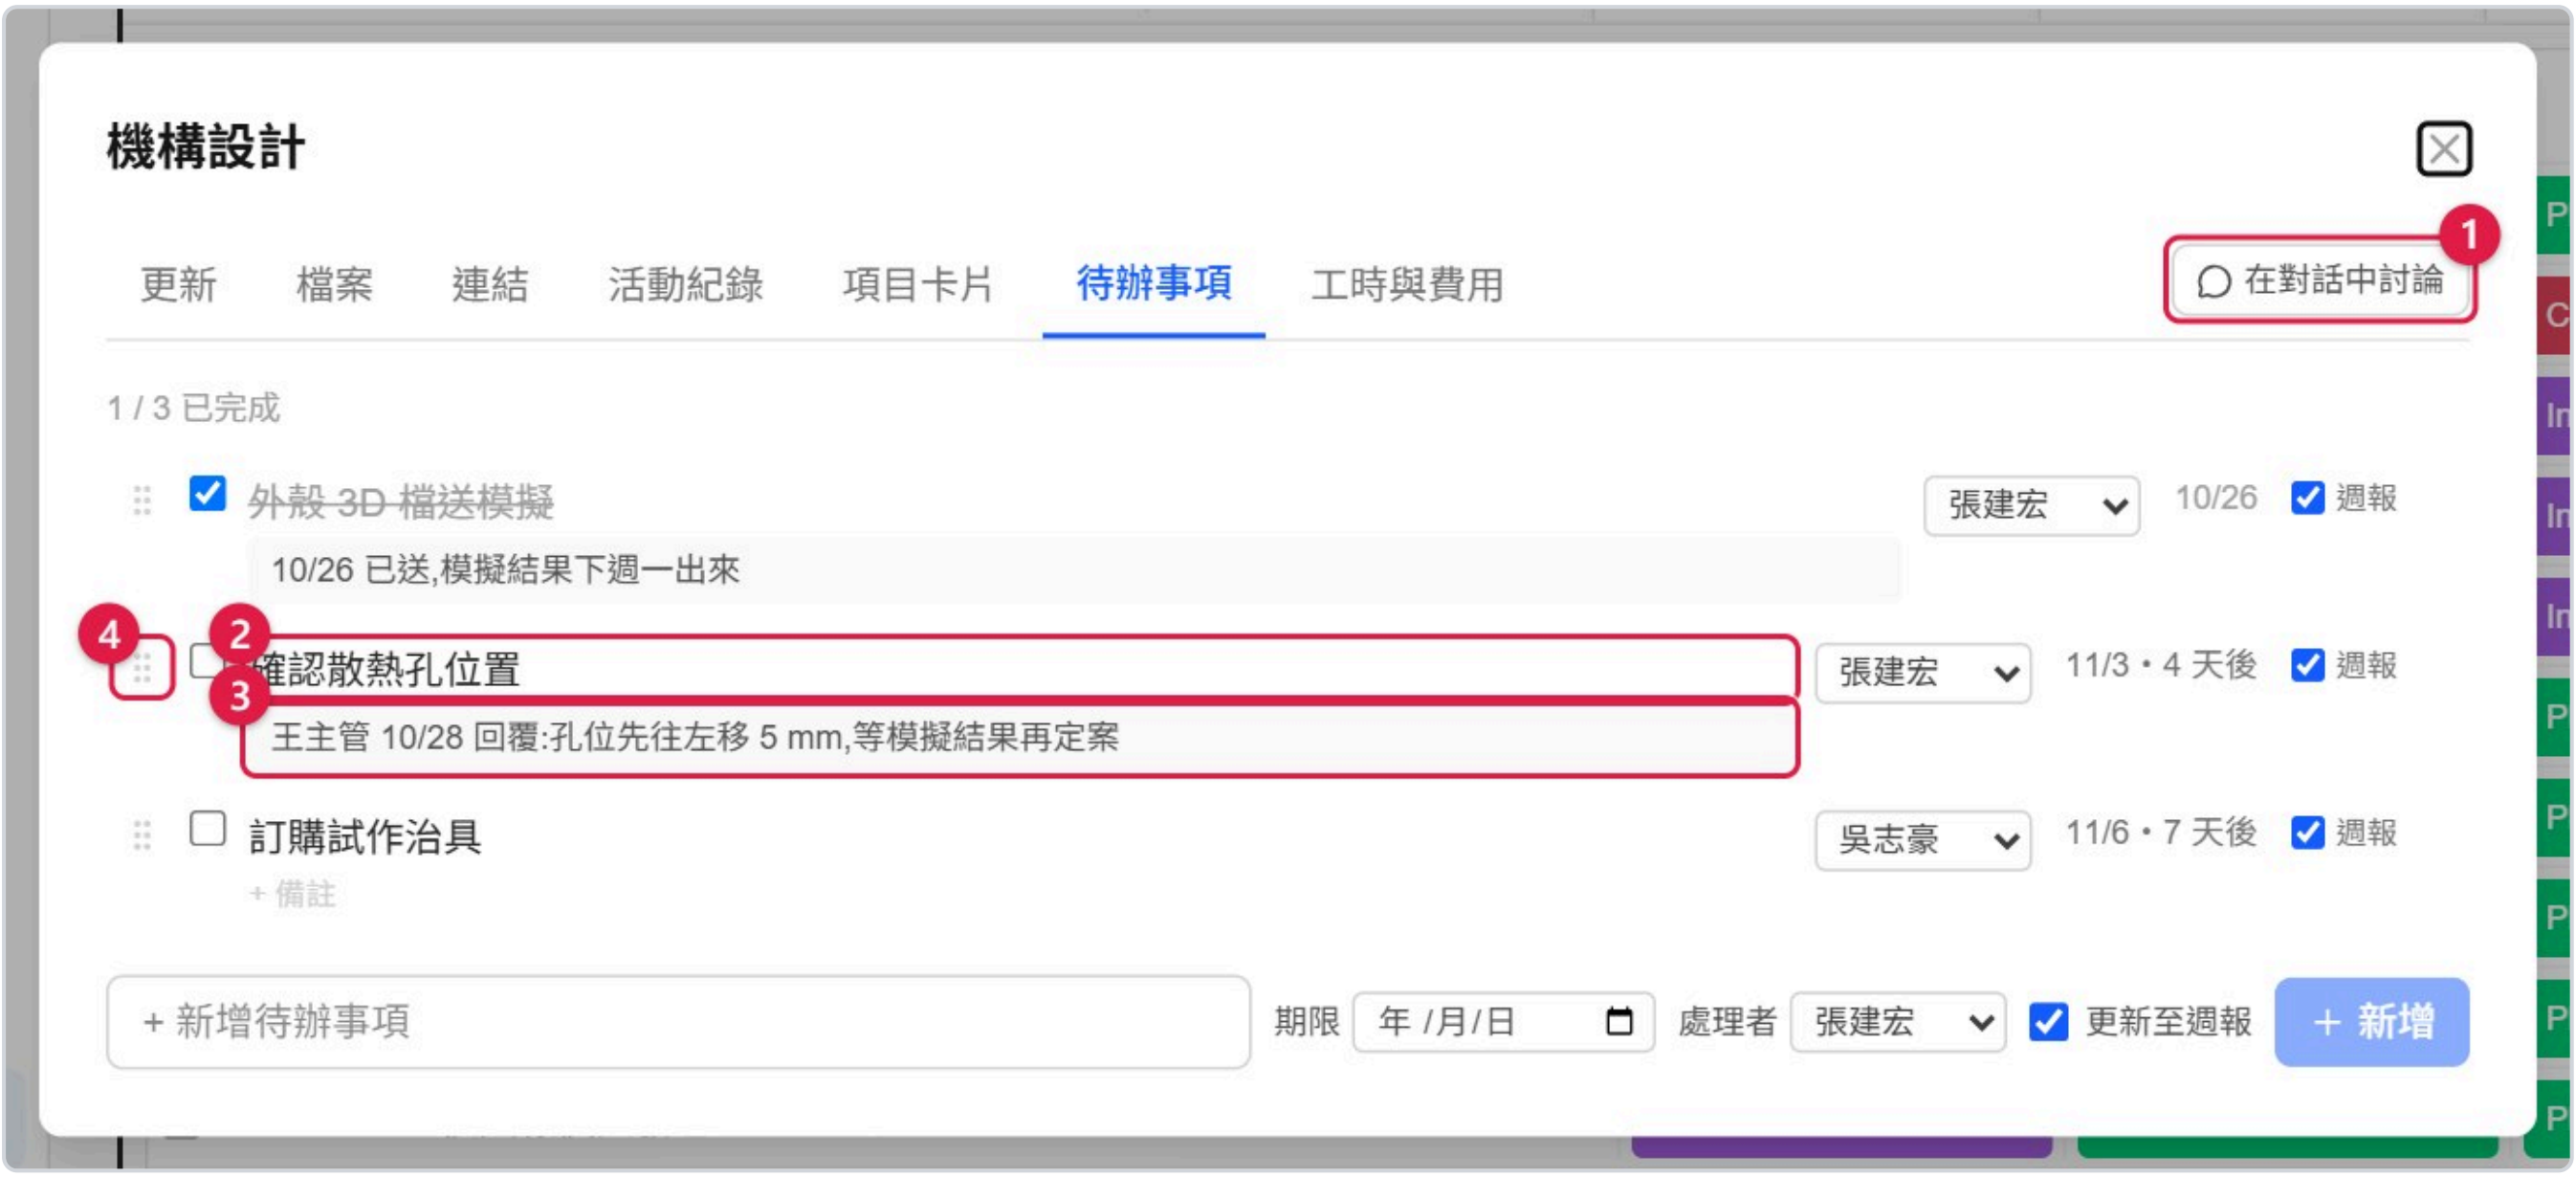
機構設計
更新
檔案
連結
活動紀錄
項目卡片
待辦事項
工時與費用
在對話中討論
1
2
3
4
+ 新增待辦事項
期限
年 /月/日
處理者
張建宏
更新至週報
+ 新增

1 / 3 已完成

☑ ~~外殼 3D 檔送模擬~~ 張建宏 10/26 ☑ 週報
10/26 已送,模擬結果下週一出來

□ 確認散熱孔位置 張建宏 11/3 • 4 天後 ☑ 週報
王主管 10/28 回覆:孔位先往左移 5 mm,等模擬結果再定案

□ 訂購試作治具 吳志豪 11/6 • 7 天後 ☑ 週報
+ 備註

① 視窗右上角的「**在對話中討論**」(見 1.7);② 點待辦事項的文字改名稱;③ 文字下面的**備註**;④ 最左邊的 ⠿ 把手,拖曳調整順序。

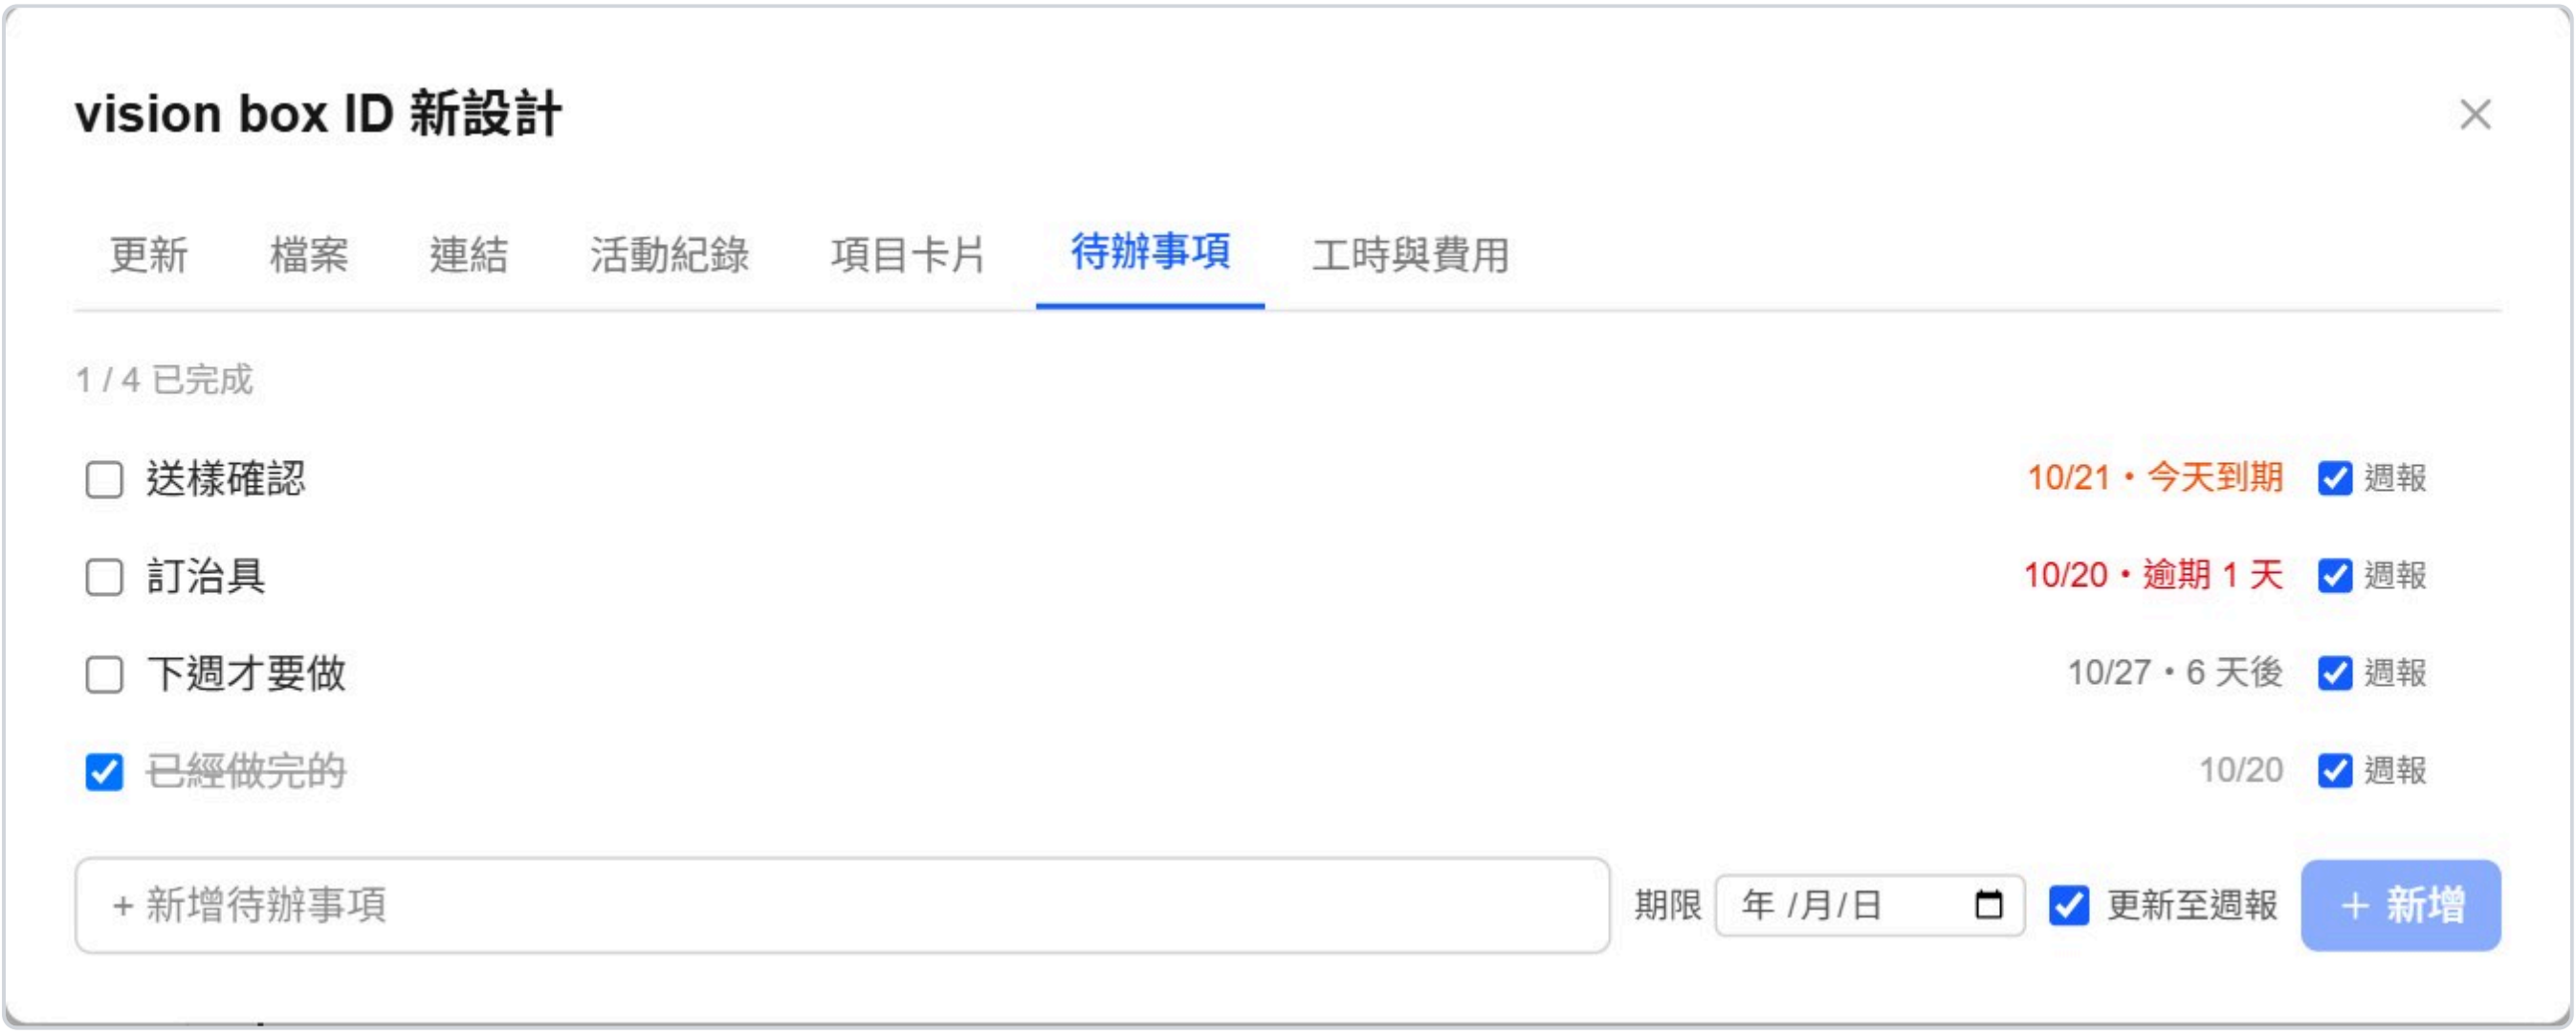
vision box ID 新設計
更新
檔案
連結
活動紀錄
項目卡片
待辦事項
工時與費用
+ 新增待辦事項
期限
年 /月/日
更新至週報
+ 新增

1 / 4 已完成

□ 送樣確認 10/21 • 今天到期 ☑ 週報

□ 訂治具 10/20 • 逾期 1 天 ☑ 週報

□ 下週才要做 10/27 • 6 天後 ☑ 週報

☑ ~~已經做完的~~ 10/20 ☑ 週報

工時與費用分頁:

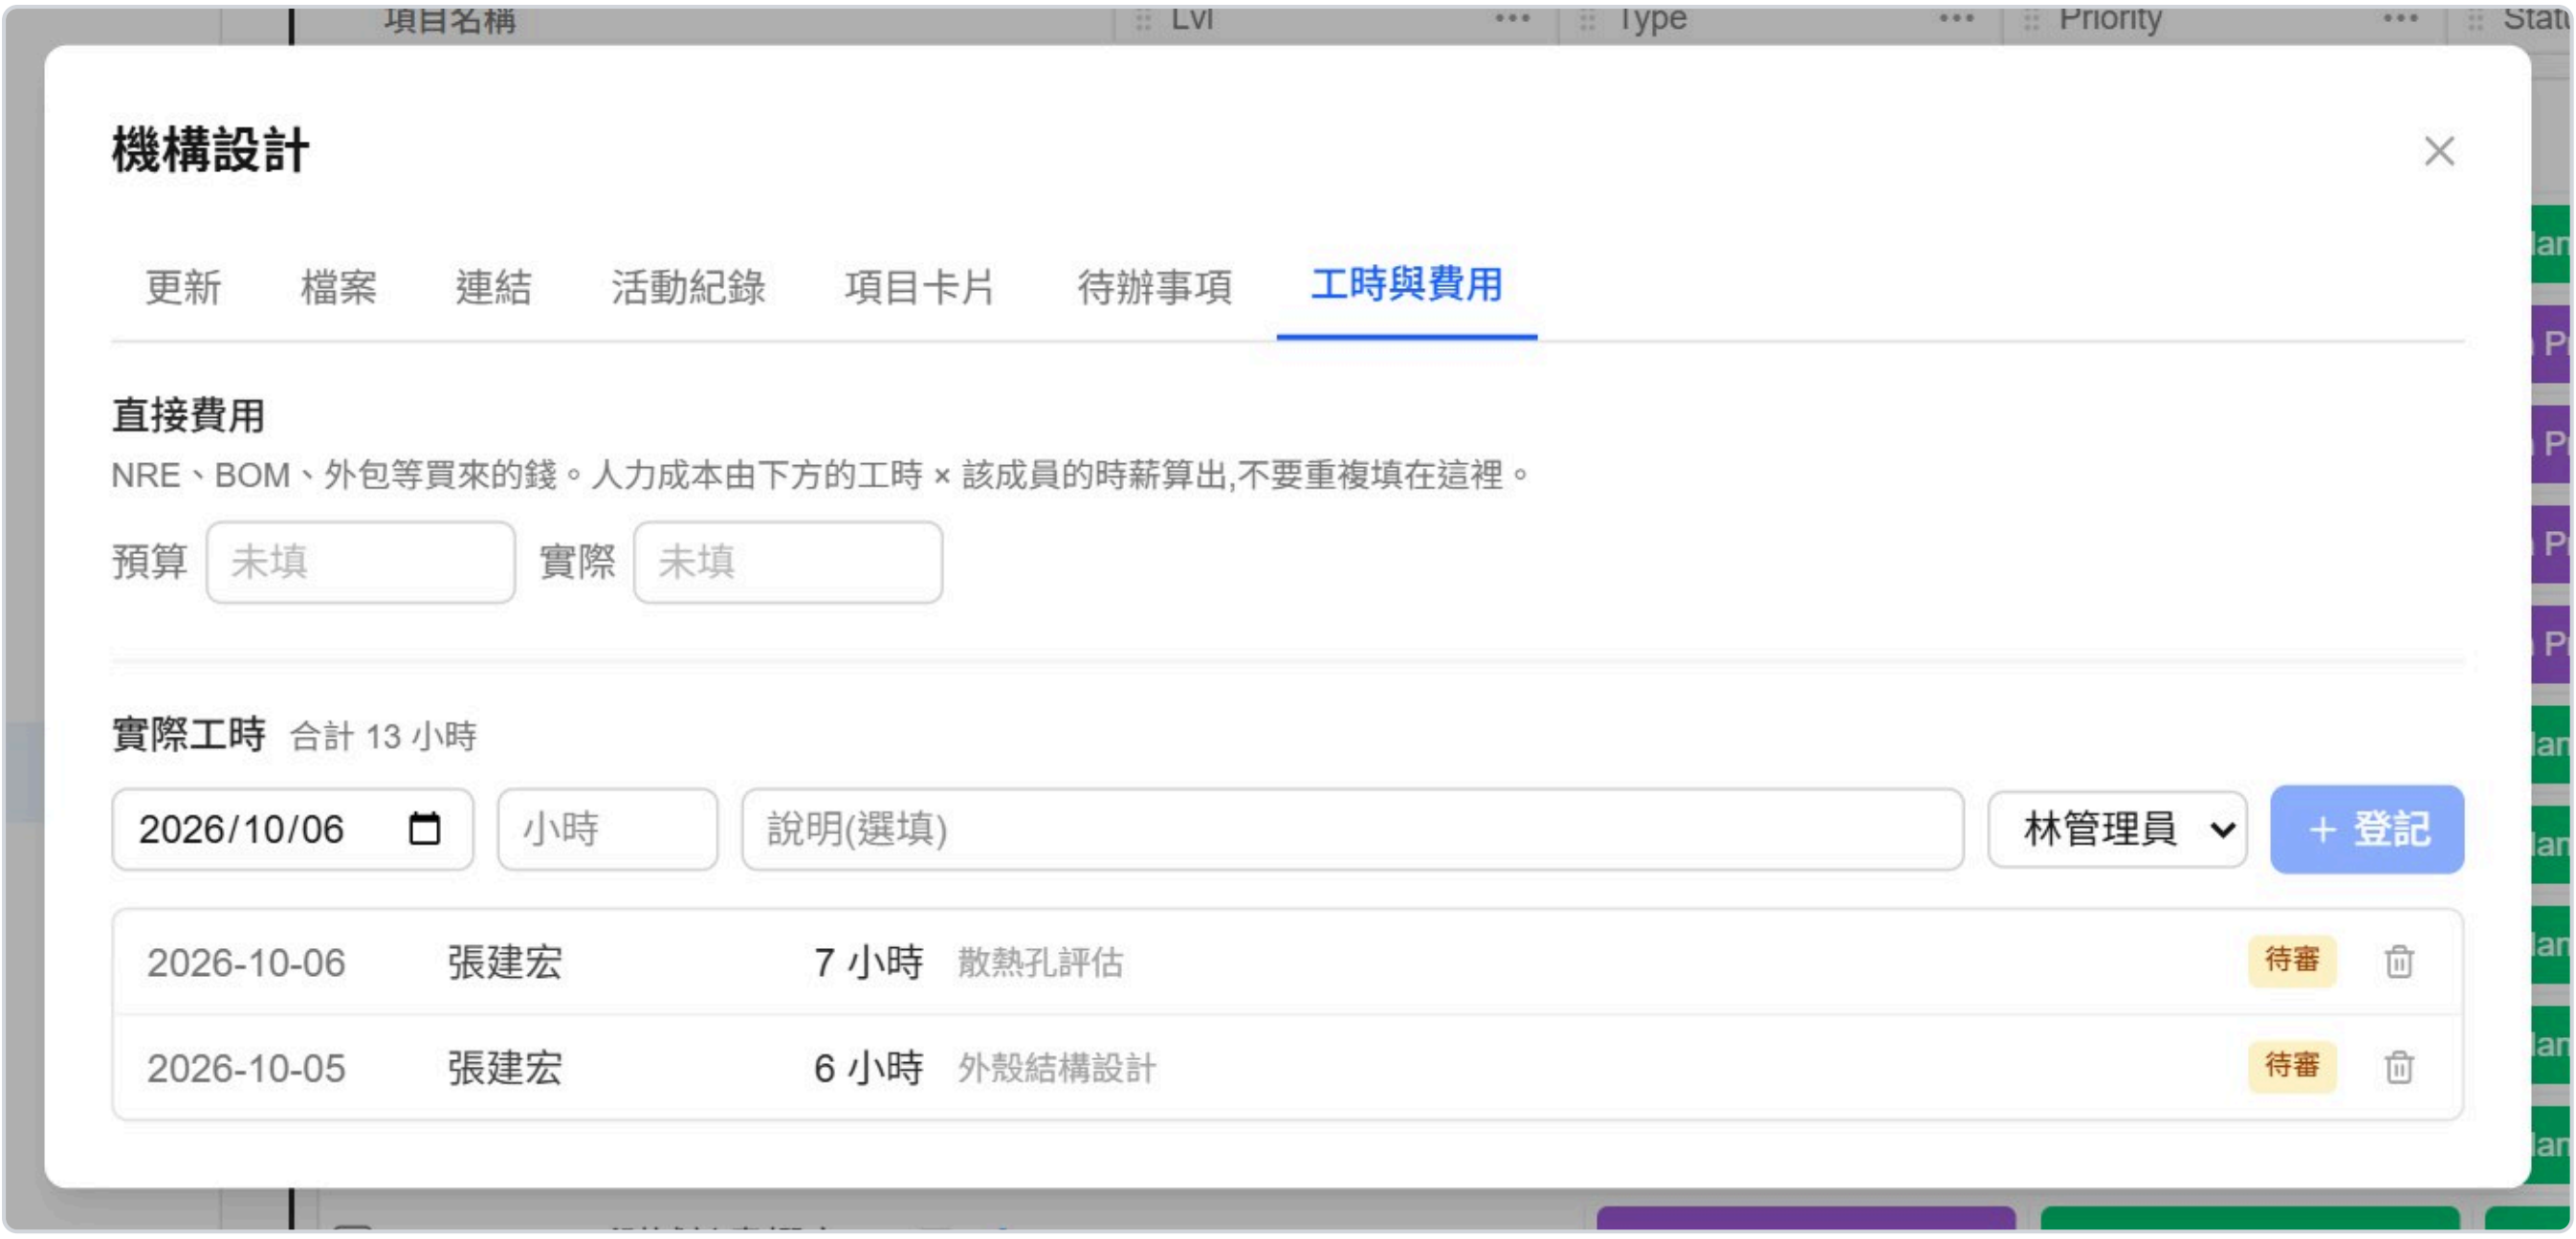

機構設計

直接費用

NRE、BOM、外包等買來的錢。人力成本由下方的工時 × 該成員的時薪算出,不要重複填在這裡。

預算 未填 實際 未填

實際工時 合計 13 小時

2026/10/06 小時 說明(選填) 林管理員

2026-10-06	張建宏	7 小時	散熱孔評估	待審
2026-10-05	張建宏	6 小時	外殼結構設計	待審

- **直接費用**:預算與實際金額,記錄買來的錢(NRE、BOM、外包)。人力成本不要填在這裡,它由工時 × 成員時薪自動算出。
- **實際工時**:選日期、輸入小時、說明(選填)後按「登記」。新登記的工時是「**待審**」,要等直屬主管核准後才會計入成本報表。

項目卡片分頁裡值得注意的欄位

- **Status 的切換時間**:卡片上 **Status 那一列的下面**有一行小字,寫**什麼時候切成進行中、什麼時候切成完成**(台灣時間,後面是誰切的),例如「切成進行中:10/12 18:47 · Schumi Su」「切成完成:10/13 09:10 · Schumi Su」。還沒切過寫「尚未」;狀態改了這一行會跟著更新。**完成要現在還是完成狀態才顯示**——完成後又切回別的狀態,會寫「目前不是完成(曾於 ... 完成)」。進行中顯示的是**最近一次**切成進行中的時間。這跟表格最右邊的「進行中時間」「完成時間」是同一份紀錄;每一次切換的完整歷史在「活動紀錄」分頁。
- **相關項目**:列出誰以這個項目為前置(也就是排在它後面的工作)。
- **日期約束**:替項目加上一條日期規則。
  - 不得早於(開始):前置算出的開始日若早於這天,會被推到這天。
  - 不得晚於(完成):是**期限**,不會改動排程,只在超過時提出警告。
  - 必須完成於:完成日固定在這天,開始日由**天數**往回推算。**不需要前置依賴、也不需要手動開始日**,只要有天數,Start / Finish 就會算出來(自動排程的看板連 Days 也會寫上),甘特圖畫出一條「到這天結束」的條。例如「必須完成於 11/03」、天數 23,開始日就是 10/12。
    - 這種項目的 **Start / Finish 是算出來的,不能手改**(表格、項目卡片、甘特條都一樣),滑過或點一下會說明原因;要調整請改**約束日期**或**天數**。
    - 還沒填天數時日期是空的,約束那一列會提示「還沒有天數」,補上天數就會算出來。
    - 同時有前置依賴時,以約束為準:完成日固定在約束日,不會被前置依賴推走。
    - **跟前置依賴打架會警示**:前置依賴最快要排到的完成日,晚於約束日時(例如前置到 11/05 才做完,約束卻要求 11/03 完成),項目仍然排在約束日——也就是會在前置還沒做完時就開始。這時:

        - 存下約束、或改了天數 / Pred / Link / Lag 讓它變成這樣的當下,會跳出「**日期約束衝突**」視窗,寫出前置依賴最快的日期、目前實際排的日期;**改前置那一端**(例如把前置拉長)害後面某個被釘住的項目排不下時,改的人也會看到,並指名是哪個項目。
        - 項目卡片的約束那一列會一直標**紅字**說明,直到你調整約束日期、天數或前置依賴為止。
        - **在甘特圖上拖曳**(整條搬移、拉開始 / 結束邊緣)或**拉前置連結**時,確認視窗會先列出「⚠ 套用後,以下 N 個項目的『必須完成於』會跟前置依賴衝突」——把前置往後拖,害後面被釘住的項目排不下,在你按「確定」之前就看得到,不用等到套用之後。只列這次調整**新造成或變嚴重**的,原本就有的衝突不重複列;列出來只是警告,不會擋你。
        - 前置依賴排出來比約束早,只是有餘裕,不警示。批次修改、匯入、人員分配視窗造成的衝突不會跳視窗,但打開項目卡片仍看得到紅字。
- **總浮時 / 要徑**:這個項目最多可以延幾天而不影響整個專案;0 天代表在要徑上。
- **基準線**:與原始計畫相比延遲或提前幾天(建立基準線後才會出現)。
- **人員分配**:指派人員與投入百分比,會換算成工時與成本。
- **任務派遣人**與**任務派遣時間**:誰建立了這個項目、什麼時候建立(派遣)的——台灣時間、含年份,例如「2026/9/24 10:30」。「活動紀錄」分頁的最上面也寫著派遣人與派遣時間,就算這個項目還沒有任何修改紀錄也看得到。

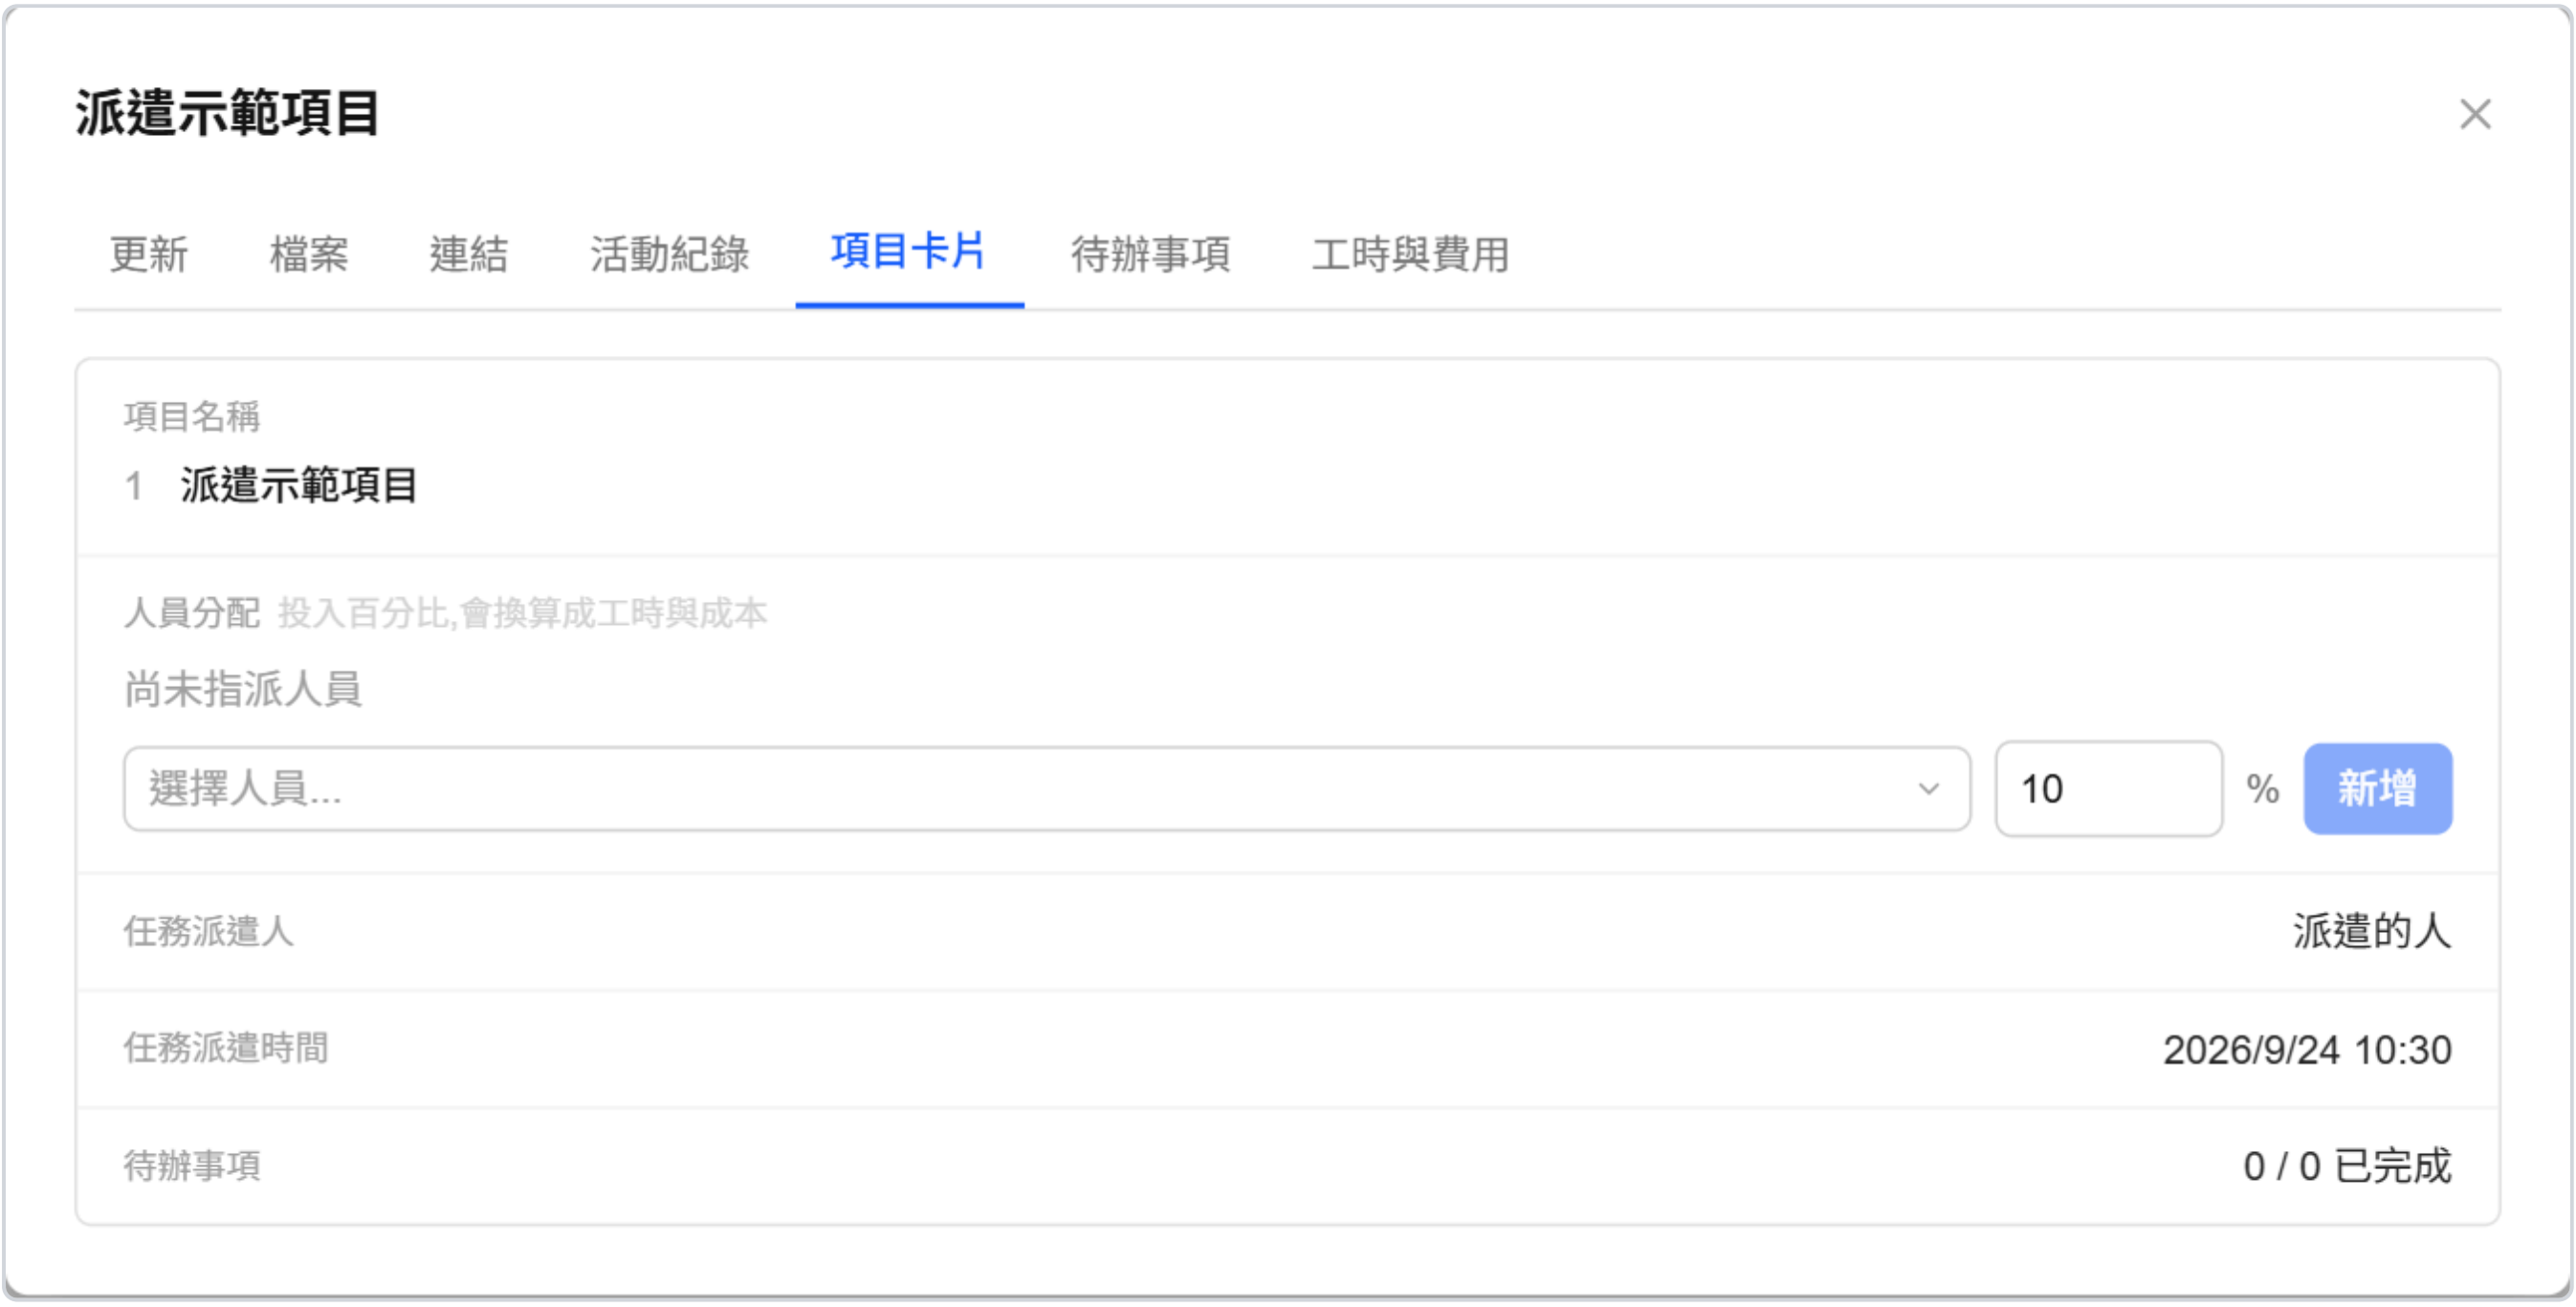

項目名稱
1 派遣示範項目

人員分配 投入百分比,會換算成工時與成本
尚未指派人員

10 %

任務派遣人 派遣的人
任務派遣時間 2026/9/24 10:30
待辦事項 0 / 0 已完成

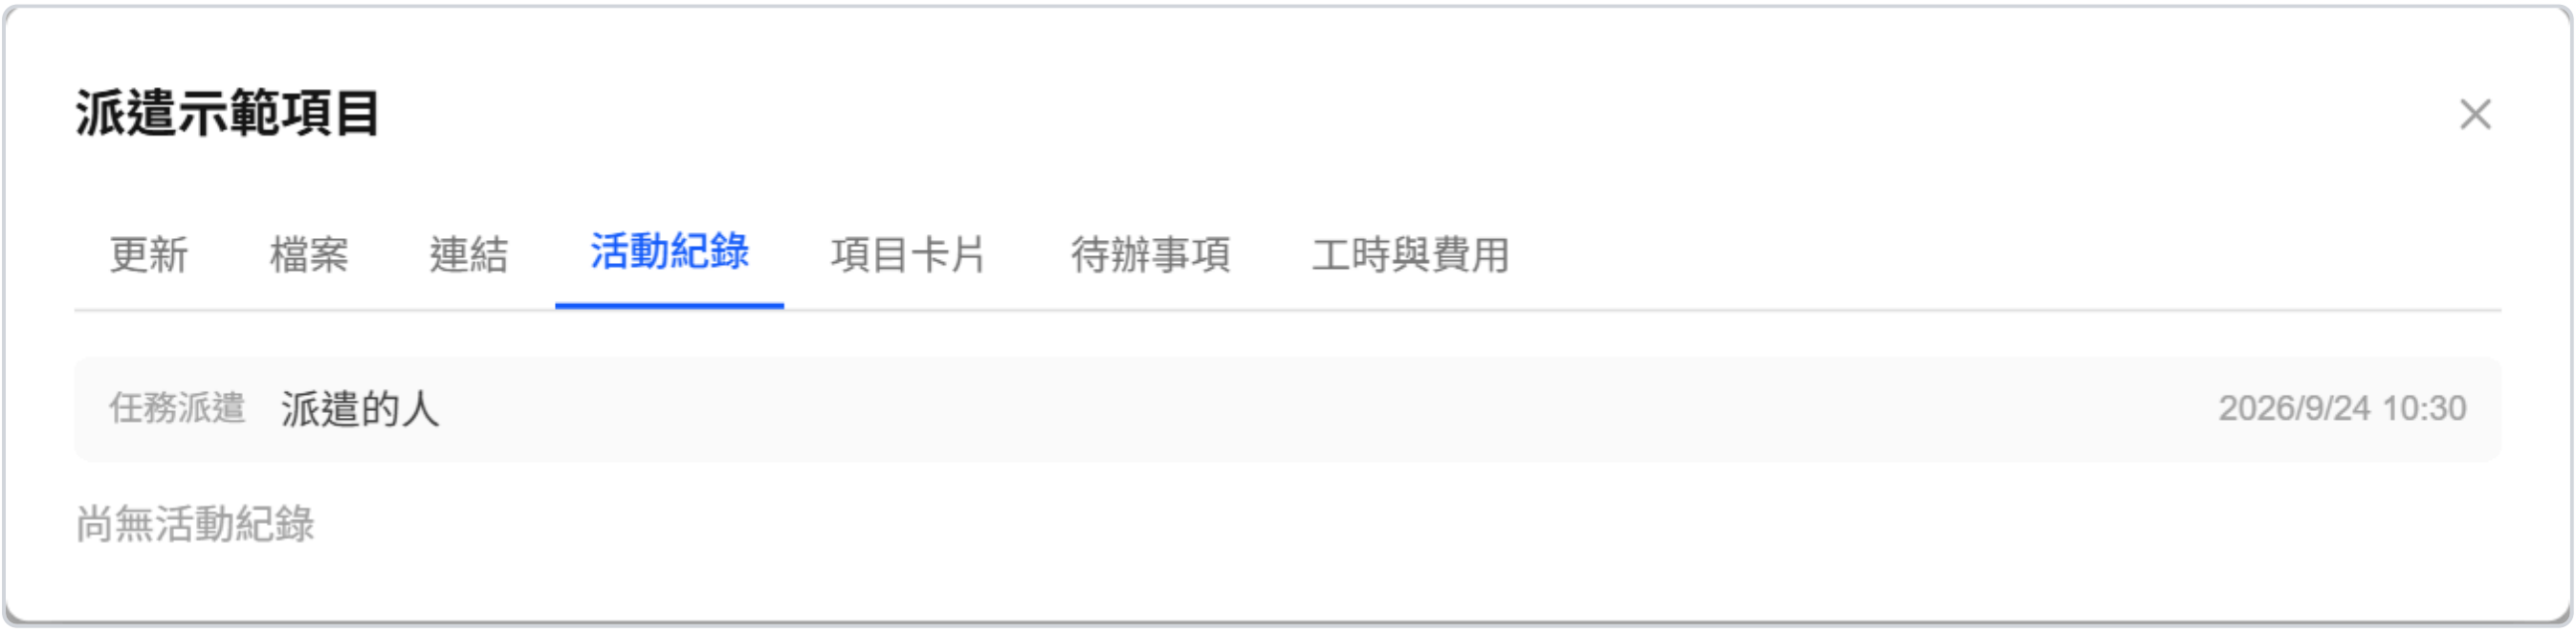

任務派遣 派遣的人 2026/9/24 10:30

尚無活動紀錄

6. 上一步 / 下一步

改錯了不必手動一個一個改回來。表格與甘特圖工具列都有兩顆按鈕:

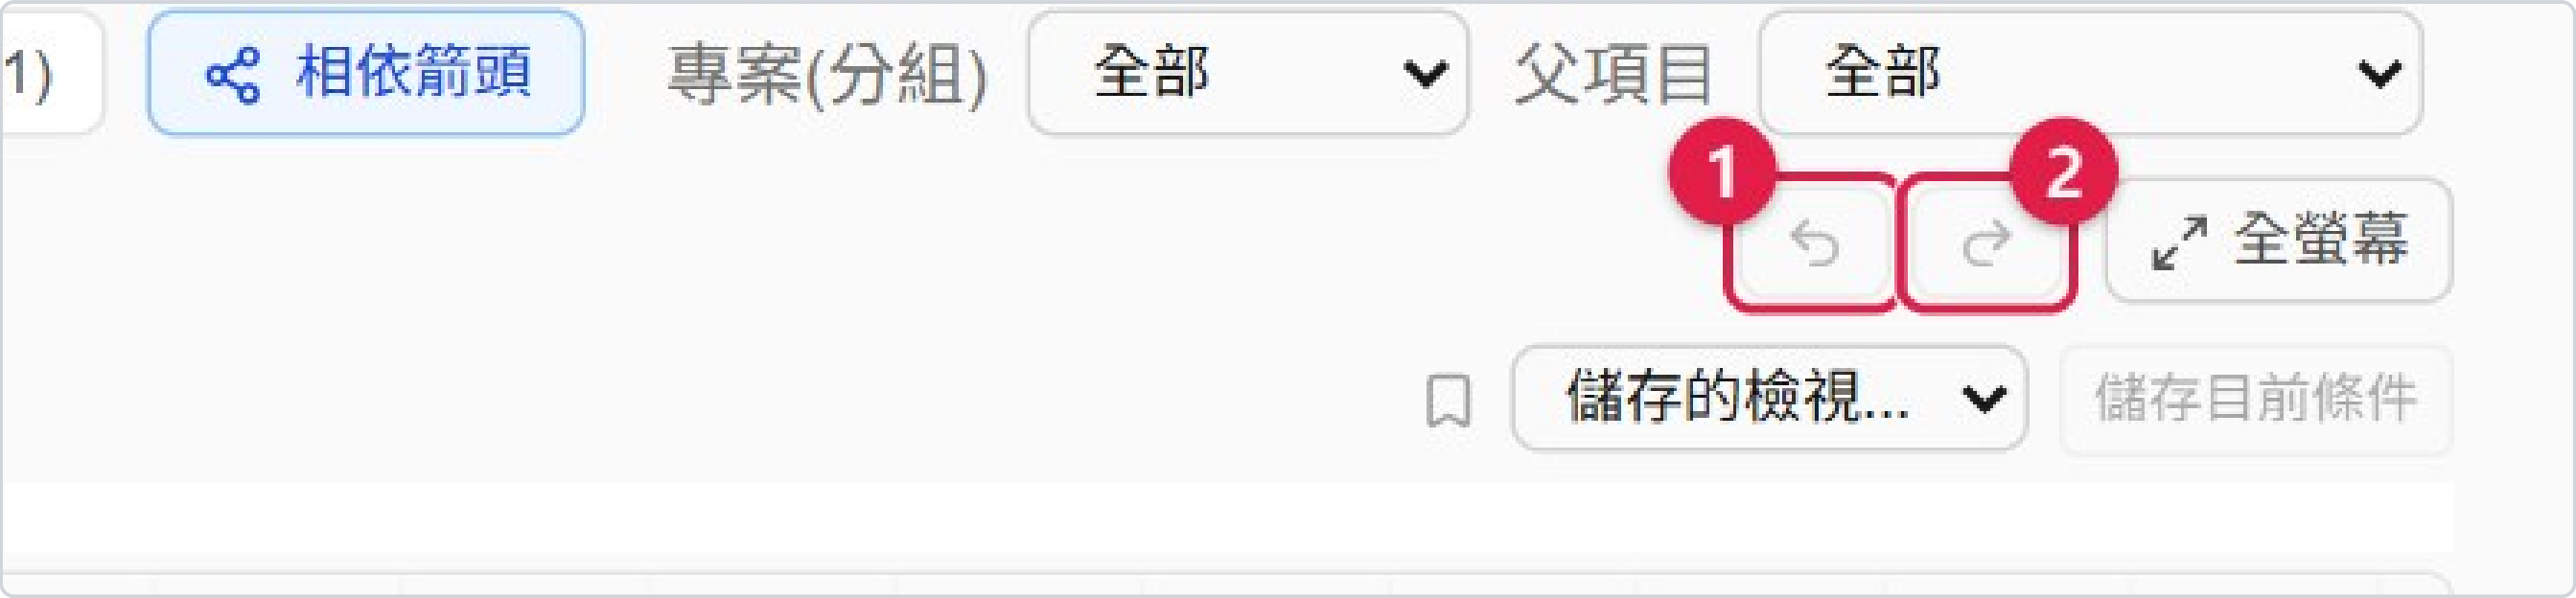

- **上一步**(復原)、**下一步**(重做)。按鈕停用(灰色)代表沒有可以復原的紀錄。滑鼠停在按鈕上會顯示是哪一個動作。
- 快捷鍵:**Ctrl + Z**(Mac 用 ⌘ + Z)上一步;**Ctrl + Y** 或 **Ctrl + Shift + Z** 下一步。游標在輸入框裡、或對話框開著時,快捷鍵不會觸發(輸入框自己的文字復原照常運作)。
- 三個視圖(表格、看板、甘特圖)**共用同一份紀錄**,切換視圖不會掉;最多保留 **50 步**。

可以復原的動作

類型	說明
儲存格修改	文字、數字、日期、人員、狀態、Pred,以及在看板視圖拖曳卡片換狀態
甘特圖日期	拖移整根長條、拉長或縮短長條(依賴它的項目會跟著重新排程)
拖曳搬移項目	表格與甘特圖裡拖曳改階層或順序
項目改名	在項目卡片改名稱

限制,請先知道

- 紀錄只存在**這次開著的畫面**:重新整理、換看板就清空。
- 新增、刪除、批次操作(包含批次取代名稱)、人員分配(指派人員與投入 %)、分組與欄位的修改**無法復原**。刪除的項目請從垃圾桶還原。
- 復原前,系統會先確認那個值**還是你當初改完的值**。如果期間別人(或別的分頁)又改過,會跳出「無法復原」並擋下來,不會蓋掉別人的修改。
- 復原也會再發一次通知,被指派的人可能多收到一則「已更新」。若狀態改變曾觸發自動化規則,復原只會把狀態改回去,不會反轉自動化做的事。

7. 勾選後批次操作:複製、移動、取代名稱、刪除

表格與甘特圖每一列前面都有**勾選框**。勾選一個或多個項目後,上方會出現操作列:

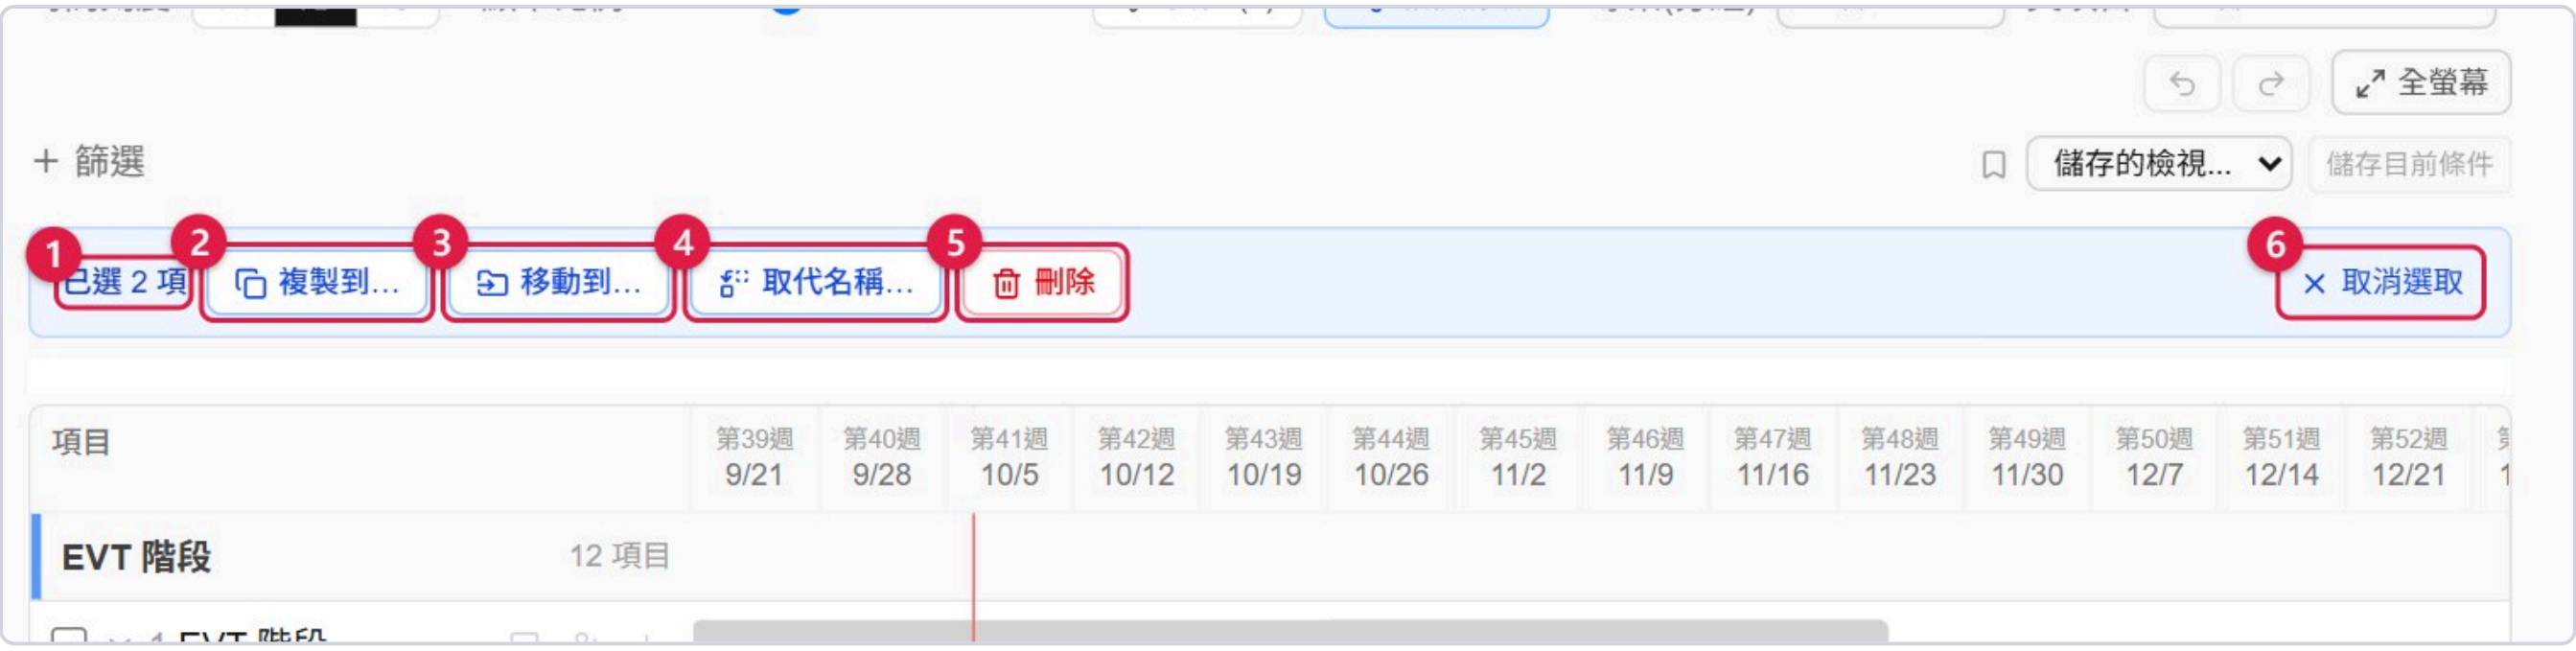
全螢幕
+ 篩選
儲存的檢視...
儲存目前條件
1
已選 2 項
2
複製到...
3
移動到...
4
取代名稱...
5
刪除
6
× 取消選取
項目
第39週 9/21
第40週 9/28
第41週 10/5
第42週 10/12
第43週 10/19
第44週 10/26
第45週 11/2
第46週 11/9
第47週 11/16
第48週 11/23
第49週 11/30
第50週 12/7
第51週 12/14
第52週 12/21
EVT 階段
12 項目

編號	功能
① 已選 N 項	括號內會標出連同子項目一共幾項
② 複製到...	複製到指定的父項目底下
③ 移動到...	搬到指定的父項目底下,並決定位置
④ 取代名稱...	把勾選項目名稱裡的某個字樣,統一換成別的字樣
⑤ 刪除	移到垃圾桶
⑥ 取消選取	清除勾選

重點規則:複製、移動、刪除:勾選一個父項,它底下的**所有子項目會一起被處理**。如果父項和它的子項都被勾選,只算父項(不會複製兩份)。**取代名稱例外**,只改打勾的項目本身(見 7.3)。**父項被收成一行時**(底下的子項看不到),勾它會**連所有子項一起勾起來**,取消勾選也是整個子樹一起取消,所以取代名稱也會一起改到那些子項;父項**展開**著時只勾它自己,子項各自勾。表格視圖的操作列除了這幾個,還保留原本的批次設定狀態、人員欄位、與「推移 N 天」。表格裡的複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除只有管理者與主管看得到;只有分組負責角色的人(例如 Team Leader)請在**甘特圖**操作,系統會再逐個分組檢查權限。

7.1 複製

按「複製到...」:

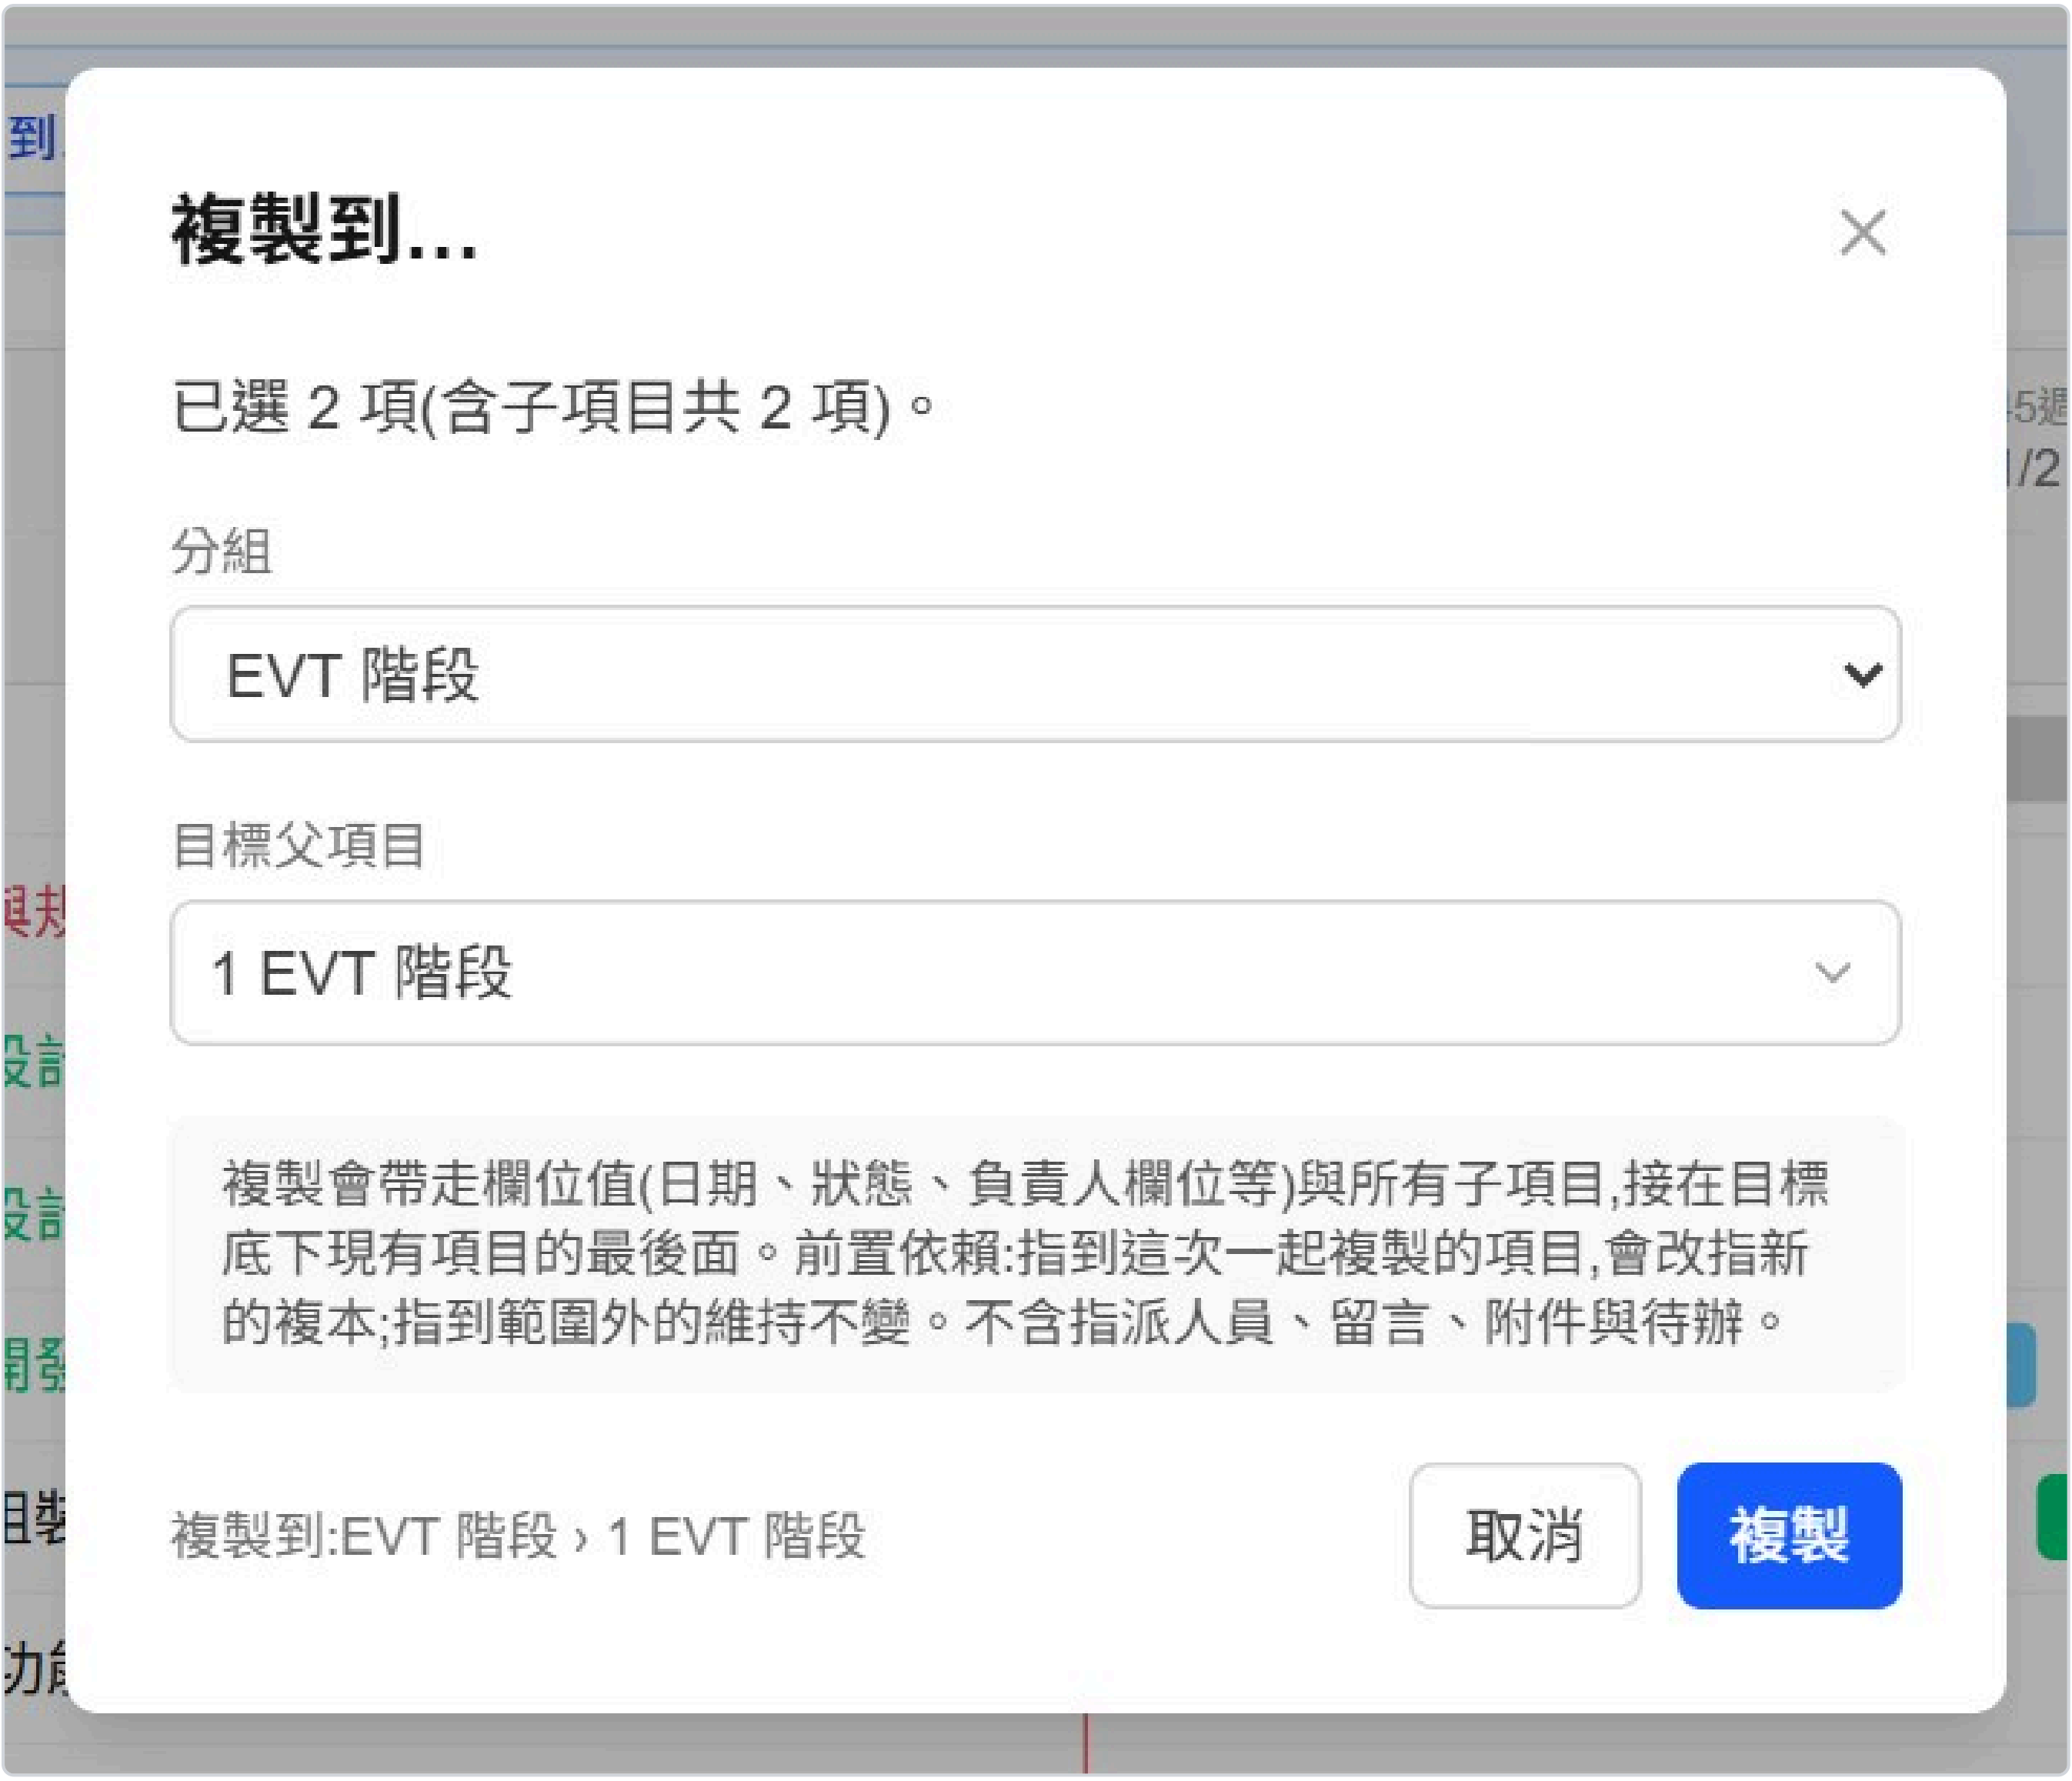

複製到...

已選 2 項(含子項目共 2 項)。

分組: EVT 階段

目標父項目: 1 EVT 階段

複製會帶走欄位值(日期、狀態、負責人欄位等)與所有子項目,接在目標底下現有項目的最後面。前置依賴:指到這次一起複製的項目,會改指新的複本;指到範圍外的維持不變。不含指派人員、留言、附件與待辦。

複製到:EVT 階段 › 1 EVT 階段

1. 選擇**看板**(預設是目前這個看板;也可以選別的看板,見 7.5),再選**分組**。
2. 選擇**目標父項目**;留空代表放在該分組最上層。同一個看板內,被選的項目與它們的子項目不能當目標。
3. 按「複製」。

複製的內容:

- 項目名稱、階層、所有**欄位值**(日期、天數、狀態、優先度、負責人欄位等);Lvl 依新位置自動調整。
- 日期約束、直接費用預算。
- **前置依賴(Pred)**:指到「這次一起複製」的項目,會改指它們的複本(複本之間的先後關係保持原樣);指到範圍外的項目維持不變(複本和原件等同一個前置)。每一條依賴自己的關聯類型與 Lag 都保留。
- 目標父項會自動變成 Summary。

不會複製:指派人員(人員分配)、留言、附件、連結、待辦、工時。你看不到的私人子項目也不會被複製。

複製整批在同一個交易裡完成,失敗就什麼都不會建立。複製出來的項目名稱和原件一樣。

7.2 移動,並決定位置

按「移動到...」:

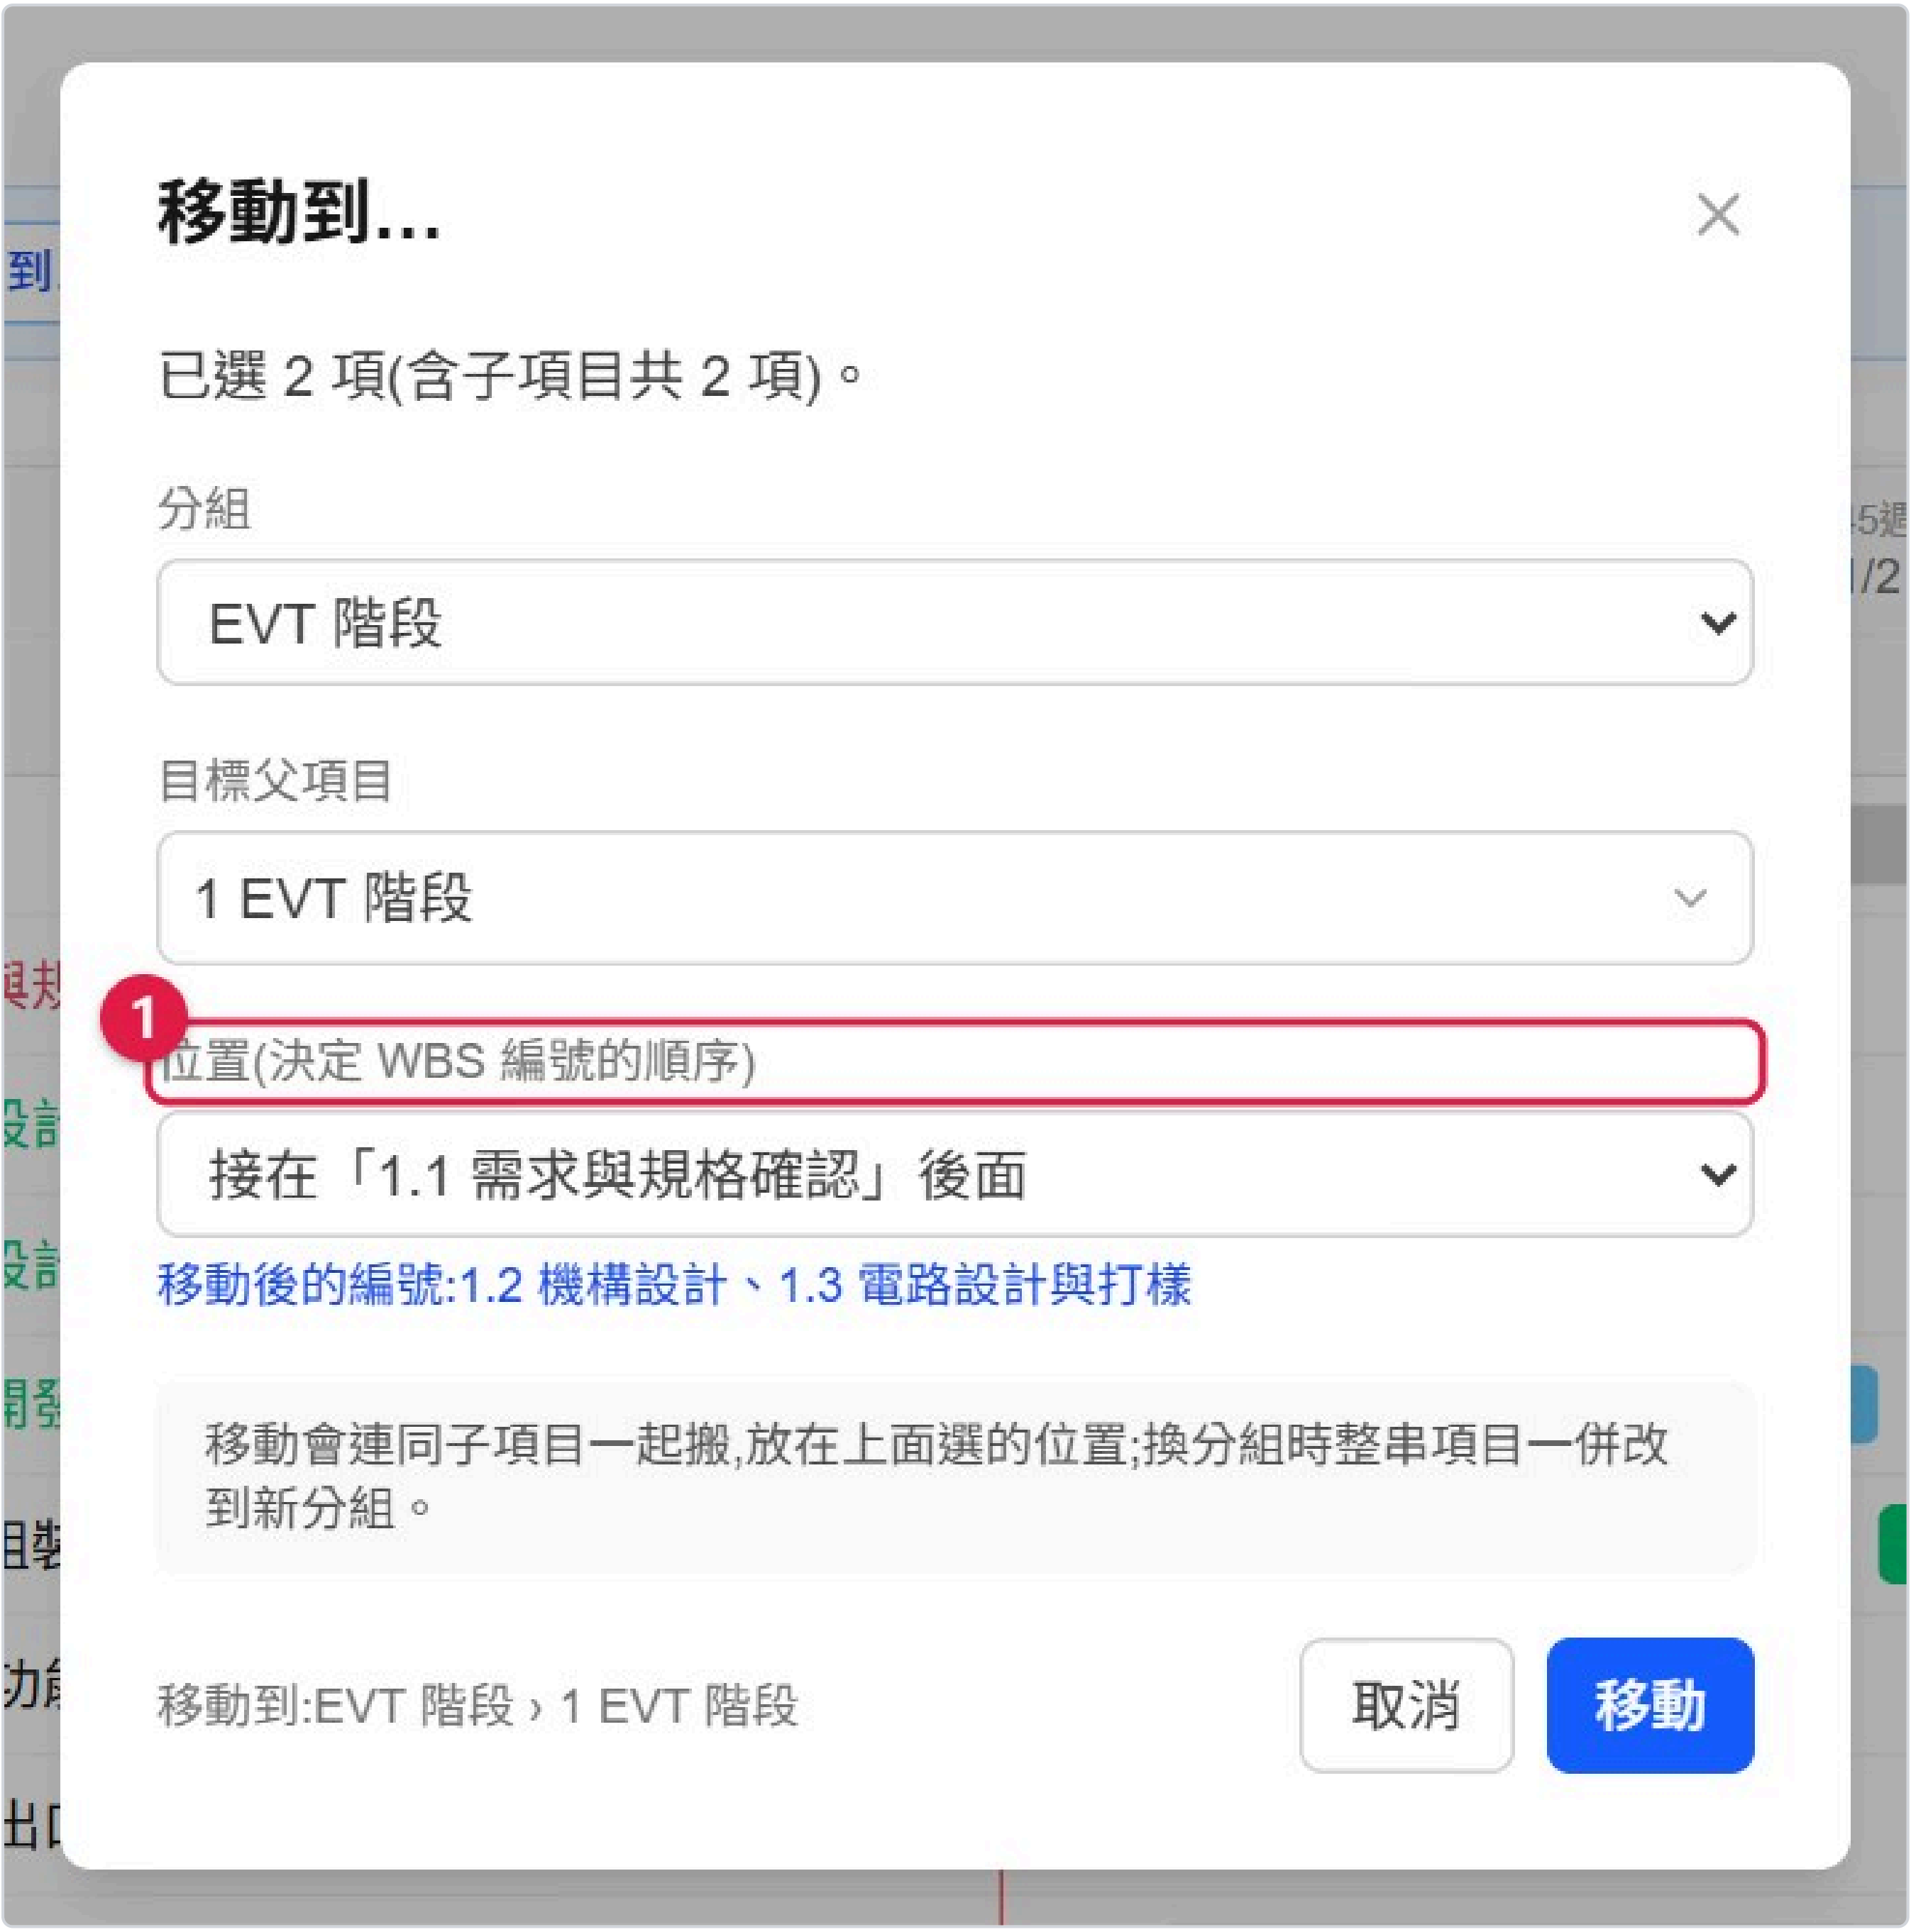

已選 2 項(含子項目共 2 項)。

分組: EVT 階段

目標父項目: 1 EVT 階段

位置(決定 WBS 編號的順序): 接在「1.1 需求與規格確認」後面

移動後的編號:1.2 機構設計、1.3 電路設計與打樣

移動會連同子項目一起搬,放在上面選的位置;換分組時整串項目一併改到新分組。

移動到:EVT 階段 › 1 EVT 階段

1. 選擇分組與目標父項目(同複製)。
2. **位置**(決定新的 WBS 編號順序):
    - 放在最後面(預設)
    - 放在最前面
    - 接在「某個項目」後面 —— 清單是目標底下現有的項目(扣掉被搬的)。
3. 選擇之後,視窗會即時顯示**移動後的編號**(藍字),例如「1.2 機構設計、1.3 電路設計與打樣」。
4. 按「移動」。

也可以用來在**同一個父項底下重新排序**:目標選原本的父項,再挑位置。

- 換分組時,整串子項目一起改到新分組;Lvl、Type=Summary、舊父項的順序都會一併處理。搬空的舊父項會還原成原本的 Type。

- 舊匯入留下的「WBS 編號式」前置依賴,會在跨分組搬移前先轉成固定的項目參照,不會因為搬走而指錯人。
- 搬出去的**來源分組**也需要結構權限。

7.3 取代名稱

按「取代名稱…」:

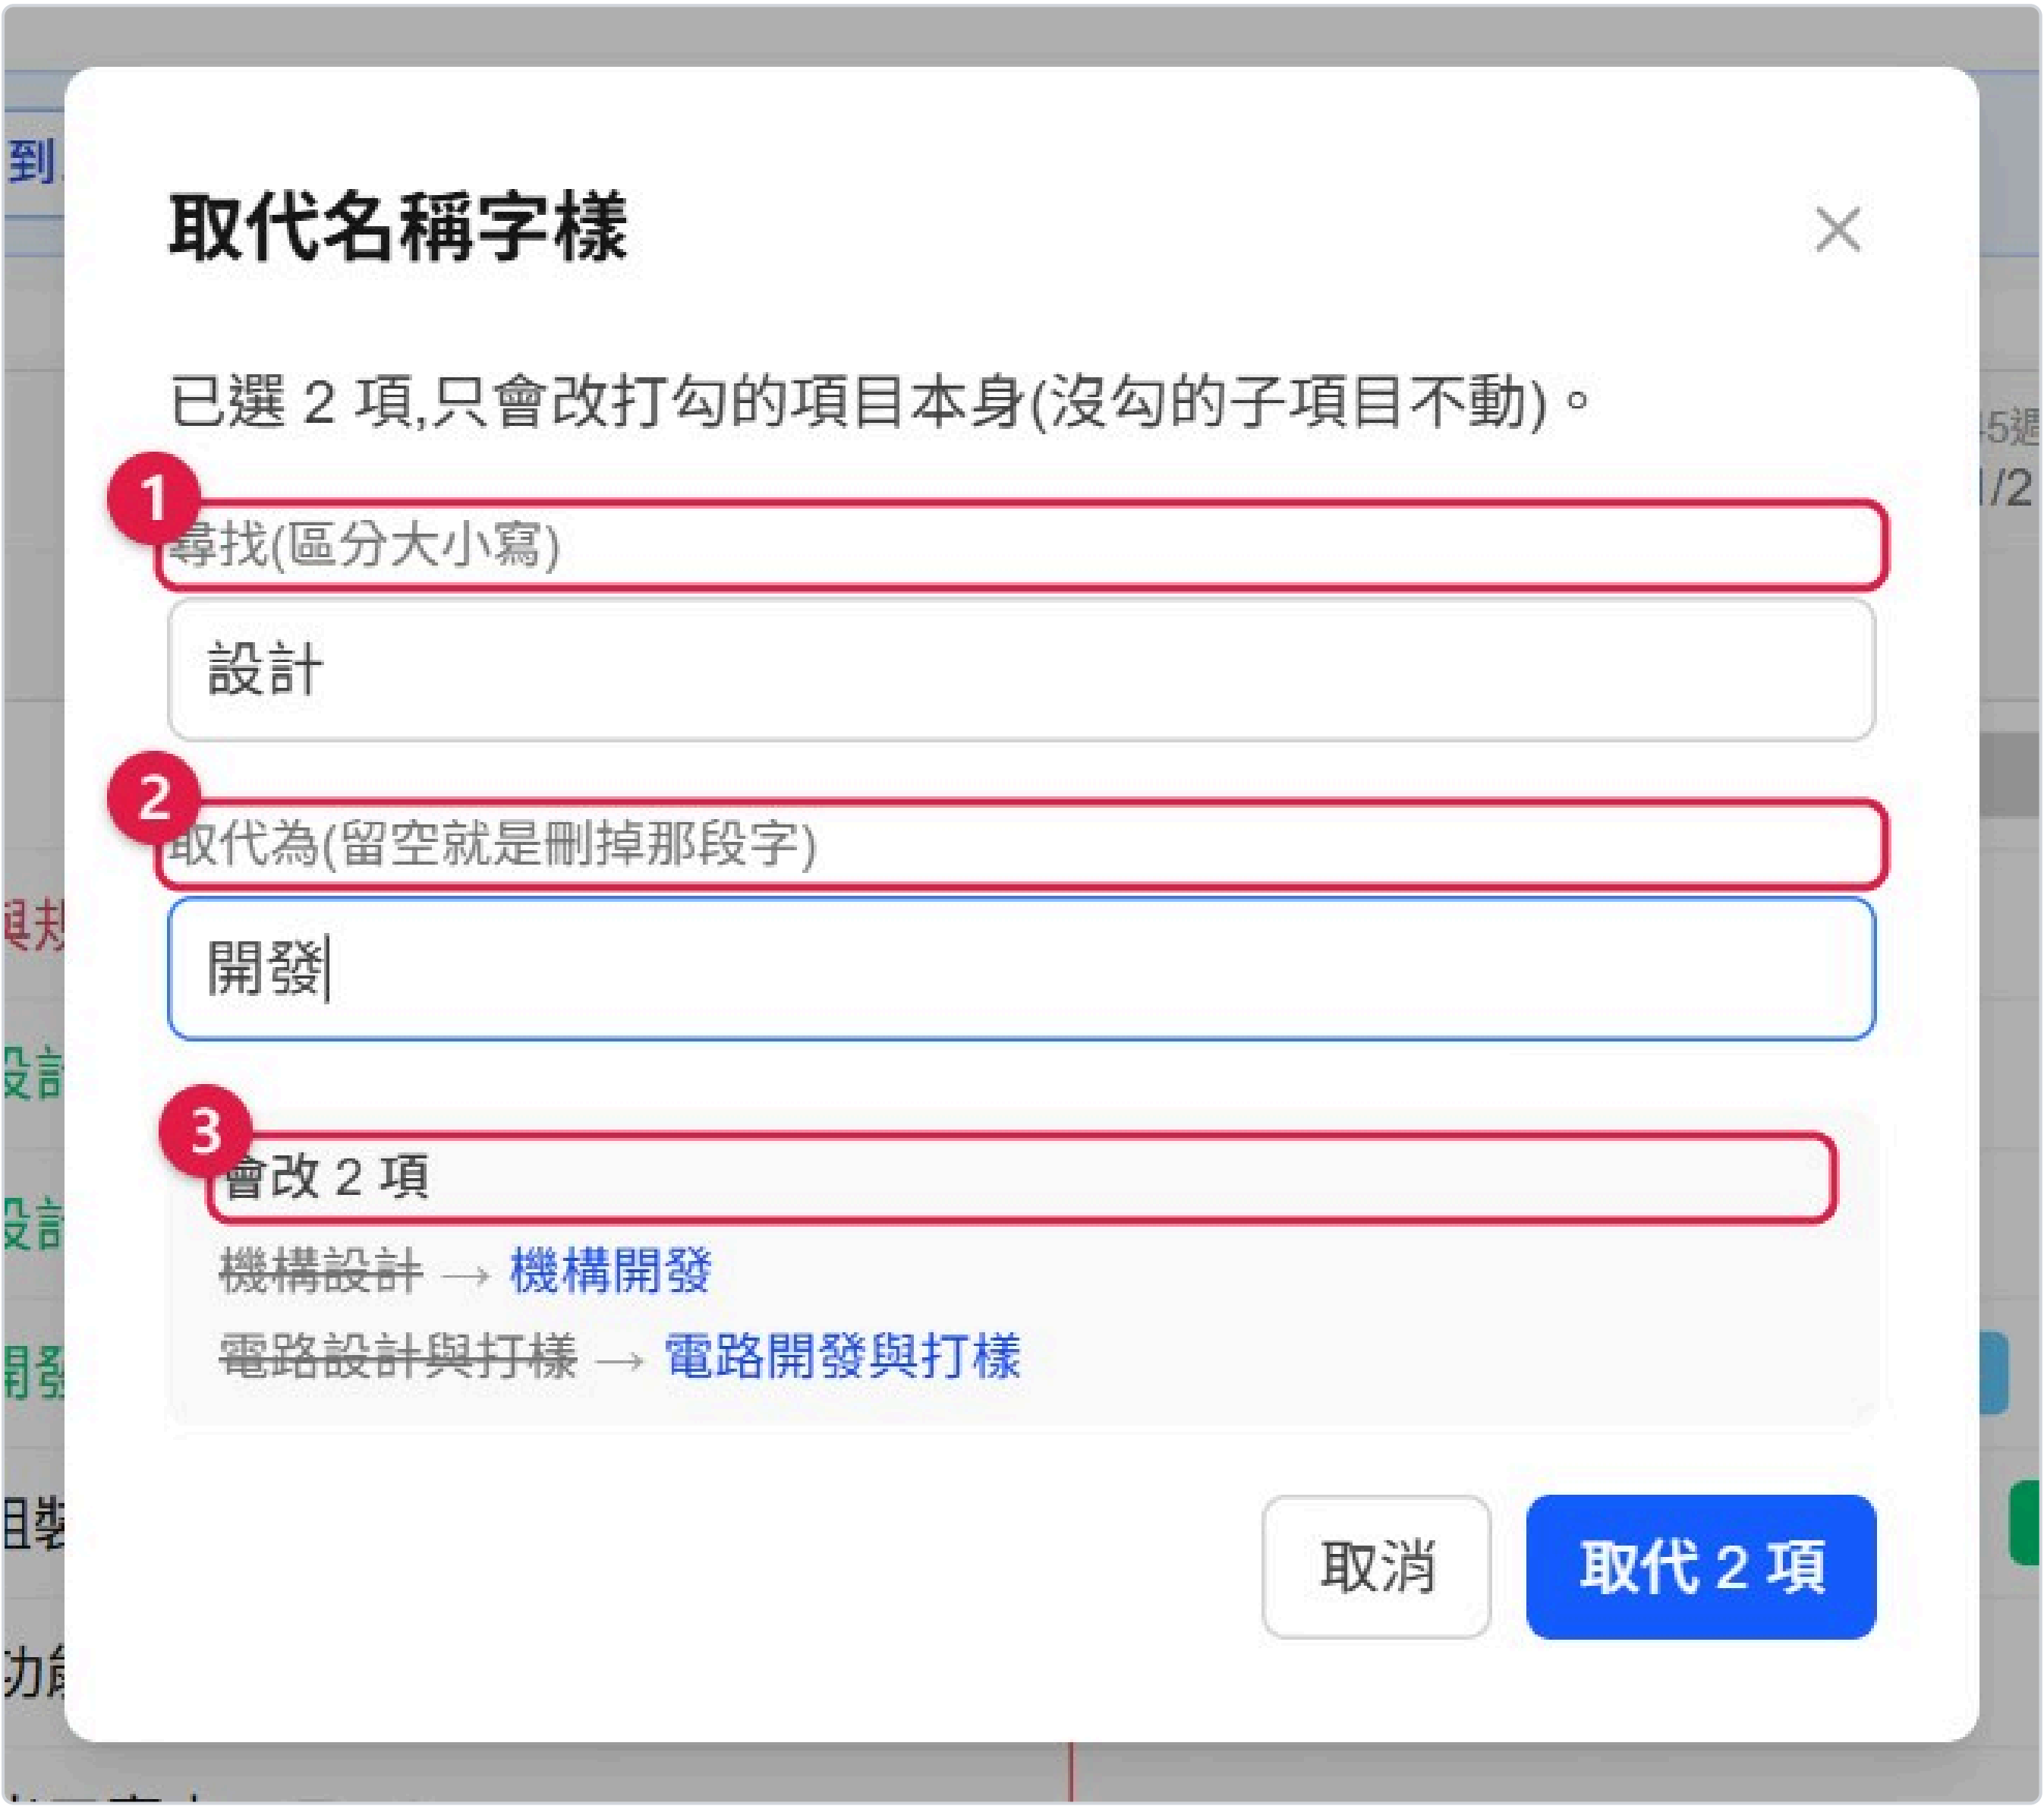

取代名稱字樣

已選 2 項,只會改打勾的項目本身(沒勾的子項目不動)。

尋找(區分大小寫): 設計

取代為(留空就是刪掉那段字): 開發

會改 2 項

~~機構設計~~ → 機構開發

~~電路設計與打樣~~ → 電路開發與打樣

1. **尋找**:要換掉的字樣。
2. **取代為**:換成什麼;**留空**就是把那段字刪掉。
3. 下方即時列出每個項目改完的名稱(舊名稱劃線 → 新名稱),以及「會改 N 項」、有幾項沒有這段字樣。確認後按「取代 N 項」。

規則:

- **只改打勾的項目本身**,不會連帶改沒勾的子項目(這點和複製、移動、刪除不同)。想改整串,請把子項目也一起勾起來。
- 照字面比對,**區分大小寫**。「.」「(」「$」這些符號都當一般文字,不是規則運算式。

- 名稱裡出現幾次就換幾次,例如把「PoC」換成「POC」,「PoC-1 spec / PoC-1 review」兩處都會換。
- 取代之後名稱會變成空白的項目會**略過**(不會被改成「未命名項目」),預覽裡會註明。
- 需要結構權限(管理者、主管,或該分組的負責角色)。勾選的項目涉及的分組只要有一個沒權限,整批都不會改。
- 每個被改的項目,項目卡片的「活動紀錄」分頁會留下一筆「項目名稱從...改為...」。
- 這個動作**不能用「上一步」還原**(批次操作不支援復原)。取代錯了,把「尋找」與「取代為」對調再做一次,通常就能改回來。

7.4 刪除

按「刪除」,會先列出要刪的項目;若有**其他**工作項以它們為前置依賴,會列出受影響的項目,並讓你選:

- **改為參照被刪項目的前置**(讓後面的工作接上前一個),或
- **清空它們的前置**(它們會停在目前算出來的時間,系統會提醒你補上排程規則)。

刪除是移到**垃圾桶**,不是永久刪除,可以還原(見 15.6)。刪除項目限管理者,或主管**自己建立的**項目;沒有權限刪的項目會被略過並列出來。

7.5 複製、移動到別的看板

「複製到...」「移動到...」的第一個下拉是**看板**:選別的看板之後,分組與目標父項目改成那個看板的。清單只列你**可以新增項目**的看板(管理者、主管,或該分組的負責角色)。跨看板一律**接在目標底下現有項目的最後面**,不能選位置。

兩個看板的欄位各自獨立,所以:

- **欄位值依「欄位名稱 + 類型」對應**:目標看板有同名、同類型的欄位(例如 Start、Days、Status、負責人)就帶過去;狀態、優先度這類選項依**選項名稱**對應。目標看板對不上的欄位值,或找不到同名選項的狀態,會**略過**,完成後的訊息會告訴你略過了哪些。
- **前置依賴只保留這次一起處理的項目之間的**,指到範圍外的會清掉(跨看板的依賴不能單獨存在)。
- Lvl、Type=Summary 依目標位置重算。

跨看板複製:同 7.1,不含指派人員、留言、附件、連結、待辦、工時;原看板的項目不動。

跨看板移動是**真的搬過去**:項目連同子項目改成屬於目標看板(項目本身不變),**留言、附件、連結、待辦、工時、更新記錄、指派都跟著走**。綁在原看板的東西搬不走,處理方式如下:

- 有**已下單、支出、預算紀錄**,或**對應了預算階段**的項目:**直接擋下**,訊息會點名是哪些項目;請先處理,或改用「複製到...」。
- **樣機使用紀錄**(指到原看板的樣機):清掉。
- 原看板**別的項目**的前置依賴指到被搬走的項目:清掉,它們的日期照剩下的規則重算。
- 搬的人與原看板的分組都需要**結構權限**(同 7.2)。

跨看板的複製與移動**不能用「上一步」還原**。移動錯了,可以再從目標看板搬回來(欄位值會再依名稱對應一次)。

8. 看板(Kanban)視圖

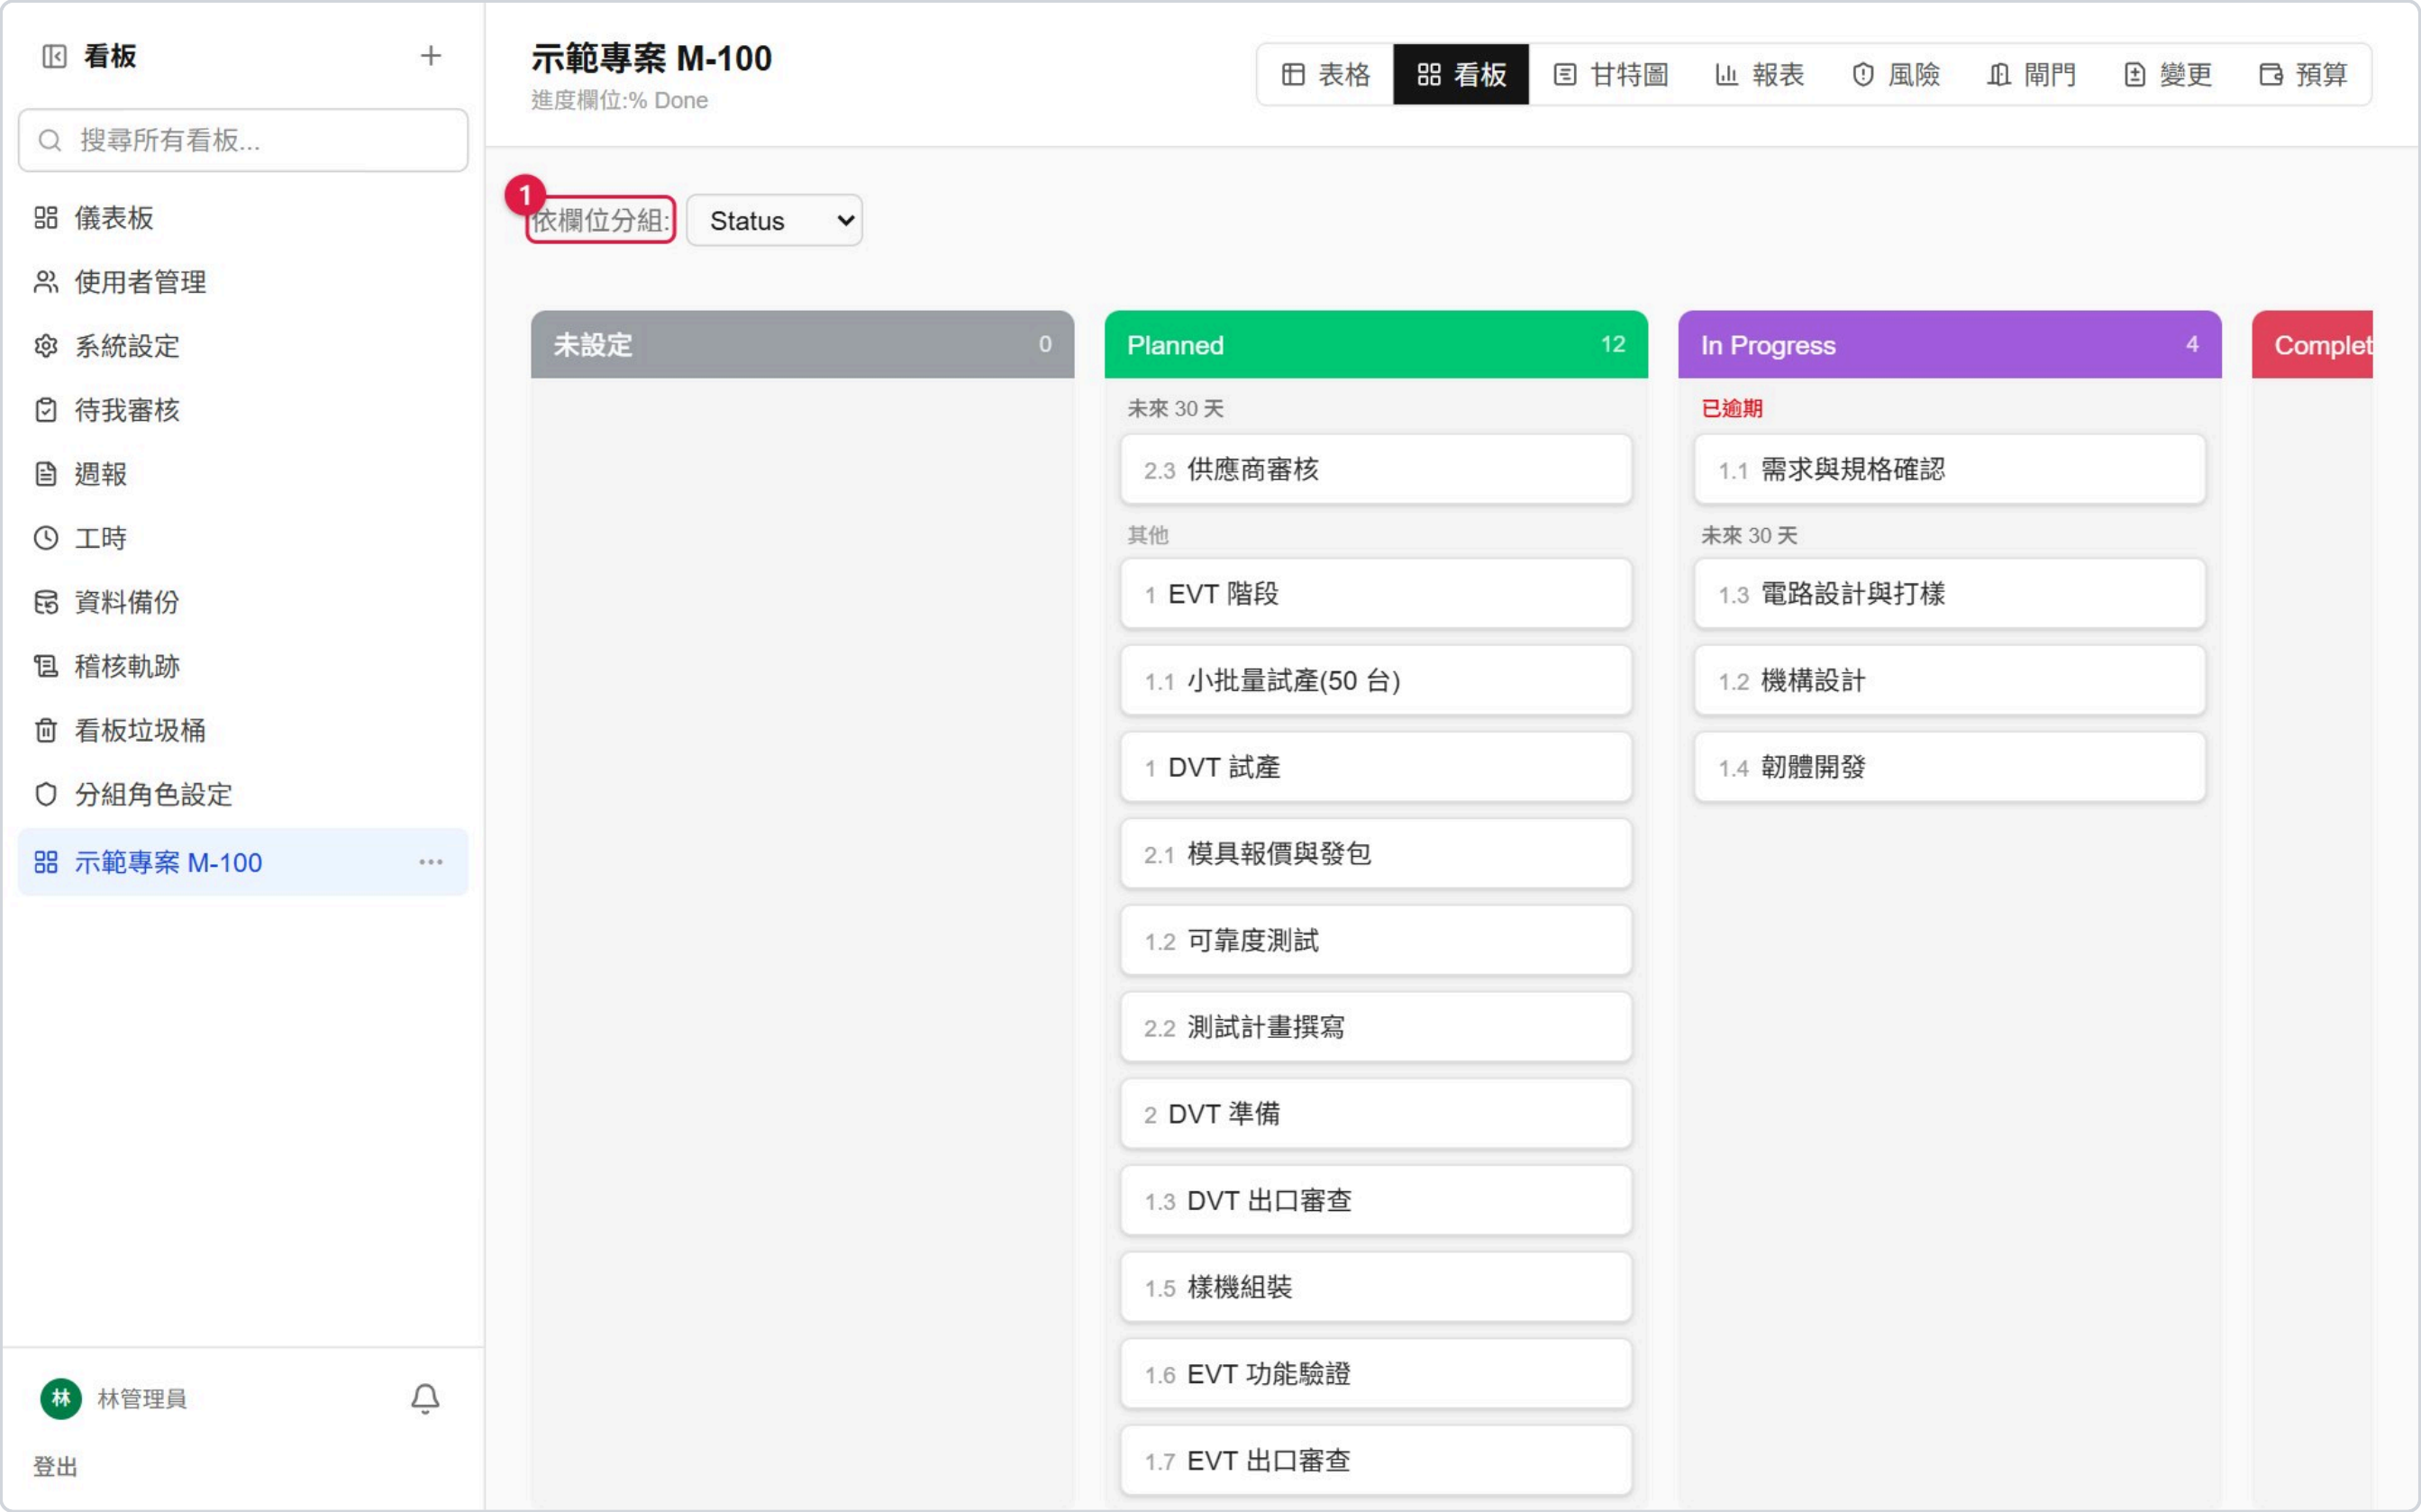
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
示範專案 M-100
林管理員
登出
示範專案 M-100
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
1
依欄位分組:
Status
未設定 0
Planned 12
未來 30 天
2.3 供應商審核
其他
1 EVT 階段
1.1 小批量試產(50 台)
1 DVT 試產
2.1 模具報價與發包
1.2 可靠度測試
2.2 測試計畫撰寫
2 DVT 準備
1.3 DVT 出口審查
1.5 樣機組裝
1.6 EVT 功能驗證
1.7 EVT 出口審查
In Progress 4
已逾期
1.1 需求與規格確認
未來 30 天
1.3 電路設計與打樣
1.2 機構設計
1.4 韌體開發
Complet

- 上方「**依欄位分組**」選一個狀態欄位(例如 Status),每個選項成為一欄;也可以選「**到期時間**」,分成「已逾期 / 本週完成 / 未來 7 天 / 未來 30 天」。
- **拖曳卡片**到另一欄,就是把那個項目的狀態改成該欄(會被記進「上一步」)。
- 點卡片開啟項目卡片。
- 主管可以用「我的團隊 / 全部」切換只看團隊的項目或全部;「我的團隊」是**主管自己加上所有部屬**(沒有部屬的主管,看到的就是自己負責的項目)。**副主管**(組織架構圖上勾了「可代簽」的人,見 21.1b)的「我的團隊」是**自己加上他擔任副主管的那個部門的人**(部門成員,加上底下子部門的主管與成員,**不含部門主管本人**);副主管沒有「全部」可以切換(一般成員本來就只看得到自己的項目,副主管多看到團隊)。

9. 甘特圖

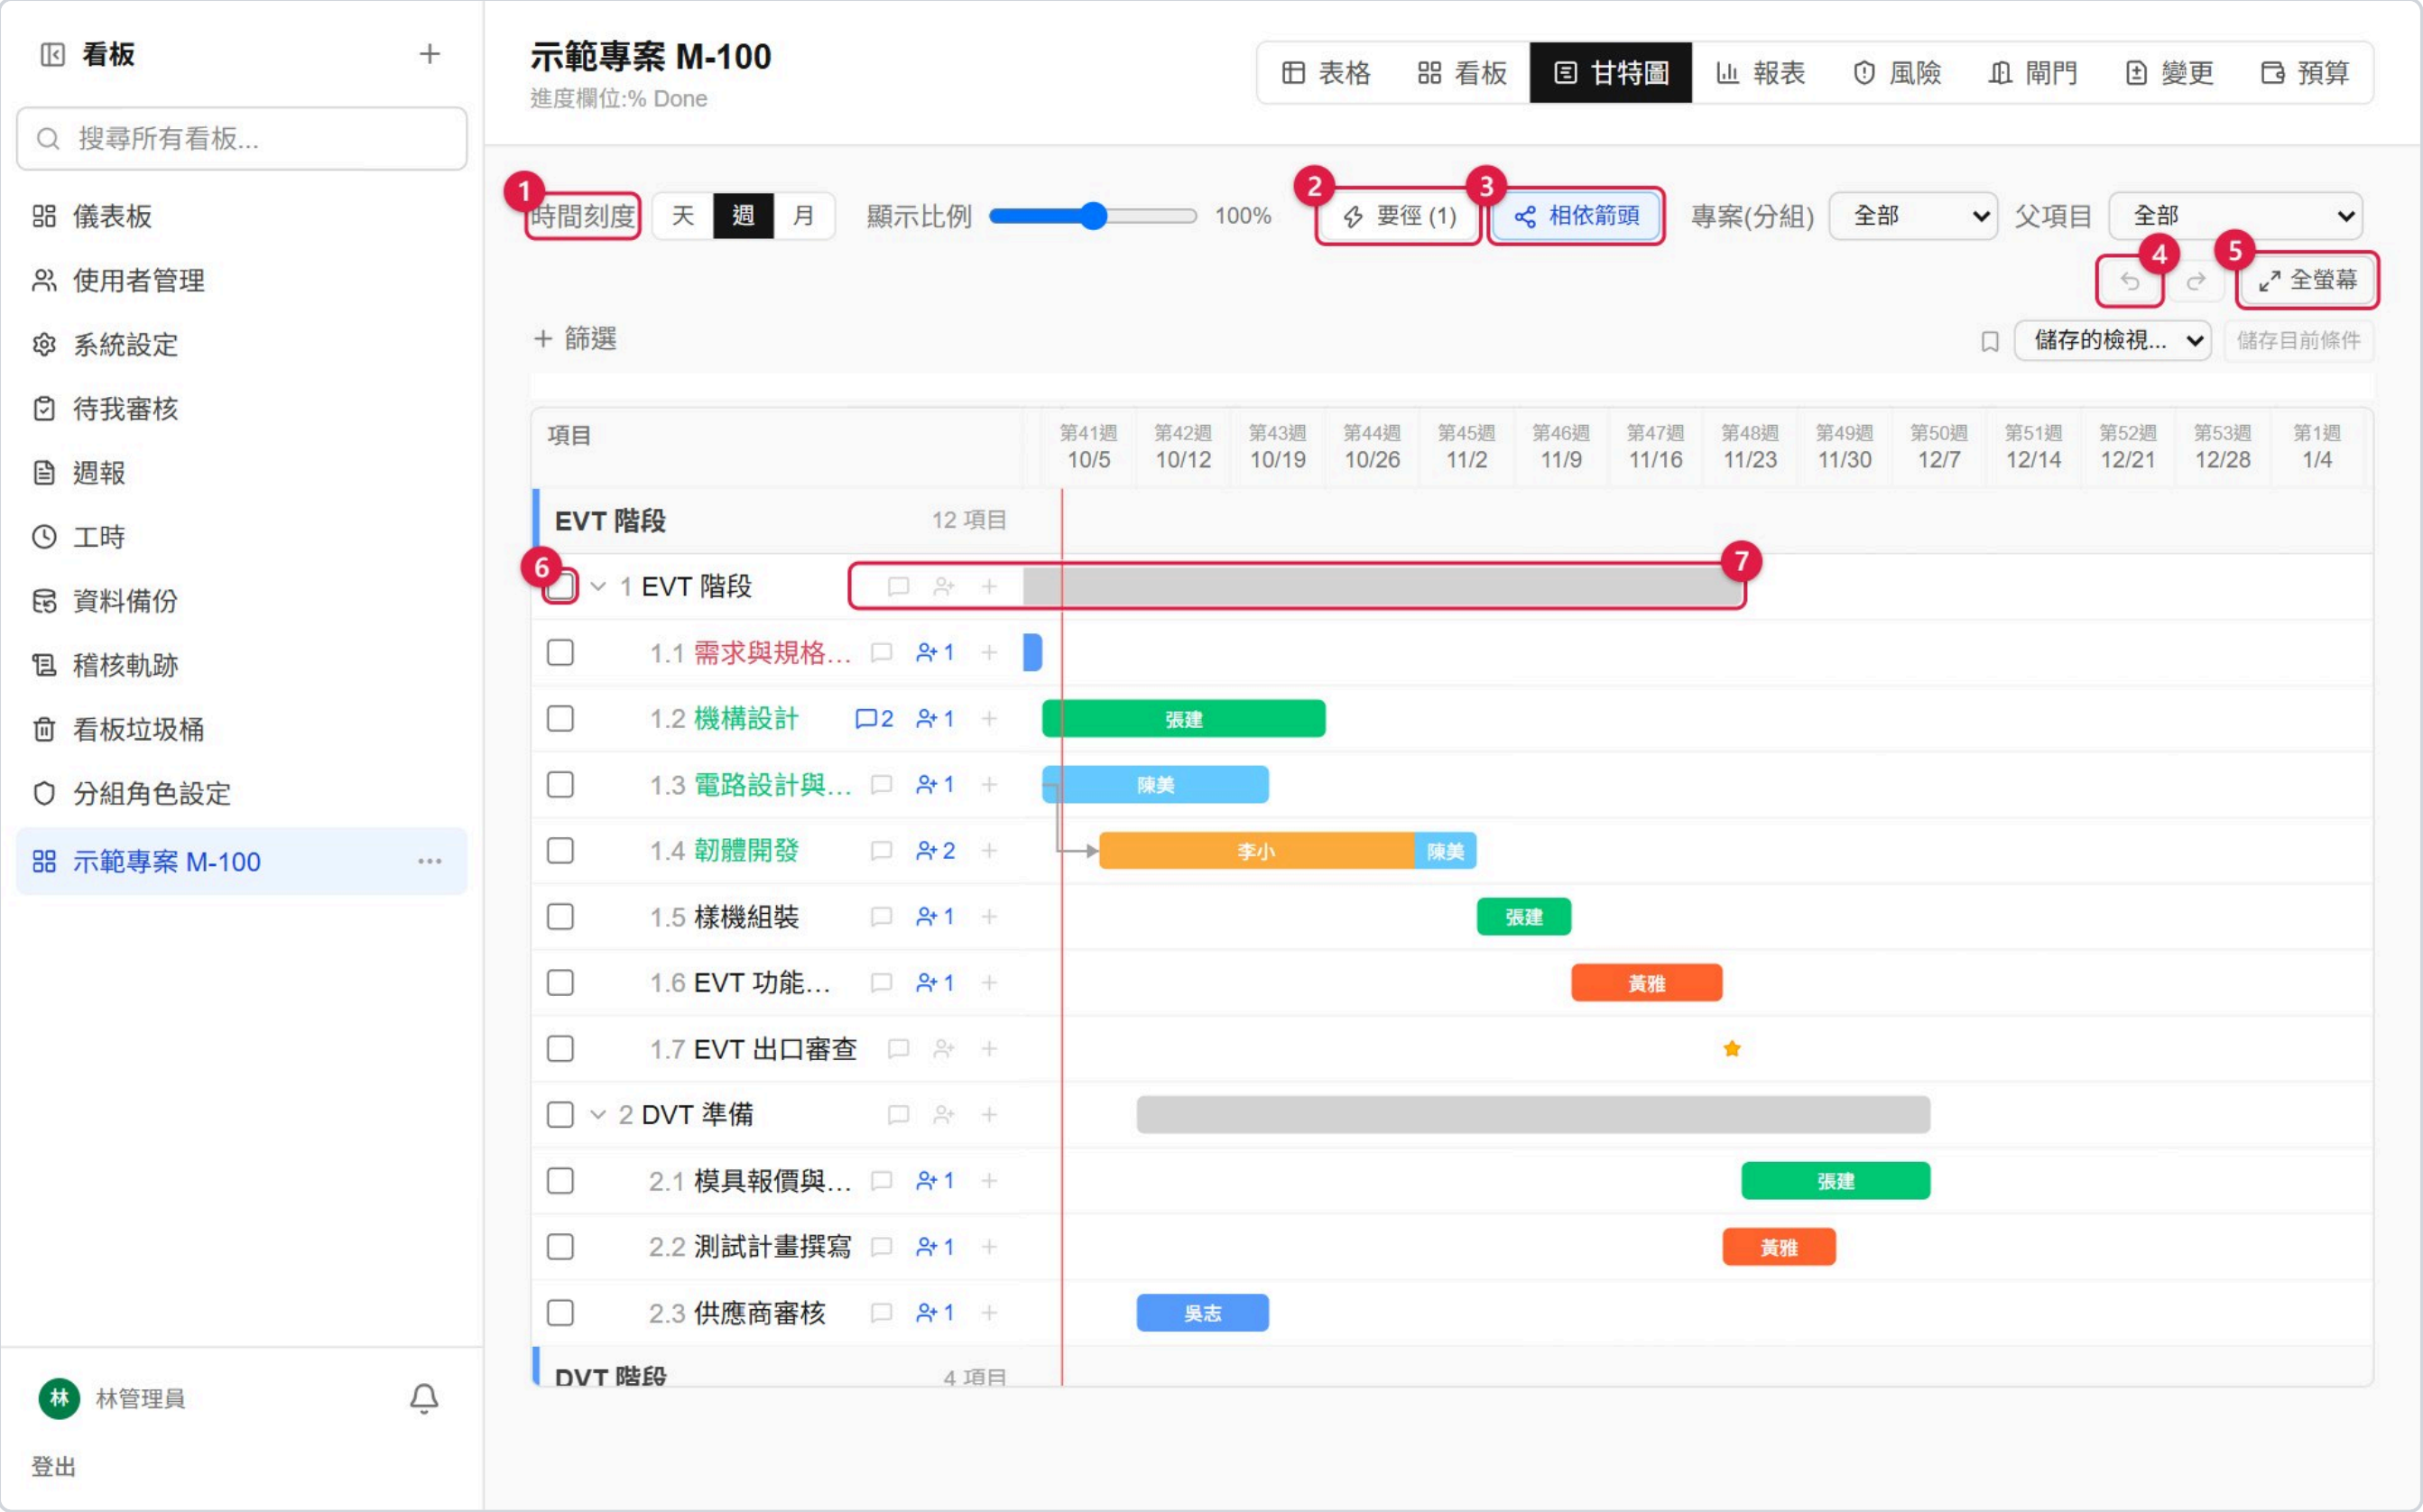
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
示範專案 M-100
林管理員
登出
示範專案 M-100
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
1
時間刻度
天
週
月
顯示比例
100%
2
要徑 (1)
3
相依箭頭
專案(分組)
全部
父項目
全部
4
5
全螢幕
+ 篩選
儲存的檢視...
儲存目前條件
項目
第41週 10/5
第42週 10/12
第43週 10/19
第44週 10/26
第45週 11/2
第46週 11/9
第47週 11/16
第48週 11/23
第49週 11/30
第50週 12/7
第51週 12/14
第52週 12/21
第53週 12/28
第1週 1/4
EVT 階段
12 項目
6
1 EVT 階段
7
1.1 需求與規格...
1.2 機構設計
1.3 電路設計與...
1.4 韌體開發
1.5 樣機組裝
1.6 EVT 功能...
1.7 EVT 出口審查
2 DVT 準備
2.1 模具報價與...
2.2 測試計畫撰寫
2.3 供應商審核
DVT 階段
4 項目
張建
陳美
李小
陳美
張建
黃雅
張建
黃雅
吳志

9.1 工具列

編號	功能
① 時間刻度	天 / 週 / 月
② 要徑	標出「延一天整個專案就延一天」的項目(總浮時為 0)
③ 相依箭頭	在長條之間畫出前置依賴的箭頭;點箭頭可以修改或刪除那條連結(見 9.5.1)
③b 建立連結	管理者、主管才有:在甘特圖上建立前置連結(見 9.5.1)
③c 顯示狀態	勾選框,**預設開啟**:在項目名稱旁用小字標出狀態(例如 Planned、In Progress、Completed),顏色與 Status 欄上設定的一致;取消勾選就只剩名稱。**點標籤可以直接換狀態**(跟表格的 Status 欄同一份資料、同樣的權限:管理者與主管任何項目都能換,其他人只有指派給自己或同分組同職能組員的項目,沒有權限的人只看得到標籤)。看板沒有 Status 欄時不會出現這個勾選框
④ 上一步 / 下一步	見第 6 章

編號	功能
⑤ 全螢幕	擴大成整個螢幕,按「退出全螢幕」回來
⑥ 勾選框	勾選後批次複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除(第 7 章)
⑦ 長條	見下

另有「顯示比例」滑桿、「專案(分組)」與「父項目」篩選、「+ 篩選」與「儲存的檢視」(與表格相同)。

- **搜尋項目名稱**:「父項目」旁邊的搜尋欄,輸入名稱的一部分(不分大小寫)就只留下名稱符合的項目,**連同它們的上層**一起顯示,這樣在階層裡才看得出位置;旁邊寫有幾個項目符合。**搜尋中不管收合**——符合的項目就算藏在收合著的上層底下也找得到,清掉搜尋就恢復原本收合的樣子。搜尋可以跟分組、父項目、「+ 篩選」一起用,也會存進「儲存的檢視」(跟表格的搜尋是同一個檢視設定)。

9.2 怎麼看長條

- **顏色**依指派的人區分,多人共同做的會分成幾段;長條上顯示人員姓名的前兩個字。
- **灰色長條**:沒有指派人員,或是 Summary 父項(範圍由子項統計)。
- **星形**:里程碑。
- **紅色豎線**:今天。時間刻度為「日曆天」時,週末與國定假日有淺色底;為「工作天」時,時間軸直接略過非工作日。
- **要徑**打開後,在要徑上的長條會有紅色外框與閃電。
- 建立**基準線**後,每根長條下方會多一條細線,是當初的計畫日期。
- 項目名稱的顏色代表狀態(完成 / 逾期 / 進行中),顏色可由管理者調整。名稱旁的小標籤則直接寫出 Status 欄選的狀態(見 ③c)。
- **滑鼠停在長條上**,會顯示:指派人員與投入 %、**開始日期**、**結束日期**、**工作天數**、總浮時與最晚完成日。

9.3 拖曳調整時程

需要時程權限(建立者、管理者、Team Leader / PMD)。

- **拖移整根長條**:整體搬到新的開始日,天數不變。
- **拉長或縮短**:拖長條左右兩端,改開始日或結束日(天數會跟著重算)。
- 放開後會先跳出**確認視窗**,列出這個項目的新舊日期,以及會被連動的後續項目;按「確定」才會套用。

拖不動的常見原因(滑鼠停在長條邊緣會說明):

- 開始或結束日由**前置依賴**決定;
- 它是**父項**,時程由子項目統計;
- 它是**里程碑**,天數固定;
- 你沒有調整這個項目時程的權限。

9.4 父項目的長條

有子項目的父項,長條會**自動涵蓋所有子項目的範圍**(最早的開始到最晚的結束),子項目調整後它會跟著變。例外:父項目自己設有 **Pred(前置依賴)**時,它保留依前置排出來的自己的日期,子項目要落在它的區間內。

9.5 前置依賴(Pred / Link / Lag)

在表格的 Pred 欄、項目卡片或下面的人員分配視窗設定。

- **Pred**:選擇這個項目要等誰;可以選**多個**前置,時間以排得最晚的那一條為準。
- **關聯類型 Link**:
  - **FS**(完成 → 開始):前置完成後,這個才開始。最常見。
  - **SS**(開始 → 開始):前置開始後,這個才開始。
  - **FF**(完成 → 完成):前置完成時,這個一起完成。
  - **SF**(開始 → 完成):前置開始,這個才完成。
- **Lag**:兩者之間再空幾天;負數代表可以提前。
- 每一個前置還可以**各自**設關聯類型與 Lag(在 Pred 選單裡每一條前置旁邊)。**新選的前置,這個項目的 Link 欄已經填了關係(FS / SS / FF / SF)就沿用它**(下拉顯示「預設(沿用 Link 欄)」),不會被蓋過;**Link 欄空白才預設是 FS**,而且直接寫在這條依賴上,所以選完就會排出日期,不用另外去填 Link 欄。要換成別種就改旁邊的下拉;選「**預設(沿用 Link 欄)**」則改回看這個項目的 Link 欄位;Lag 留空表示沿用 Lag 欄位。
- **Pred 選單裡看得到「目前這個項目」**:選前置的清單照 WBS 樹排好,正在編輯的這個項目自己(不能當自己的前置)仍然留在原本的位置,用**紅框**框起來、右邊寫 **current task**、不能點,讓你一眼看出「我在清單的哪裡」;打開選單時也會直接捲到這裡。
- Pred 欄位旁有**燈號**:綠 = 前置已完成,可開始;橘 = 等待前置;紅 = 前置已逾期,被延後(預設顏色,管理者可以調整)。
- 改了前置、天數或日期,後續依賴它的項目會**自動重新排程**。
- **里程碑也一樣會照前置排出日期**:里程碑(Type 選 Milestone)的 Days 欄固定是 0、不能填,新建的里程碑那一格是空白——系統把它當 0 天算,設好 Pred 與 Link 之後 Start / Finish 會照前置排出來(FF:完成日 = 前置完成日 + Lag,開始日同一天),Days 也會補成 0,甘特圖上就畫得出星形。把 Type 改成 Milestone 也會馬上重算。
- 如果某個里程碑**以前**就設好了 Pred 與 Link、日期卻還是空白,到「系統設定 → 甘特圖欄位設定」按該看板的「重算全部」,或隨便改一下它的 Lag(填 0 也行),就會補上。

9.5.1 在甘特圖上建立前置連結

不用開項目卡片,直接在甘特圖上把兩個任務連起來。**管理者與主管**可以用(權限跟編輯 Pred 欄位一樣)。

做法一:拖曳圓點(最直覺)

1. 滑鼠移到長條上,**兩端會出現圓點**。
2. 從**前置任務**的圓點拖出一條線,拖到**後續任務**的長條上放開。
3. 關係由「從哪一端拉到哪一端」決定:

從前置的	放在後續的	關係
右端(完成)	左半(開始)	**FS** 完成到開始
左端(開始)	左半(開始)	**SS** 開始到開始
右端(完成)	右半(完成)	**FF** 完成到完成
左端(開始)	右半(完成)	**SF** 開始到完成

拖的時候線的終點會標出落在哪一端:**藍色圈**代表可以連,**紅色圈**代表不行(旁邊寫原因)。

做法二:建立連結模式(點兩下):按工具列的「**建立連結**」,先點**前置任務**、再點**後續任務**,建立的是 FS。按 Esc 取消已選的前置,再按一次 Esc 結束這個模式。長條很小、要捲動畫面時比拖曳方便。

放開之後先預覽,不會直接寫入。 視窗會列出後續任務的日期會從哪天改成哪天、連帶有哪些項目會跟著移動(跟拖日期條時的確認視窗同一套),讓你選:

- **緊接前置,重算日期**(預設):後續任務依排程規則接在前置後面。
- **保持目前日期(延遲 N 天)**:後續任務的日期不動,系統自動算出剛好讓它不動的延遲天數填進去。

不能建立的連結(會直接告訴你原因):連到自己、這條已經存在、父項目與它底下的子項目互連(父項目的時程是子項目統計出來的)、會形成循環(前置自己已經在等這個任務)。

修改或刪除:開著「相依箭頭」時,**點那條箭頭**會跳出小卡,可以改關係(FS / SS / FF / SF)、延遲天數(負數 = 提前),或刪除連結。刪除一律先確認。

建立、修改、刪除都可以用「**上一步**」還原(第 6 章)。目前只能連同一個看板上的項目;跨看板的前置請在項目卡片的 Pred 選單勾「跨看板」。

9.6 點長條:人員分配視窗

點長條(不拖動),會開啟這個視窗:

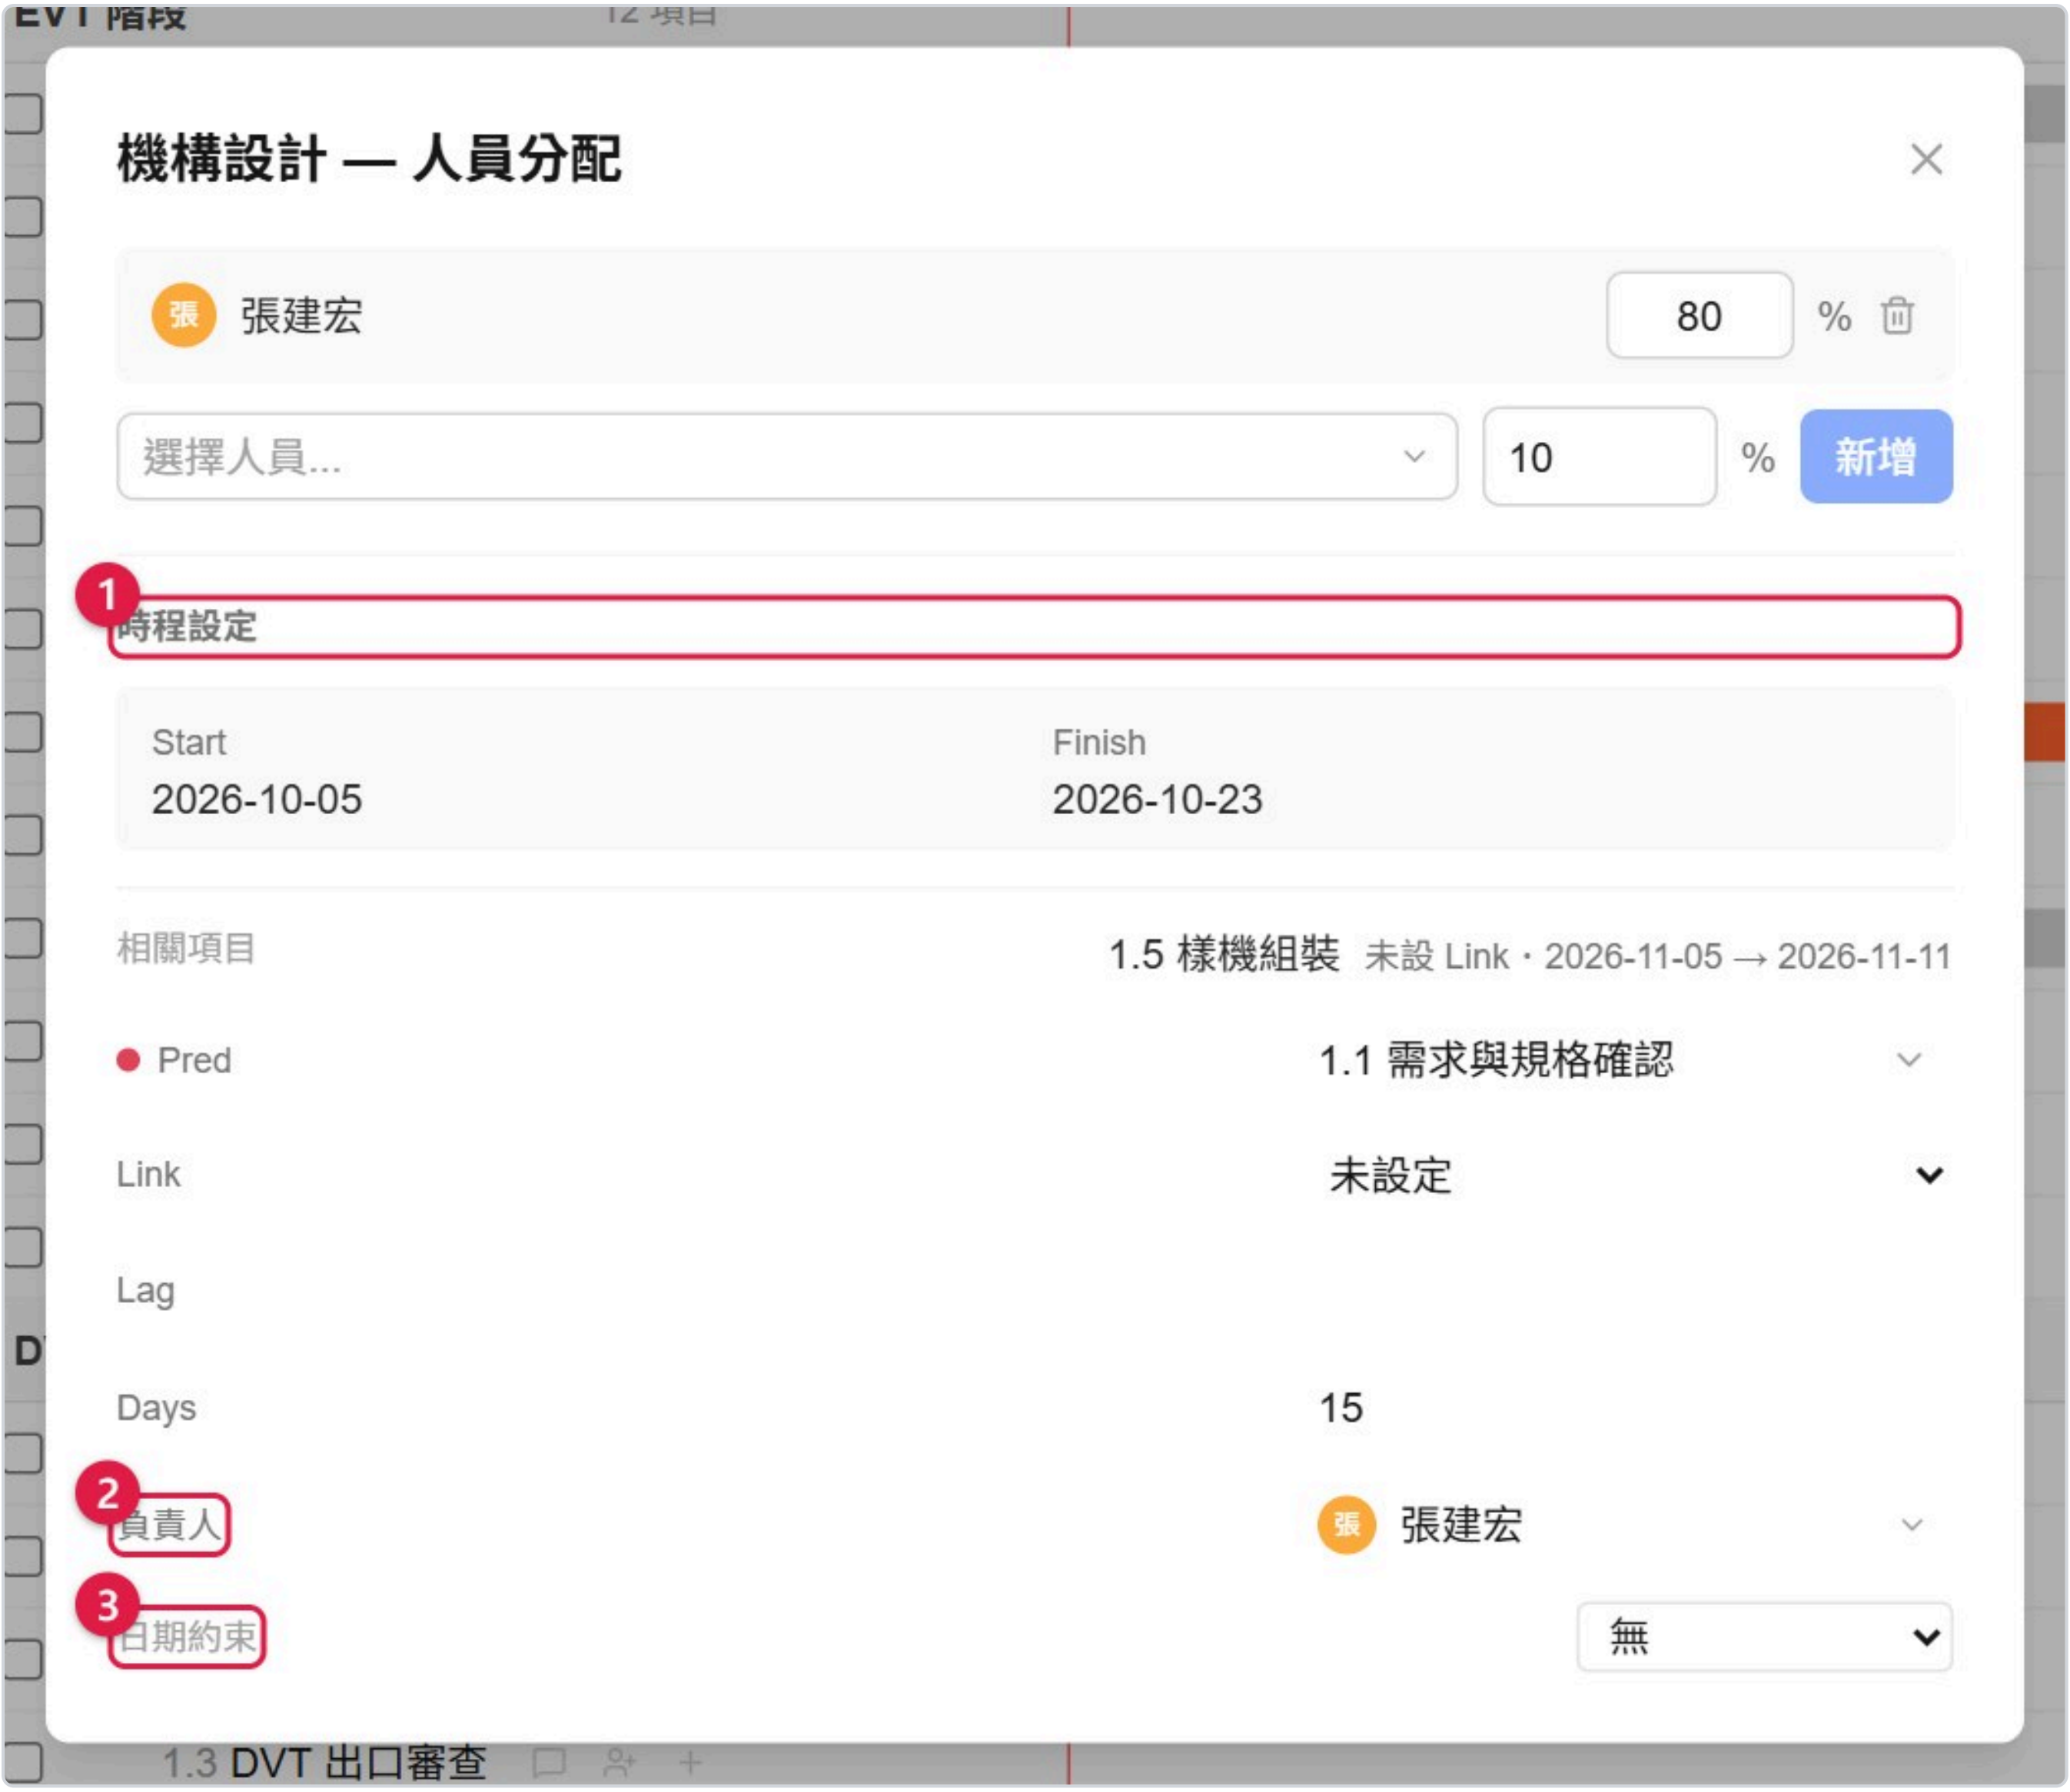

機構設計 — 人員分配

張建宏 80 %

選擇人員... 10 % 新增

① 時程設定

Start: 2026-10-05
Finish: 2026-10-23

相關項目: 1.5 樣機組裝 未設 Link · 2026-11-05 → 2026-11-11
Pred: 1.1 需求與規格確認
Link: 未設定
Lag:
Days: 15
② 負責人: 張建宏
③ 日期約束: 無

區塊	說明
人員分配	選人、填投入百分比後按「新增」,即指派給這個項目;百分比會換算成工時與成本。選人的選單有搜尋框(見下);百分比 1–100%、最小單位 1%,游標在輸入框裡時可以用滑鼠滾輪加減(往上滾增加),已指派的人改了數字,停手半秒後自動儲存。**可以選誰**:主管只能選自己與自己團隊的人;但這個項目所在分組的 Team Leader(分組的,或在「整個看板」設的)是專案負責人,**可以選任何人**,即使對方不是他的部屬
① 時程設定	Start / Finish 顯示目前結果;下方可以設 Pred、Link、Lag、天數(或 start(set))
② 負責人	設定「負責人」欄位的人
③ 日期約束	不得早於 / 不得晚於 / 必須完成於,再選日期

選人時搜尋:按「選擇人員...」後,選單最上面有搜尋框,輸入姓名(或其中幾個字)就會過濾名單,按 Enter 直接選第一個符合的人;都不符合會顯示「找不到符合的人員」。「負責人」欄位、新增子任務時的人員選單也一樣(「負責人」選單多一個「未指派」,輸入關鍵字時會先收起來)。

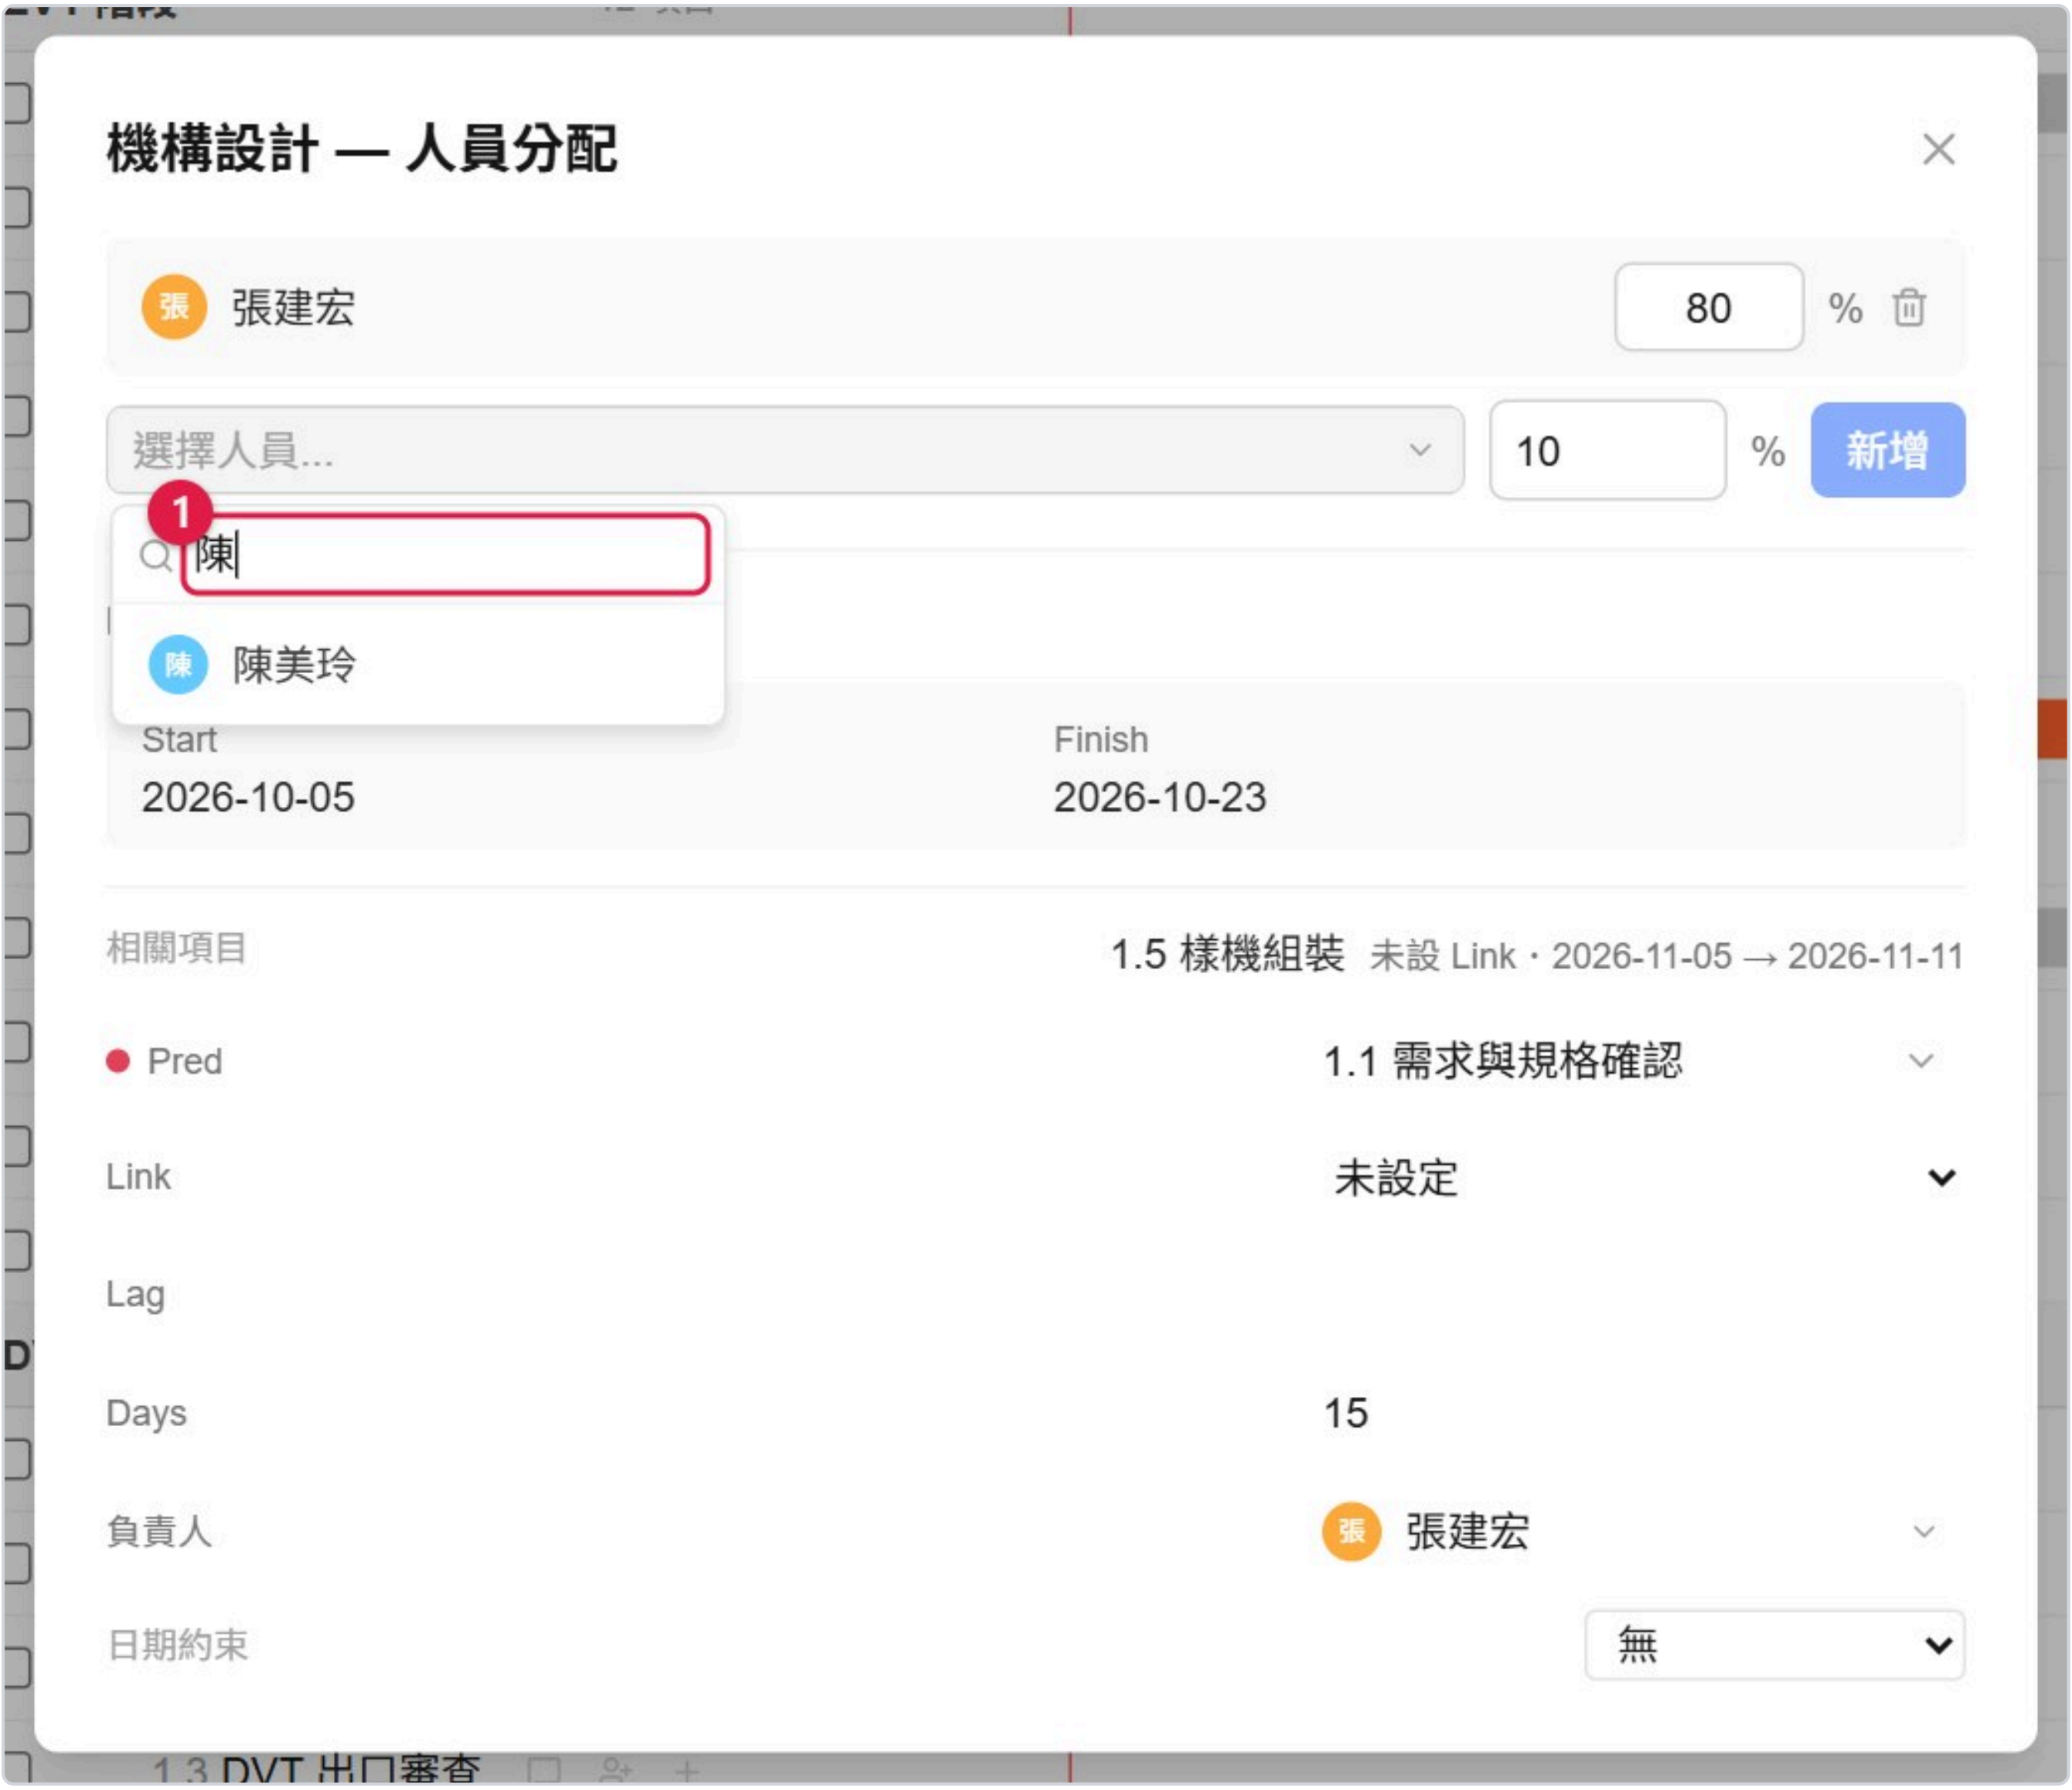
機構設計 — 人員分配

張建宏 80 %

選擇人員... 10 %

陳

陳美玲

Start 2026-10-05

Finish 2026-10-23

相關項目 1.5 樣機組裝 未設 Link · 2026-11-05 → 2026-11-11

Pred 1.1 需求與規格確認

Link 未設定

Lag

Days 15

負責人 張建宏

日期約束 無

改了會影響日期的欄位時,視窗會先預覽「Start / Finish → 新日期」,並問「此變更將調整時程,是否套用?」,按「確認套用」才會生效。

9.7 自動排程看板

有些看板啟用了「自動排程」:Start / Days / Finish 變成**唯讀**,改填 **start(set)**(手動開始日)與 **duration**(手動天數),再由前置依賴自動算出結果。管理者在「系統設定 → 甘特圖欄位設定」對應這些欄位,並可以按「重算全部」重新計算整個看板。

- **欄位要先對應才算數**:只是欄位名字叫 start(set)、duration 並不會啟用;要在「甘特圖欄位設定」的「手動開始日期欄位」「手動天數欄位」選好這兩欄(兩個都選才算啟用)。沒對應的看板,Days 是自己填的,duration 欄只是一般的數字欄,不會影響日期。
- **Days 是算出來的**:自動排程的看板上 Days 一律唯讀,顯示由 duration 算出的天數(沒填 duration 時沿用原本的 Days);Start / Finish 同樣唯讀。

- **跟日期約束一起用**:項目設了「必須完成於 11/03」又填了 duration 23,不用 start(set) 也會算出 10/12 ~ 11/03,甘特圖畫出 23 天的條;這時 start(set) 不再決定日期(完成日以約束為準)。

---

10. 報表

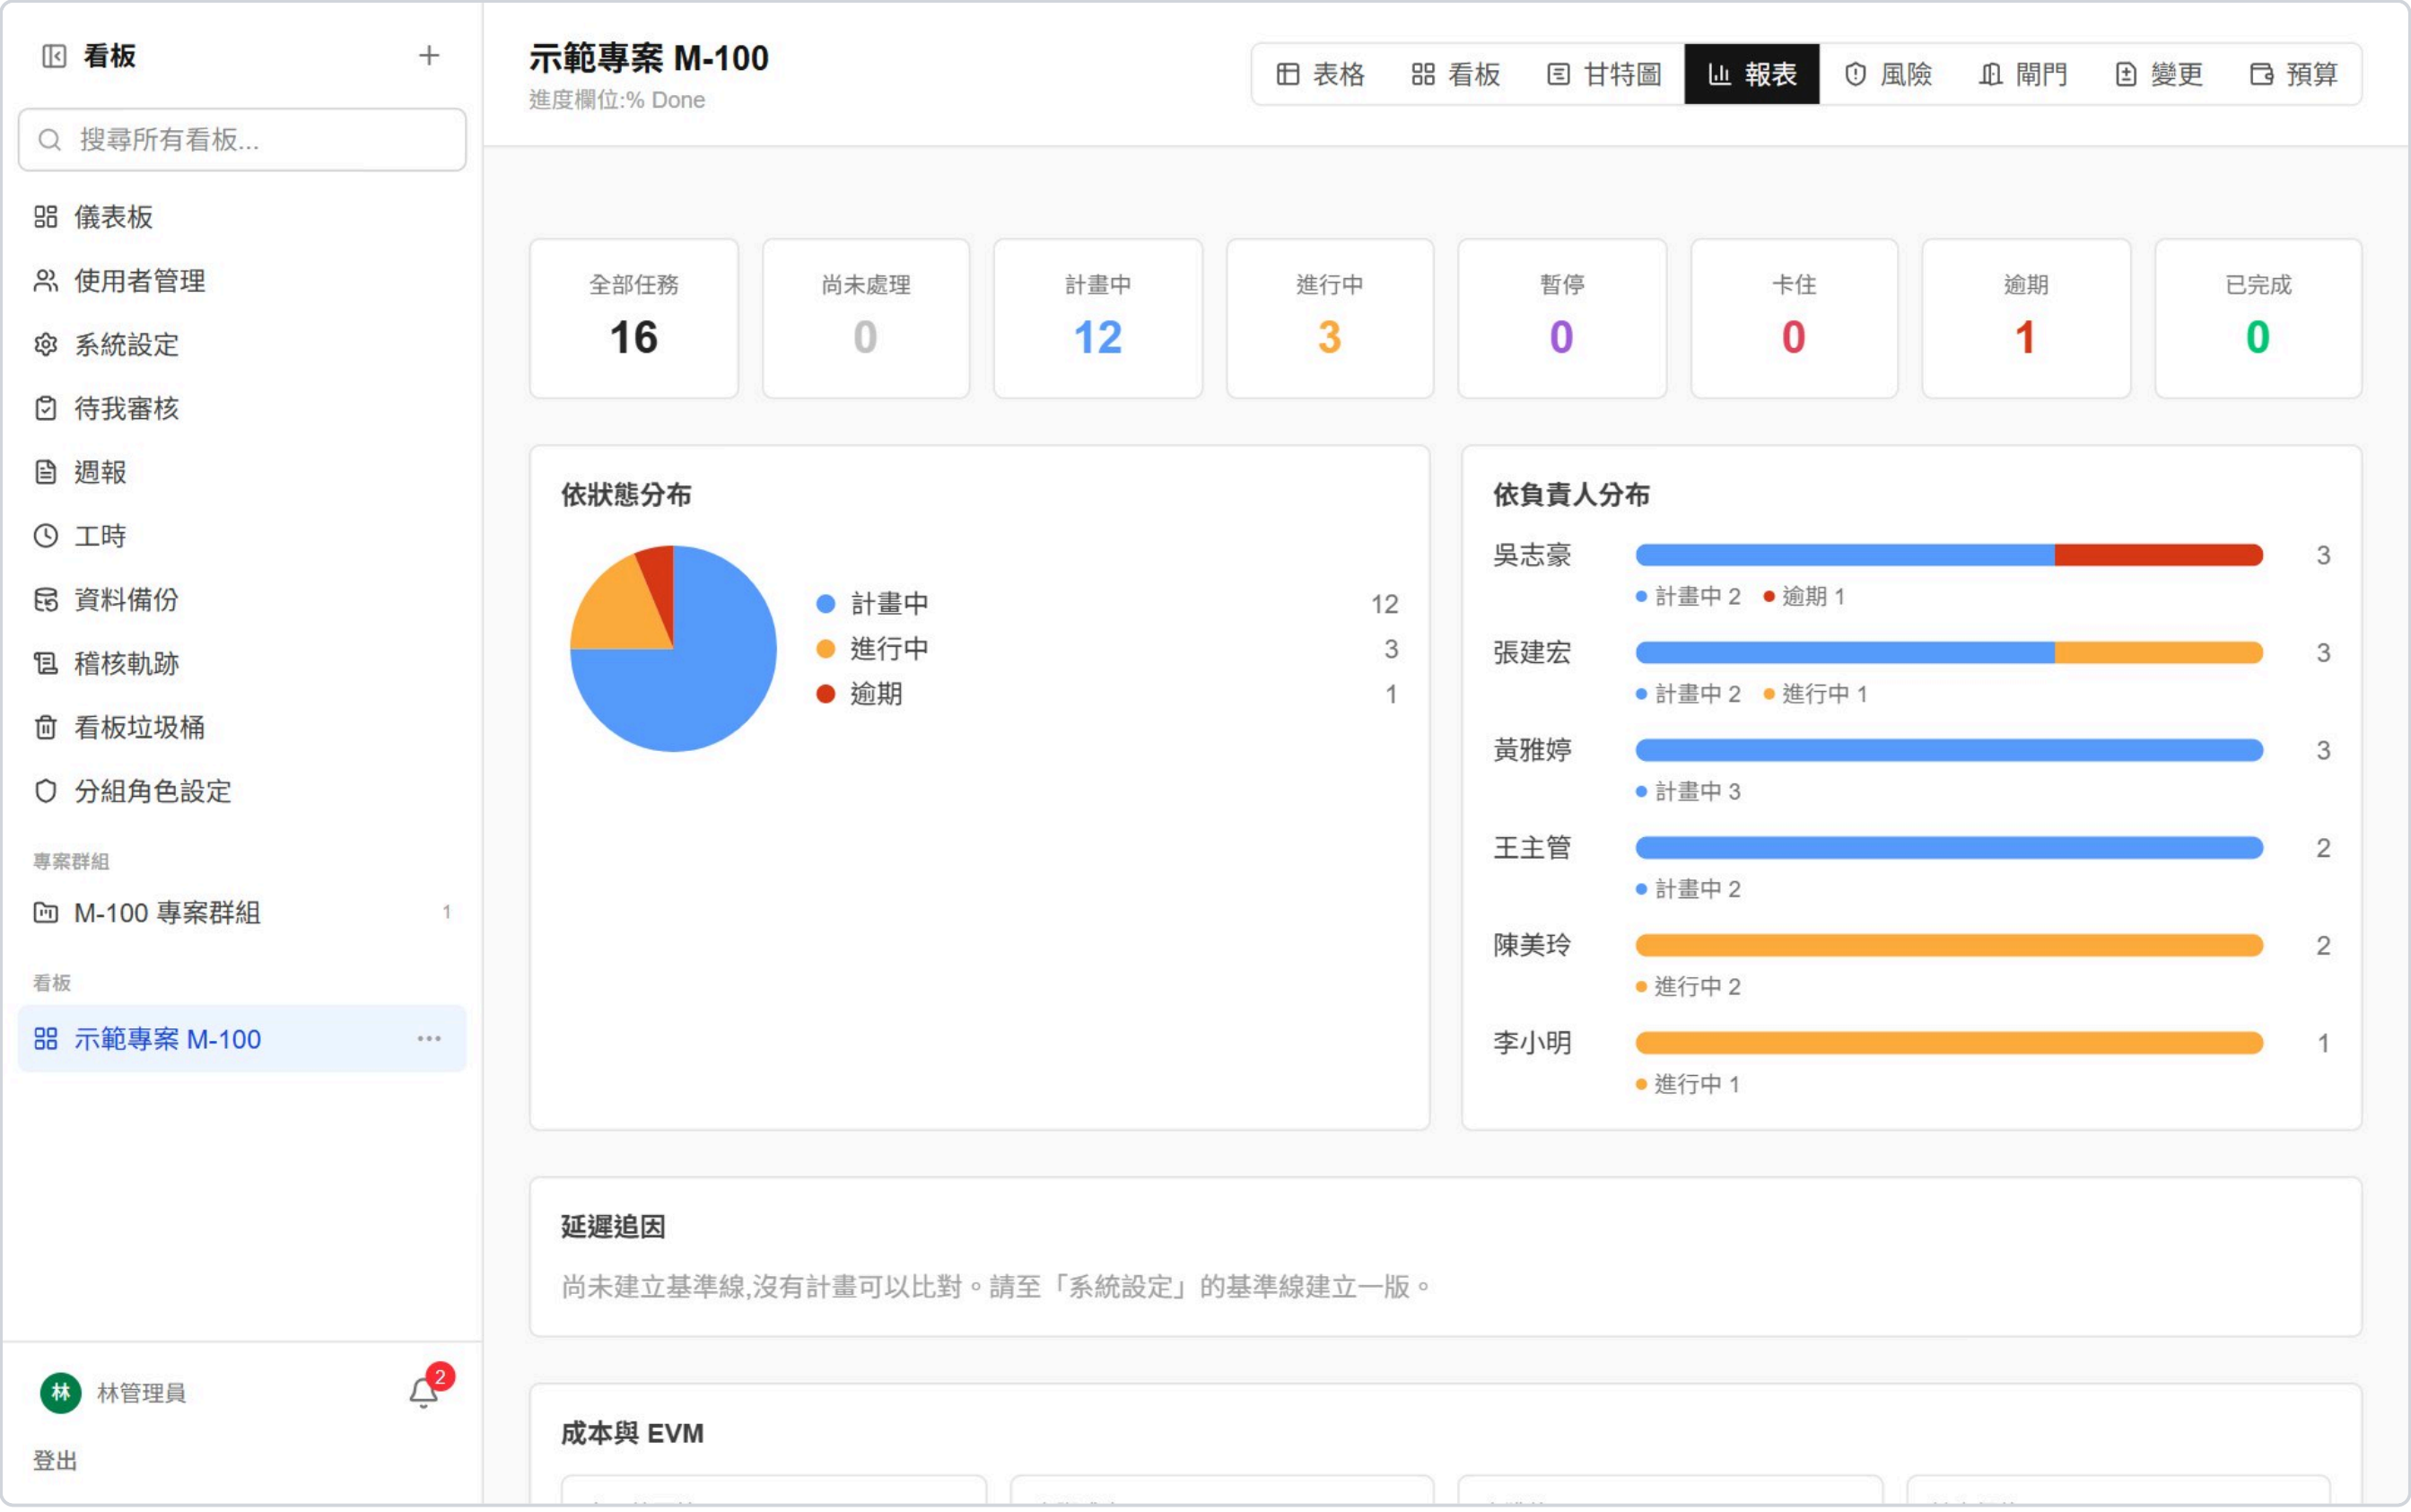
看板
+
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林
林管理員
2
登出
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算

示範專案 M-100

進度欄位:% Done

全部任務	尚未處理	計畫中	進行中	暫停	卡住	逾期	已完成
16	0	12	3	0	0	1	0

依狀態分布

● 計畫中	12
● 進行中	3
● 逾期	1

依負責人分布

吳志豪	● 計畫中 2 ● 逾期 1	3
張建宏	● 計畫中 2 ● 進行中 1	3
黃雅婷	● 計畫中 3	3
王主管	● 計畫中 2	2
陳美玲	● 進行中 2	2
李小明	● 進行中 1	1

延遲追因

尚未建立基準線,沒有計畫可以比對。請至「系統設定」的基準線建立一版。

成本與 EVM

- 上方數字卡:全部任務、尚未處理、計畫中、進行中、暫停、卡住、逾期、已完成。分類依「報表設定」把各狀態歸到哪一類。
- **依狀態分布**、**依負責人分布**:圖表。主管與副主管可用「我的團隊 / 全部」切換範圍。
- **延遲追因**:找出**自己**延誤的工作項(扣掉前置推給它的部分之後仍然晚了),與影響多少下游。需要先建立基準線。
- **成本與 EVM**:完工總預算 BAC、實際成本 AC、實獲值 EV、計畫價值 PV、成本效率 CPI、進度效率 SPI、成本差異 CV、完工預估 EAC。需要有直接費用預算與成員時薪。
- **進度曲線**、**逾期清單**。

> 報表要統計哪個狀態欄位、每個狀態算哪一類,由管理者在「系統設定 → 報表設定」指定。

11. 風險與議題

NUDD 會議上談到的風險與議題,記在這裡才追得下去。

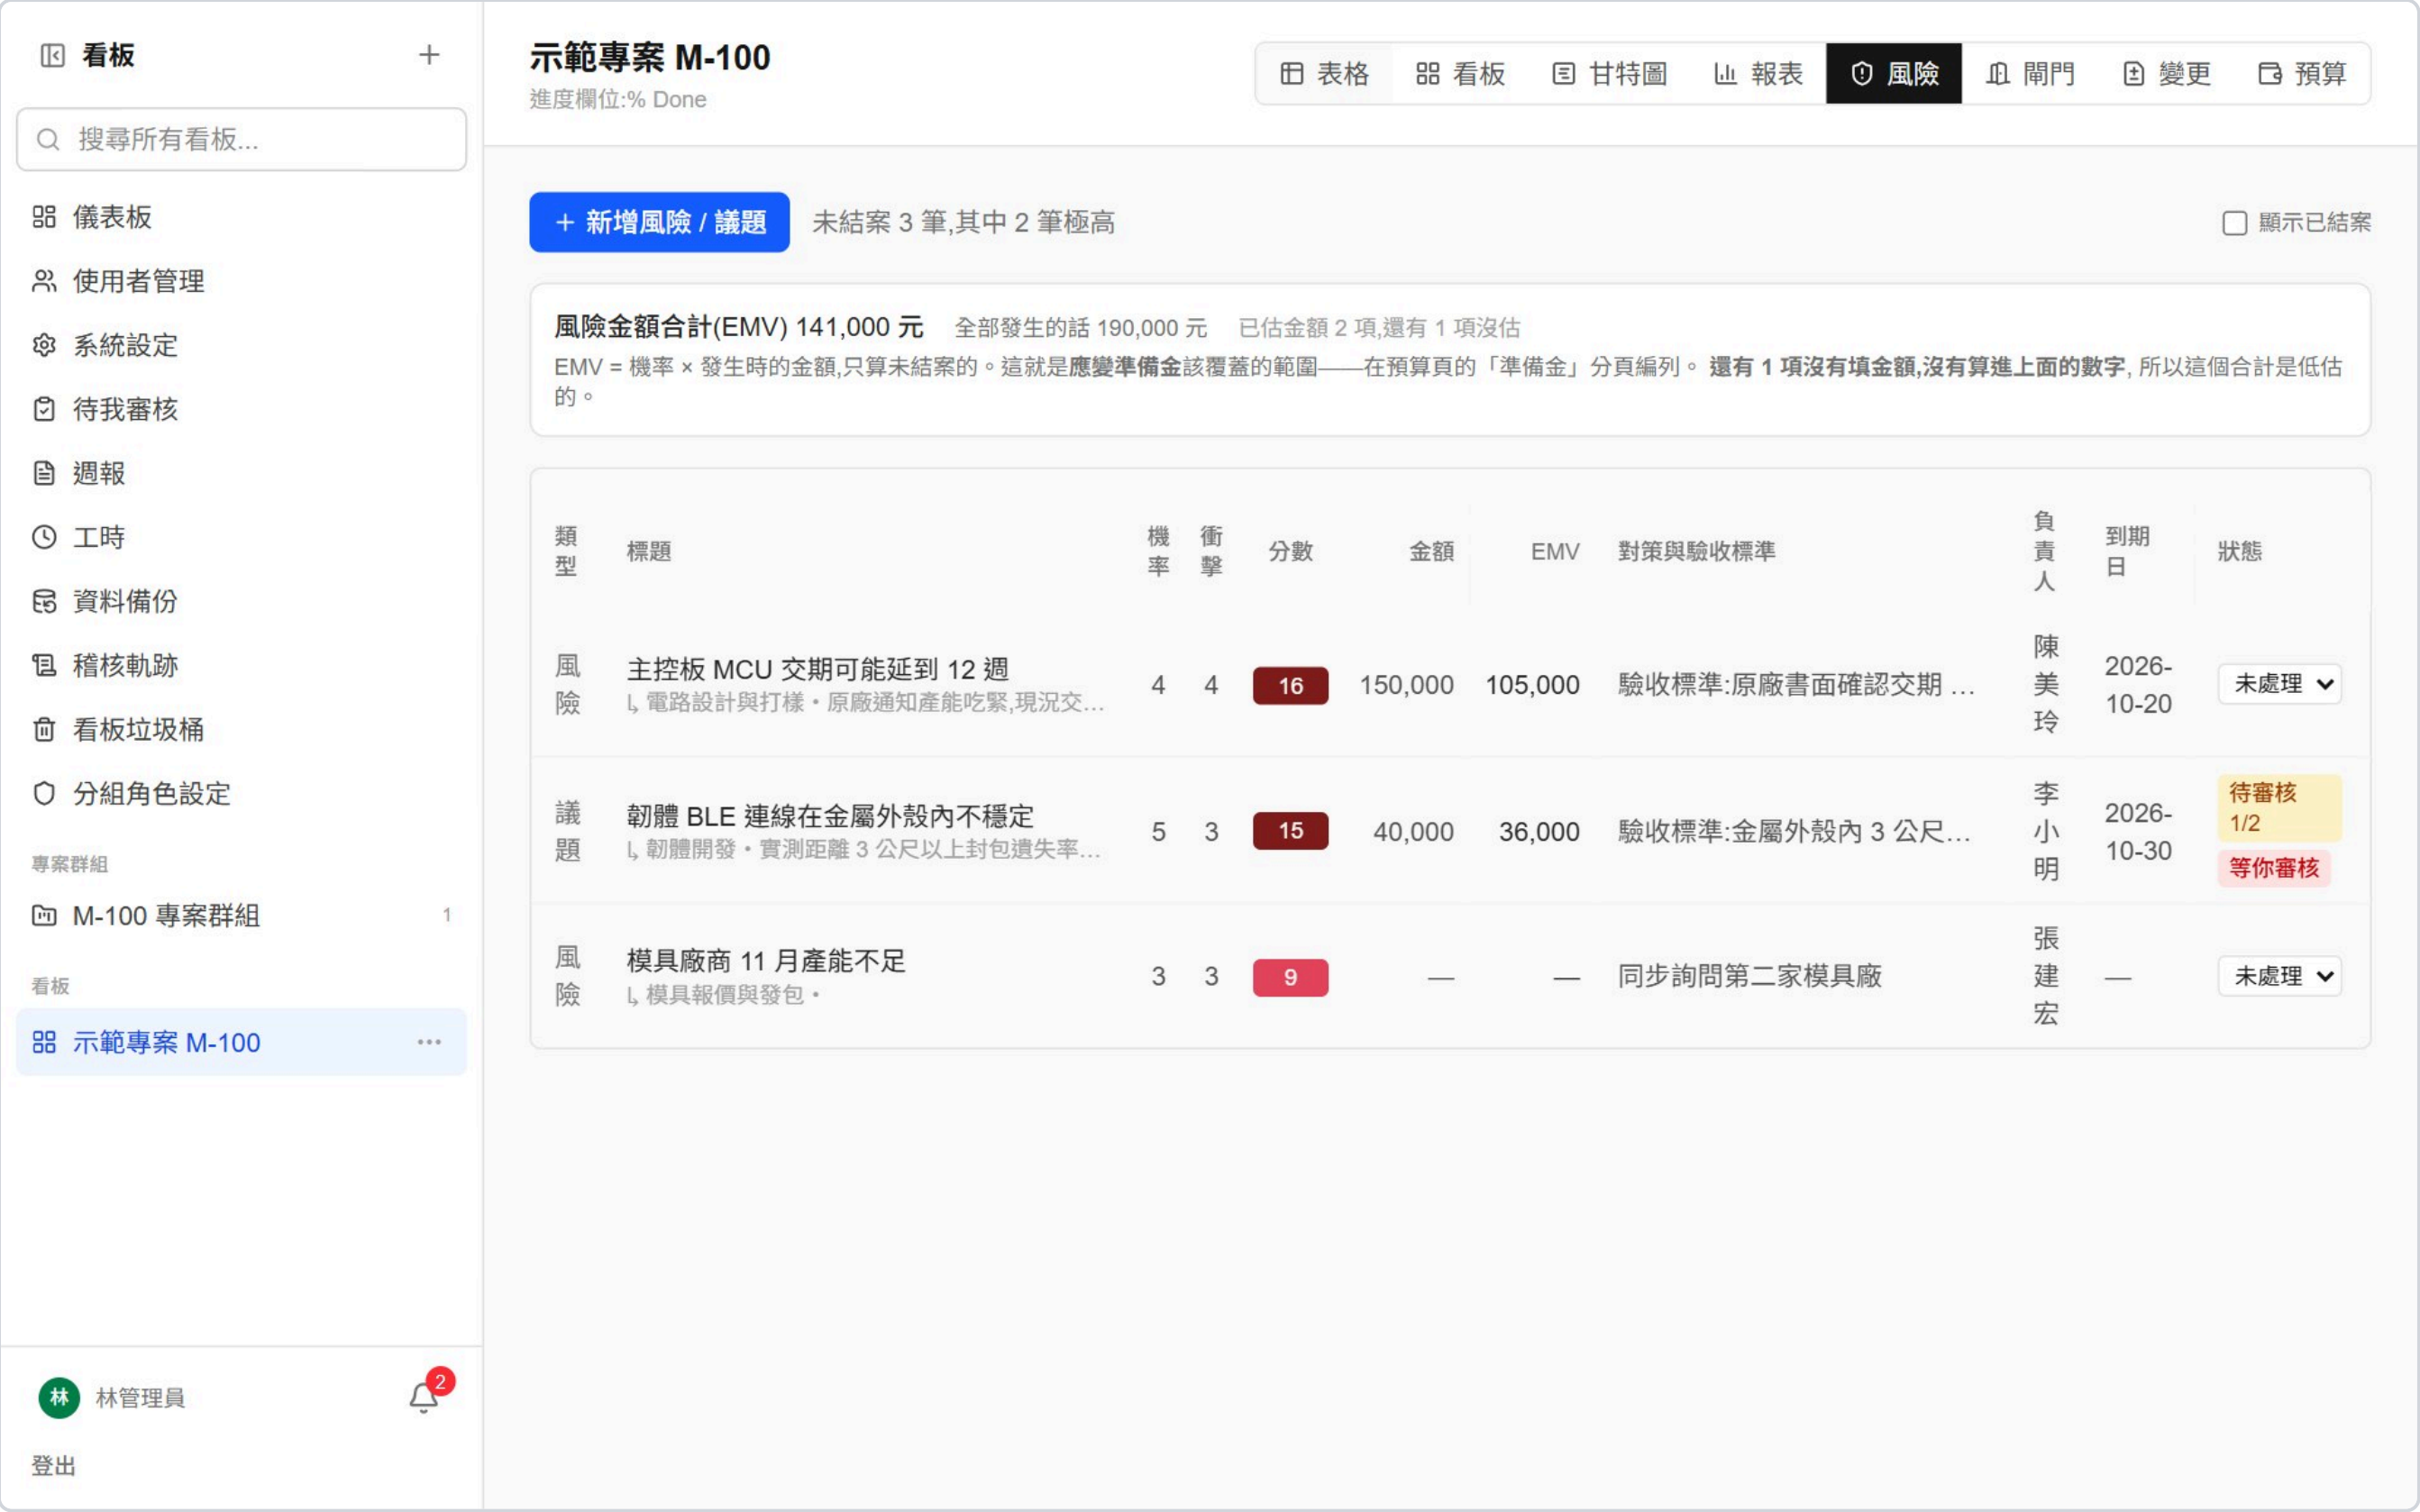
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林
林管理員
2
登出
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
+ 新增風險 / 議題
□ 顯示已結案

示範專案 M-100

進度欄位:% Done

未結案 3 筆,其中 2 筆極高

風險金額合計(EMV) 141,000 元 全部發生的話 190,000 元 已估金額 2 項,還有 1 項沒估

EMV = 機率 × 發生時的金額,只算未結案的。這就是**應變準備金**該覆蓋的範圍——在預算頁的「準備金」分頁編列。 **還有 1 項沒有填金額,沒有算進上面的數字**, 所以這個合計是低估的。

類型	標題	機率	衝擊	分數	金額	EMV	對策與驗收標準	負責人	到期日	狀態
風險	主控板 MCU 交期可能延到 12 週 ↳ 電路設計與打樣・原廠通知產能吃緊,現況交…	4	4	16	150,000	105,000	驗收標準:原廠書面確認交期 …	陳美玲	2026-10-20	未處理
議題	韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定 ↳ 韌體開發・實測距離 3 公尺以上封包遺失率…	5	3	15	40,000	36,000	驗收標準:金屬外殼內 3 公尺…	李小明	2026-10-30	待審核 1/2 等你審核
風險	模具廠商 11 月產能不足 ↳ 模具報價與發包・	3	3	9	—	—	同步詢問第二家模具廠	張建宏	—	未處理

- 清單依「**機率 × 衝擊**」分數由高到低排;已結案的沉到最後。
- **分數**:機率與衝擊各 1–5,相乘 1–25:低(< 4)、中(4–7)、高(8–14)、極高(≥ 15)。
- **EMV 風險金額**:機率 × 發生時的金額,只算未結案的(包含待審核),就是**應變準備金**該覆蓋的範圍。沒填金額的項目不會算進去,畫面上會提醒你合計偏低。
- **從別處點進來,直接開到那一筆**:儀表板「未結案的風險與議題」、更新記錄、通知、對話裡 #引用 的風險 / 議題 / 問題,點下去會**直接打開那一筆**的視窗(不用再到清單裡找);找不到的(已刪除)就只停在清單。視窗右上角有「**在對話中討論**」(見 1.7)。
- **點一列就能打開編輯**:不用找最右邊的鉛筆圖示,點清單裡那一筆的任何地方(沒有編輯權的人打開是唯讀檢視)就會打開;列裡面的 Mantis 編號連結、狀態選單、鉛筆與刪除圖示照原本的動作,不會連帶打開。用鍵盤也行:Tab 移到那一列按 Enter。
- **狀態欄**:負責人與編輯者可以直接在「未處理 / 處理中」之間切換;**待審核**會標出已同意的審核人數(例如 1/2),輪到你審核的另外標紅色的「等你審核」;**已結案**不能直接選,要走 11.3 的流程。

11.1 誰可以做什麼

風險與議題的分工是:**指派的人**把要做什麼、做到什麼程度才算解除寫清楚;**負責人**去做、回報進度;**審核人**確認真的解除了。

角色	能做的事
建立者(指派的人)	改標題、說明、機率、衝擊、金額、**對策與驗收標準**;指定**負責人**與**審核人**;寫進度更新;重新開啟已結案的;刪除
負責人	寫**進度更新**;切換「未處理 / 處理中」;處理完成後**申請結案**。**不能改內容**
審核人	申請結案後**同意解除**或**退回**;也可以改內容、寫進度更新、重新開啟
管理者	除了「同意 / 退回」以外都可以(包含代負責人申請結案);要同意或退回,得是被指定的審核人
其他看板成員	只能看內容、進度更新與紀錄

沒有編輯權的人打開一筆,表單是唯讀的,也不會有儲存鍵。

11.2 新增風險 / 議題

按「+ 新增風險 / 議題」:

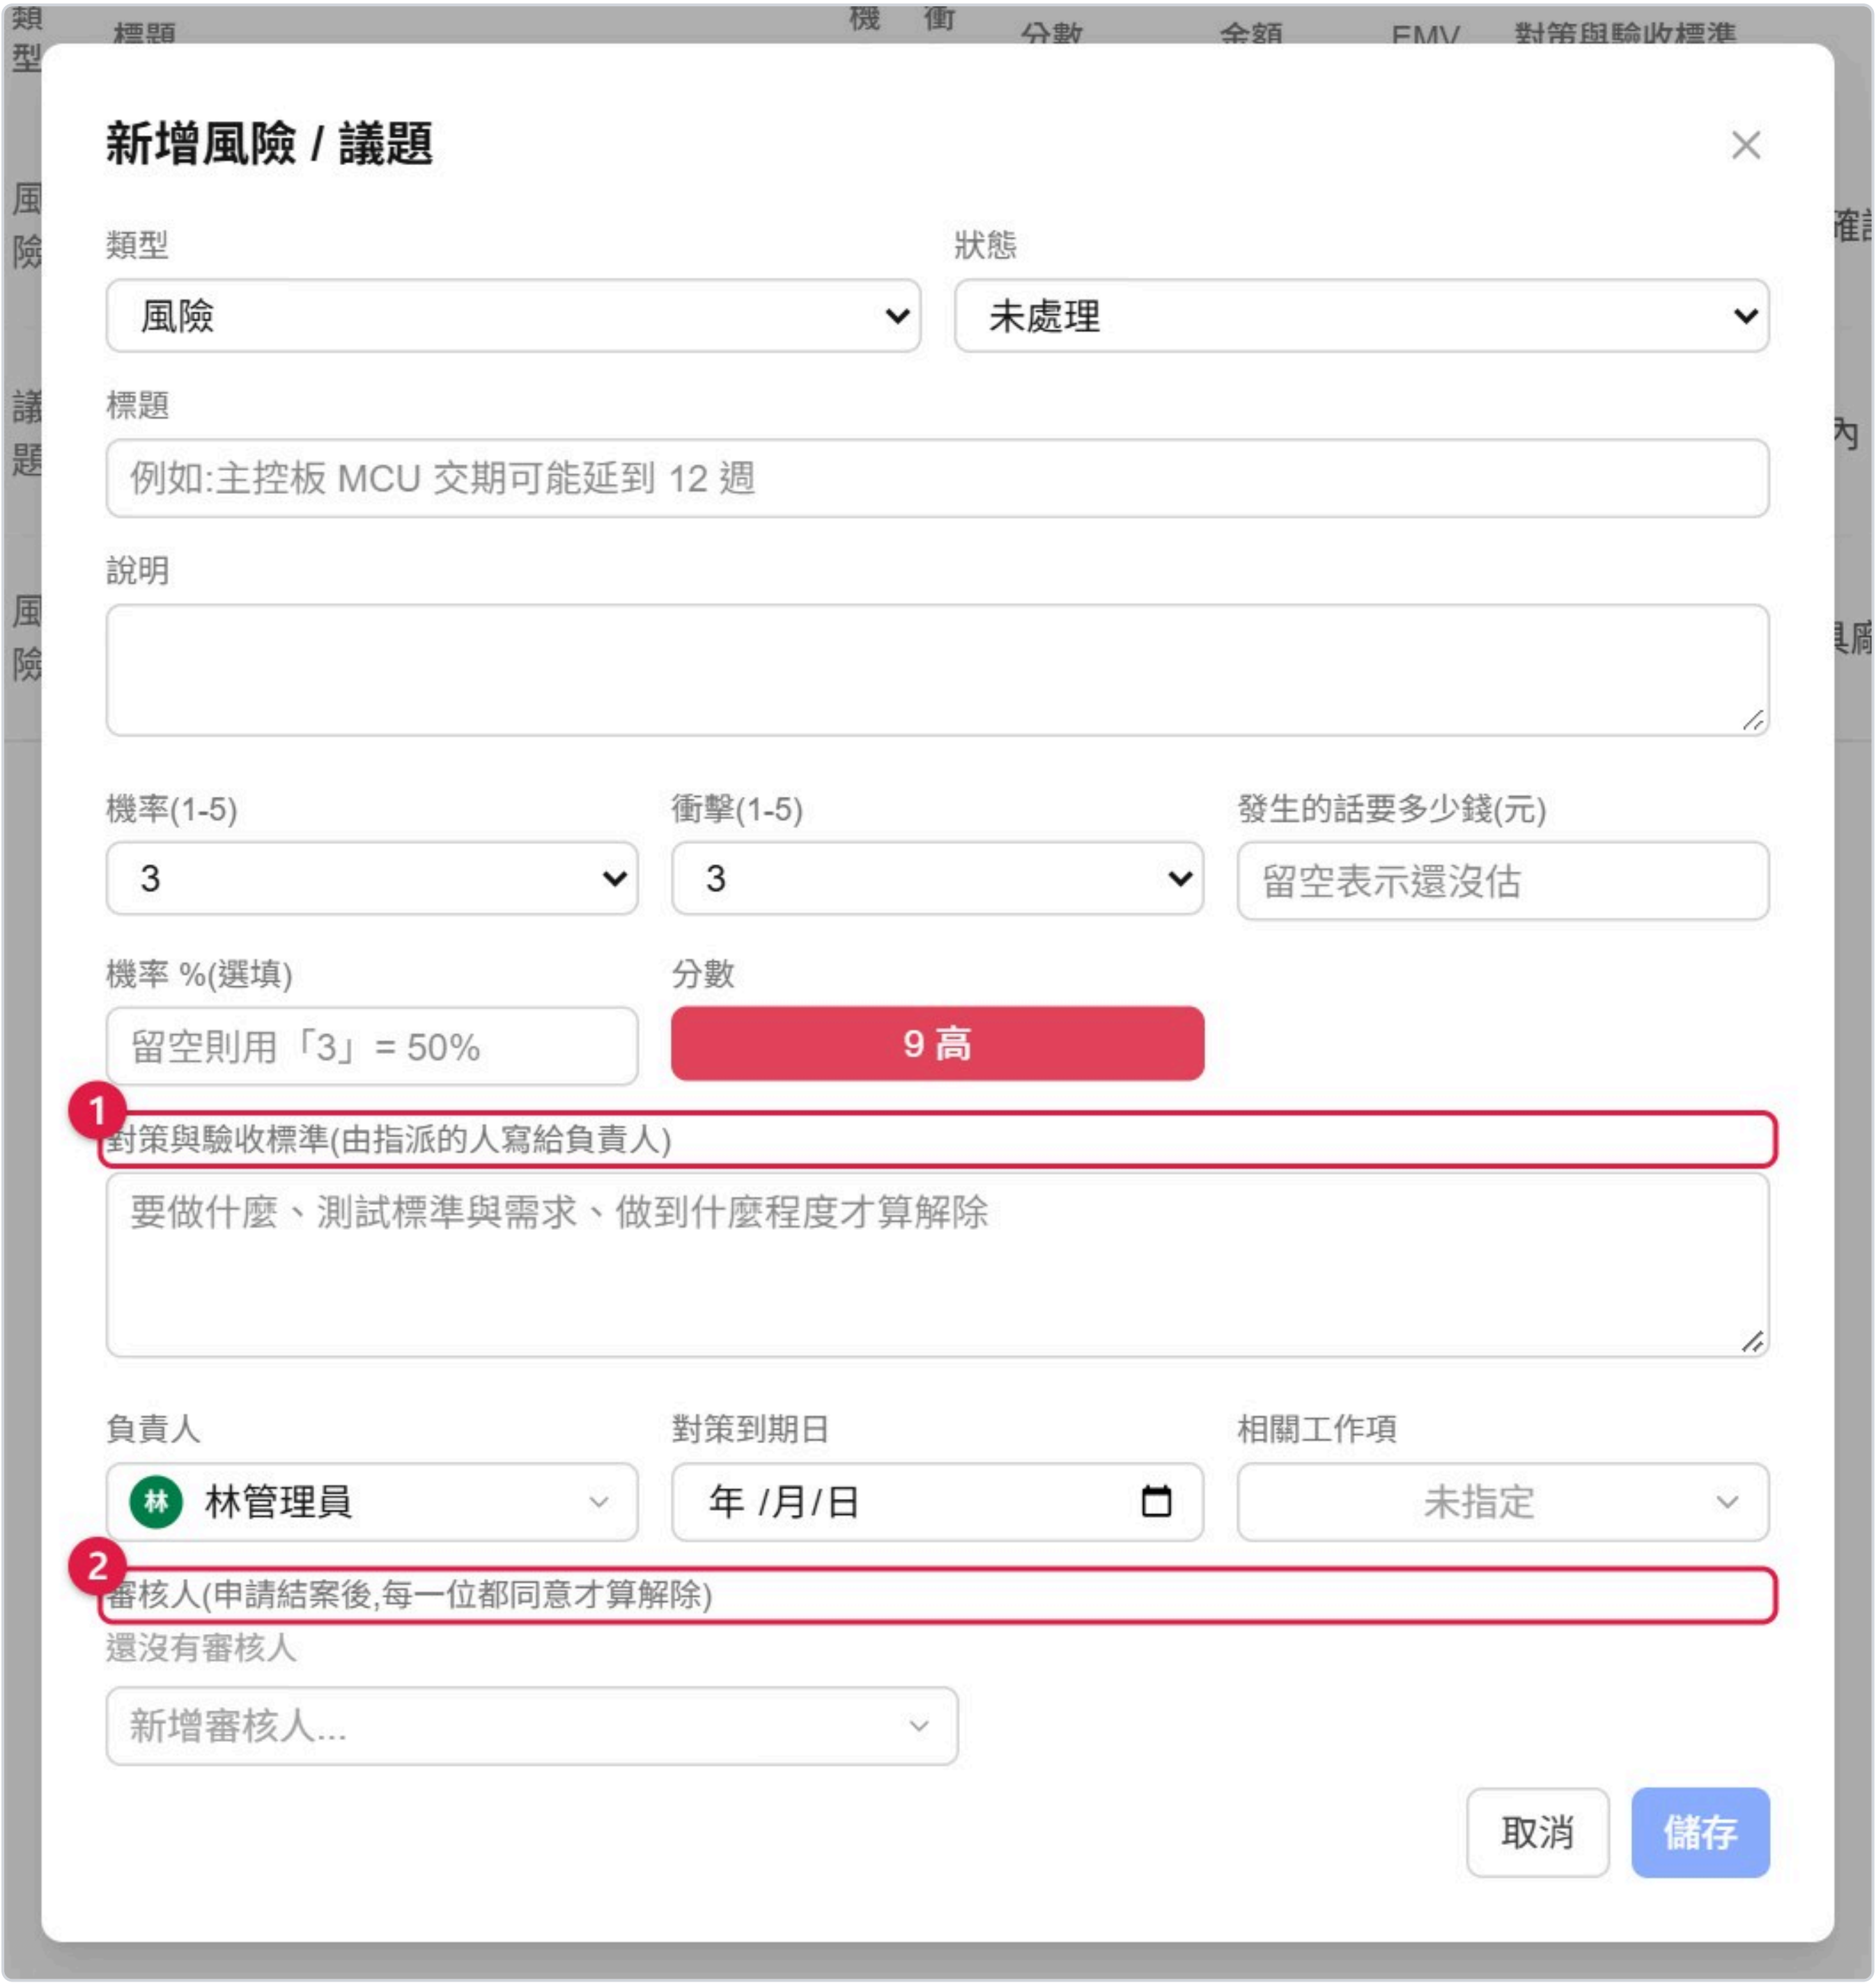

新增風險 / 議題

類型: 風險

狀態: 未處理

標題: 例如:主控板 MCU 交期可能延到 12 週

說明:

機率(1-5): 3

衝擊(1-5): 3

發生的話要多少錢(元): 留空表示還沒估

機率 %(選填): 留空則用「3」= 50%

分數: 9 高

① 對策與驗收標準(由指派的人寫給負責人): 要做什麼、測試標準與需求、做到什麼程度才算解除

負責人: 林管理員

對策到期日: 年 /月/日

相關工作項: 未指定

② 審核人(申請結案後,每一位都同意才算解除)

還沒有審核人

新增審核人...

欄位:類型(風險 / 議題)、狀態(新增時只能選未處理 / 處理中)、標題、說明、機率、衝擊、發生的話要多少錢、機率 %(選填,不填則依 1–5 等級換算)、 ① **對策與驗收標準**(由指派的人寫給負責人:要做什麼、測試標準與需求、做到什麼程度才算解除)、負責人、對策到期日、相關工作項、 ② **審核人**(可以指定多位,申請結案後每一位都同意才算解除)。你自己就是這一筆的「建立者」。

11.3 進度更新、申請結案與審核

打開既有的一筆,上面有四個分頁:**內容與審核**、**進度更新**、**待辦事項**、**紀錄**。

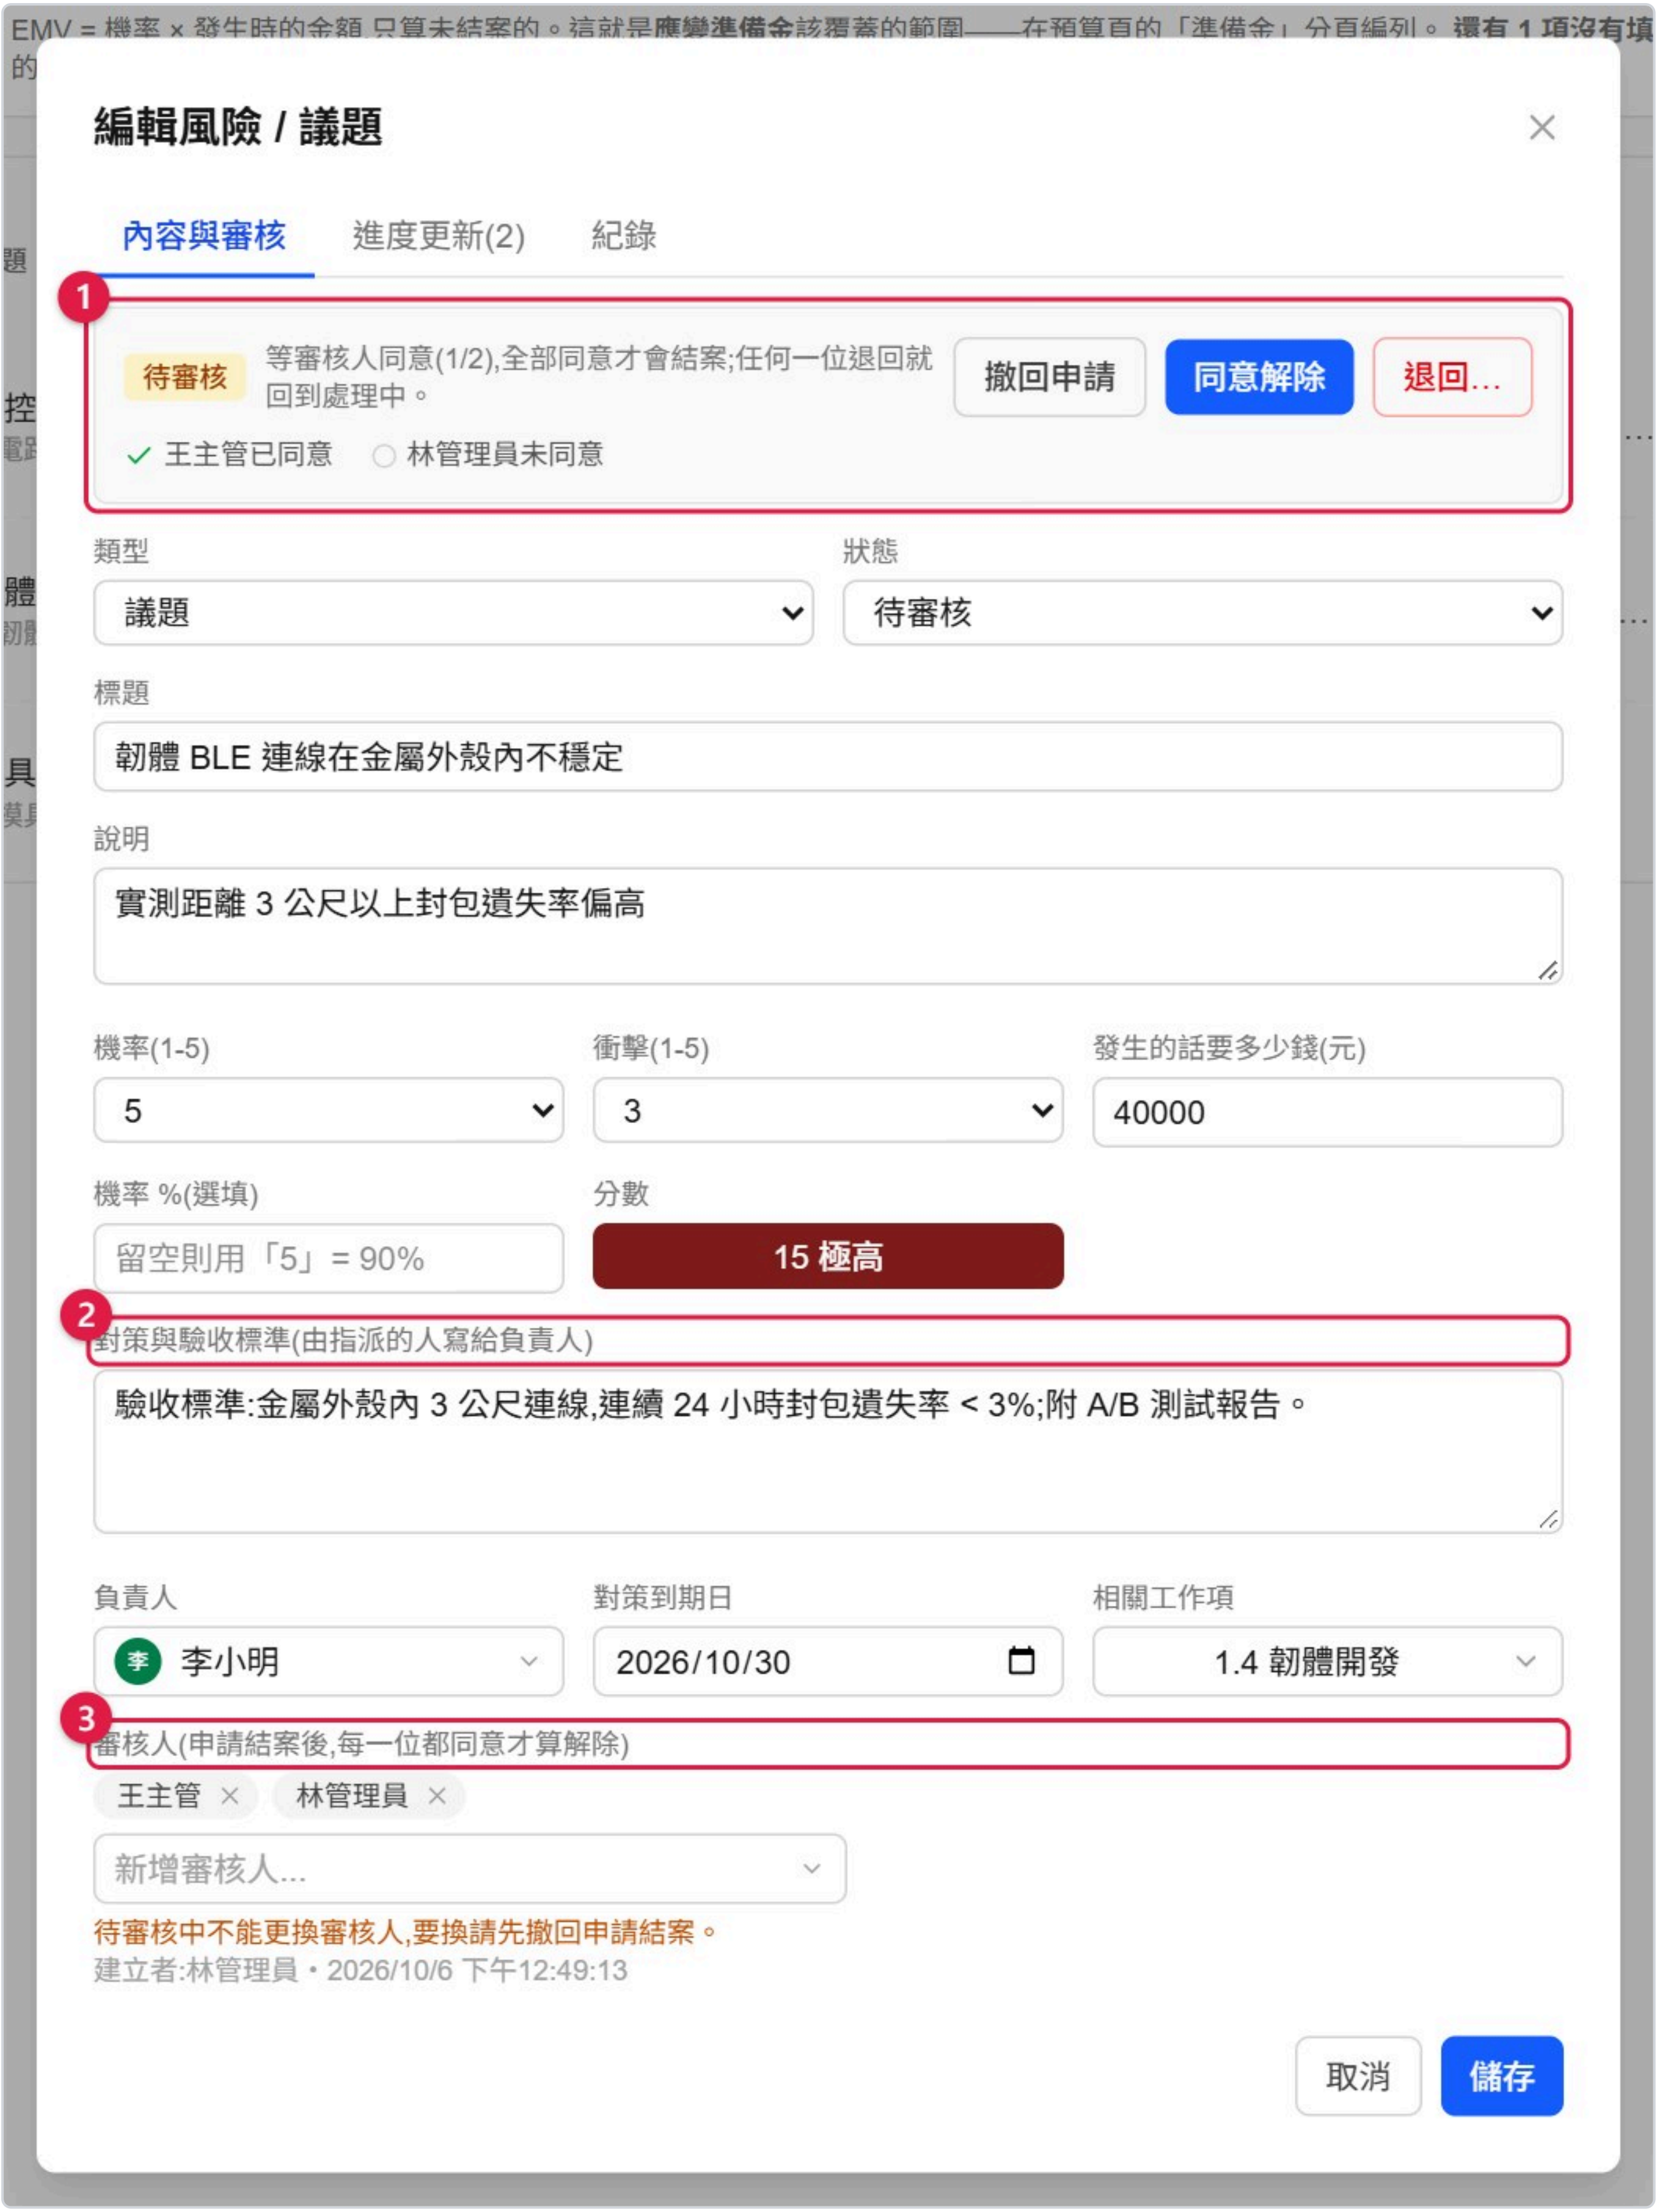

編輯風險 / 議題
×
內容與審核
進度更新(2)
紀錄
1
待審核
撤回申請
同意解除
退回…
2
3
取消
儲存

等審核人同意(1/2),全部同意才會結案;任何一位退回就回到處理中。

✓ 王主管已同意 ○ 林管理員未同意

類型: 議題

狀態: 待審核

標題: 韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定

說明: 實測距離 3 公尺以上封包遺失率偏高

機率(1-5): 5

衝擊(1-5): 3

發生的話要多少錢(元): 40000

機率 %(選填): 留空則用「5」= 90%

分數: 15 極高

對策與驗收標準(由指派的人寫給負責人): 驗收標準:金屬外殼內 3 公尺連線,連續 24 小時封包遺失率 < 3%;附 A/B 測試報告。

負責人: 李小明

對策到期日: 2026/10/30

相關工作項: 1.4 韌體開發

審核人(申請結案後,每一位都同意才算解除): 王主管 × 林管理員 ×

新增審核人…

待審核中不能更換審核人,要換請先撤回申請結案。

建立者:林管理員 • 2026/10/6 下午12:49:13

編號	說明
① 狀態列	目前狀態與下一步,按鈕依你的角色出現:申請結案、撤回申請、同意解除、退回、重新開啟;待審核時列出每位審核人同不同意
② 對策與驗收標準	指派的人寫的解除條件,負責人照這個做、審核人照這個驗
③ 審核人	申請結案後,每一位都同意才算解除

流程:

1. **負責人**在「進度更新」分頁寫進度(新的在上面,寫了不能改)。
2. 處理完成後,在「內容與審核」分頁按「**申請結案**」,狀態變成「待審核」。要先指定至少一位審核人並儲存。
3. 每位**審核人**按「**同意解除**」或「**退回…**」。退回一定要寫原因:原因會記進進度更新,狀態回到「處理中」,**所有人的同意票清空**,負責人補完後要重新申請。
4. **全部審核人都同意**,才會變成「已結案」。
5. 已結案的,建立者、審核人或管理者可以按「重新開啟」,回到處理中。

注意:

- 待審核中不能更換審核人;要換請先「撤回申請」(負責人、建立者、審核人都可以撤回)。
- 目前**沒有**站內通知或 email:負責人申請結案後,請告訴審核人;審核人到風險頁看有沒有「等你審核」。
- 舊的風險沒有審核人;要結案請先補上審核人。已經是已結案的維持原樣。

11.3b 風險、議題的待辦事項

風險、議題(含 Mantis 同步來的議題)的「**待辦事項**」分頁,跟工作項的待辦事項是同一個樣子:勾完成、點日期設**期限**、選**處理者**、刪除;新增時處理者預設是這一筆的**負責人**。**看得到那個看板的人都能新增、勾選、改期限與處理者**(進度更新才限負責人、建立者與審核人)。期限到了會提醒:**到期前一天、當天、逾期後各一次**,通知給處理者(沒指定就是這一筆的負責人)與新增的人,通知類型跟工作項待辦事項的「待辦事項期限提醒」同一個。新增、完成、改期限、處理者與備註都記在「紀錄」分頁。對話裡的訊息可以直接轉成這裡的待辦事項(見 1.7)。

備註:每一筆待辦事項的文字下面有「**+ 備註**」,點一下就能寫目前的**處理狀態、結果**(例如「已寄出報價單,等客戶回覆」)。寫好後點別處、或按 Ctrl+Enter 就存檔;已經有備註的,直接點備註的文字修改,全部刪掉再存就是清空。備註上限 1000 字,可以換行。工作項的待辦事項也一樣有備註。

改名稱與調順序:點待辦事項的文字就能改名稱,拖最左邊的 ⠿ 把手調整順序,做法跟工作項的待辦事項一樣(見第 5 章項目卡片的「待辦事項分頁」)。

工作項的待辦事項也一樣多了「**處理者**」與「**備註**」:新增時預設是工作項的負責人(沒有負責人就取人員分配工作量比例最高的人,再沒有就取登記工時最多的人),每一筆旁邊的選單可以改;到期提醒給處理者(沒指定就是工作項的負責人)與新增的人;儀表板的「待辦事項期限」也會列出**指定給你處理**的待辦事項。

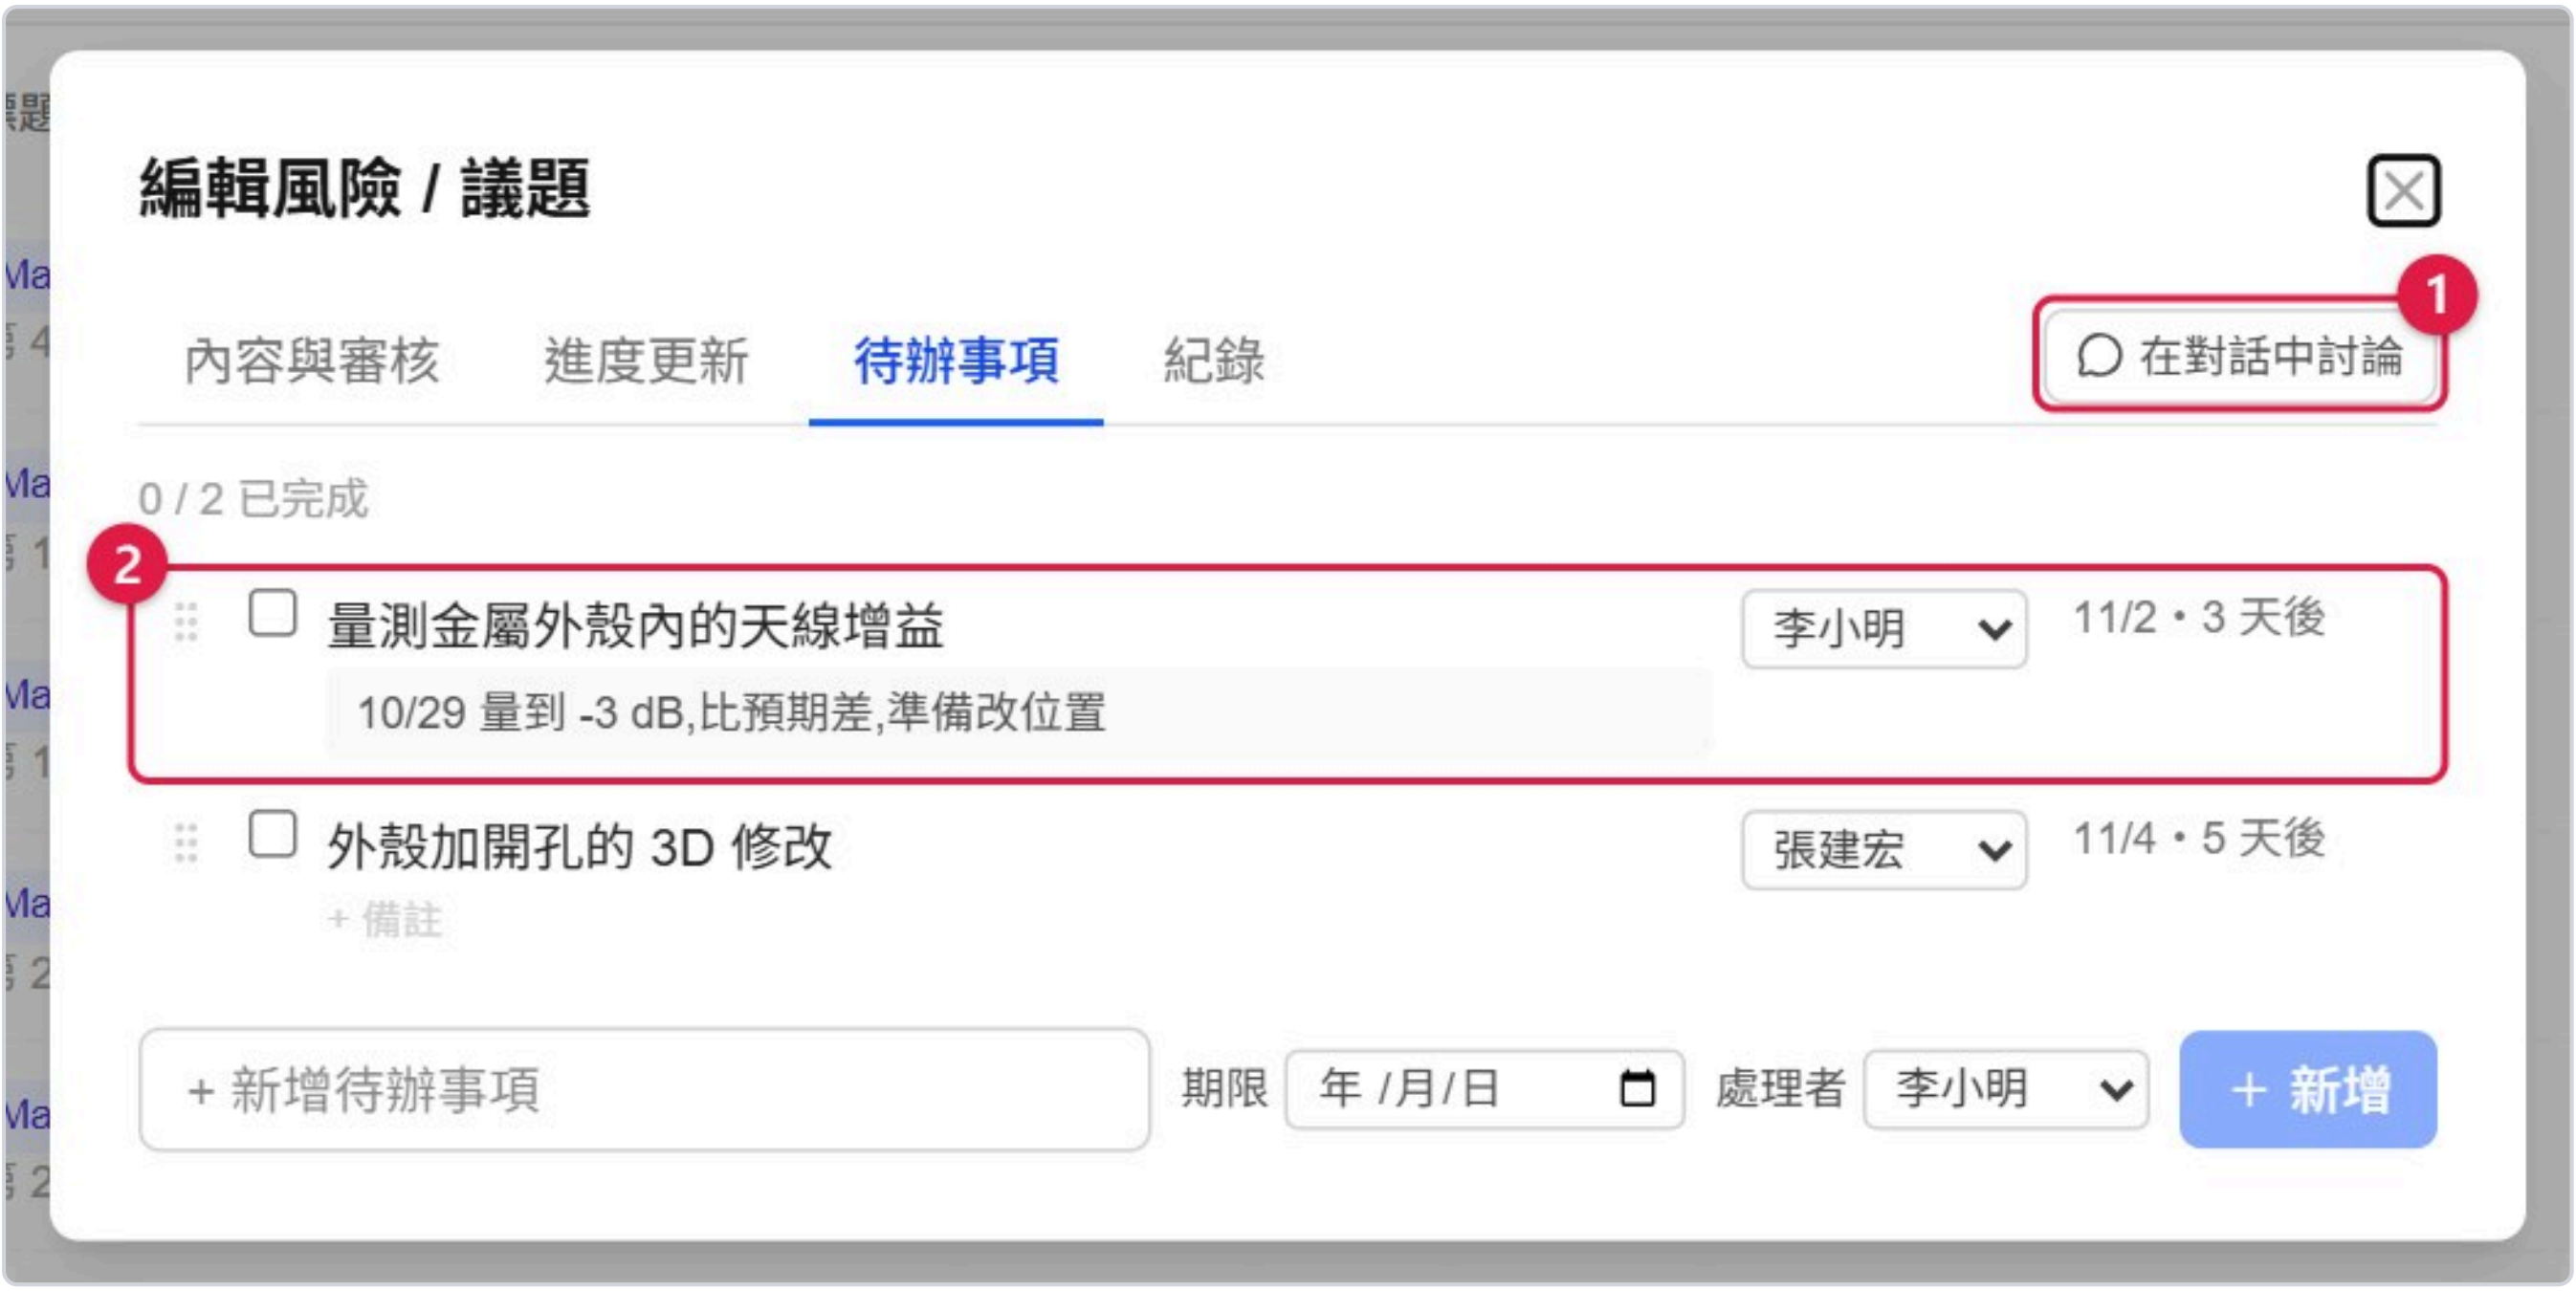

編輯風險 / 議題

內容與審核　進度更新　**待辦事項**　紀錄　　在對話中討論

0 / 2 已完成

- □ 量測金屬外殼內的天線增益　李小明　11/2・3 天後
  10/29 量到 -3 dB,比預期差,準備改位置
- □ 外殼加開孔的 3D 修改　張建宏　11/4・5 天後
  + 備註

+ 新增待辦事項　期限 年 /月/日　處理者 李小明　+ 新增

① 視窗右上角的「**在對話中討論**」;② 一筆待辦事項:處理者、期限與備註都在這一行。

11.4 進度更新與紀錄

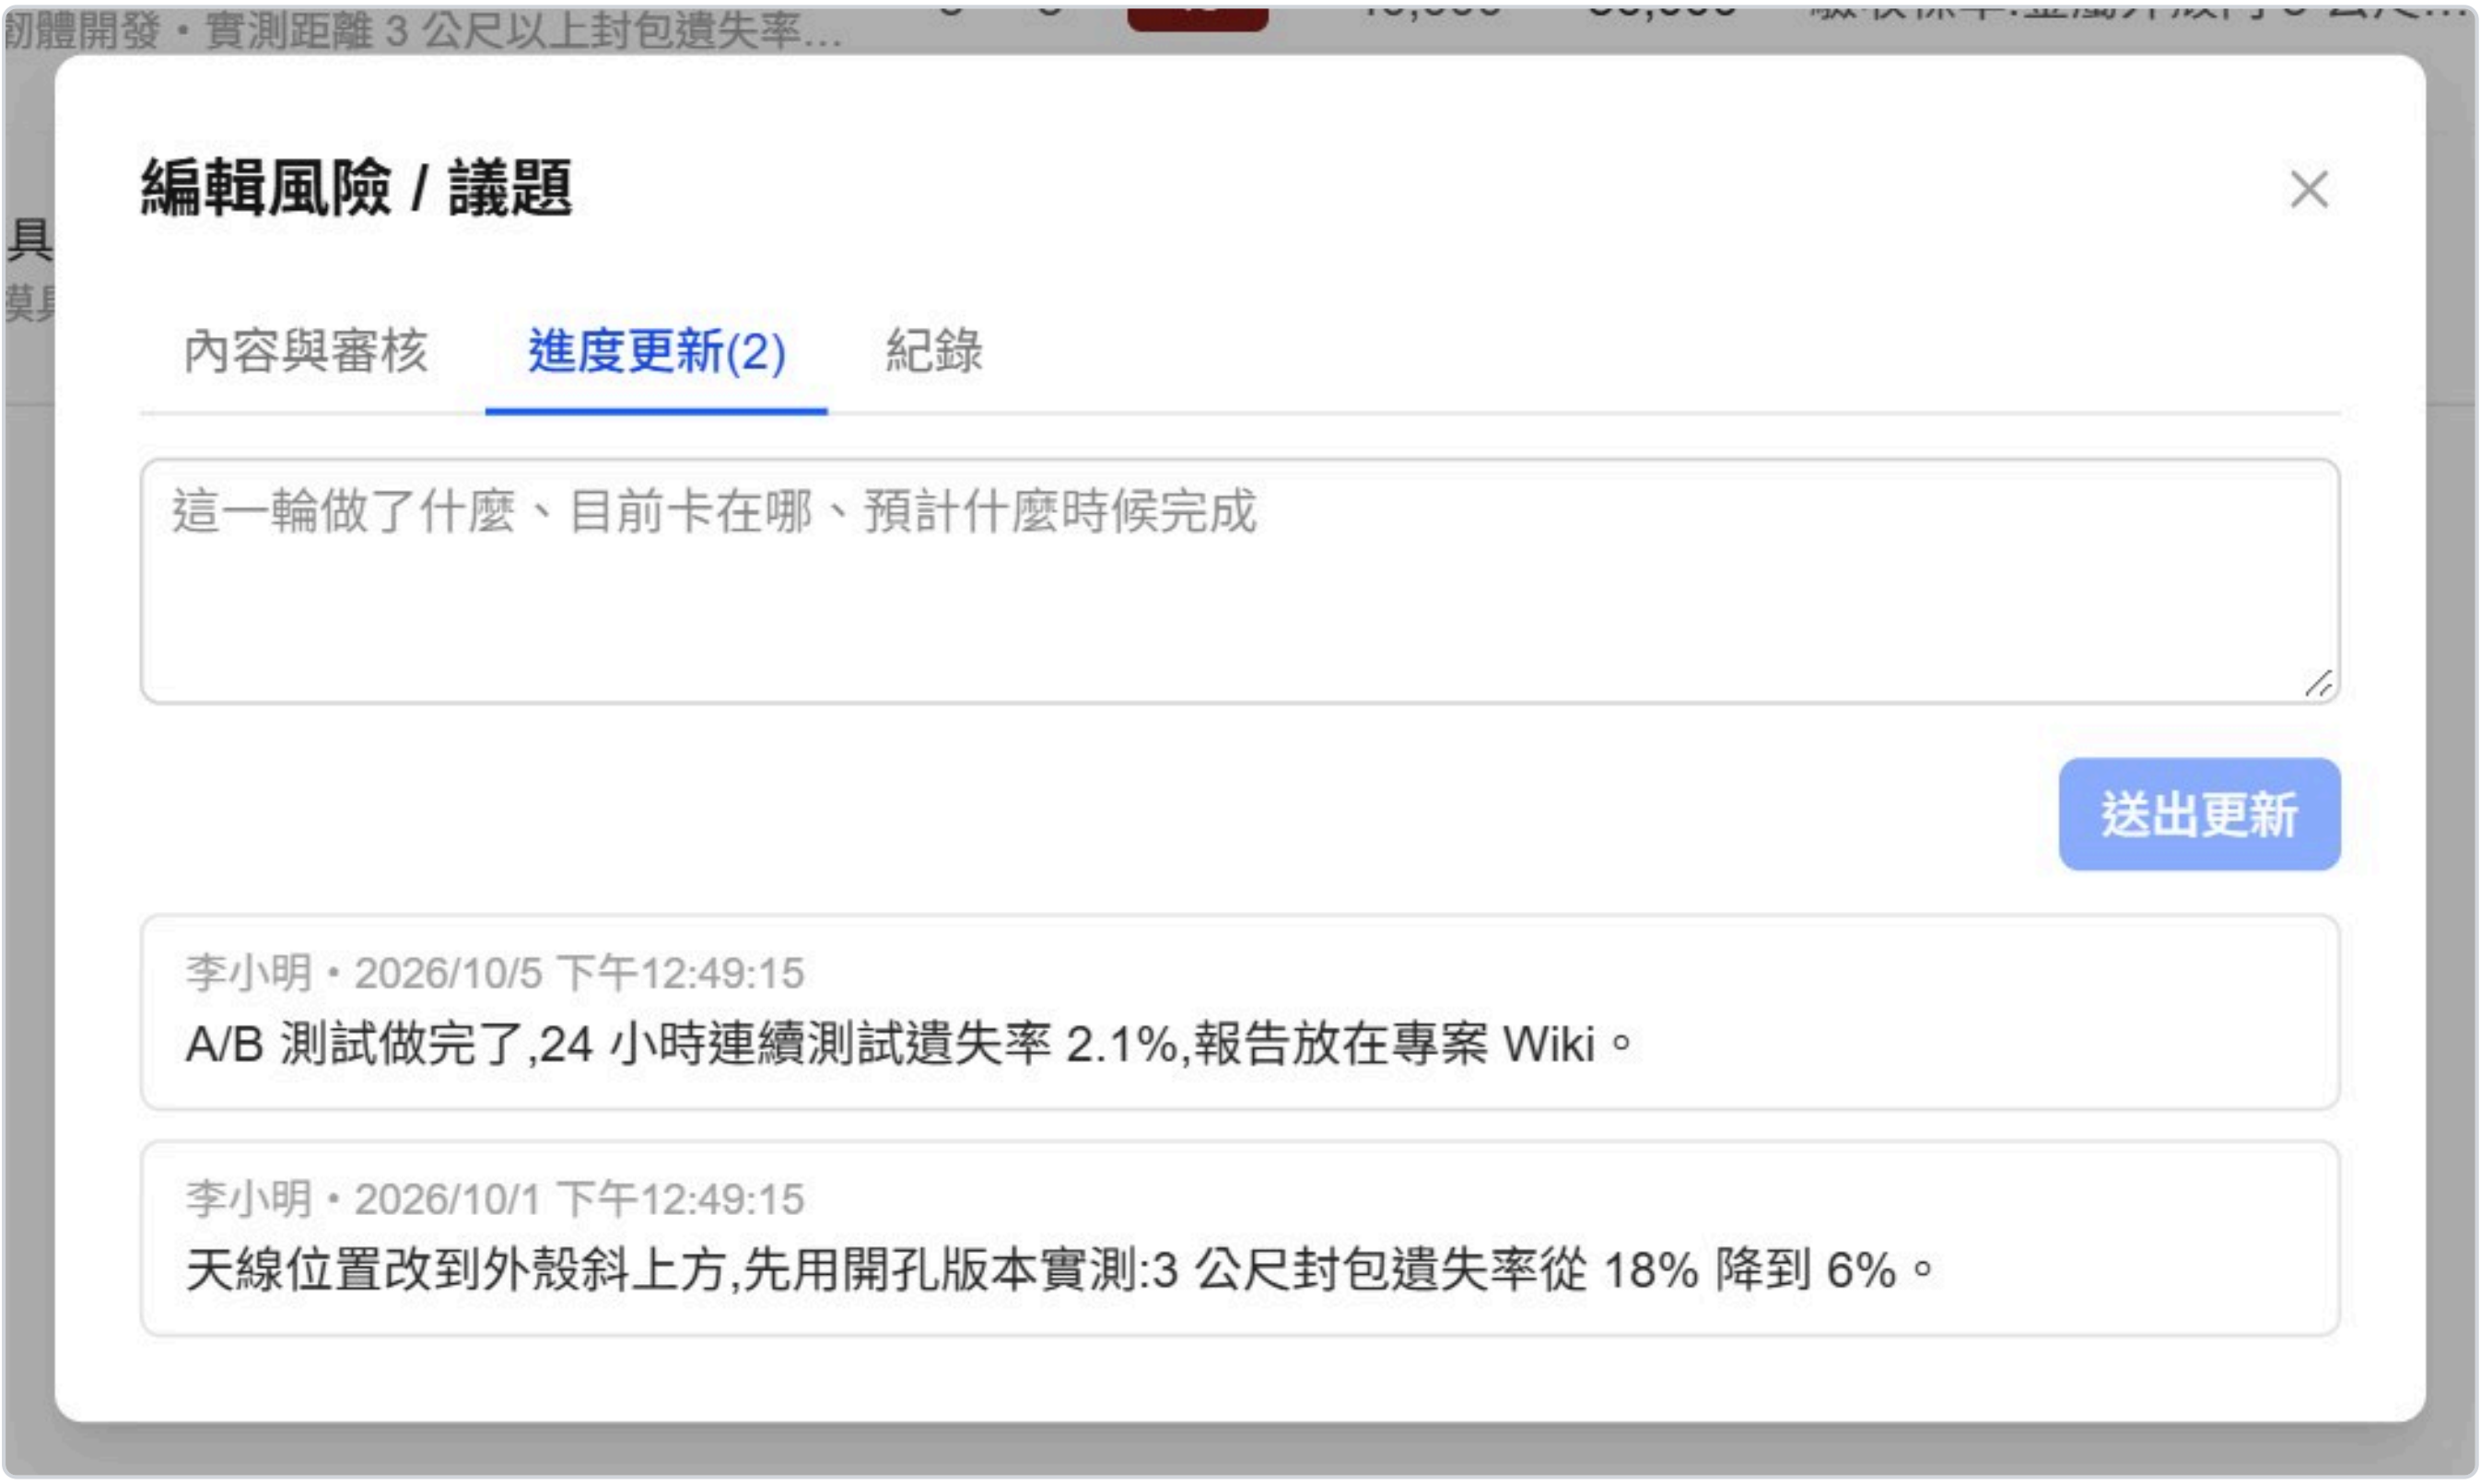

編輯風險 / 議題

內容與審核　**進度更新(2)**　紀錄

這一輪做了什麼、目前卡在哪、預計什麼時候完成

送出更新

李小明・2026/10/5 下午12:49:15
A/B 測試做完了,24 小時連續測試遺失率 2.1%,報告放在專案 Wiki。

李小明・2026/10/1 下午12:49:15
天線位置改到外殼斜上方,先用開孔版本實測:3 公尺封包遺失率從 18% 降到 6%。

「**紀錄**」分頁會列出這一筆發生過的每件事:誰建立、改了哪個欄位(例如「負責人:李小明 → 張建宏」)、寫了進度更新、申請結案、誰同意、誰退回、重新開啟。

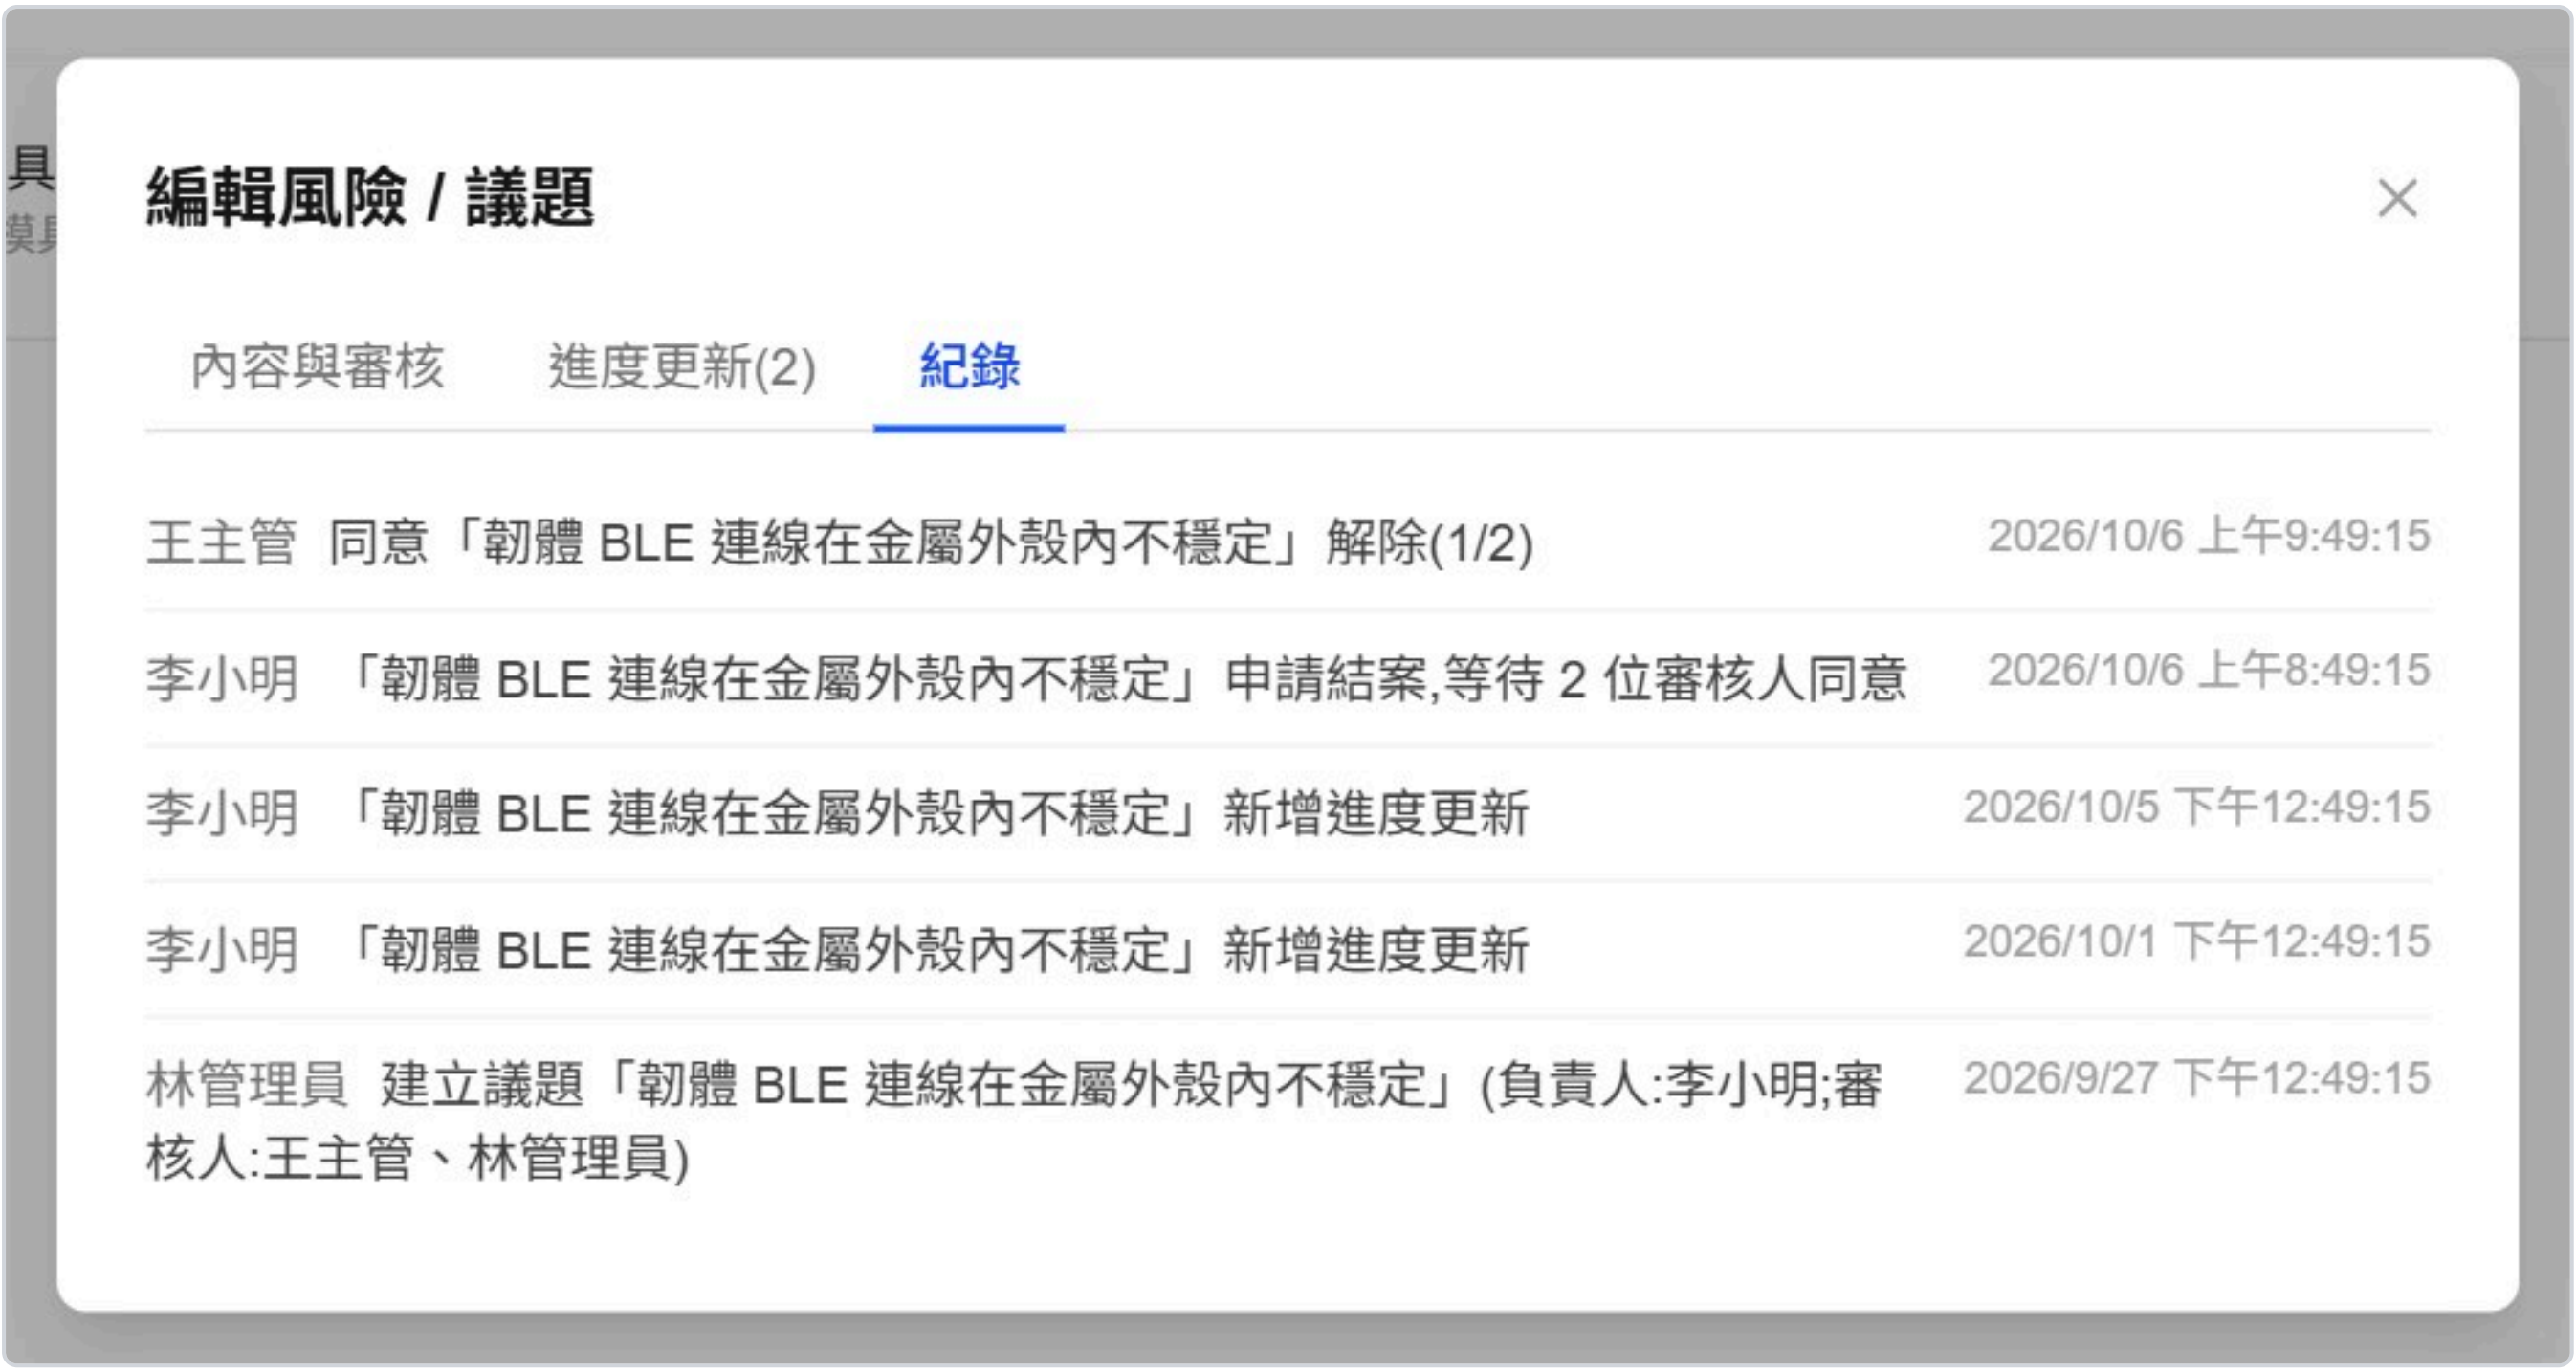

王主管 同意「韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定」解除(1/2) 2026/10/6 上午9:49:15

李小明 「韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定」申請結案,等待 2 位審核人同意 2026/10/6 上午8:49:15

李小明 「韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定」新增進度更新 2026/10/5 下午12:49:15

李小明 「韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定」新增進度更新 2026/10/1 下午12:49:15

林管理員 建立議題「韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定」(負責人:李小明;審核人:王主管、林管理員) 2026/9/27 下午12:49:15

管理者也可以在「稽核軌跡」選「風險議題」分類看全部看板的紀錄,被刪掉的風險、議題也會留下一筆「刪除」。

11.5 從 MantisBT 同步問題

專案的 bug 與問題如果記在 MantisBT,可以讓它同步進看板的風險與議題。**預設只從 Mantis 讀**(以 Mantis 為準,這邊唯讀);管理者也可以開啟**寫回**,讓你在這邊的修改馬上寫進 Mantis(見本節最後的「雙向:欄位對應與寫回 Mantis」):

- **誰設定、怎麼設定**【管理者】:系統設定的「**MantisBT 同步**」卡片,「新增連線」。選看板、貼 Mantis 網址、貼 API token(在 Mantis 的「我的帳號 → API 權杖」建立,那個帳號要能檢視該專案),按「讀取專案」挑 Mantis 專案,「儲存並同步」。**一個看板對一個 Mantis 專案**,一個 Mantis 專案也只能對應一個看板。需要 Mantis 2.20 以上。token 加密後存放,不會再顯示出來。

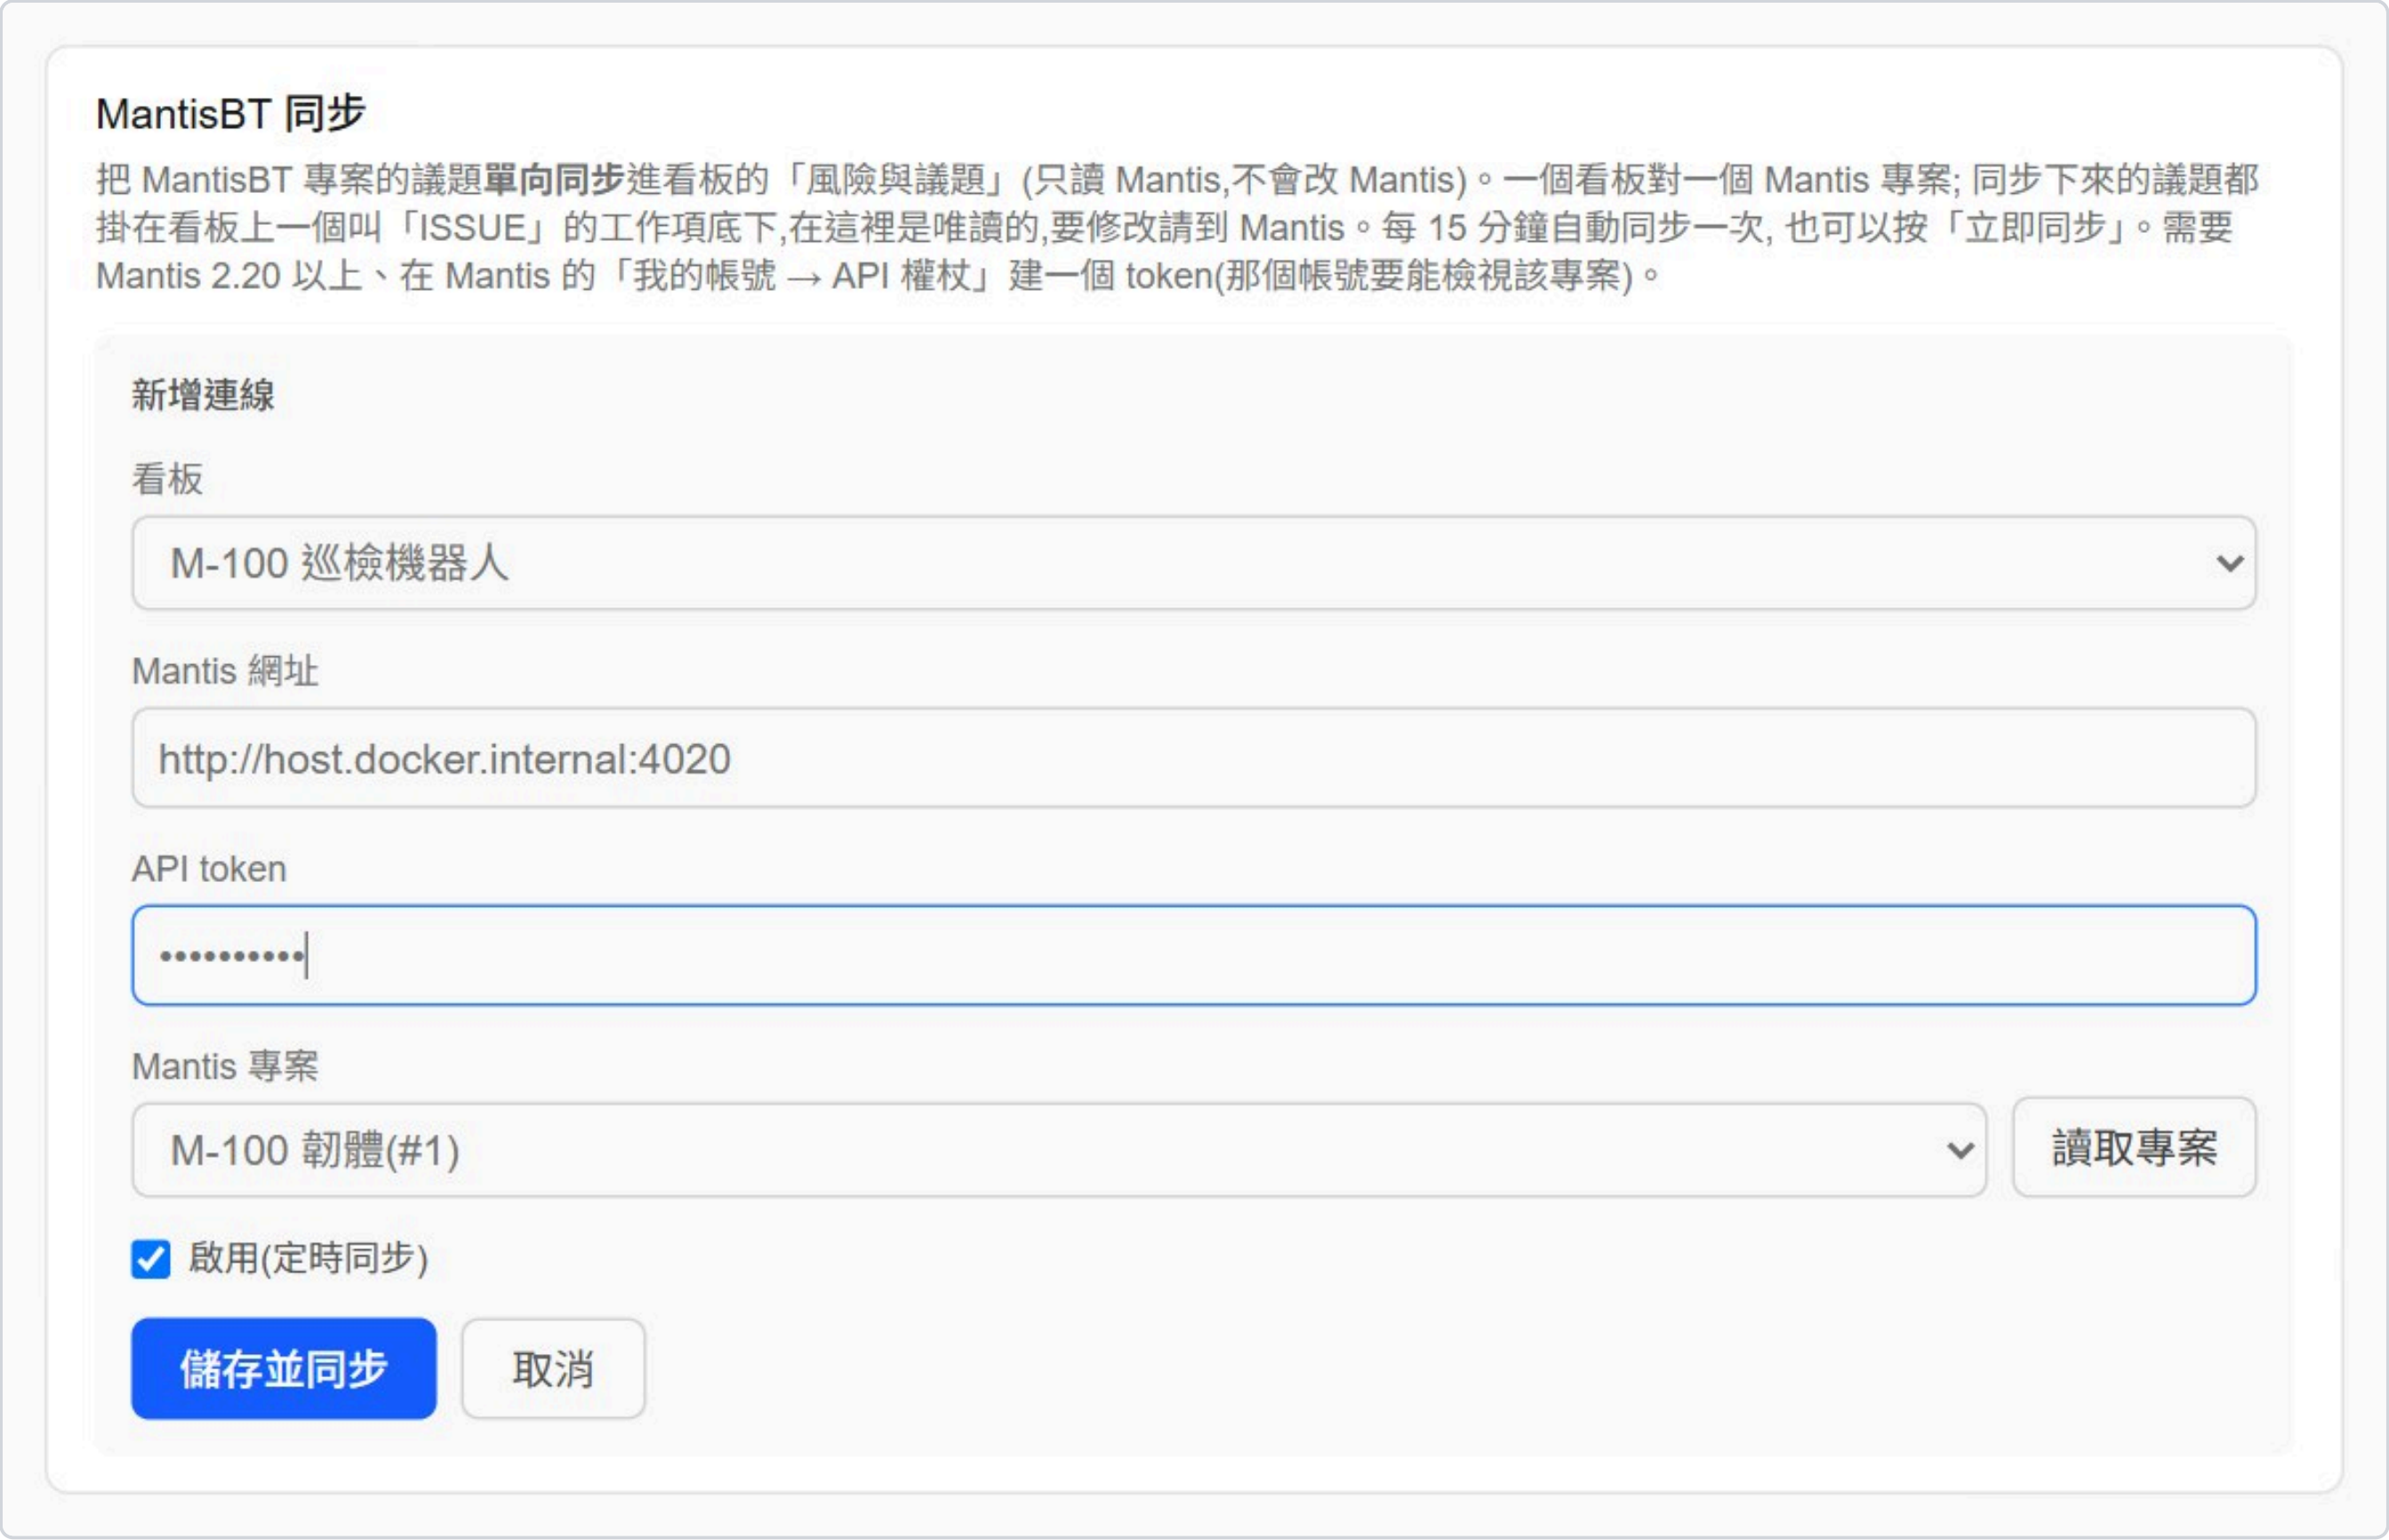

MantisBT 同步

把 MantisBT 專案的議題**單向同步**進看板的「風險與議題」(只讀 Mantis,不會改 Mantis)。一個看板對一個 Mantis 專案; 同步下來的議題都掛在看板上一個叫「ISSUE」的工作項底下,在這裡是唯讀的,要修改請到 Mantis。每 15 分鐘自動同步一次, 也可以按「立即同步」。需要 Mantis 2.20 以上、在 Mantis 的「我的帳號 → API 權杖」建一個 token(那個帳號要能檢視該專案)。

新增連線

看板: M-100 巡檢機器人

Mantis 網址: http://host.docker.internal:4020

API token: ••••••••••

Mantis 專案: M-100 韌體(#1)

☑ 啟用(定時同步)

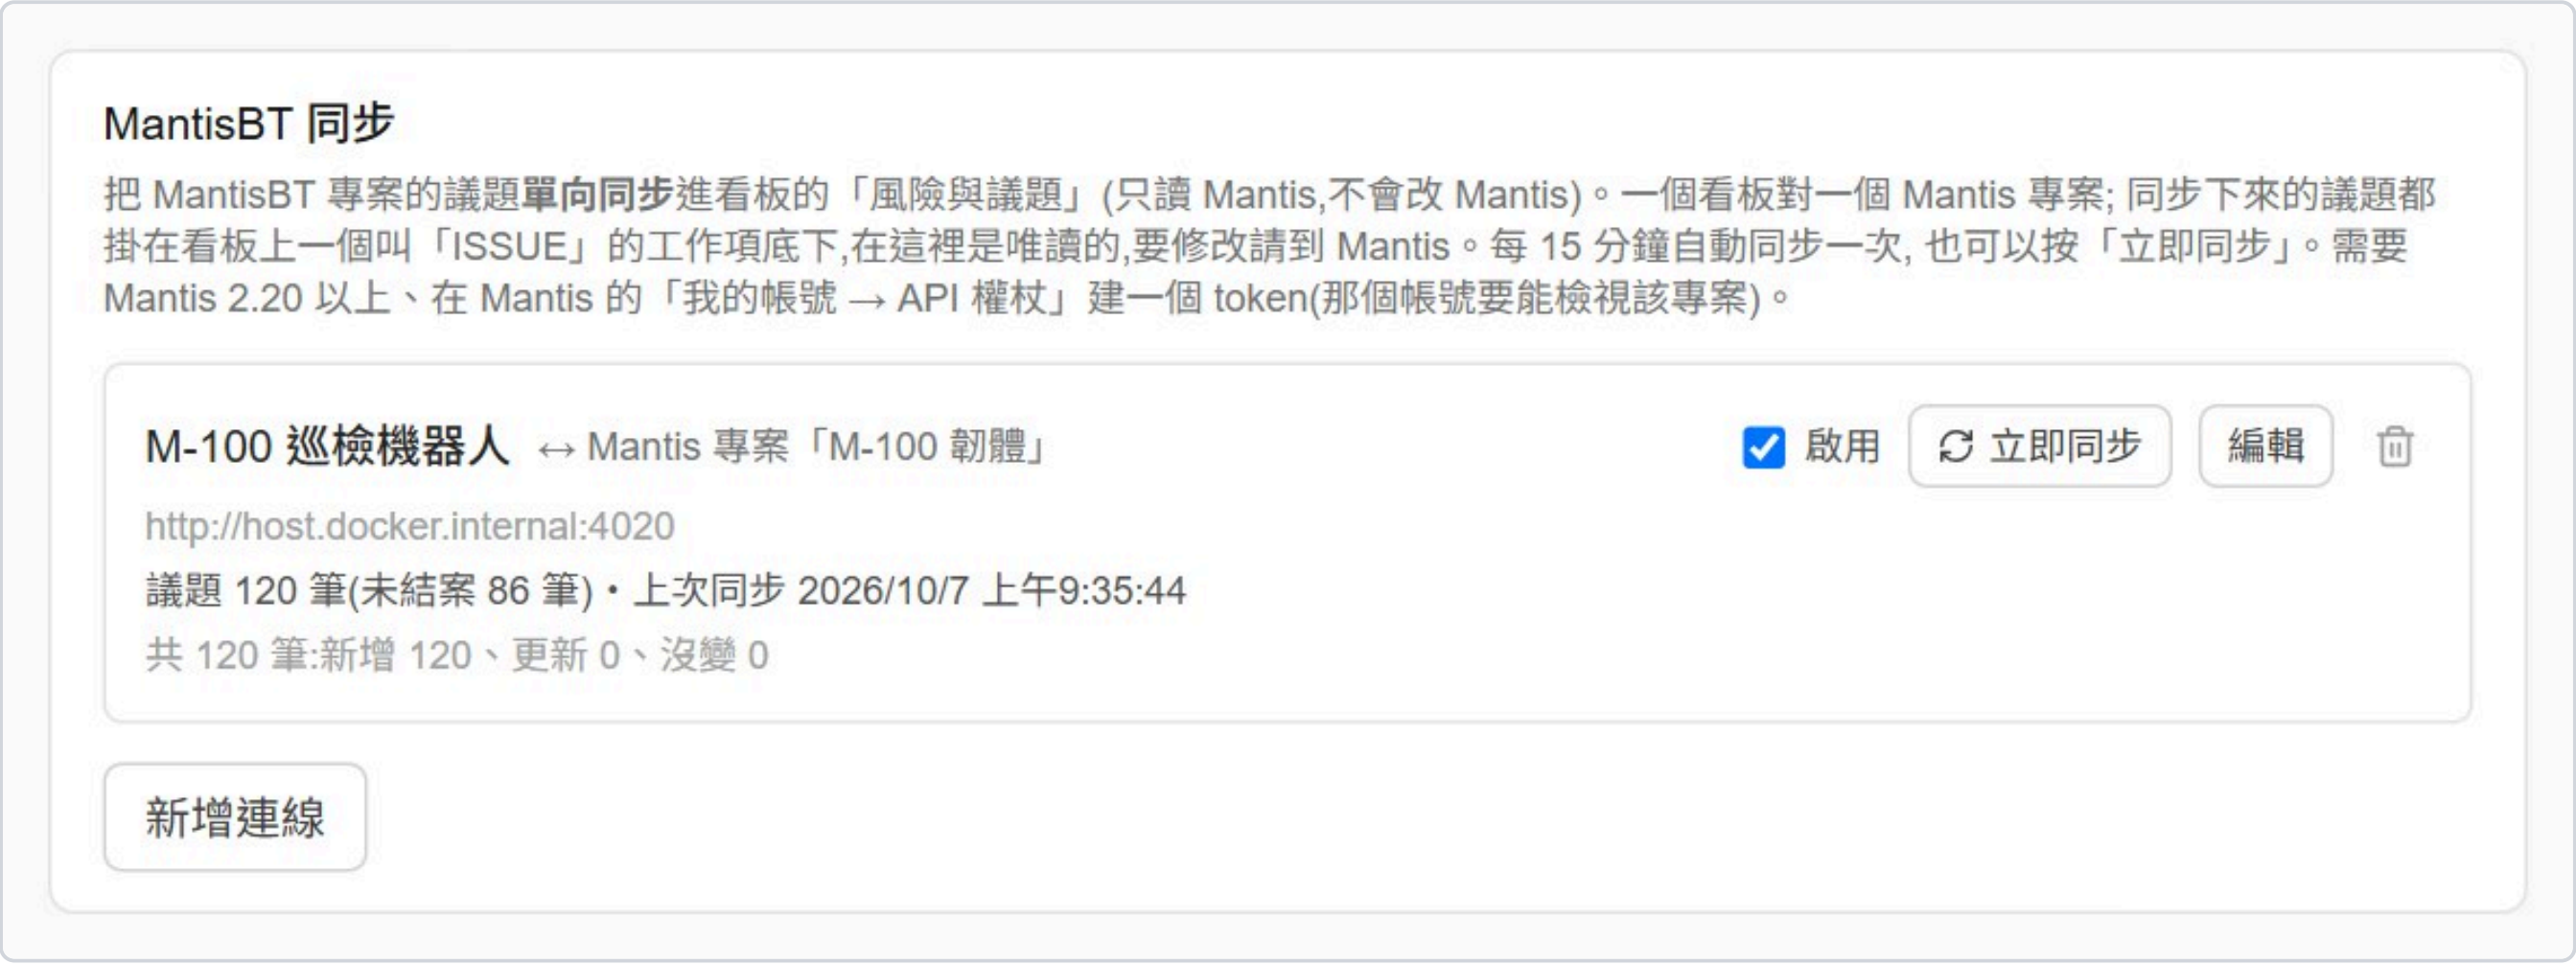

MantisBT 同步

把 MantisBT 專案的議題**單向同步**進看板的「風險與議題」(只讀 Mantis,不會改 Mantis)。一個看板對一個 Mantis 專案; 同步下來的議題都掛在看板上一個叫「ISSUE」的工作項底下,在這裡是唯讀的,要修改請到 Mantis。每 15 分鐘自動同步一次, 也可以按「立即同步」。需要 Mantis 2.20 以上、在 Mantis 的「我的帳號 → API 權杖」建一個 token(那個帳號要能檢視該專案)。

M-100 巡檢機器人 ↔ Mantis 專案「M-100 韌體」

http://host.docker.internal:4020

議題 120 筆(未結案 86 筆)・上次同步 2026/10/7 上午9:35:44

共 120 筆:新增 120、更新 0、沒變 0

☑ 啟用

- **同步哪些**:這個 Mantis 專案的所有問題單,變成看板「風險與議題」裡的項目,類型欄標「**問題**」(跟「問題」分頁、對話 # 選單的「問題」是同一批),**都掛在看板上自動建立的「ISSUE」工作項底下**(放在第一個分組,可以自己搬位置)。每 15 分鐘自動同步一次,也可以按「立即同步」;失敗的原因(token 被拒、網址被轉址、找不到 REST API、逾時)會寫在卡片上。
- **欄位怎麼對應**:標題 = Mantis 摘要;說明 = Mantis 說明 + 最近 5 則備註;**狀態**依 Mantis 的狀態編號——沒人處理(new、feedback、acknowledged、confirmed)= 未處理,assigned = 處理中,resolved 與 closed = 已結案(自訂狀態也照編號歸類);**衝擊**依嚴重度(trivial 以下 1、tweak 2、minor 3、major 4、crash 與 block 5),機率固定最高(議題是已經發生的事);**負責人**依處理人對應本系統的同仁——先看管理者**手動指定**的,再比 **Email**,再比**名稱**(Mantis 的使用者名稱或姓名,跟本系統同仁的姓名或 Email 帳號相同,忽略大小寫與空白、底線、點,例如 Jason_Huang = Jason Huang;同名的兩個人不會亂猜),都對不到就沒有負責人,可以在「欄位對應與寫回」的「處理人對應」直接指定;到期日用 Mantis 的到期日。**這些是預設規則**,每個連線可以在「欄位對應與寫回」調整(見下面)。

- **在風險與議題頁**:Mantis 來源的「類型」欄寫「**問題**」(手動建立的寫風險或議題),標題旁有「Mantis #123」標記(點下去開 Mantis 該問題),上方多一個「**來源**」篩選(全部 / 手動建立 / Mantis 同步)。這些議題**預設是唯讀**的——內容、狀態、結案流程和刪除都鎖住,因為下一次同步會用 Mantis 上的內容蓋回來,要修改請到 Mantis(連線開啟寫回後,開放的欄位可以在這邊改,見本節最後);「進度更新」是這邊自己的時間軸,照常可以寫。

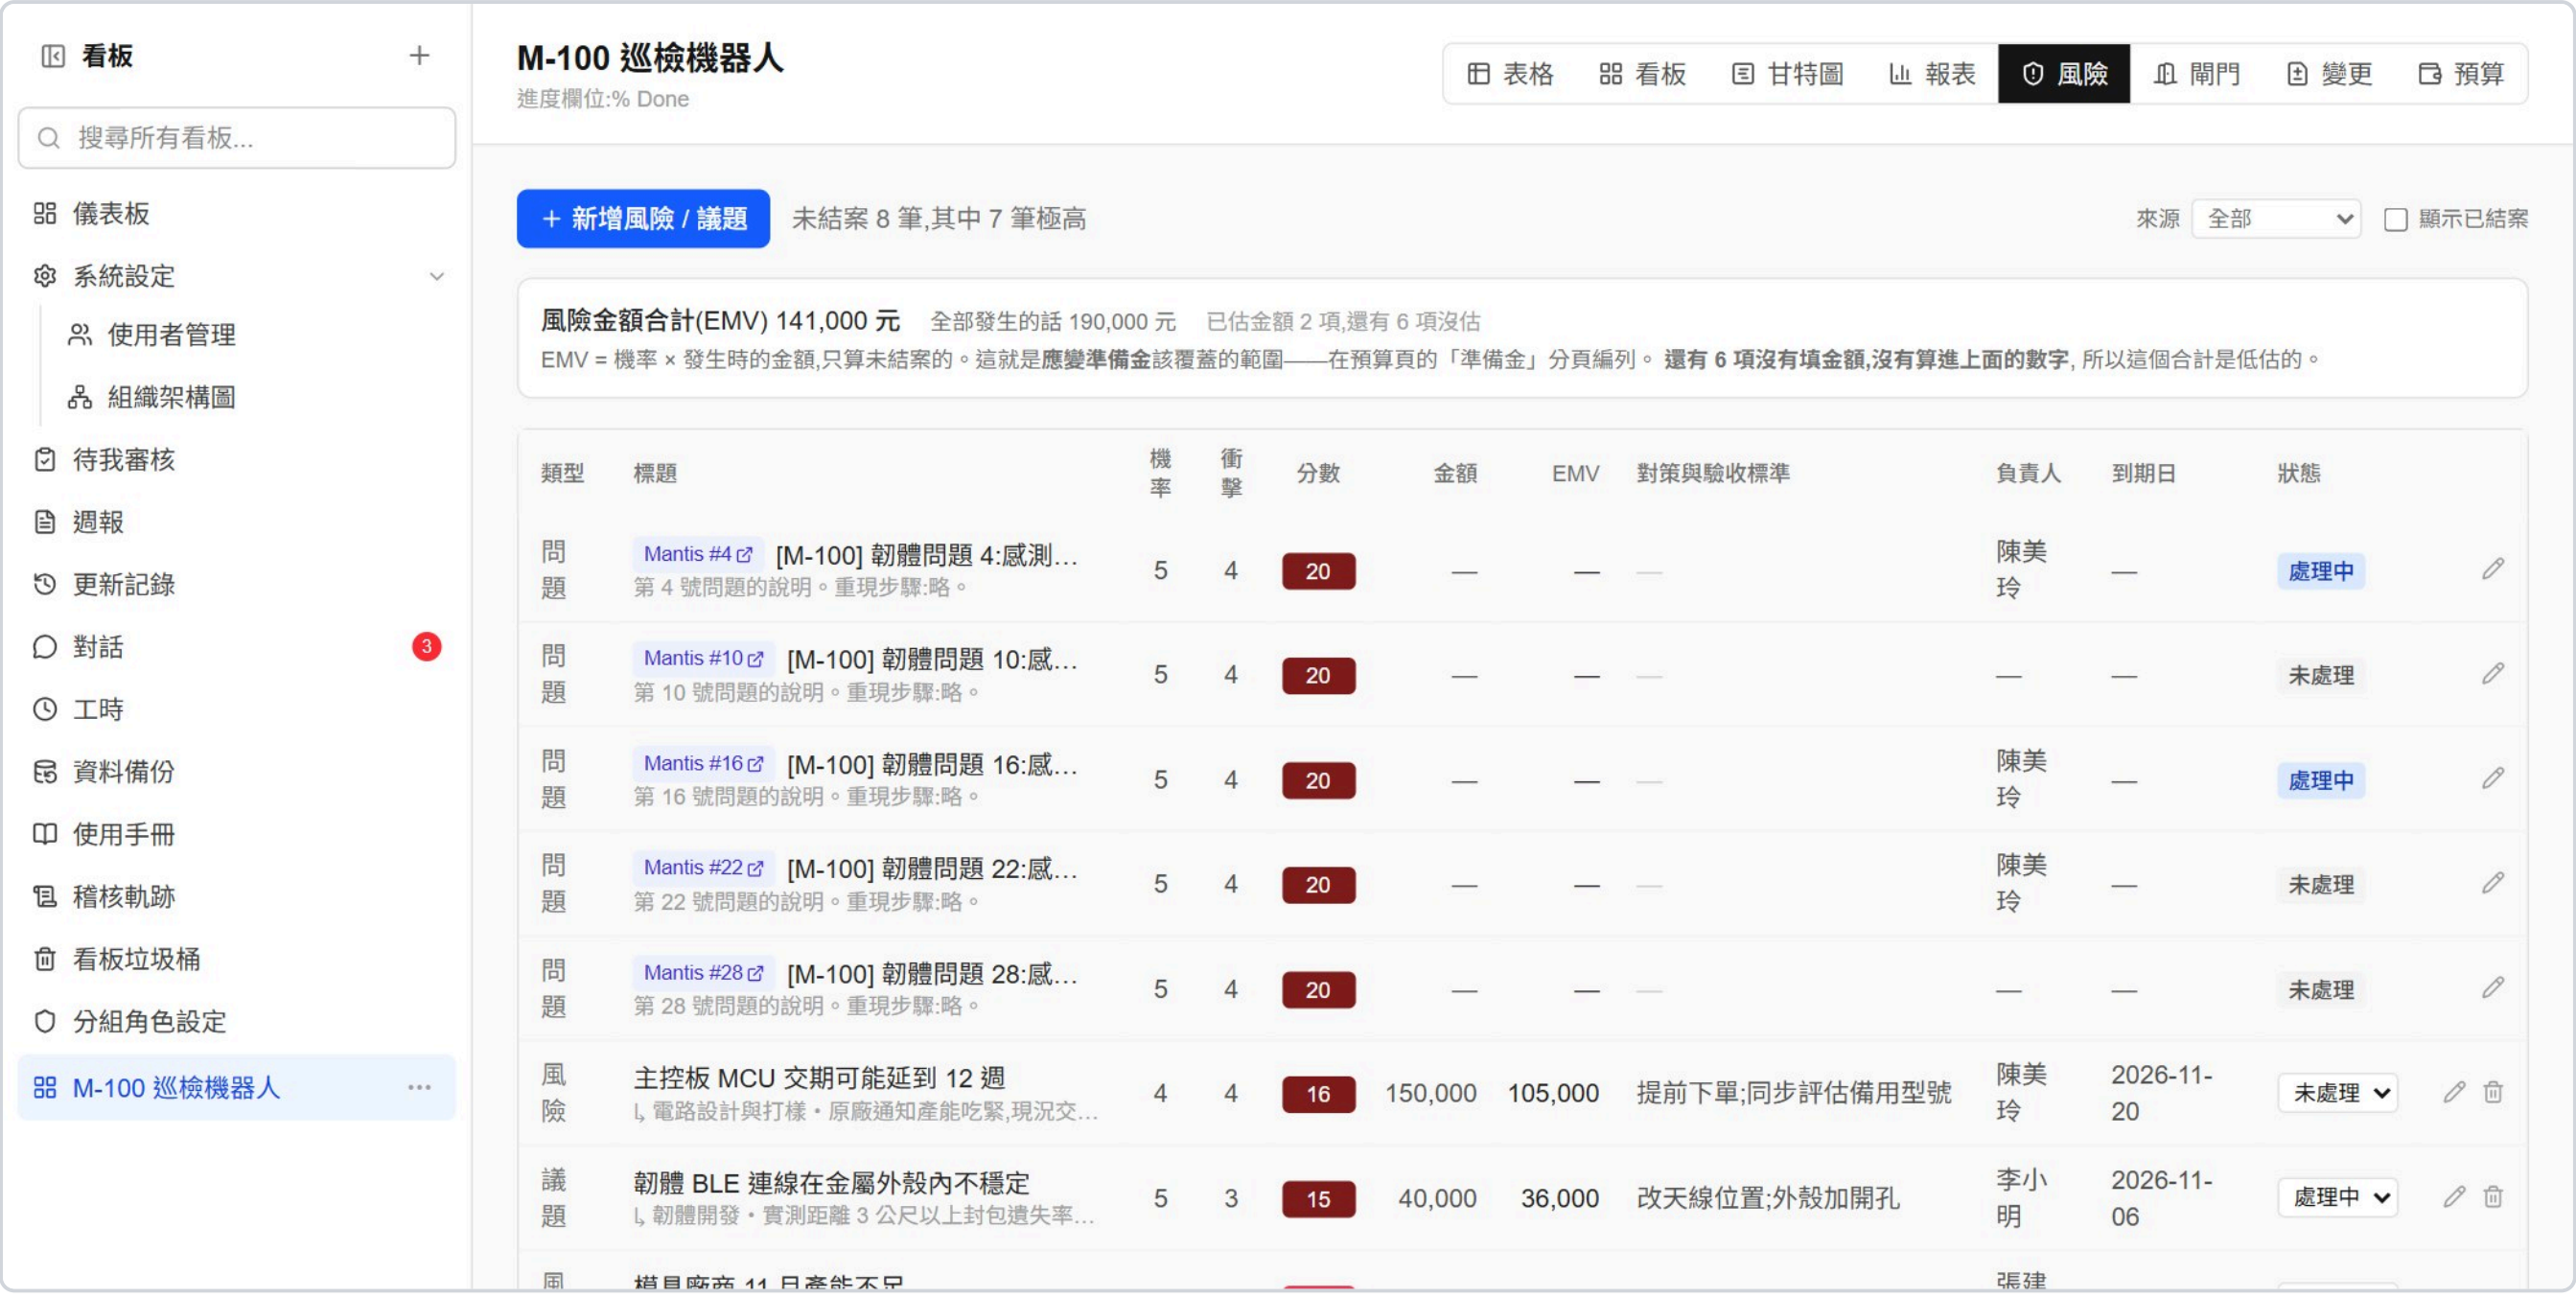
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
對話
3
工時
資料備份
使用手冊
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
+ 新增風險 / 議題
來源
全部
□ 顯示已結案

M-100 巡檢機器人

進度欄位:% Done

未結案 8 筆,其中 7 筆極高

風險金額合計(EMV) 141,000 元 全部發生的話 190,000 元 已估金額 2 項,還有 6 項沒估

EMV = 機率 × 發生時的金額,只算未結案的。這就是**應變準備金**該覆蓋的範圍——在預算頁的「準備金」分頁編列。 **還有 6 項沒有填金額,沒有算進上面的數字**, 所以這個合計是低估的。

類型	標題	機率	衝擊	分數	金額	EMV	對策與驗收標準	負責人	到期日	狀態
問題	Mantis #4 [M-100] 韌體問題 4:感測… 第 4 號問題的說明。重現步驟:略。	5	4	20	—	—	—	陳美玲	—	處理中
問題	Mantis #10 [M-100] 韌體問題 10:感… 第 10 號問題的說明。重現步驟:略。	5	4	20	—	—	—	—	—	未處理
問題	Mantis #16 [M-100] 韌體問題 16:感… 第 16 號問題的說明。重現步驟:略。	5	4	20	—	—	—	陳美玲	—	處理中
問題	Mantis #22 [M-100] 韌體問題 22:感… 第 22 號問題的說明。重現步驟:略。	5	4	20	—	—	—	陳美玲	—	未處理
問題	Mantis #28 [M-100] 韌體問題 28:感… 第 28 號問題的說明。重現步驟:略。	5	4	20	—	—	—	—	—	未處理
風險	主控板 MCU 交期可能延到 12 週 ↳ 電路設計與打樣 • 原廠通知產能吃緊,現況交…	4	4	16	150,000	105,000	提前下單;同步評估備用型號	陳美玲	2026-11-20	未處理
議題	韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定 ↳ 韌體開發 • 實測距離 3 公尺以上封包遺失率…	5	3	15	40,000	36,000	改天線位置;外殼加開孔	李小明	2026-11-06	處理中
風	模具廠商 11 月產能不足							張建		

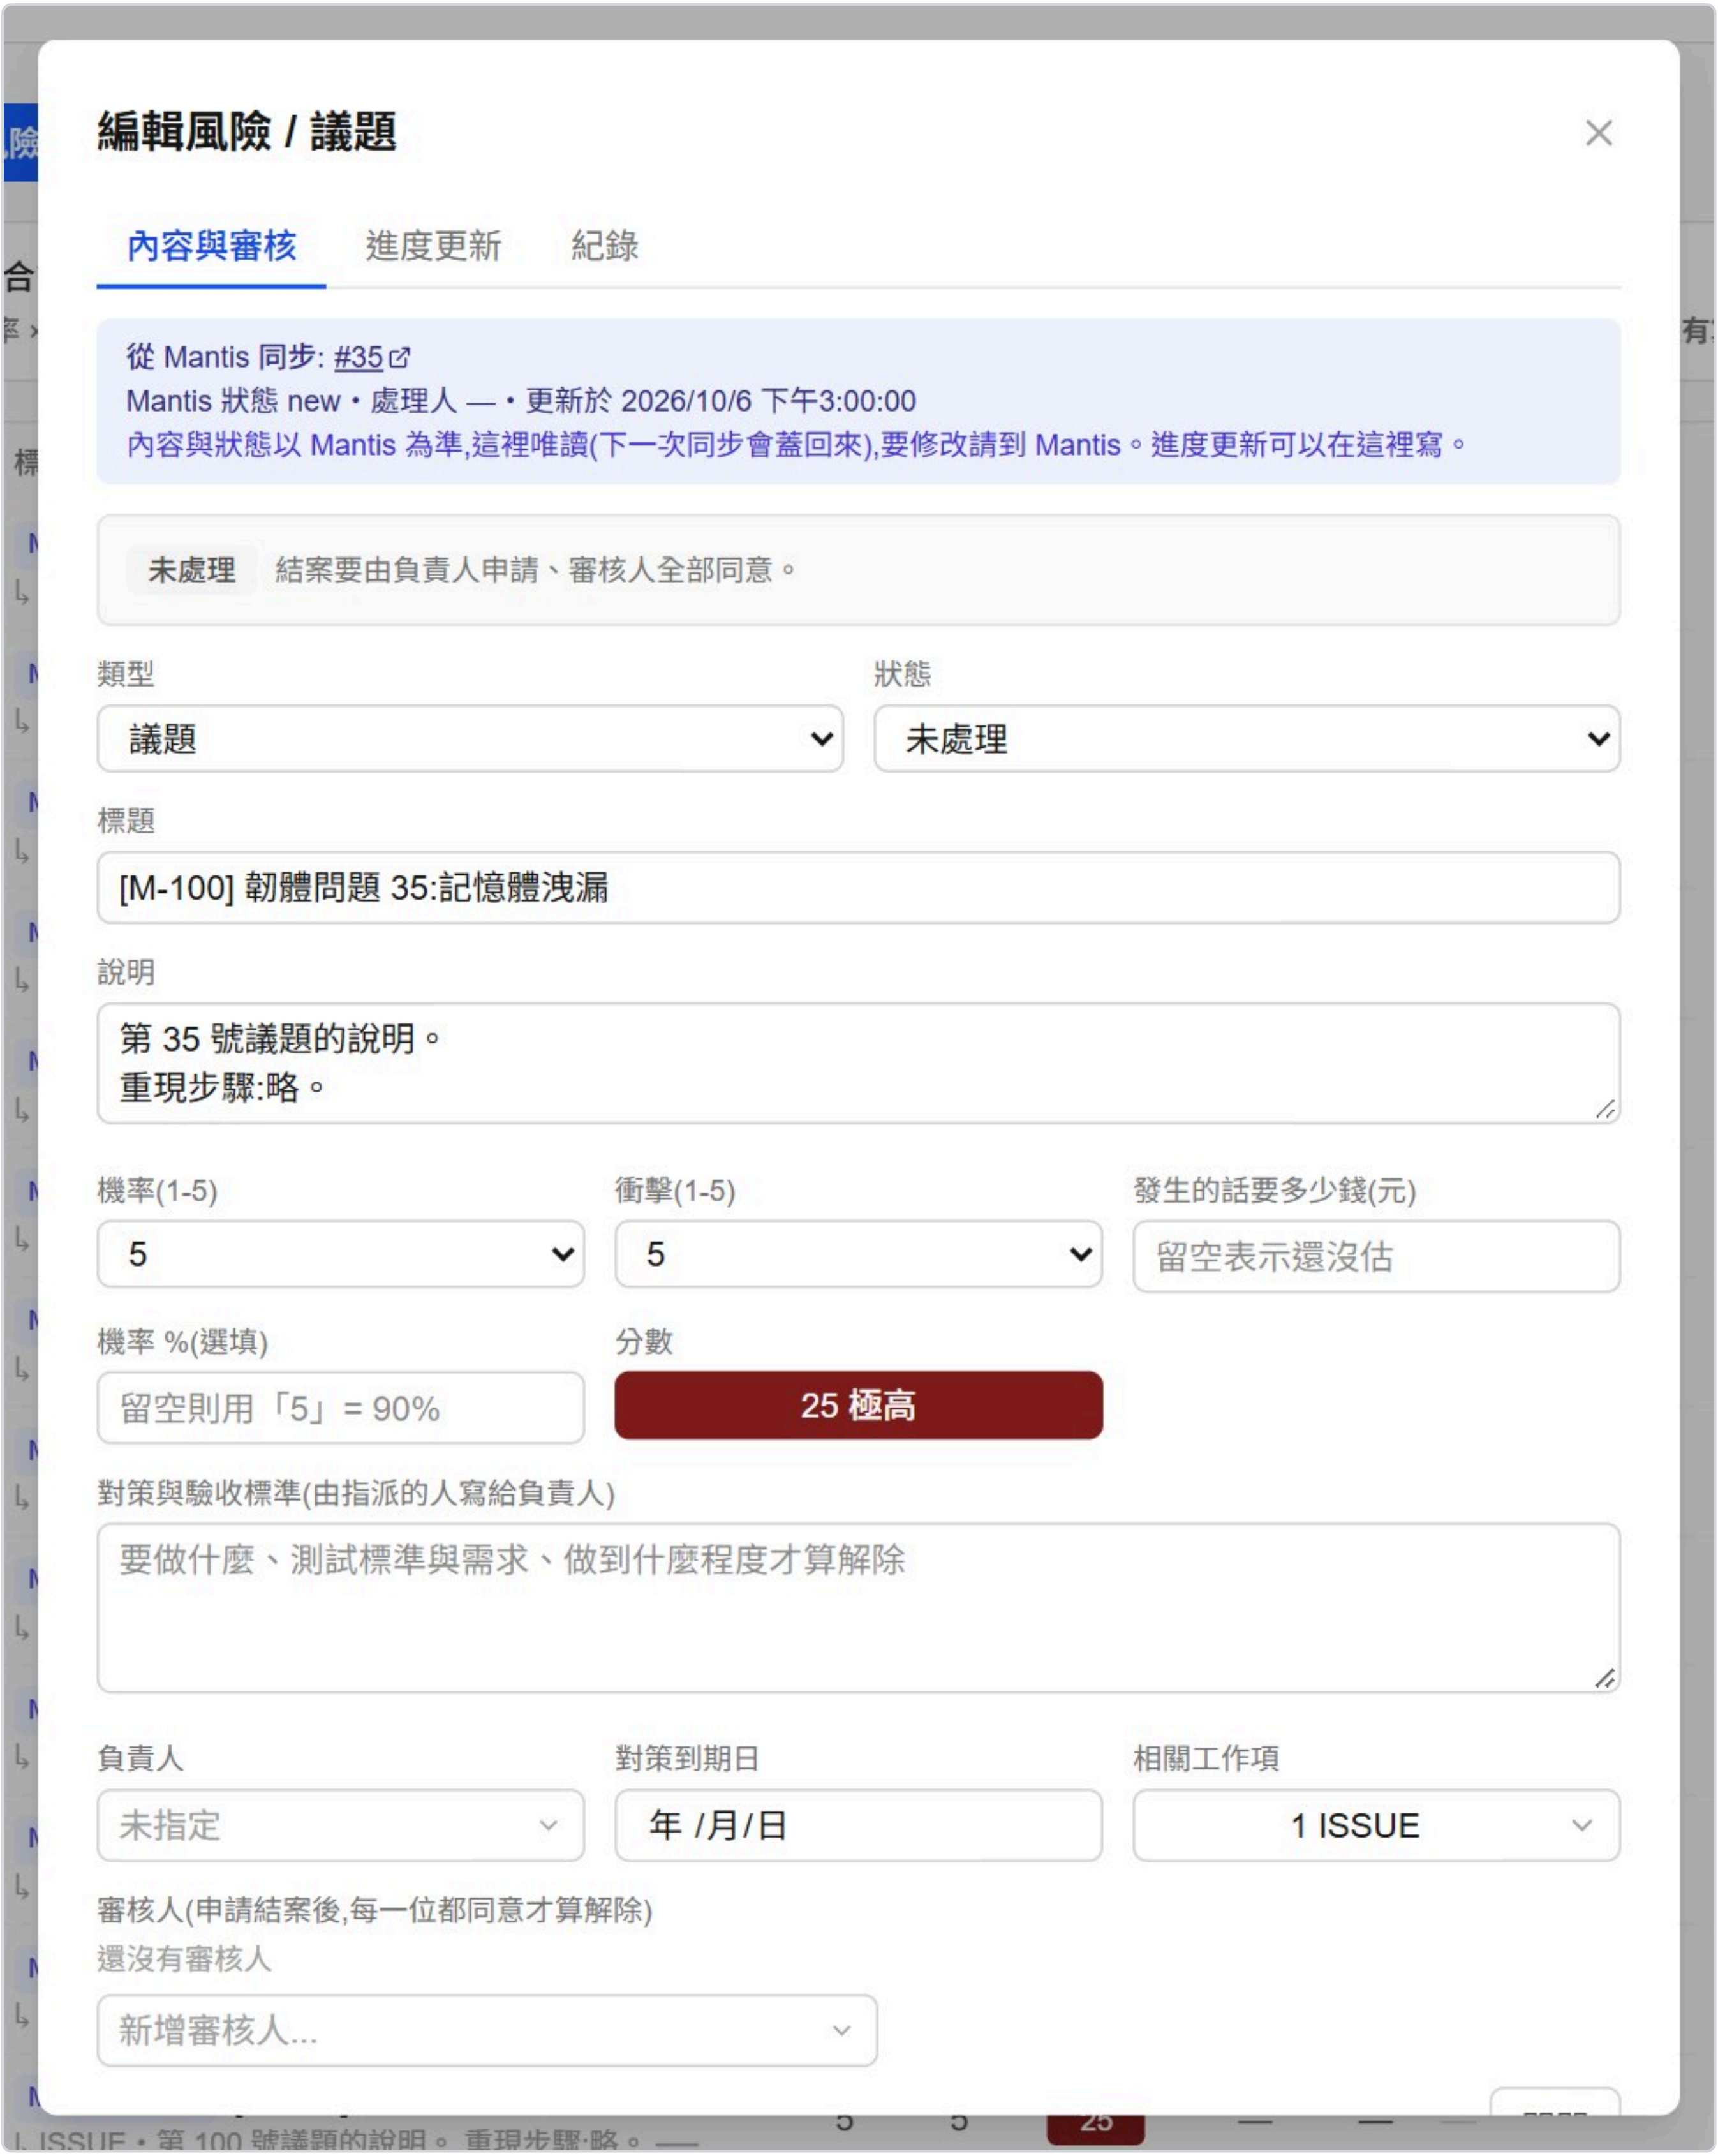

從 Mantis 同步: #35
Mantis 狀態 new・處理人 —・更新於 2026/10/6 下午3:00:00
內容與狀態以 Mantis 為準,這裡唯讀(下一次同步會蓋回來),要修改請到 Mantis。進度更新可以在這裡寫。

未處理　結案要由負責人申請、審核人全部同意。

類型: 議題
狀態: 未處理
標題: [M-100] 韌體問題 35:記憶體洩漏
說明: 第 35 號議題的說明。
重現步驟:略。
機率(1-5): 5
衝擊(1-5): 5
發生的話要多少錢(元): 留空表示還沒估
機率 %(選填): 留空則用「5」= 90%
分數: 25 極高
對策與驗收標準(由指派的人寫給負責人): 要做什麼、測試標準與需求、做到什麼程度才算解除
負責人: 未指定
對策到期日: 年 /月/日
相關工作項: 1 ISSUE
審核人(申請結案後,每一位都同意才算解除)
還沒有審核人
新增審核人...

- **「問題」分頁**:連了 Mantis 的看板,在「風險」旁邊多一個「問題」分頁,專門看同步下來的 Mantis 問題(看得到看板的人都看得到,唯讀)。上方是連線的 Mantis 專案、上次同步時間(管理者有「立即同步」)與狀態統計(全部 / 未處理 / 處理中 / 已結案,點一下就篩);可以搜尋標題、編號、處理人、分類,也能依處理人篩選。同步成功卻一筆問題都沒取到時,這一頁會直接說明是用哪個 Mantis 帳號在讀、那個帳號看不看得到這個專案(最常見的原因是 token 的帳號沒有專案的檢視權限)。有兩種看法:

  - **清單**:每筆問題的 Mantis 資訊——編號(點下去開 Mantis)、摘要、狀態、嚴重度、優先權、處理人、回報人、分類、到期日、更新時間;未結案的在前、嚴重的在前;點一列展開看說明與建立 / 更新時間。
  - **依處理人**:每位處理人一張卡,列出他手上的問題與各狀態筆數;處理人依上面的規則對應到本系統的同仁(對不到的標「Mantis」,沒有處理人的放最後)。

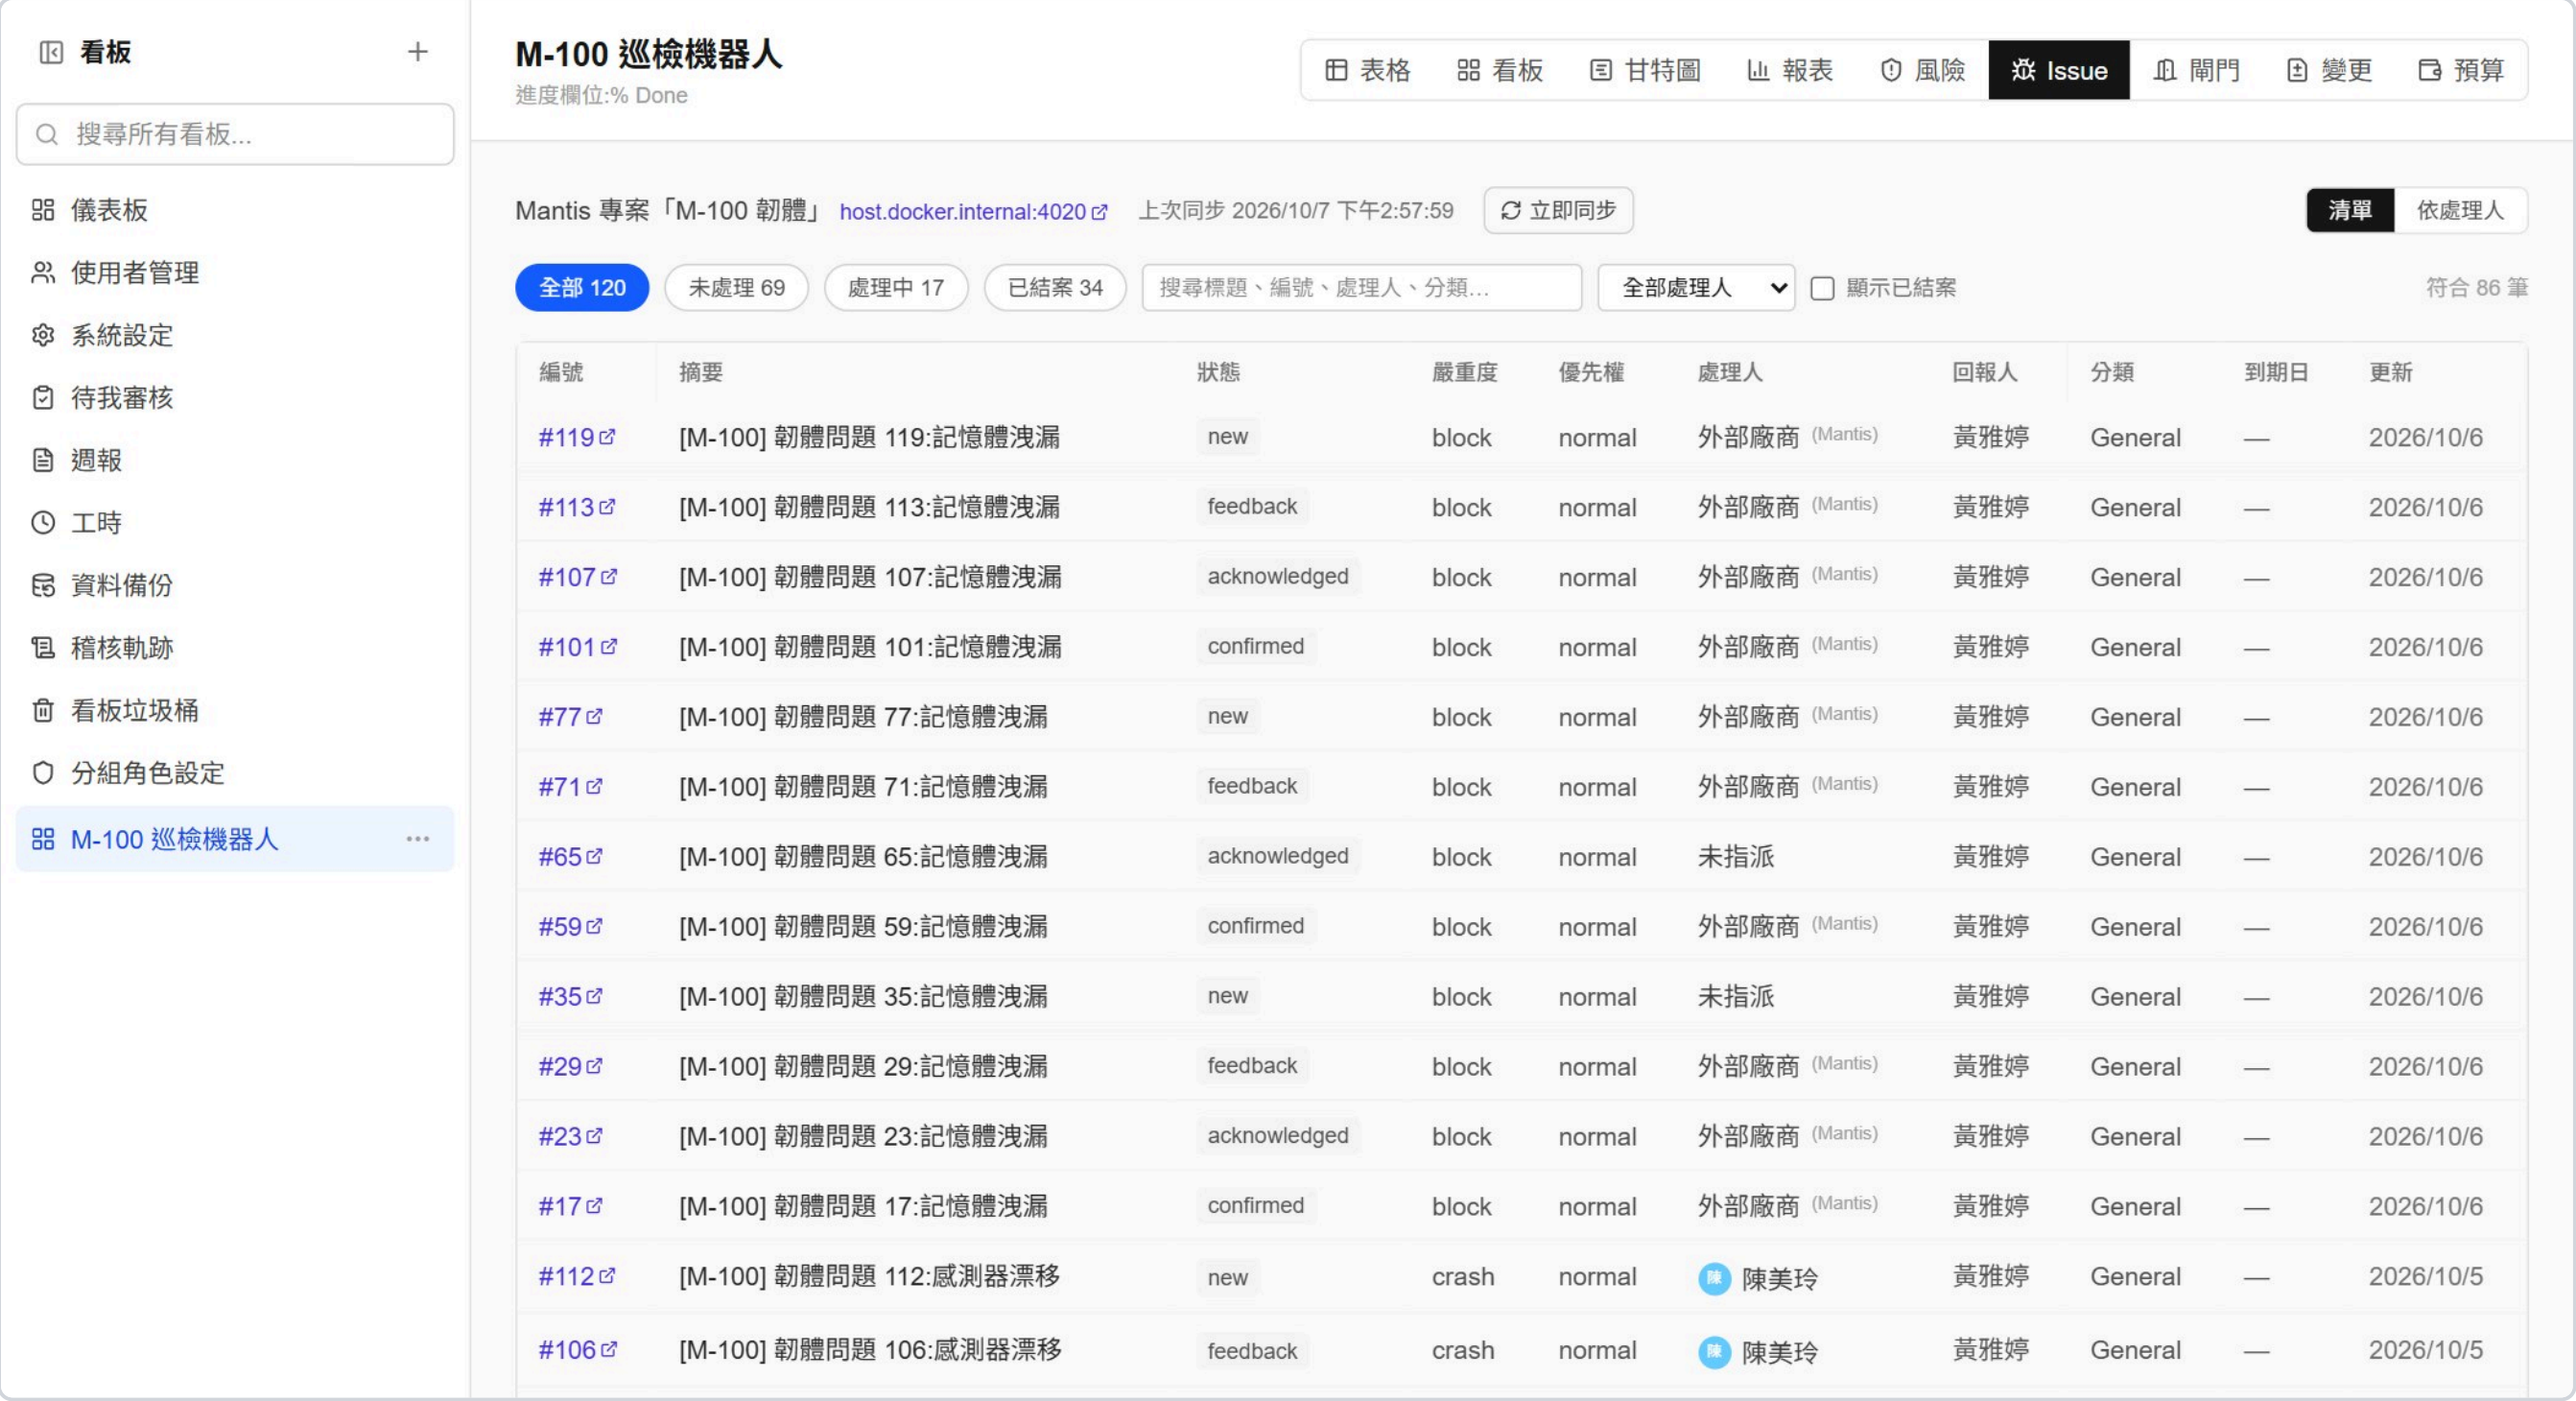
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
M-100 巡檢機器人
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
Issue
閘門
變更
預算
立即同步
清單
依處理人
全部 120
未處理 69
處理中 17
已結案 34
搜尋標題、編號、處理人、分類...
全部處理人
□ 顯示已結案

Mantis 專案「M-100 韌體」 host.docker.internal:4020 上次同步 2026/10/7 下午2:57:59

符合 86 筆

編號	摘要	狀態	嚴重度	優先權	處理人	回報人	分類	到期日	更新
#119	[M-100] 韌體問題 119:記憶體洩漏	new	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#113	[M-100] 韌體問題 113:記憶體洩漏	feedback	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#107	[M-100] 韌體問題 107:記憶體洩漏	acknowledged	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#101	[M-100] 韌體問題 101:記憶體洩漏	confirmed	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#77	[M-100] 韌體問題 77:記憶體洩漏	new	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#71	[M-100] 韌體問題 71:記憶體洩漏	feedback	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#65	[M-100] 韌體問題 65:記憶體洩漏	acknowledged	block	normal	未指派	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#59	[M-100] 韌體問題 59:記憶體洩漏	confirmed	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#35	[M-100] 韌體問題 35:記憶體洩漏	new	block	normal	未指派	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#29	[M-100] 韌體問題 29:記憶體洩漏	feedback	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#23	[M-100] 韌體問題 23:記憶體洩漏	acknowledged	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#17	[M-100] 韌體問題 17:記憶體洩漏	confirmed	block	normal	外部廠商 (Mantis)	黃雅婷	General	—	2026/10/6
#112	[M-100] 韌體問題 112:感測器漂移	new	crash	normal	陳美玲	黃雅婷	General	—	2026/10/5
#106	[M-100] 韌體問題 106:感測器漂移	feedback	crash	normal	陳美玲	黃雅婷	General	—	2026/10/5

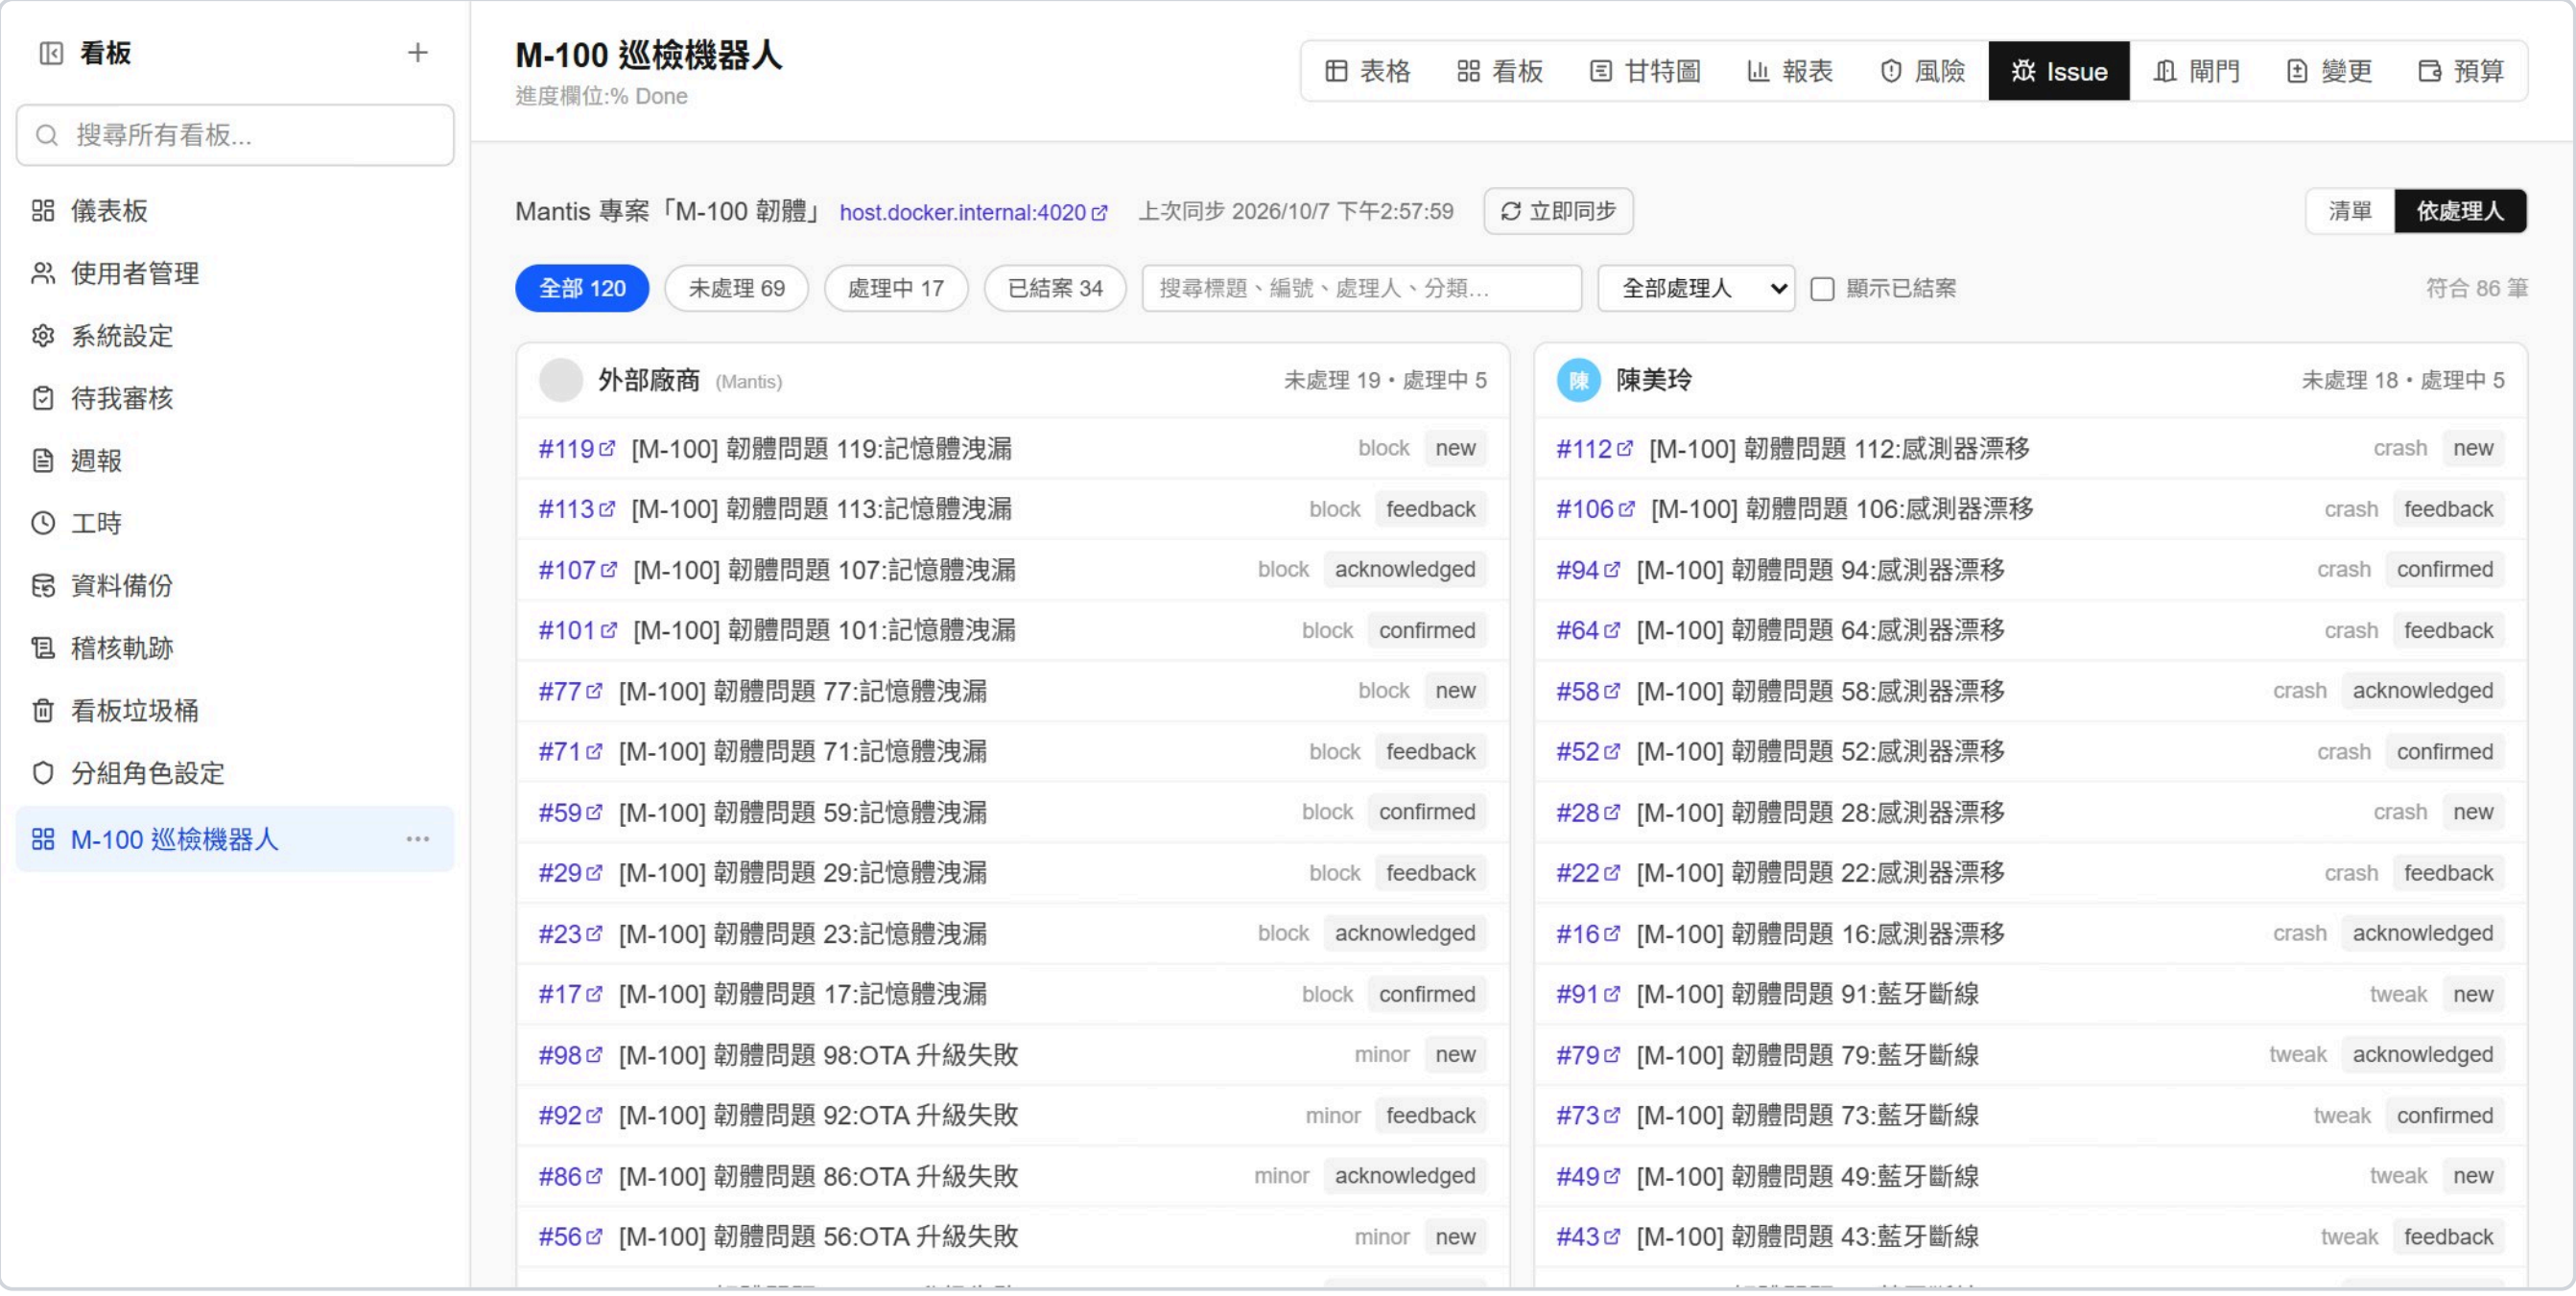
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
M-100 巡檢機器人
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
Issue
閘門
變更
預算
立即同步
清單
依處理人
全部 120
未處理 69
處理中 17
已結案 34
搜尋標題、編號、處理人、分類...
全部處理人
□ 顯示已結案

Mantis 專案「M-100 韌體」 host.docker.internal:4020 上次同步 2026/10/7 下午2:57:59

符合 86 筆

外部廠商 (Mantis) 未處理 19・處理中 5

#119	[M-100] 韌體問題 119:記憶體洩漏	block	new
#113	[M-100] 韌體問題 113:記憶體洩漏	block	feedback
#107	[M-100] 韌體問題 107:記憶體洩漏	block	acknowledged
#101	[M-100] 韌體問題 101:記憶體洩漏	block	confirmed
#77	[M-100] 韌體問題 77:記憶體洩漏	block	new
#71	[M-100] 韌體問題 71:記憶體洩漏	block	feedback
#59	[M-100] 韌體問題 59:記憶體洩漏	block	confirmed
#29	[M-100] 韌體問題 29:記憶體洩漏	block	feedback
#23	[M-100] 韌體問題 23:記憶體洩漏	block	acknowledged
#17	[M-100] 韌體問題 17:記憶體洩漏	block	confirmed
#98	[M-100] 韌體問題 98:OTA 升級失敗	minor	new
#92	[M-100] 韌體問題 92:OTA 升級失敗	minor	feedback
#86	[M-100] 韌體問題 86:OTA 升級失敗	minor	acknowledged
#56	[M-100] 韌體問題 56:OTA 升級失敗	minor	new

陳美玲 未處理 18・處理中 5

#112	[M-100] 韌體問題 112:感測器漂移	crash	new
#106	[M-100] 韌體問題 106:感測器漂移	crash	feedback
#94	[M-100] 韌體問題 94:感測器漂移	crash	confirmed
#64	[M-100] 韌體問題 64:感測器漂移	crash	feedback
#58	[M-100] 韌體問題 58:感測器漂移	crash	acknowledged
#52	[M-100] 韌體問題 52:感測器漂移	crash	confirmed
#28	[M-100] 韌體問題 28:感測器漂移	crash	new
#22	[M-100] 韌體問題 22:感測器漂移	crash	feedback
#16	[M-100] 韌體問題 16:感測器漂移	crash	acknowledged
#91	[M-100] 韌體問題 91:藍牙斷線	tweak	new
#79	[M-100] 韌體問題 79:藍牙斷線	tweak	acknowledged
#73	[M-100] 韌體問題 73:藍牙斷線	tweak	confirmed
#49	[M-100] 韌體問題 49:藍牙斷線	tweak	new
#43	[M-100] 韌體問題 43:藍牙斷線	tweak	feedback

- **項目卡片的「連結」**:在工作項的連結分頁貼一個 Mantis 問題網址(`…/view.php?id=123`),如果它是這個看板所連的 Mantis 網站,連結旁會顯示同步到的 Mantis 狀態與處理人(沒同步到的標「尚未同步」)。

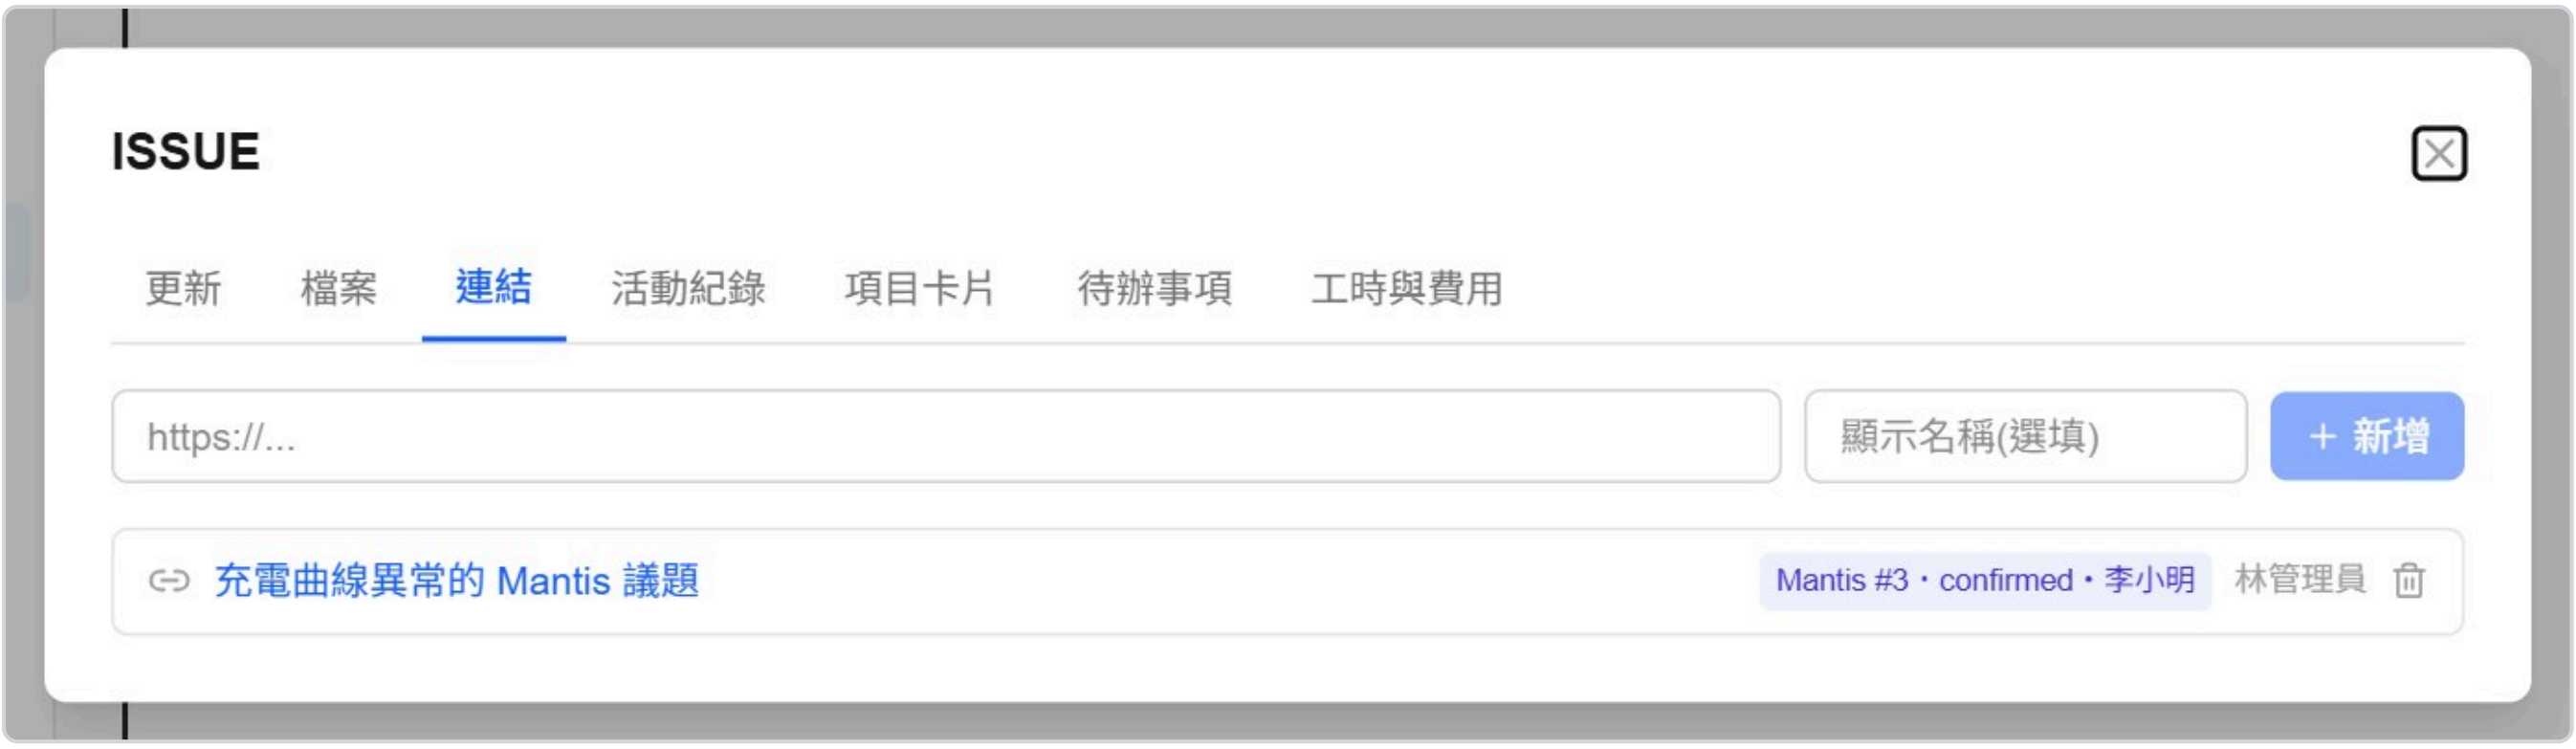

充電曲線異常的 Mantis 議題 Mantis #3・confirmed・李小明 林管理員

- **刪除連線**:已經同步下來的問題保留,但變成一般議題——不再同步,也可以自己修改。停用連線則只是暫停同步,議題維持唯讀。

雙向:欄位對應與寫回 Mantis【管理者設定】

要讓同事在這邊修改 Mantis 的問題,管理者在系統設定的 Mantis 卡片,點那個連線的「**欄位對應與寫回**」:

- **允許從這個程式寫回 Mantis**:**預設關閉**。勾起來之後,再勾要寫回哪幾類欄位——**狀態**、**處理人(負責人)**、**嚴重度與優先權**、**摘要**、**說明與到期日**。沒勾的類別維持唯讀,要到 Mantis 修改。寫回用的是這個連線存著的 API token,Mantis 上顯示的修改者就是那個 token 的帳號,所以那個帳號要有「更新問題」的權限。
- **Mantis → 本系統**兩張表:每個 Mantis 狀態算「未處理 / 處理中 / 已結案」哪一種、每個嚴重度算衝擊幾。標「預設」的是沒設定過、照上面預設規則算的;你們的 Mantis 有自訂狀態或不同流程,在這裡調。
- **本系統 → Mantis**兩張表:在這邊改成某個狀態時,Mantis 要改成哪個狀態(預設:未處理 → new、處理中 → assigned、已結案 → resolved 並帶 resolution「fixed」;**待審核**預設不寫回,因為那是這邊自己的流程);衝擊 1–5 要寫成 Mantis 的哪個嚴重度。選「不寫回」代表只改這邊。
- **處理人對應**:一張表列出 Mantis 的使用者(同步時從問題的處理人、回報人收集來的)、各自處理幾筆問題,右邊是對應到本系統哪位同仁。預設「**自動**」,依序比:**Email**(Mantis 不一定會回 Email)→ **名稱**(Mantis 的使用者名稱或姓名,跟本系統同仁的姓名或 Email 帳號相同,忽略大小寫與空白、底線、點;只有一位符合才算);自動對不上的會標紅字「這 N 筆沒有負責人」,在右邊直接選本系統同仁,存檔後馬上套用到已經同步的問題。這張對應同步(Mantis → 負責人)與寫回(負責人 → Mantis 處理人)都用。只是補了對應、Mantis 上沒動過的問題,不會對負責人發指派通知。
- 「**從 Mantis 讀取狀態與嚴重度清單**」:把你們 Mantis 實際的狀態、嚴重度、優先權與 resolution 讀進來給下拉選單用(也帶上翻譯過的名稱)。「**儲存並重新同步**」之後,新的對應馬上套用到已經同步下來的問題。

開啟寫回之後,同步來的問題在風險與議題頁這樣運作:

- **誰能改**:管理者與被指定為這一筆審核人的人可以改內容;負責人可以切換狀態、申請結案。打開那一筆,開放的欄位變成可以編輯,視窗上方的說明會寫「這個連線已開啟寫回 Mantis」。
- **按「儲存」就馬上寫進 Mantis**,成功才存;**Mantis 拒絕**(帳號沒權限、狀態不能這樣轉換……)就整筆不存,並顯示 Mantis 說的原因。只會送有改的欄位。
- **衝突保護**:寫回前先看 Mantis 上那一筆有沒有被別人改過(更新時間跟這邊記的不同)。改過就擋下來、不蓋掉對方,請管理者先在系統設定按「立即同步」,看過最新內容再改。

- **說明**:這邊編輯的是 Mantis 的「說明」本文;接在後面的「Mantis 備註」是唯讀的,只顯示、不寫回。說明太長(本系統只存了前面一段)的,為了不蓋掉 Mantis 上完整的說明,說明不開放修改。**機率**固定最高、**類型**固定是議題,不能改;**對策與驗收標準、金額、機率 %、審核人**是本系統才有的欄位,照一般議題存,不會寫進 Mantis;**優先權**是 Mantis 的欄位,在「嚴重度與優先權」這一類裡可以改。
- **結案流程**:申請結案 → 待審核(不動 Mantis)→ 全部審核人同意 → **先寫回 Mantis 成功才算結案**(預設把 Mantis 改成 resolved);寫回失敗的話還沒結案,最後那位審核人的同意會先收回,排除原因後再按一次。待審核期間,每 15 分鐘的同步不會把它蓋回處理中(除非 Mantis 上已經結案)。要勾「狀態」這一類才能走結案流程。
- **還是不行的**:刪除(刪了下次同步又長回來)。Mantis 的 API 不能清掉處理人與到期日,要取消指派、清除到期日請到 Mantis。進度更新是這邊自己的時間軸,不會變成 Mantis 的備註。
- 每次寫回都記在這一筆的「紀錄」裡,例如「已寫回 Mantis #123:狀態:assigned → resolved」。

---

12. 階段閘門

每個階段(POC / EVT / PVT)的出口審查:條件、簽核人,以及是誰放行的。

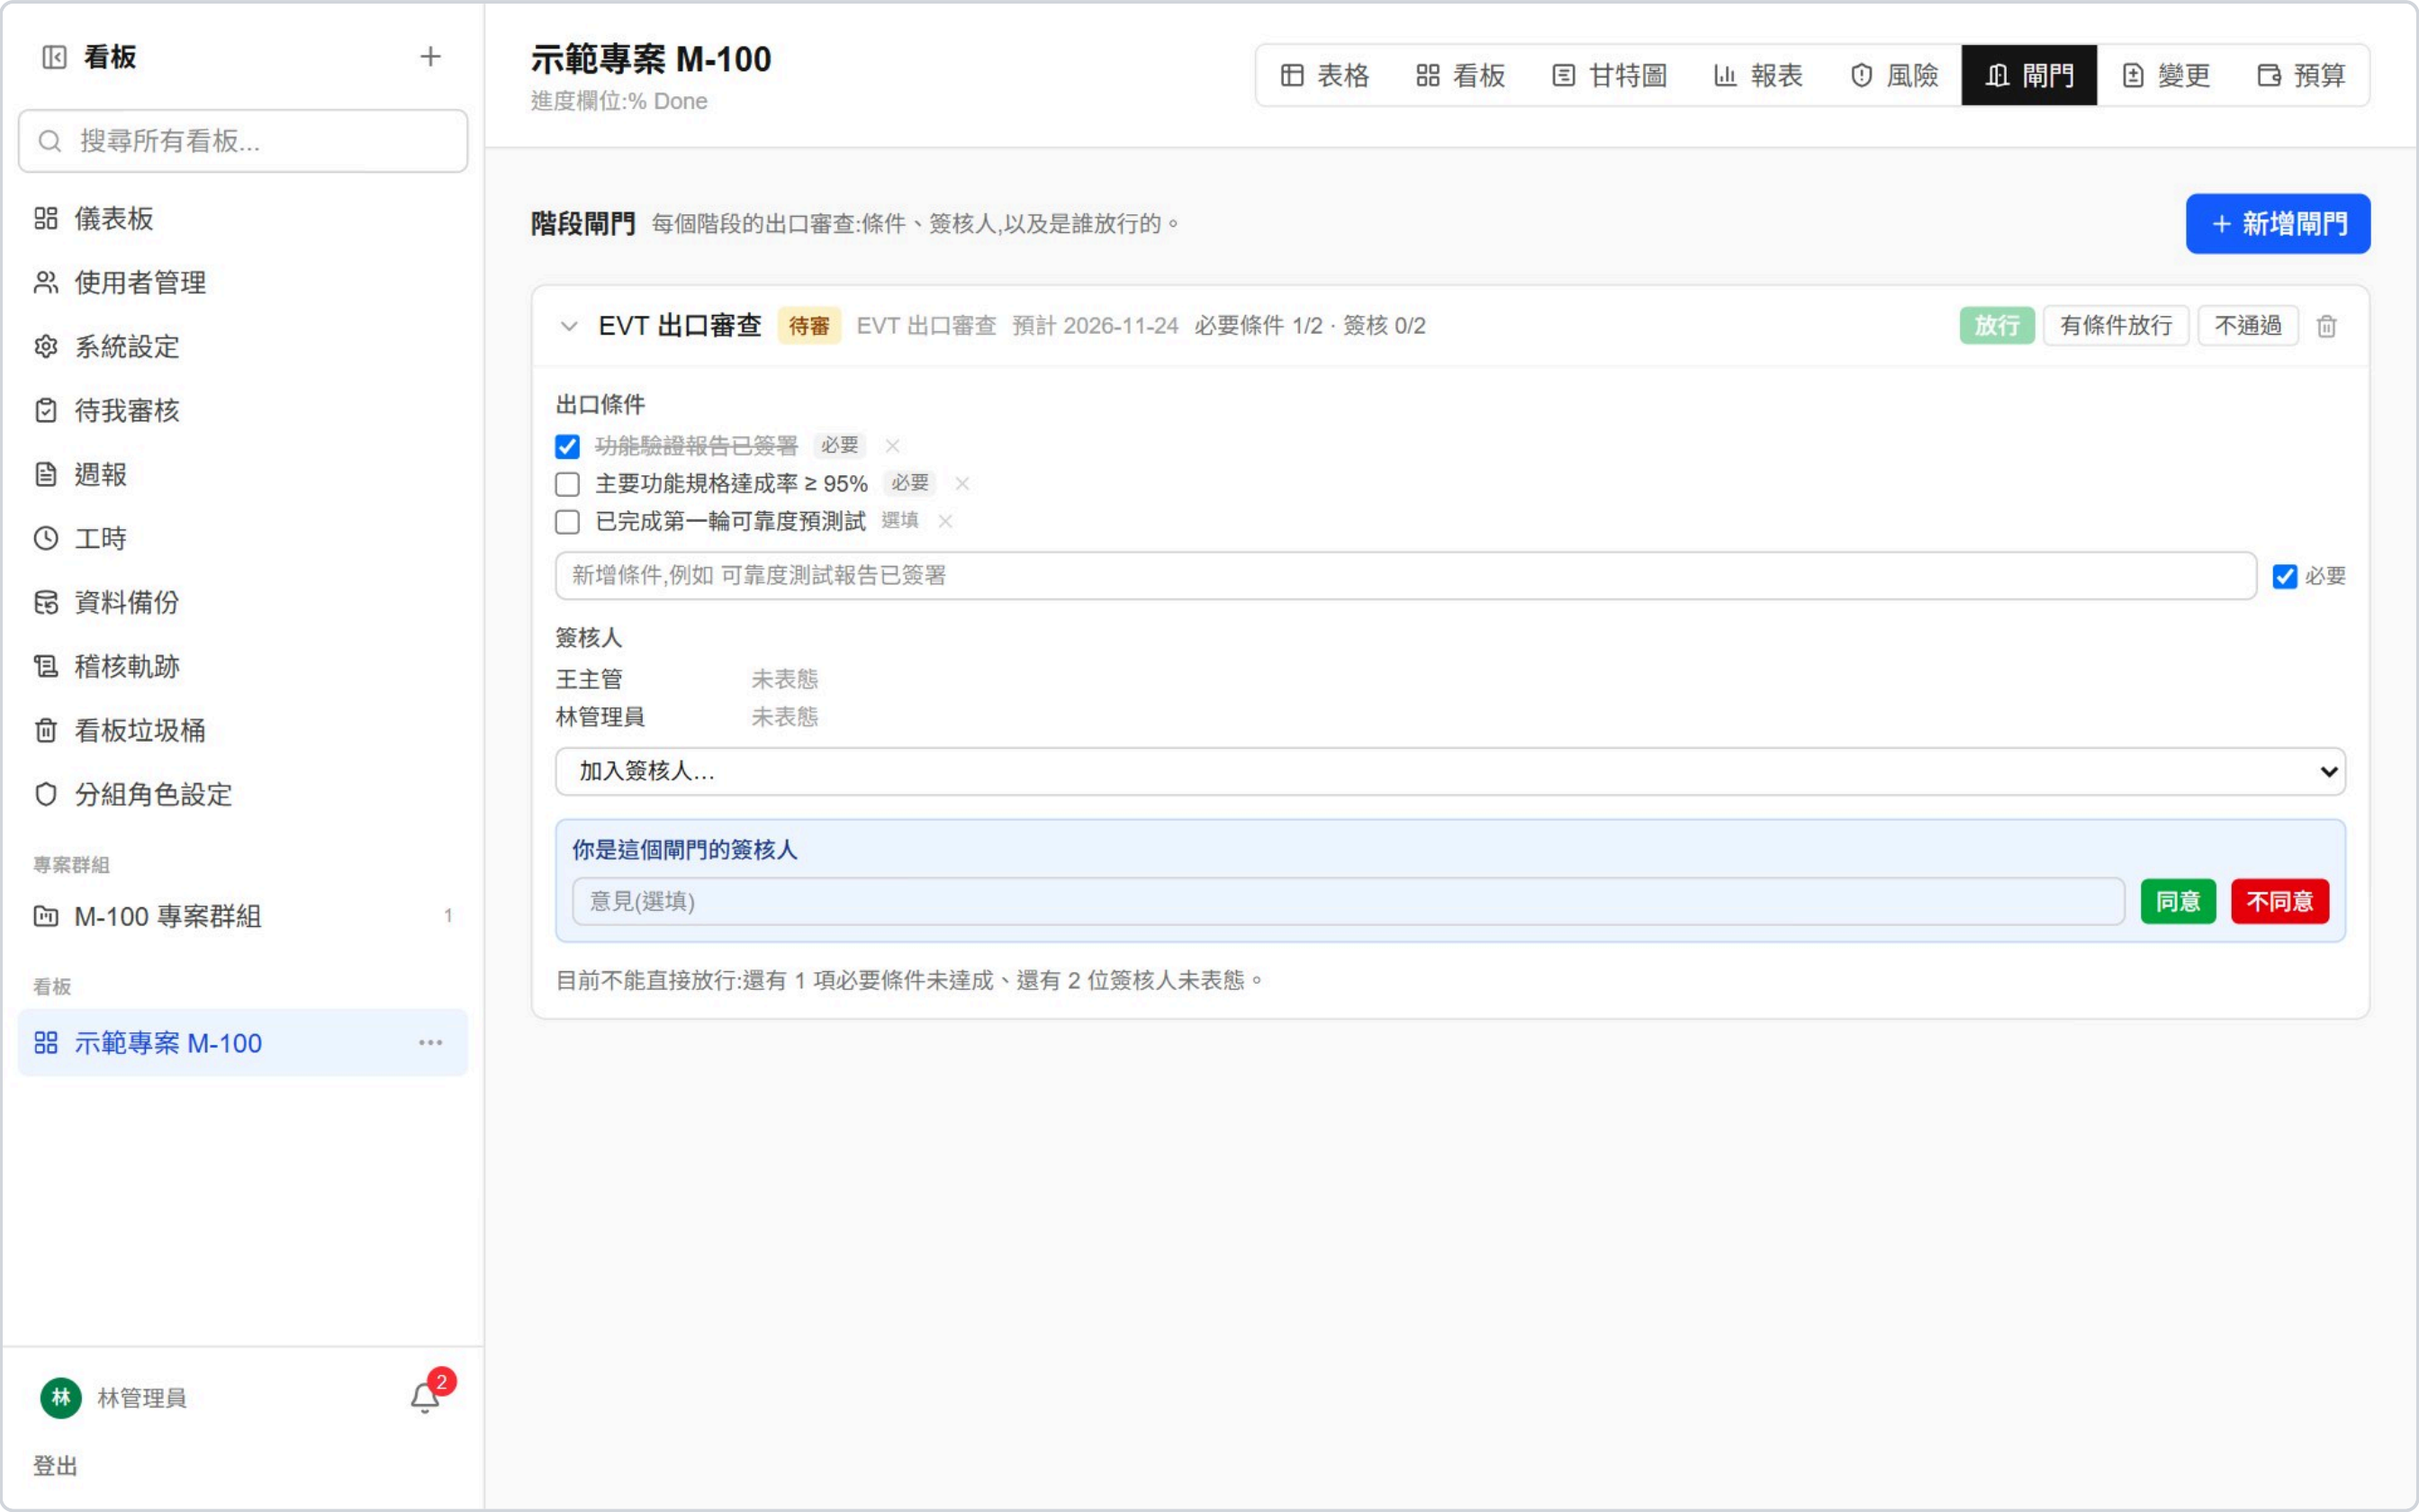
看板
+
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林管理員
2
登出
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
+ 新增閘門
放行
有條件放行
不通過
同意
不同意

示範專案 M-100
進度欄位:% Done

階段閘門 每個階段的出口審查:條件、簽核人,以及是誰放行的。

EVT 出口審查 待審 EVT 出口審查 預計 2026-11-24 必要條件 1/2 · 簽核 0/2

出口條件

☑ ~~功能驗證報告已簽署~~ 必要 ×
□ 主要功能規格達成率 ≥ 95% 必要 ×
□ 已完成第一輪可靠度預測試 選填 ×

新增條件,例如 可靠度測試報告已簽署 ☑ 必要

簽核人

王主管 未表態
林管理員 未表態

加入簽核人...

你是這個閘門的簽核人

意見(選填)

目前不能直接放行:還有 1 項必要條件未達成、還有 2 位簽核人未表態。

1. **建立閘門【主管以上】**:按「新增閘門」,填名稱(例如 EVT 出口審查)、可綁定一個階段、預計審查日。
2. **加入條件**:每一條可標為「必要」或非必要,達成後勾選。
3. **加入簽核人**:沒有簽核人的閘門只是一張清單,不能放行。
4. **送審**:狀態變成「待審」。
5. 簽核人各自選「核准」或「不通過」,可附意見。
6. 主管以上**放行**。必要條件沒全部達成、或簽核沒過,就不能放行,只能選「**有條件放行**」或「**不通過**」,並且**必須寫理由**——這是之後唯一查得到當初為什麼放行的紀錄。

狀態:準備中 → 待審 → 已放行 / 不通過 / 有條件放行。若閘門還沒放行、下一階段卻已經有工作項在進行,頁面上方會出現紅色警示「有工作跑在閘門前面」。

13. 變更管理

規格或時程要改,先開一張單:為什麼改、影響多少、誰批准。

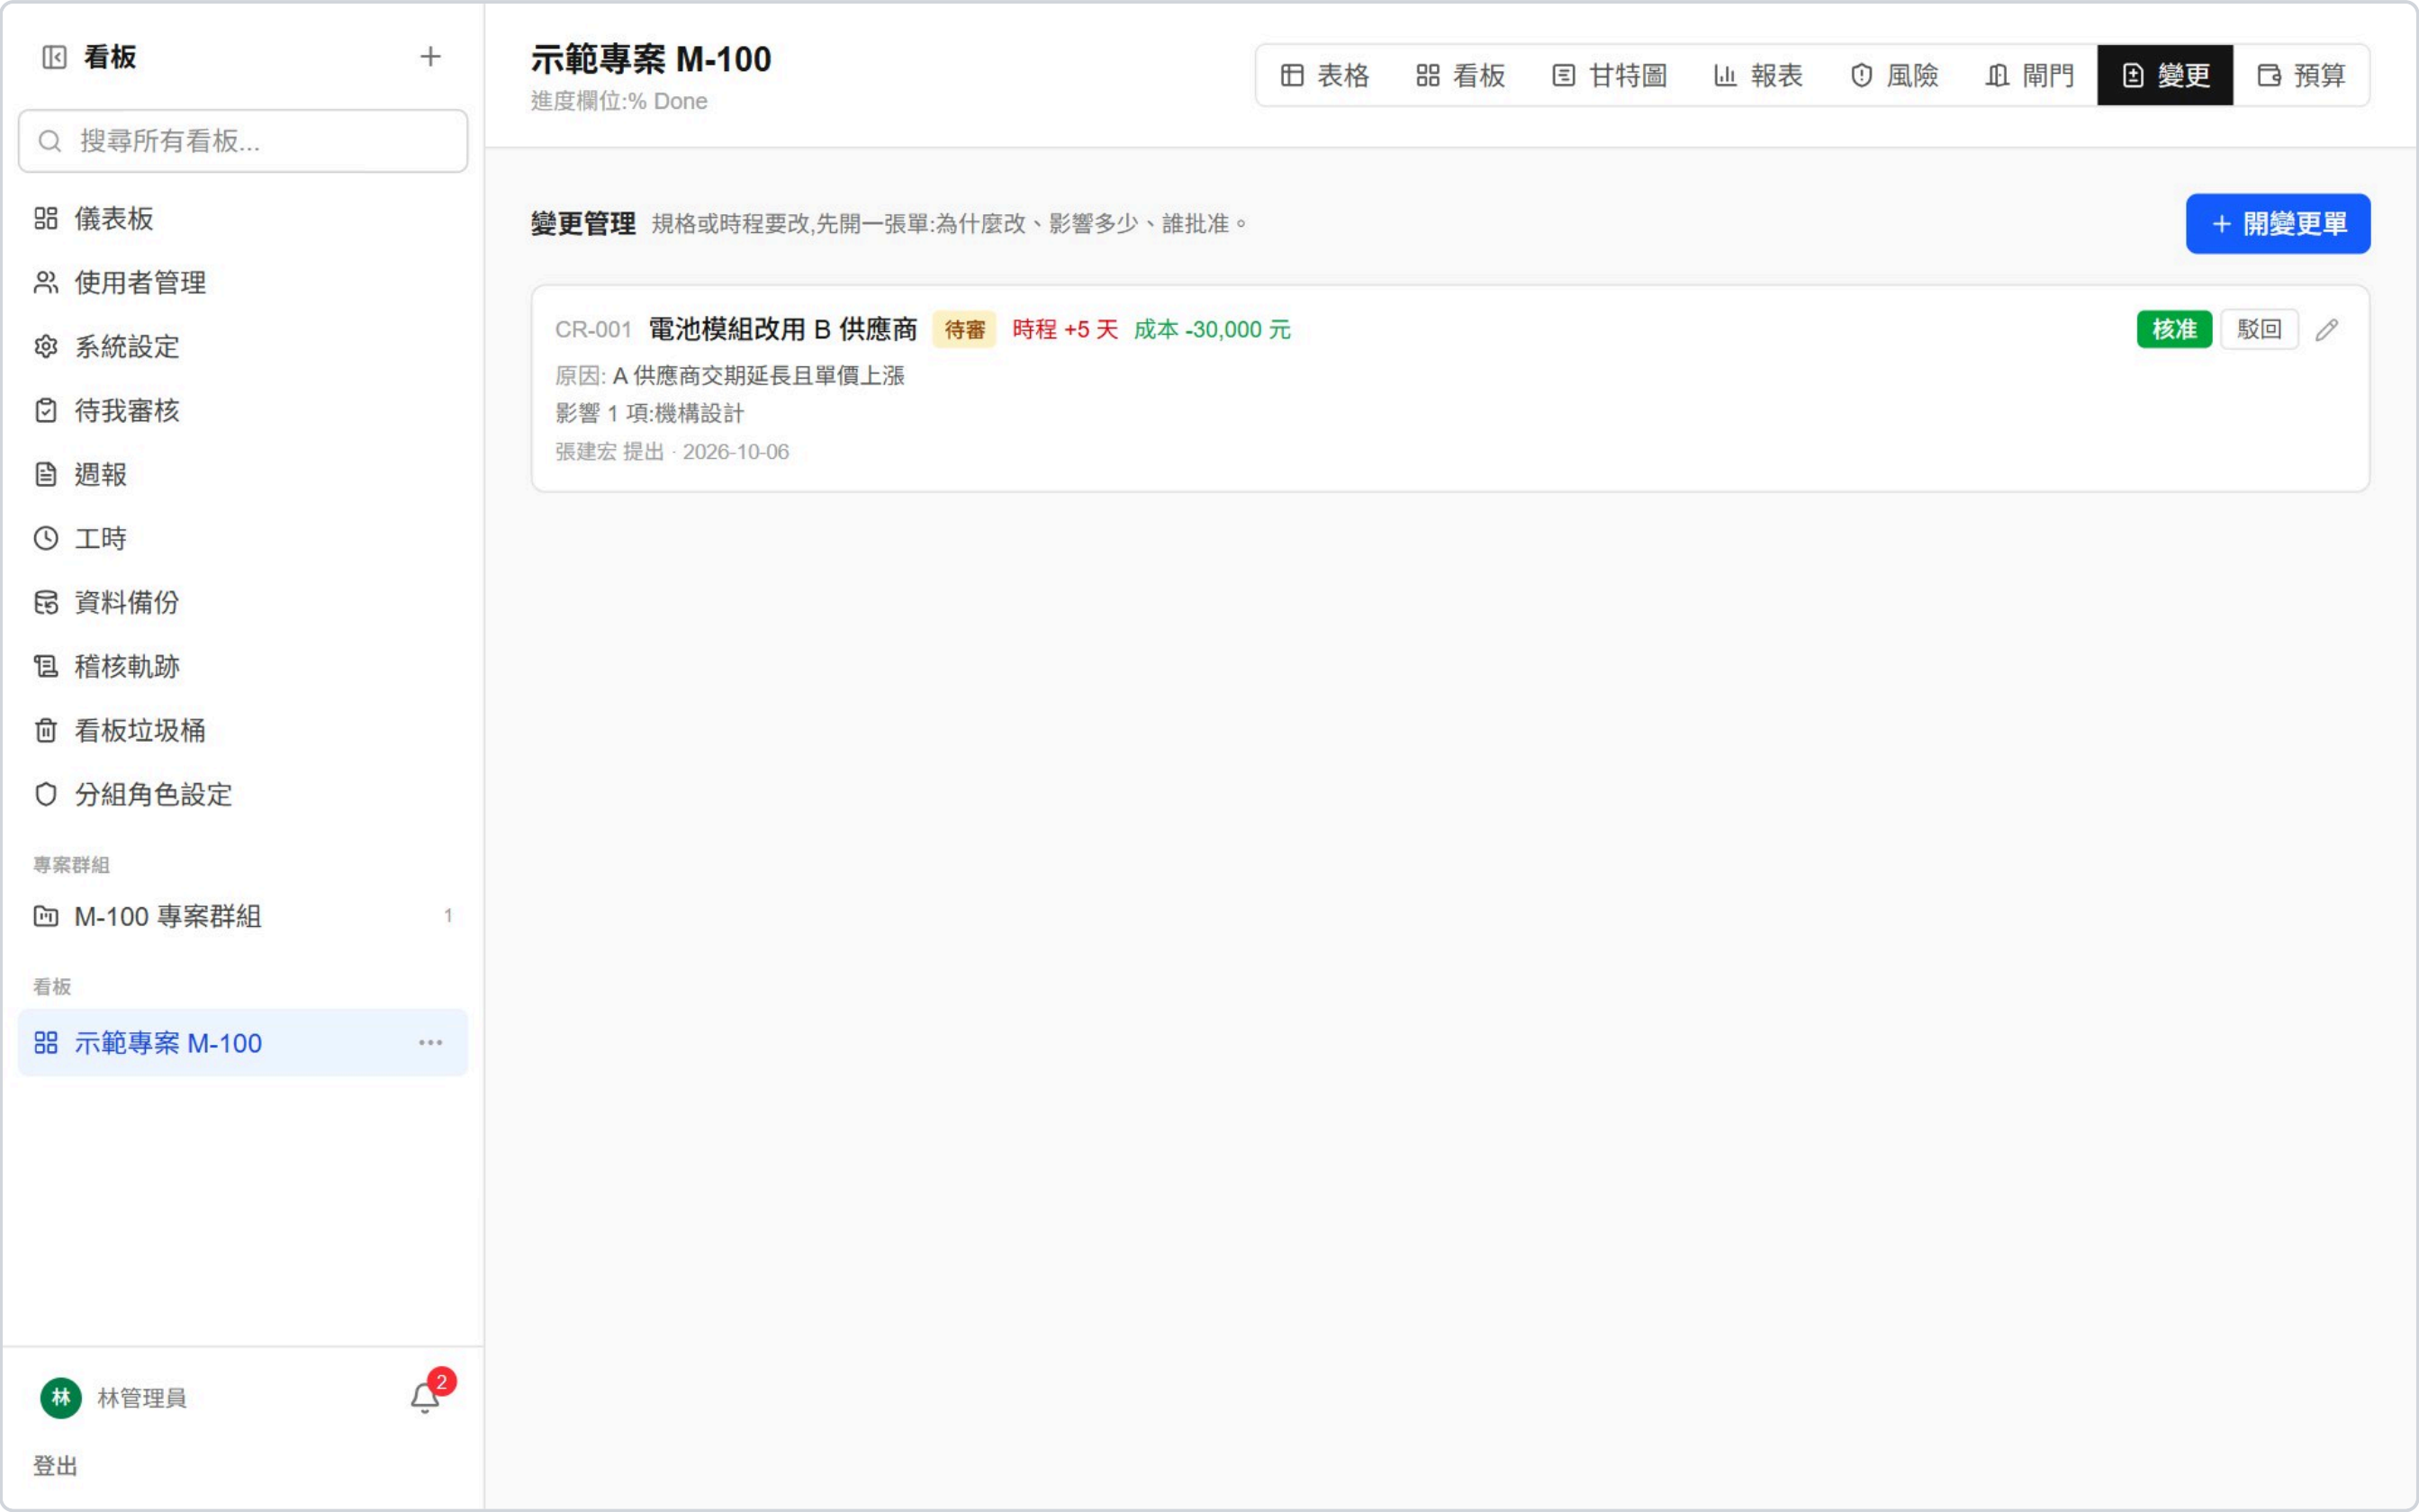
看板
+
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
...
林
林管理員
2
登出
示範專案 M-100
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
+ 開變更單
核准
駁回

變更管理 規格或時程要改,先開一張單:為什麼改、影響多少、誰批准。

CR-001 **電池模組改用 B 供應商** 待審 時程 +5 天 成本 -30,000 元

原因: A 供應商交期延長且單價上漲

影響 1 項:機構設計

張建宏 提出 · 2026-10-06

- 按「開變更單」,填:標題、原因、要改什麼、**時程影響(天)**、**成本影響(元)**、影響說明、關聯的工作項。單號自動編為 CR-1、CR-2...
- 狀態流程:**草稿 → 待審 → 已核准 / 駁回 → 已執行**;也可以**撤回**。
- **核准**、**駁回**、**標記已執行**限主管以上。駁回要寫原因;標記已執行時可連到某一版**基準線**,之後就查得到日期為什麼變。

14. 預算

> **誰看得到預算金額:**管理者、看板擁有者、Team Leader / PMD / PM DM、看板指名的人、指定組織的主管(見第 2 章「預算金額的可見範圍」)。其他人點進「預算」只看得到人力表與樣機計畫。

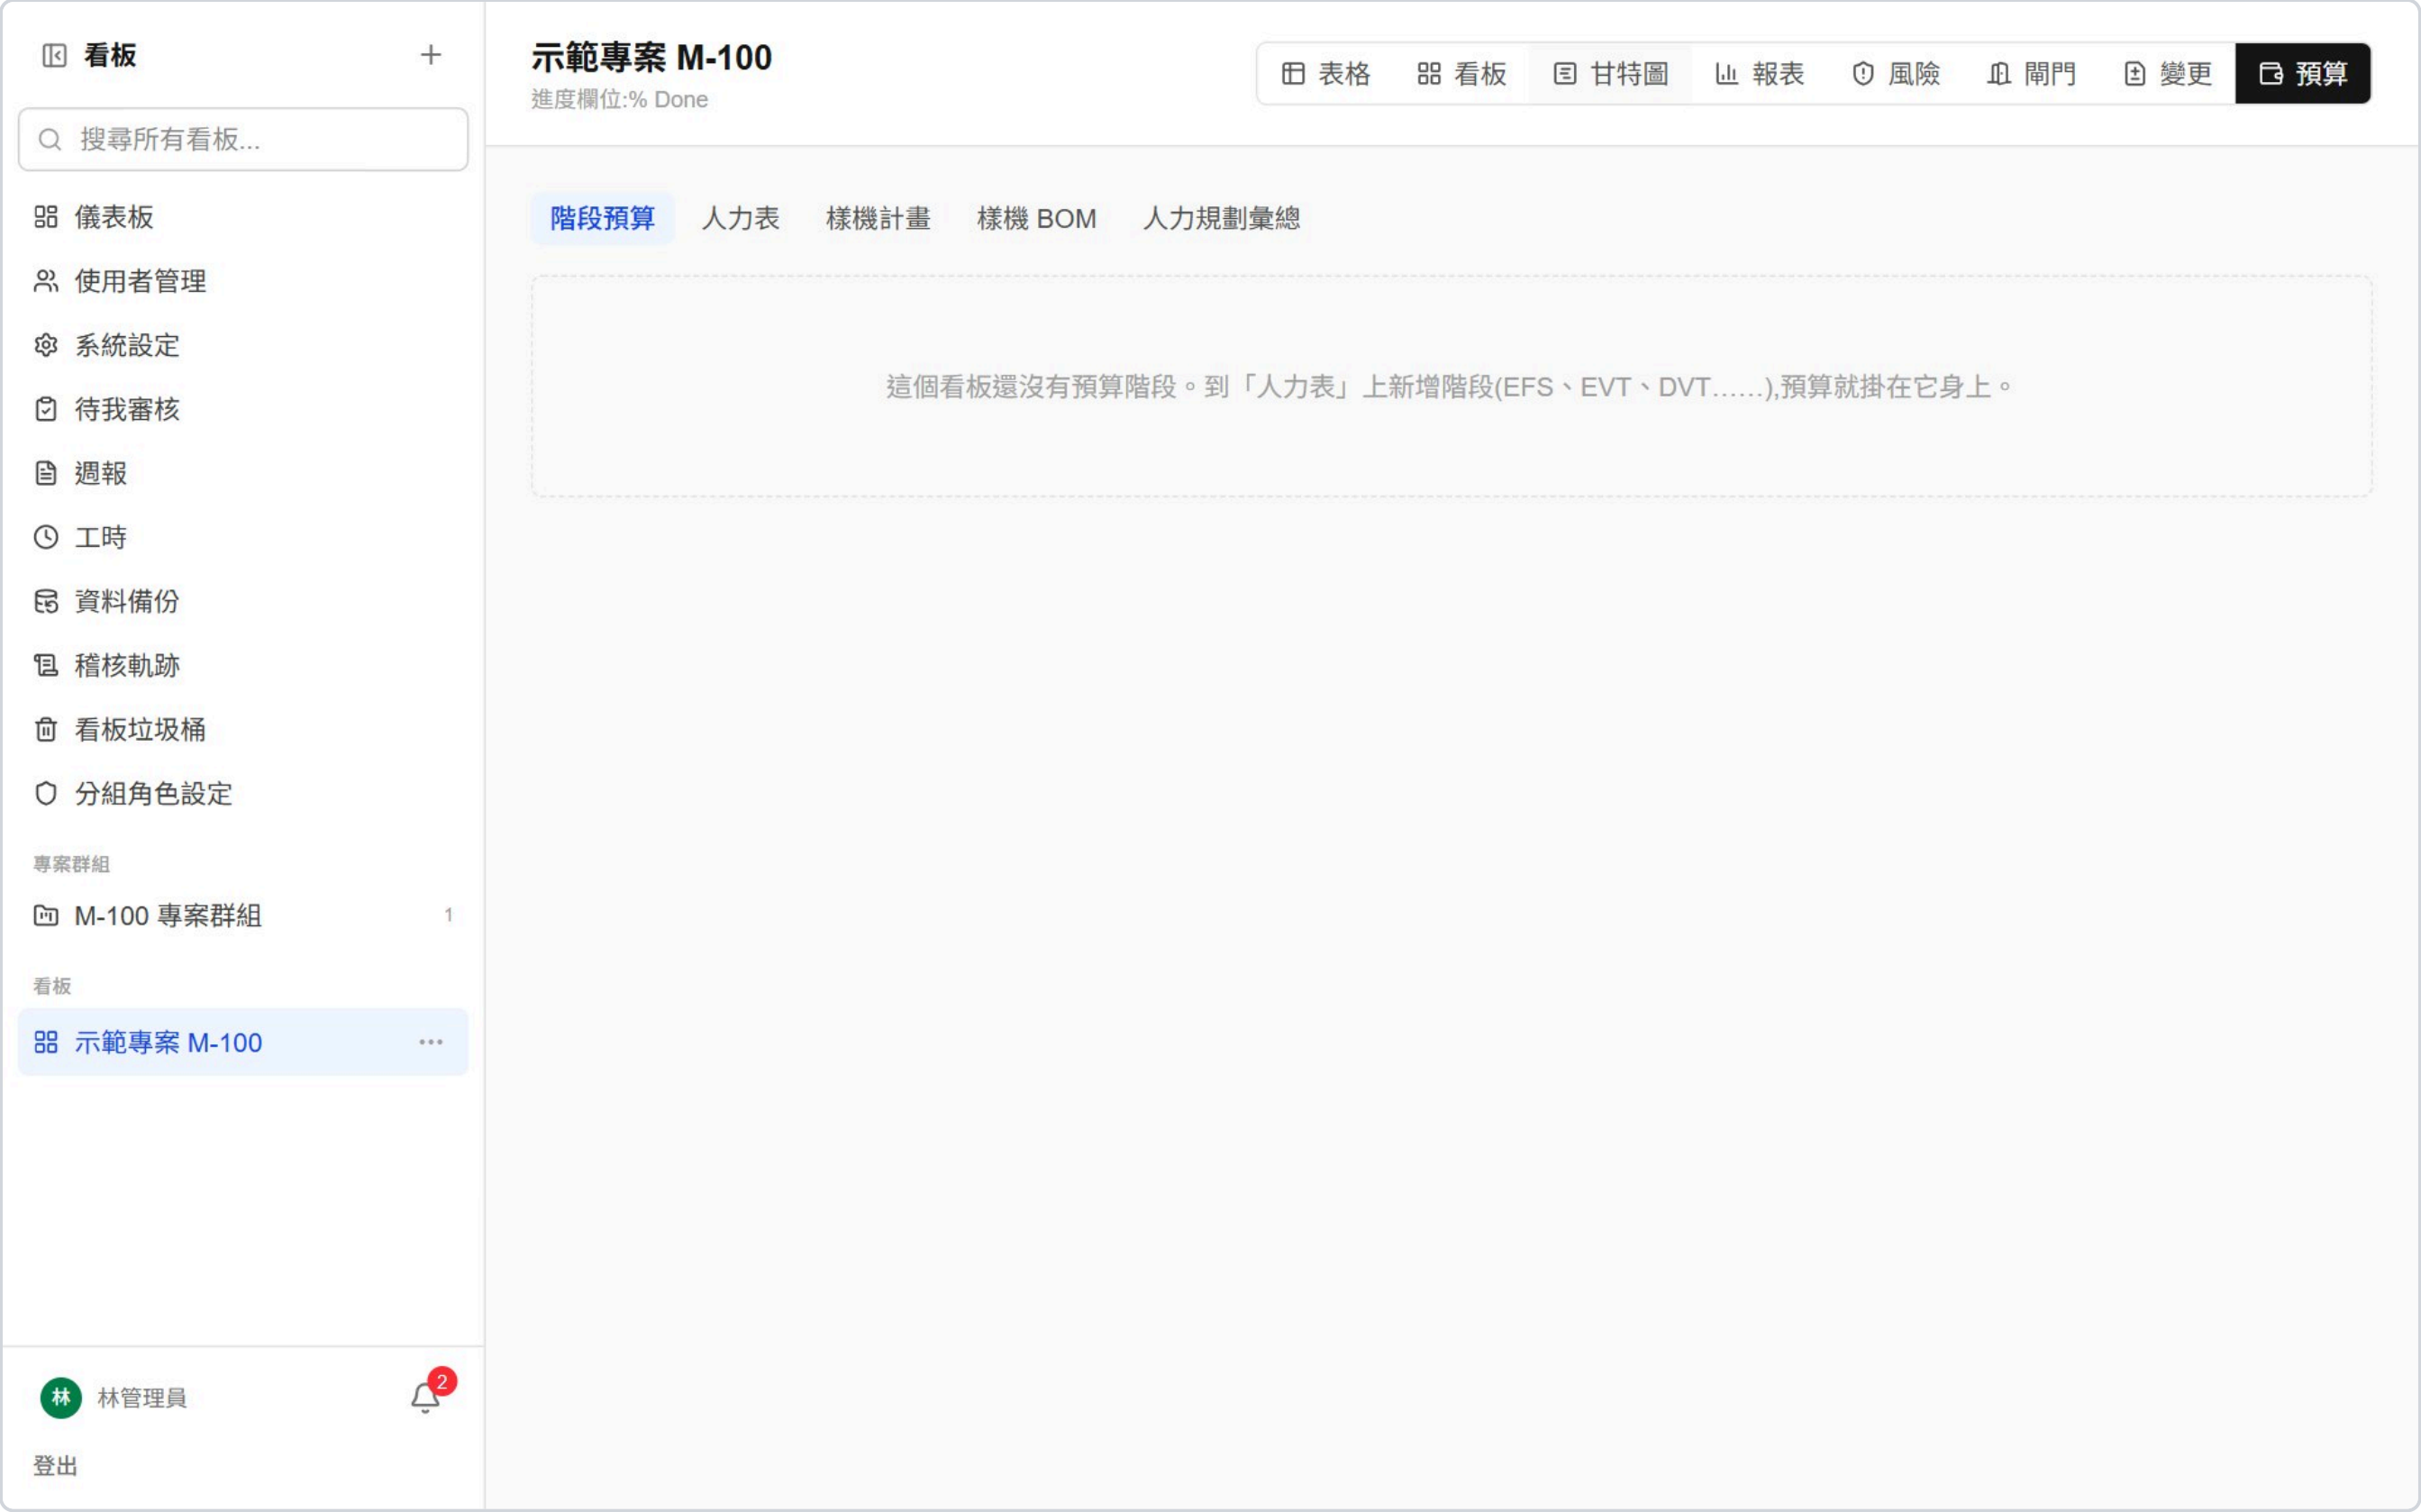
看板
+
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林
林管理員
2
登出
示範專案 M-100
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
階段預算
人力表
樣機計畫
樣機 BOM
人力規劃彙總

這個看板還沒有預算階段。到「人力表」上新增階段(EFS、EVT、DVT……),預算就掛在它身上。

預算依「**預算階段**」編列(例如 EFS、EVT、DVT1),階段由「人力表」排出。分頁:

分頁	內容
階段預算	各類別(人力、材料〔打樣與樣品〕、模具與治具、驗證與認證、委託開發、差旅、其他)的核准預算、已花費、已下單未入帳、剩餘;**準備金**(應變、管理)的動支;**完工預估**;已下單與支出明細
NRE 報價單	一次性工程費用(NRE)的報價與估算:照各大項逐列填細項、估算基礎、外部單位 / 人員、數量、單價、金額,自動算小計與總計;**委託開發**另有委託單位、委託項目、時間範圍與範圍(見下)
人力表	先排出各階段的起訖日,再填每個名額每個月投入多少人月
樣機計畫	每個產品、用途單位在各階段要幾台
樣機 BOM	產品在各階段用的料(廠商、型號、名稱,可往下分子集),算出單台成本;**乘上樣機計畫排的台數**就是這個產品的材料預算(見下方「材料預算怎麼算」)
人力規劃彙總	由人力表彙總而來,人月乘上月薪就是人力預算金額(唯讀);月薪怎麼選見下方「人力預算怎麼算」

樣機計畫怎麼填:每一格是台數(某個產品、某個用途單位、某個階段要幾台),**直接在表格上打數字**,不會跳出對話框。

- 點一格(或用 Tab 走到)就能打:**Enter 或點到別的地方就存檔**,Esc 放棄這次輸入;清空存成 0(0 是存起來的值,那一列不會消失)。只收數字,最多 4 位。
- Tab / Shift+Tab 一格接一格往右、往左走,整列填完不必碰滑鼠。
- 「**+ 新增用途**」(或某個產品「小計」那一列右邊的「+」)新增一列之後,游標會直接在新那一列的第一格,馬上就能打。
- **備註**(例如 mock up):格子左邊的小圖示(滑鼠移到那一格才出現);已經有備註的格子,左邊直接顯示備註文字,點一下可以修改。
- **階段欄的順序照時間**:欄位是 POC、EVT1、EVT2、DVT、PVT 這樣照人力表的時程排。在人力表「+ 階段」補一個階段,系統會**照它的開始日插進對的位置**(例如起訖落在 EVT1 與 DVT 之間的 EVT2 就排在兩者中間),不會排到最後面。階段是樣機計畫、階段預算、NRE、BOM **共用同一組**,所以順序到處都一樣。
- **拖曳調整階段欄**:每個階段名稱左邊有一個 ⠿ 把手,左右拖到想要的位置,放開就存;因為各表共用同一組階段,別張表的順序也跟著變。
- **拖曳調整用途列**:每一列(EE、ATD、QA...)最左邊也有 ⠿ 把手,上下拖就能調整那個產品底下的列順序;各產品各排各的。之後新增的列接在最後面。
- **修改產品名稱**:點每個產品區塊最上面的標題(例如 P100_工業型巡檢機器人)直接改,Enter 或點別處存檔,留空或沒改就放棄。這個看板上用到這個名字的地方會**一起換**:樣機 BOM、各階段的樣機計畫、排出來的每一台樣機,以及工作項「使用樣機」的選擇(選擇本身不受影響);只是換名字,BOM 與台數都不動,材料預算不會重算。新名稱不能跟這個看板上現有的任何產品重名,重名會被擋下,不自動合併。權限同下面的說明,其他人看到的是一般文字、不能點。

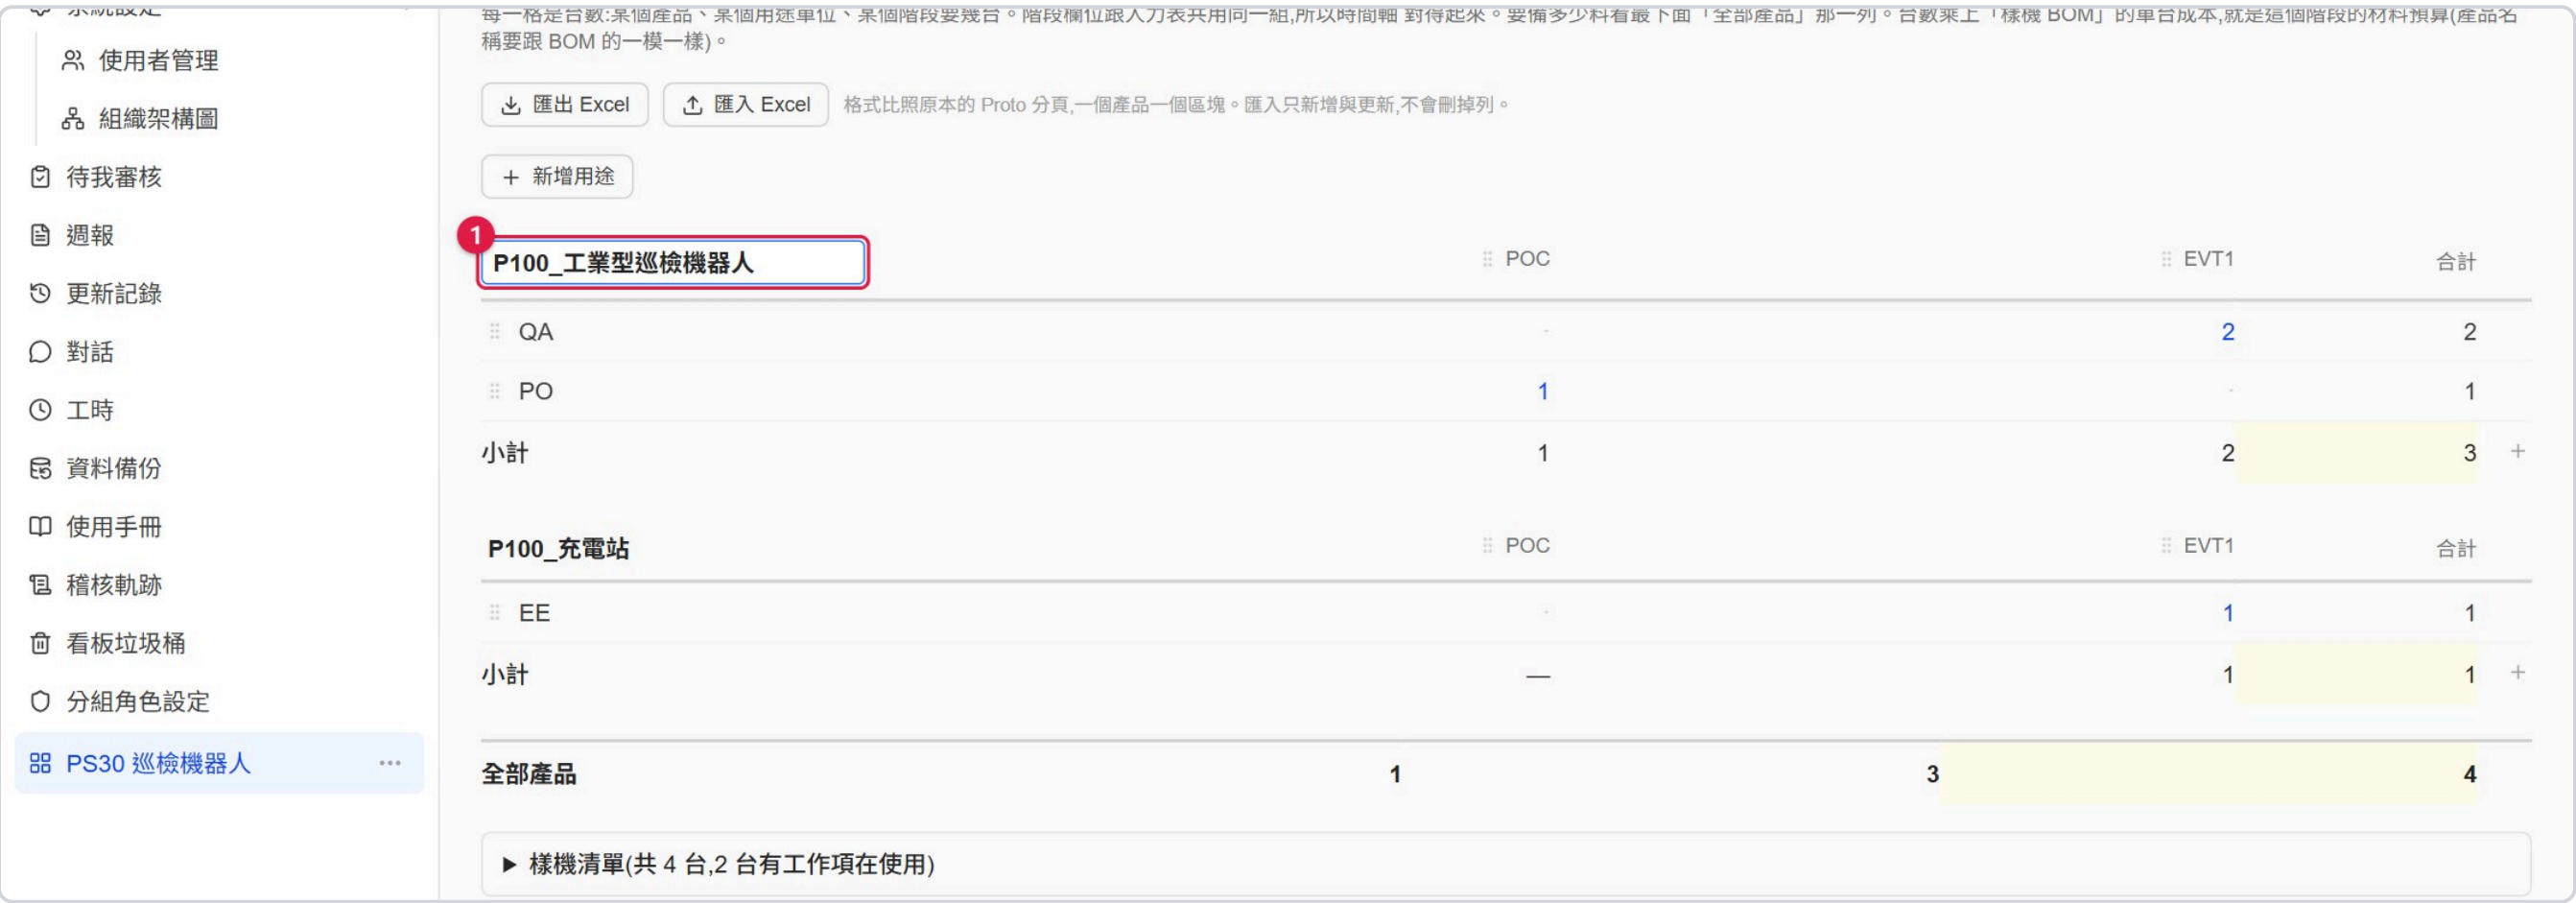

每一格是台數:某個產品、某個用途單位、某個階段要幾台。階段欄位跟人力表共用同一組,所以時間軸對得起來。要備多少料看最下面「全部產品」那一列。台數乘上「樣機 BOM」的單台成本,就是這個階段的材料預算(產品名稱要跟 BOM 的一模一樣)。

格式比照原本的 Proto 分頁,一個產品一個區塊。匯入只新增與更新,不會刪掉列。

P100_工業型巡檢機器人	POC	EVT1	合計
QA	·	2	2
PO	1	·	1
小計	1	2	3

P100_充電站	POC	EVT1	合計
EE	·	1	1
小計	—	1	1

全部產品	1	3	4

▶ 樣機清單(共 4 台,2 台有工作項在使用)

- **修改用途單位名稱**:點列上的名稱(例如 EE)直接改,Enter 或點別處存檔,留空或沒改就放棄。各階段的台數、排出來的每一台樣機(以及工作項「使用樣機」的參照)都會一起改名;同一個產品已經有同名的那一列會被擋下,不自動合併。
- 台數一存,那個階段的材料預算就跟著重算(見下方「材料預算怎麼算」)。編輯的權限跟階段預算一樣:管理者、看板擁有者、或這個看板**任一分組**的 Team Leader(樣機 BOM 也是),其他人只能看。

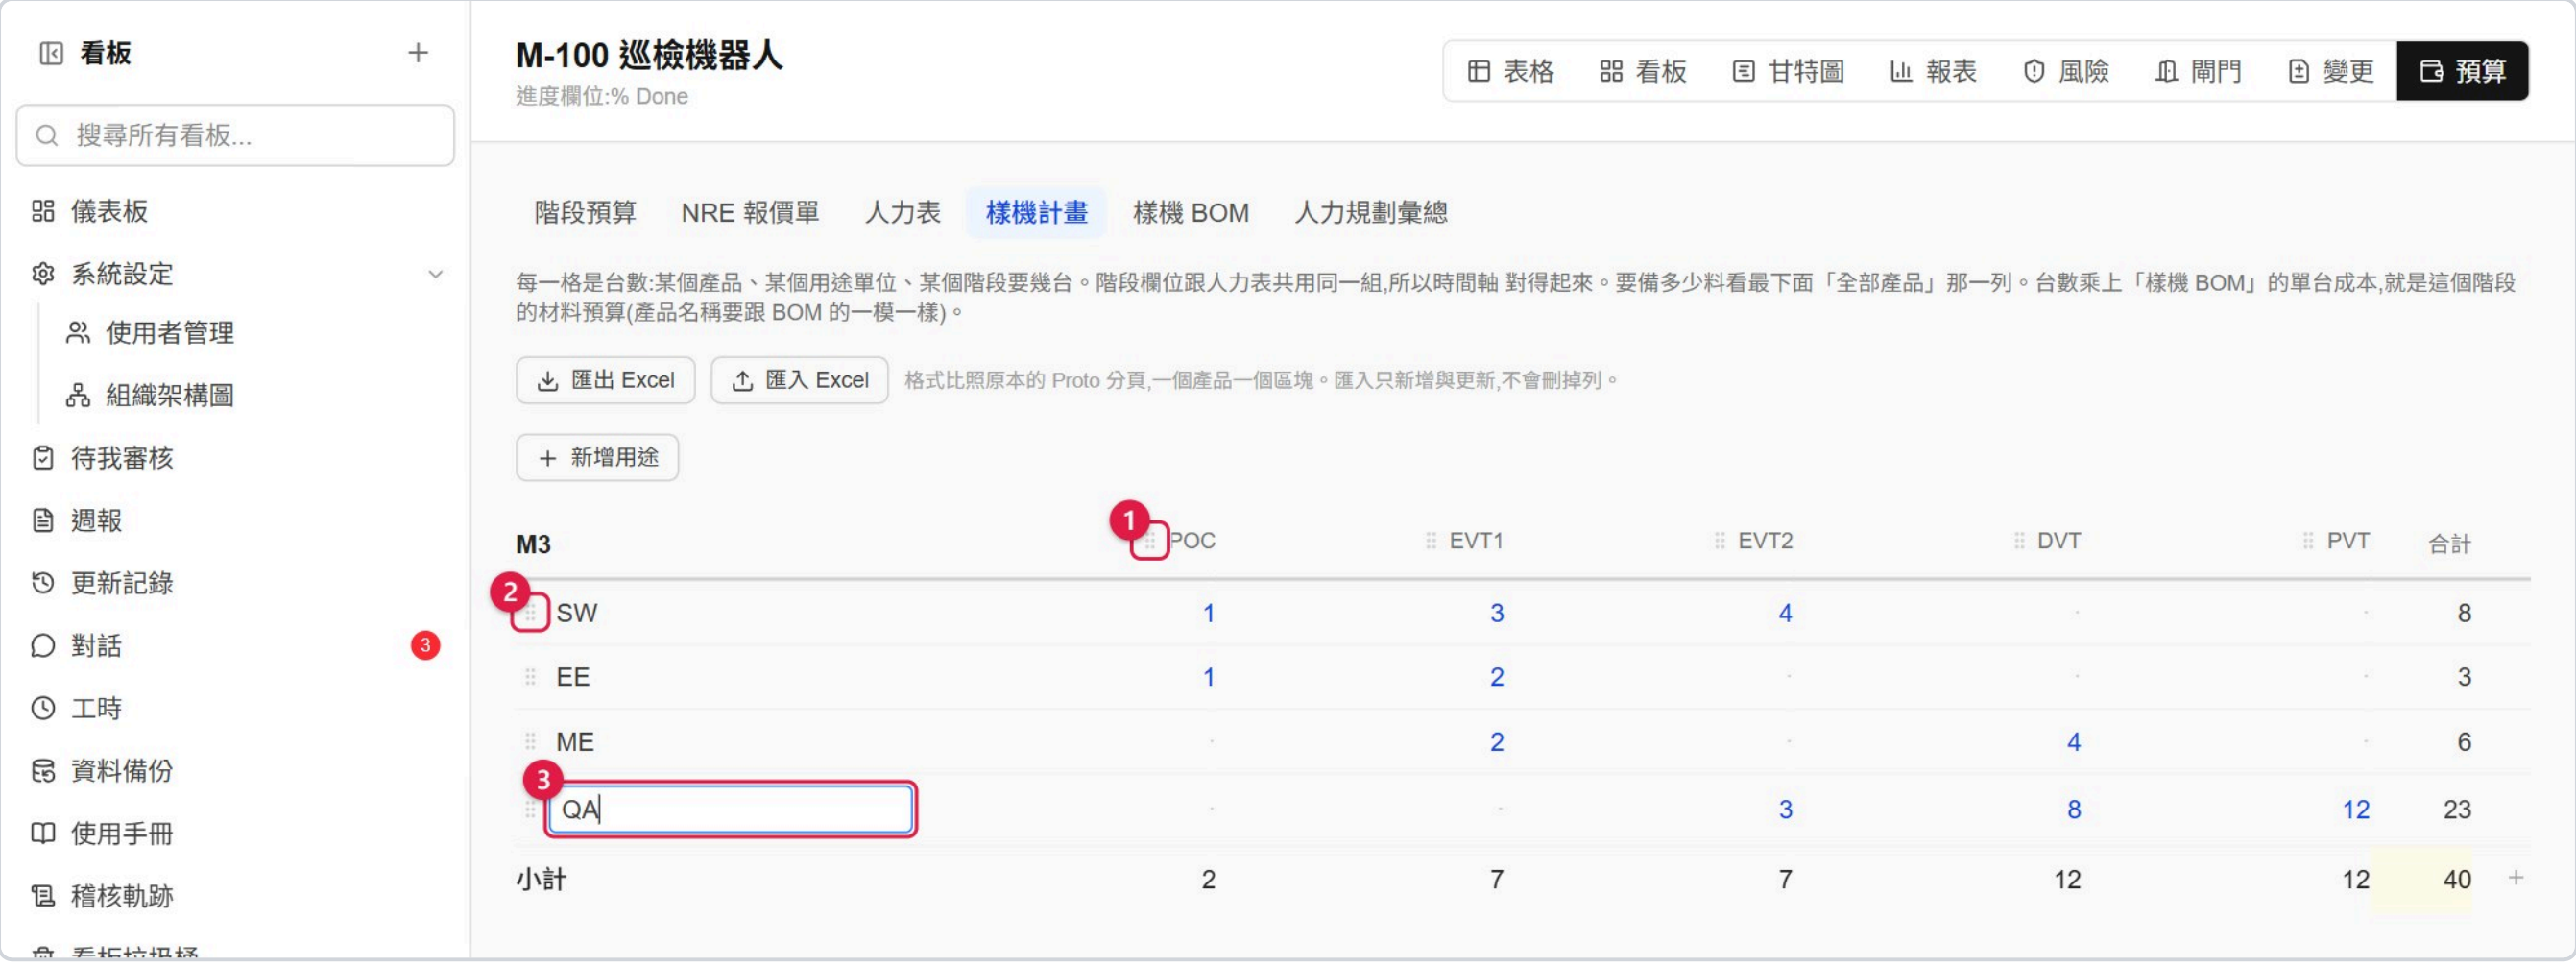
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
對話
3
工時
資料備份
使用手冊
稽核軌跡
M-100 巡檢機器人
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
階段預算
NRE 報價單
人力表
樣機計畫
樣機 BOM
人力規劃彙總
匯出 Excel
匯入 Excel
新增用途
1
2
3

每一格是台數:某個產品、某個用途單位、某個階段要幾台。階段欄位跟人力表共用同一組,所以時間軸 對得起來。要備多少料看最下面「全部產品」那一列。台數乘上「樣機 BOM」的單台成本,就是這個階段的材料預算(產品名稱要跟 BOM 的一模一樣)。

格式比照原本的 Proto 分頁,一個產品一個區塊。匯入只新增與更新,不會刪掉列。

M3	POC	EVT1	EVT2	DVT	PVT	合計
SW	1	3	4	·	·	8
EE	1	2	·	·	·	3
ME	·	2	·	4	·	6
QA	·	·	3	8	12	23
小計	2	7	7	12	12	40

① 階段名稱左邊的 ⠿ 把手,左右拖調整階段順序;② 用途列最左邊的 ⠿ 把手,上下拖調整列順序;③ 點用途單位的名稱直接改(圖中 QA 正在改名)。階段欄照時間排:POC、EVT1、EVT2、DVT、PVT。

每一台樣機與「使用樣機」:樣機計畫的一格寫「M3 / SW / EVT1 要 7 台」,系統就自動排出 **7 台樣機**(第 1 ~ 7 台),頁面下方的「**樣機清單**」(點開來看)列出每一台,以及**哪些工作項正在使用它**。測試用的工作項在表格的「**使用樣機**」欄選要用哪幾台(見第 3 章的表格欄位)。

怎麼把工作項聯結到樣機(樣機清單是唯讀的,聯結一律從工作項這邊選):

1. 先在「樣機計畫」排好台數——有排台數,才有樣機可以選。
2. 找到「**使用樣機**」,三個地方任選一個(都是同一份資料,選一次到處都一樣):
    - **項目卡片**:點工作項的名稱打開,切到「項目卡片」分頁,欄位清單最下面、「人員分配」上面。
    - **甘特圖的人員分配視窗**:在甘特圖點工作項的長條,視窗裡「人員分配」下面。
    - **表格最右邊的「使用樣機」欄**:在「進行中時間」「完成時間」「更新記錄」前面,要橫向捲到最右邊。
3. 點「使用樣機」,跳出選單,依「產品 / 階段」分組列出每一台(可以搜尋);勾要用的樣機,**點旁邊的空白處關掉選單時存檔**。一個工作項可以勾好幾台,一台樣機也可以被好幾個工作項選。
4. 回到預算 → 樣機計畫的「樣機清單」,那幾台的「使用中的工作項」就出現這個工作項(點名字跳到看板);儀表板的「樣機使用時程」也看得到(第 16 章)。

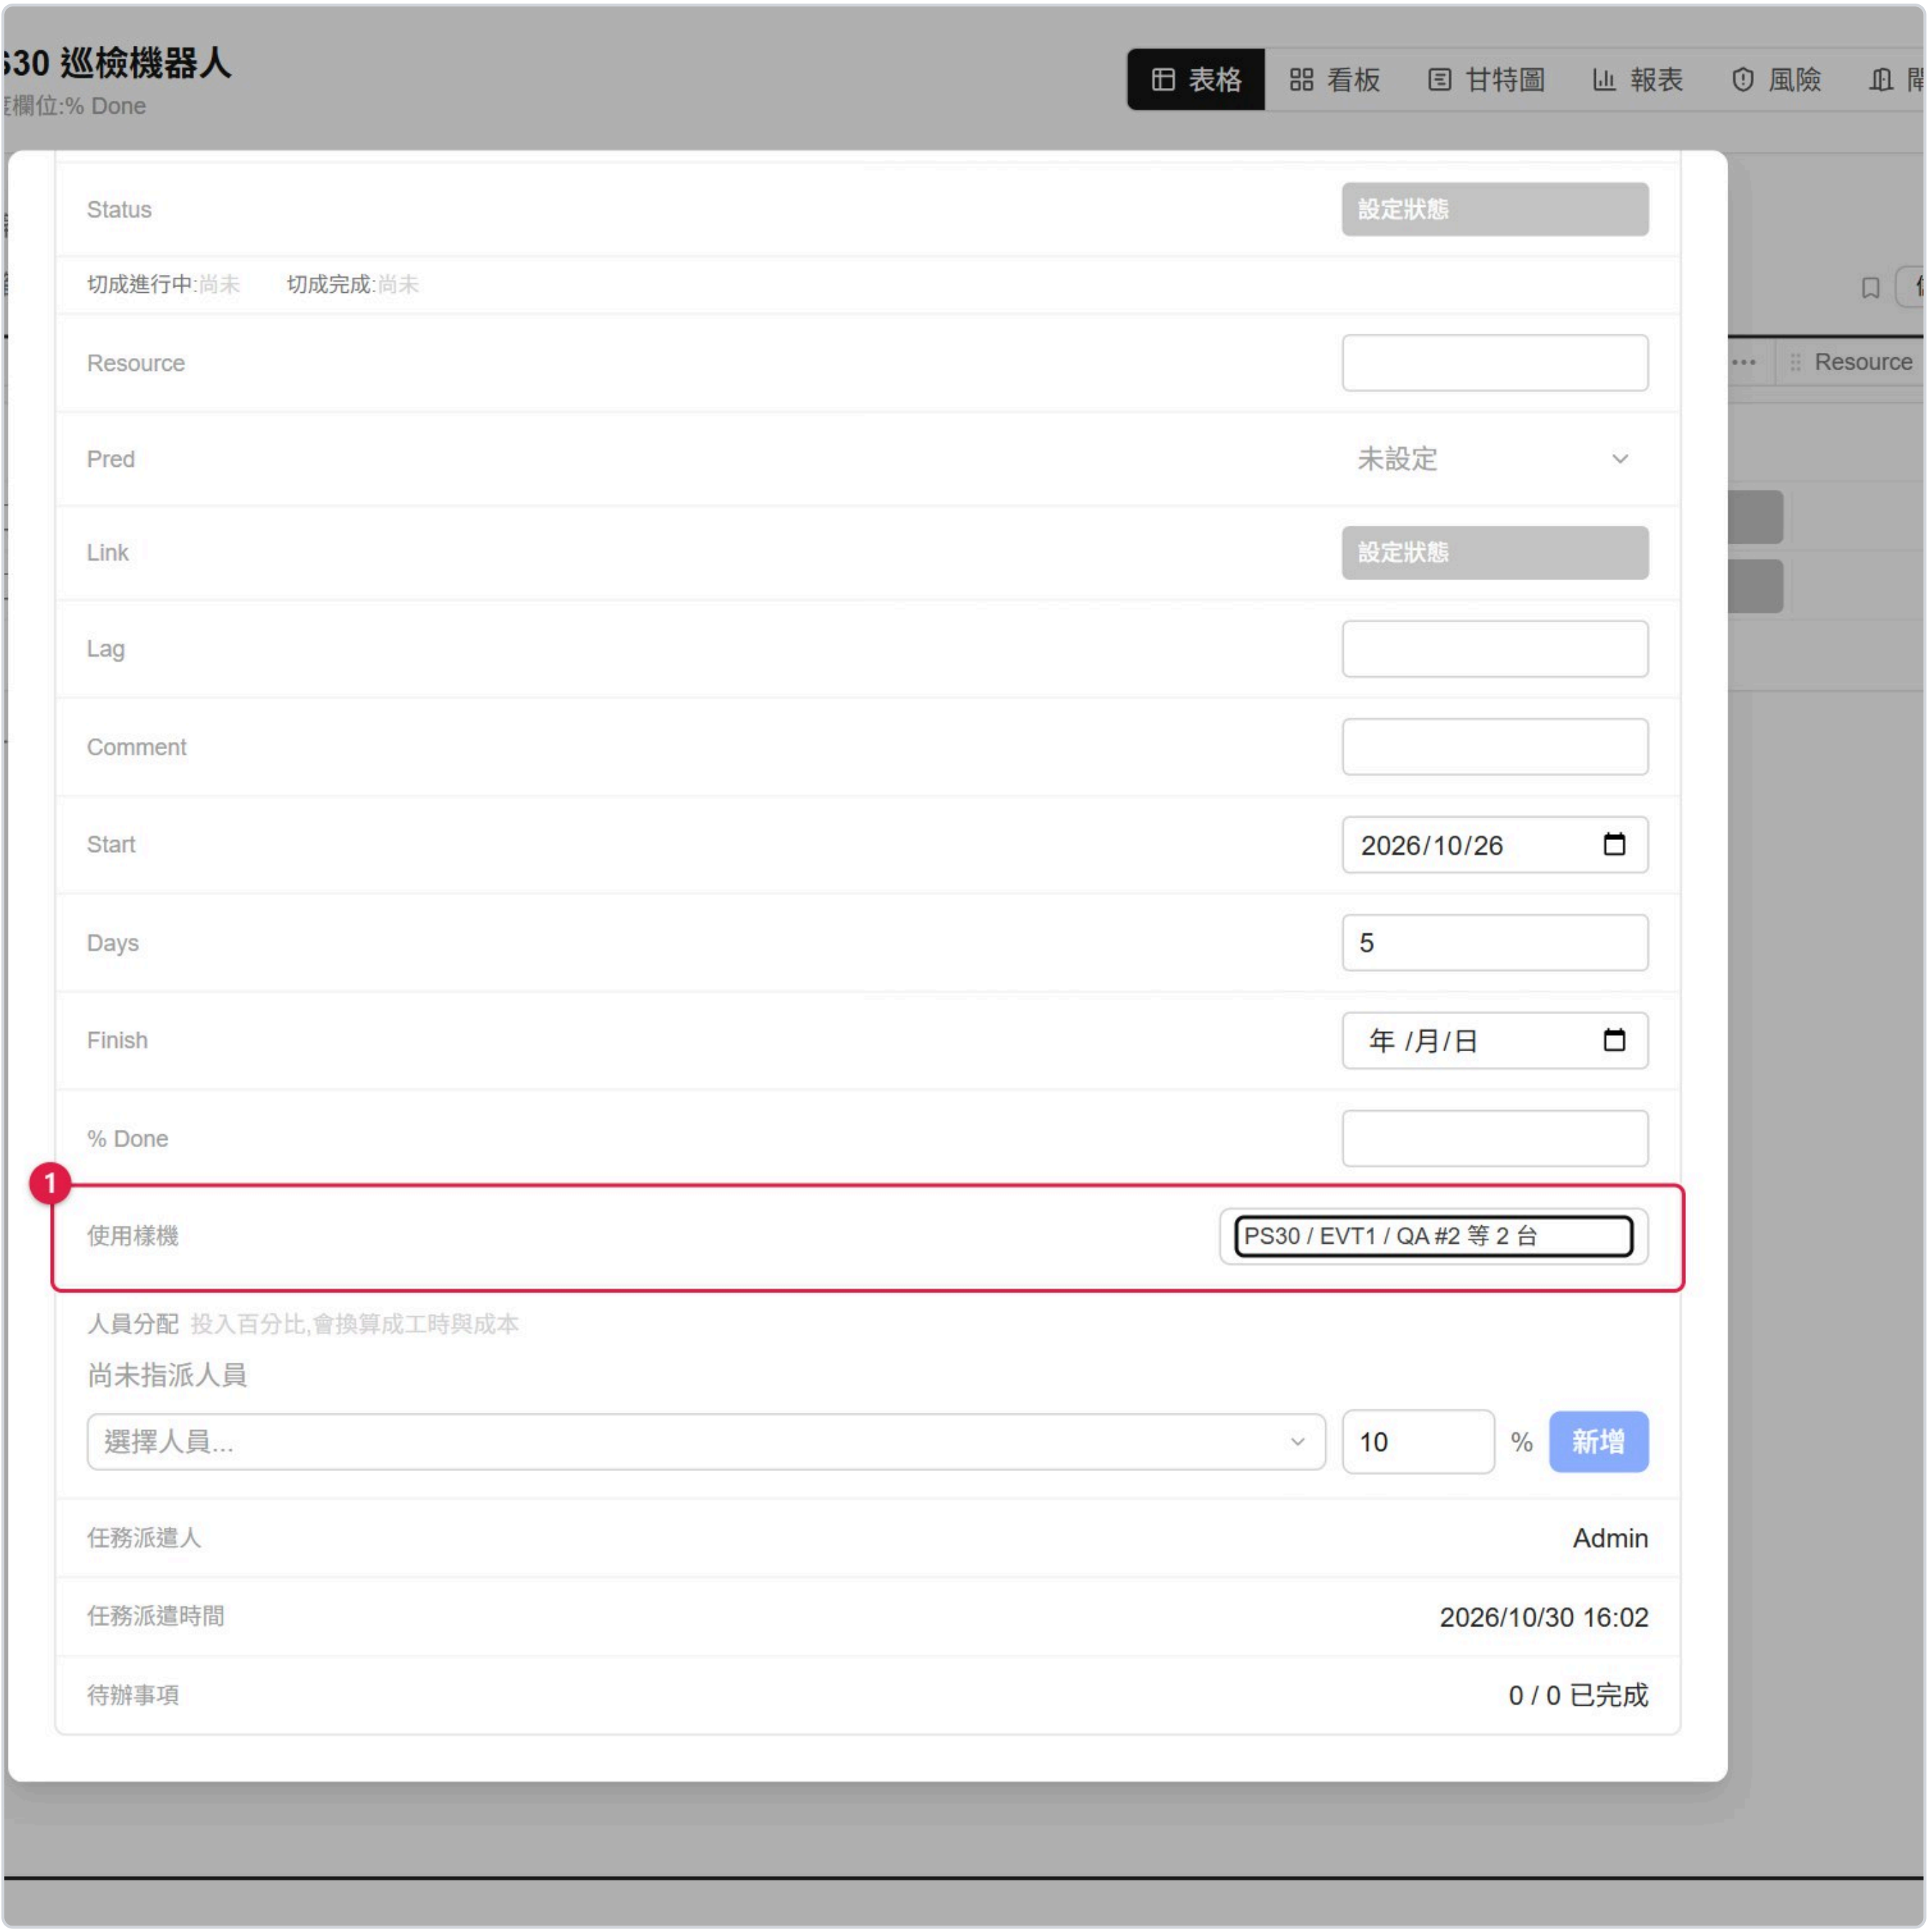

30 巡檢機器人

欄位:% Done

Status	設定狀態
切成進行中:尚未 切成完成:尚未	
Resource	
Pred	未設定
Link	設定狀態
Lag	
Comment	
Start	2026/10/26
Days	5
Finish	年 /月/日
% Done	
使用樣機	PS30 / EVT1 / QA #2 等 2 台

人員分配 投入百分比,會換算成工時與成本

尚未指派人員

選擇人員... 10 % 新增

任務派遣人	Admin
任務派遣時間	2026/10/30 16:02
待辦事項	0 / 0 已完成

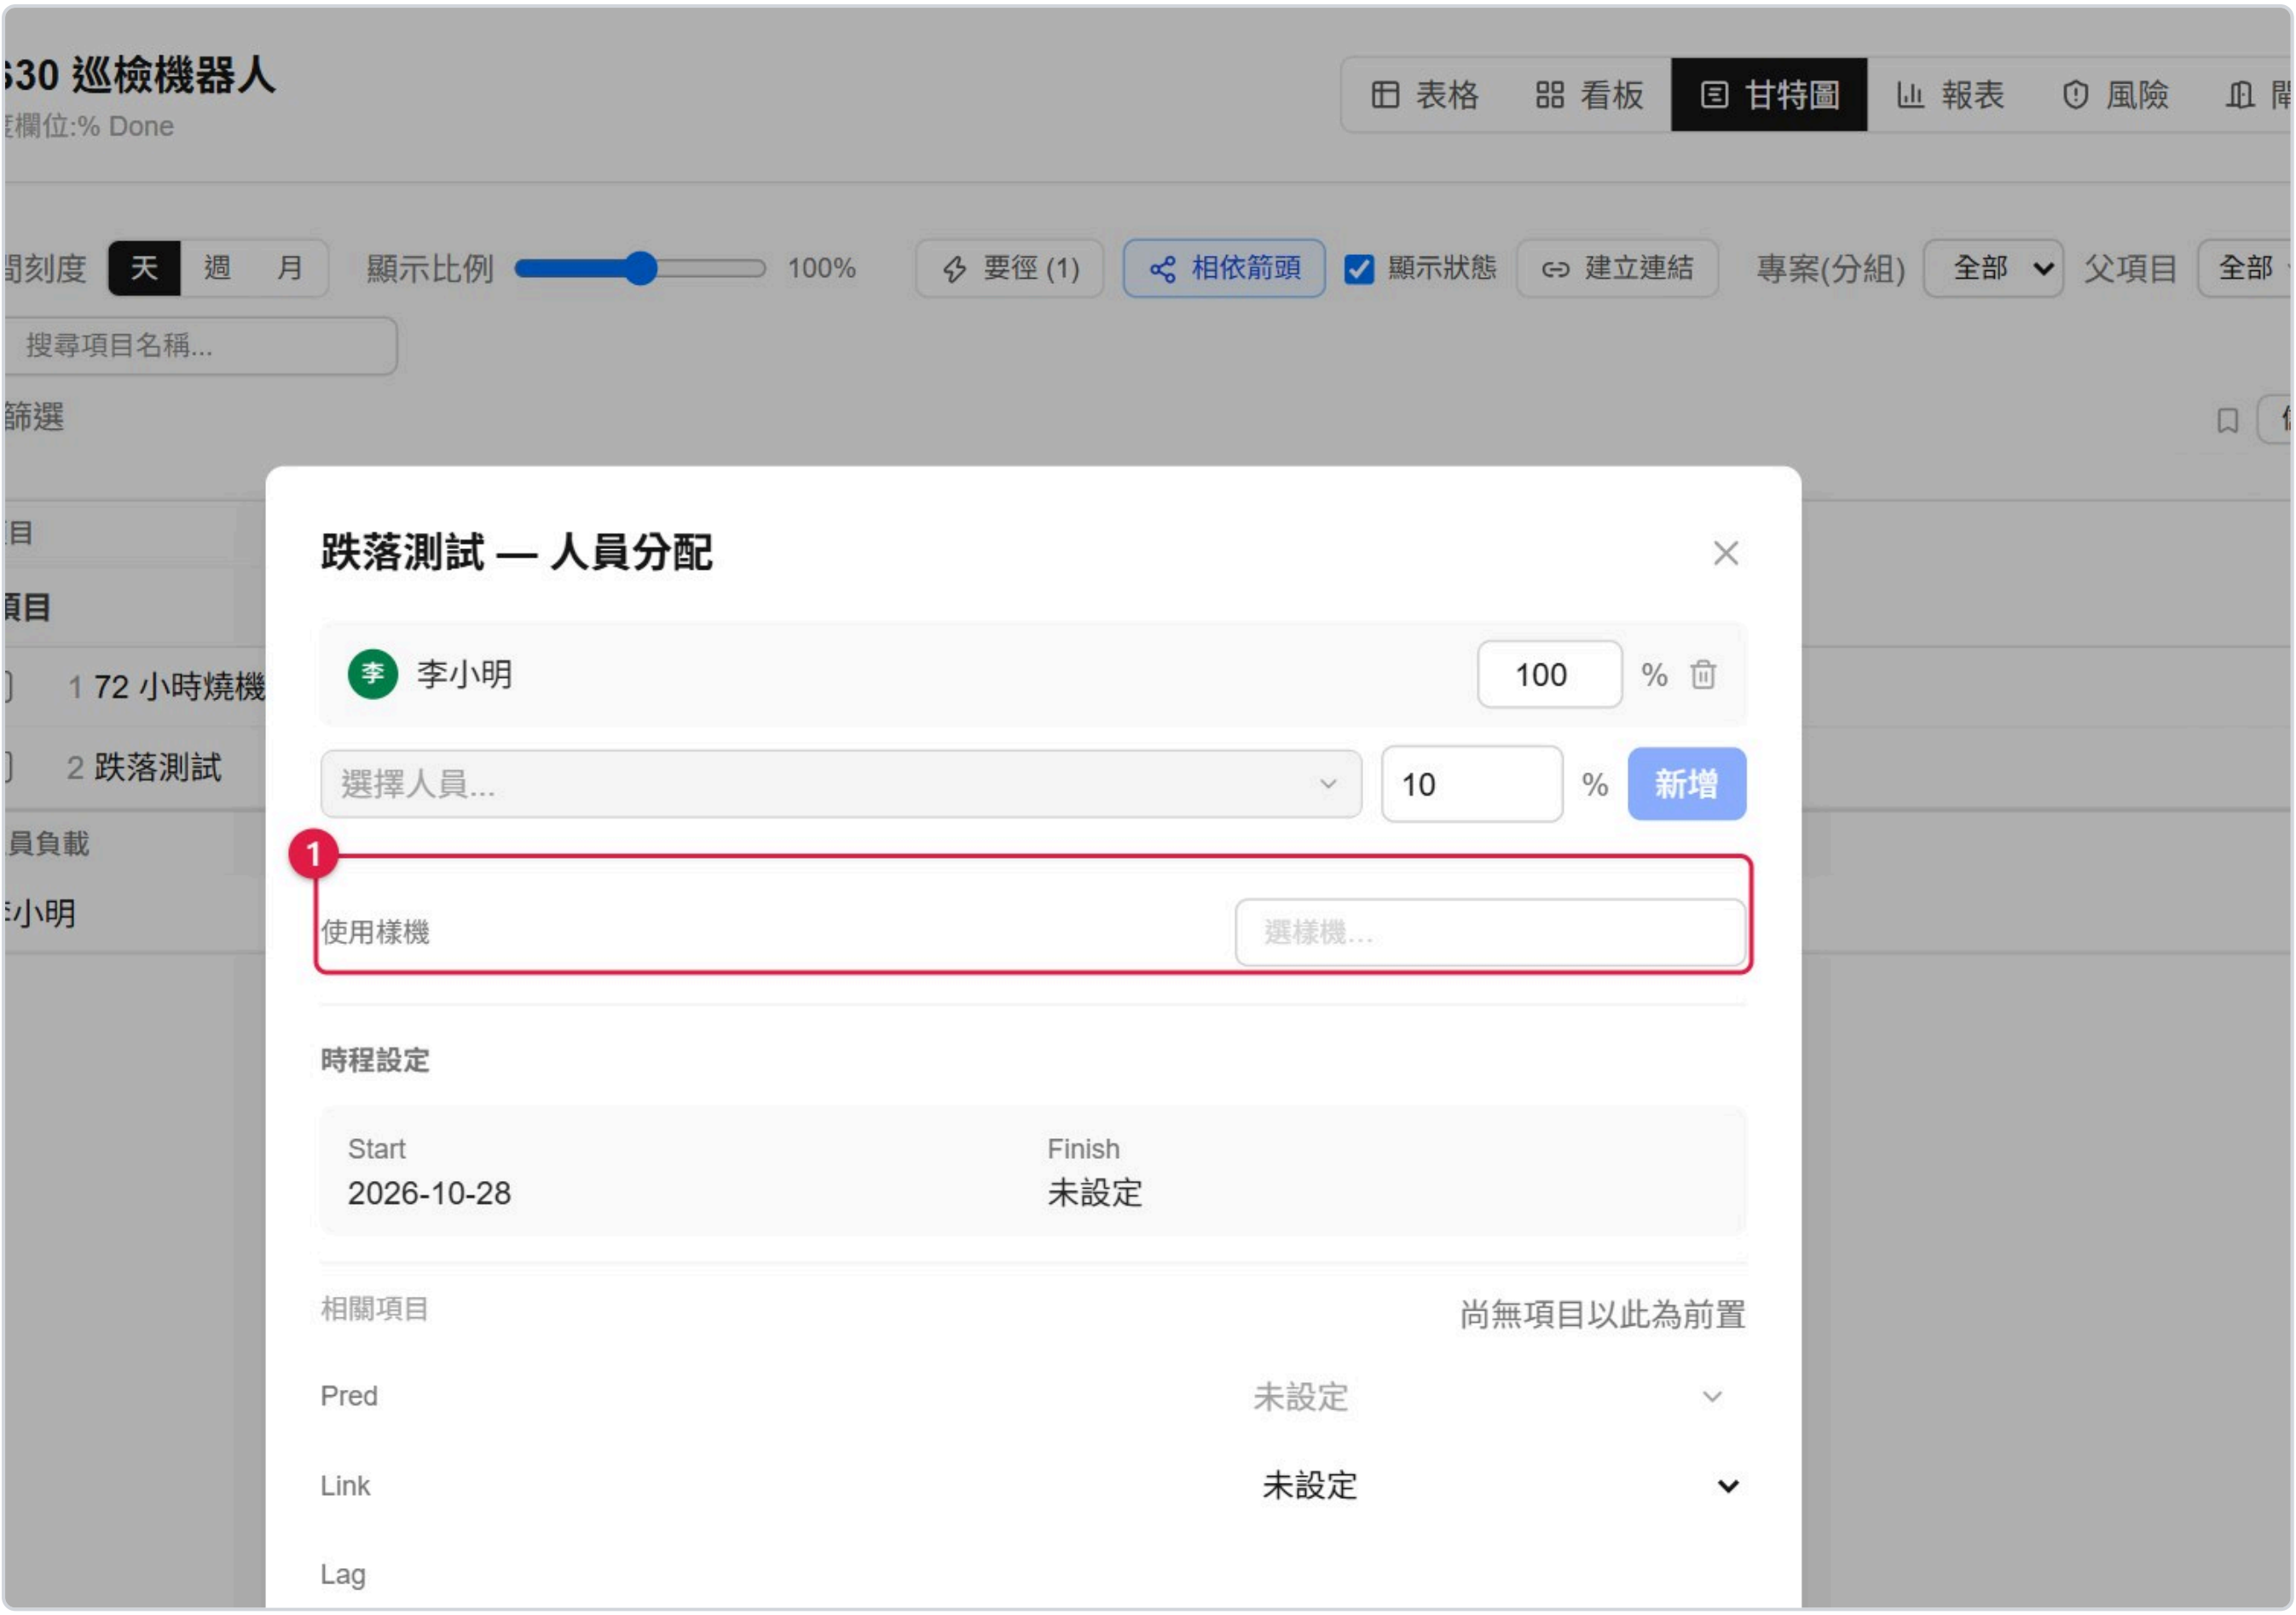
30 巡檢機器人
欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
刻度
天
週
月
顯示比例
100%
要徑 (1)
相依箭頭
顯示狀態
建立連結
專案(分組)
全部
父項目
全部
搜尋項目名稱...
篩選
目
項目
1 72 小時燒機
2 跌落測試
員負載
小明
1

跌落測試 — 人員分配

李小明 100 %

選擇人員... 10 % 新增

使用樣機 選樣機...

時程設定

Start 2026-10-28

Finish 未設定

相關項目 尚無項目以此為前置

Pred 未設定

Link 未設定

Lag

點不開、只能看:你沒有編輯權限(管理者、主管、被指派到這個工作項的人,或同分組同職能的組員才能選;能不能改由伺服器判斷,表格、項目卡片、甘特圖視窗、儀表板開的卡片一致);看不到這一列(表格的格子是「—」):這個看板的樣機計畫還沒排任何台數。

上一步 / 下一步:在看板上改「使用樣機」(表格欄、項目卡片、人員分配視窗)會記進看板的「上一步 / 下一步」(Ctrl+Z / Ctrl+Y),還原就是換回原本那幾台;如果中間有人改過,就擋下來、不蓋掉他的修改。只有看板裡的操作有,儀表板開的視窗沒有。

同一天被好幾個工作項用:新選的樣機如果在那幾天已經有別的工作項在用、合計超過 100%,存檔後會跳出提醒、並通知另外那幾個工作項的負責人(見第 16 章「樣機使用時程」)。選擇本身照樣存下來,要排開的話改工作項的日期、改用別台樣機,或把佔用百分比調低。

樣機台數變動時,已經選好的樣機會怎樣:

- **台數增加**:自動補上新的號碼(7 → 9 就多出第 8、9 台)。
- **台數減少**:從**最大的號碼**開始拿掉(9 → 7 拿掉第 8、9 台),小號碼的保留。**不會擋住你的修改**;被拿掉的樣機如果有工作項在用,那些工作項的「使用樣機」會**一併解除**,存檔之後跳出說明告訴你拿掉了哪幾台、哪些工作項被解除(也會在那些工作項的活動紀錄留一筆),需要的話請重新替它們選別的樣機。
- 刪除樣機計畫的一列、刪除產品(刪除前的確認會說明有幾台樣機、幾個工作項在使用)、從 Excel 匯入把台數改小,都是同樣的處理;產品改名時,樣機跟著改名、工作項的選擇不受影響。
- 以前已經排好的樣機計畫,升級時會自動補出對應的每一台樣機。

人力預算怎麼算(階段預算「各類別」裡的人力那一列,金額由人力表計算):每個名額的人月 × 一個月多少錢。

- 人力表裡**指到某個人、而且管理者在使用者管理替他設了「月薪」的名額,用他的月薪**算。
- 還沒指人(TBH),或指到的人沒設月薪的名額,用**單位標準月薪**(系統設定)。
- 所以在使用者管理改某個人的月薪,凡是人力表裡指到他的看板,人力預算會**自動連動重算**(稽核軌跡會寫連動了幾塊看板);把名額改指到別人、或刪除那位使用者,也會跟著重算。
- 只看**月薪**,不看時薪:時薪是算**實際工時成本**用的(時薪有填就優先於月薪);規劃是「幾個人月 × 一個月多少錢」,用月薪。
- 個人月薪只有管理者看得到,所以**用個人月薪算的名額,它自己那一列的金額只有管理者看得到**(其他人看到「—」);單位小計、階段與總計金額大家照常看得到。其他人匯出的人力表 Excel,金額一律用單位標準月薪列(檔案裡會註明),管理者匯出的才用個人月薪。人力表上用個人月薪算的名額,金額後面有「*」記號。

材料預算怎麼算(階段預算「各類別」裡的「材料(打樣與樣品)」,標「由樣機 BOM 計算」):

- 每個產品:**樣機 BOM 的單台成本 × 樣機計畫裡這個產品在這個階段排的台數**(各用途單位加起來);同一個階段有好幾個產品就各自算完再加總。**兩邊都要有**:只填 BOM、沒在樣機計畫排台數,或台數有排但那個階段沒有 BOM,材料預算都算不出來。
- 產品名稱要**一模一樣**(樣機計畫的產品欄和 BOM 的產品欄是各自輸入的文字,多一個空白、大小寫不同就是兩個產品)。
- 樣機 BOM 頁面下方會寫「× 樣機計畫排的台數 N 台 = 這個產品算進這個階段材料預算的錢」;有 BOM 卻沒排台數時,上方會出現黃色提醒。
- 這一格是存起來的數字,改 BOM 或台數時會重算寫入;**打開預算時也會對一次**,舊資料或沒走到重算的情形(例如從備份還原)會自動補上。這個階段只要有一筆 BOM,材料預算就全部由這裡驅動(算出來是 0 就是沒有編列),沒有 BOM 的階段仍是手動「設定」。

整個專案的合計:「階段預算」與「NRE 報價單」上方的階段下拉,**第一項是「整個專案(全部階段合計)」,打開預算時預設就是它**(要編輯某一段再選那個階段;選過的階段在這一次逗留期間會記住)。選它看的是整個看板(專案)的總數,**唯讀**:

- 階段預算:各類別的核准預算與準備金是**各階段核准金額加總**;已花費、已下單未入帳、人力實際成本、完工預估是這個看板上**所有工作項**的(包含沒有對應到任何階段的)。不能在這裡設定預算或登記訂單、支出——要編輯請選單一階段。
- NRE 報價單:每個階段、每一類的 NRE 小計;**涵蓋整個專案的委託開發**另成一列「涵蓋整個專案」;最後一列是全部加總。下面再列出委託開發的明細(範圍、委託項目、委託單位、時間範圍、金額)。

新增一份 BOM(某個產品在某個階段要用的料):

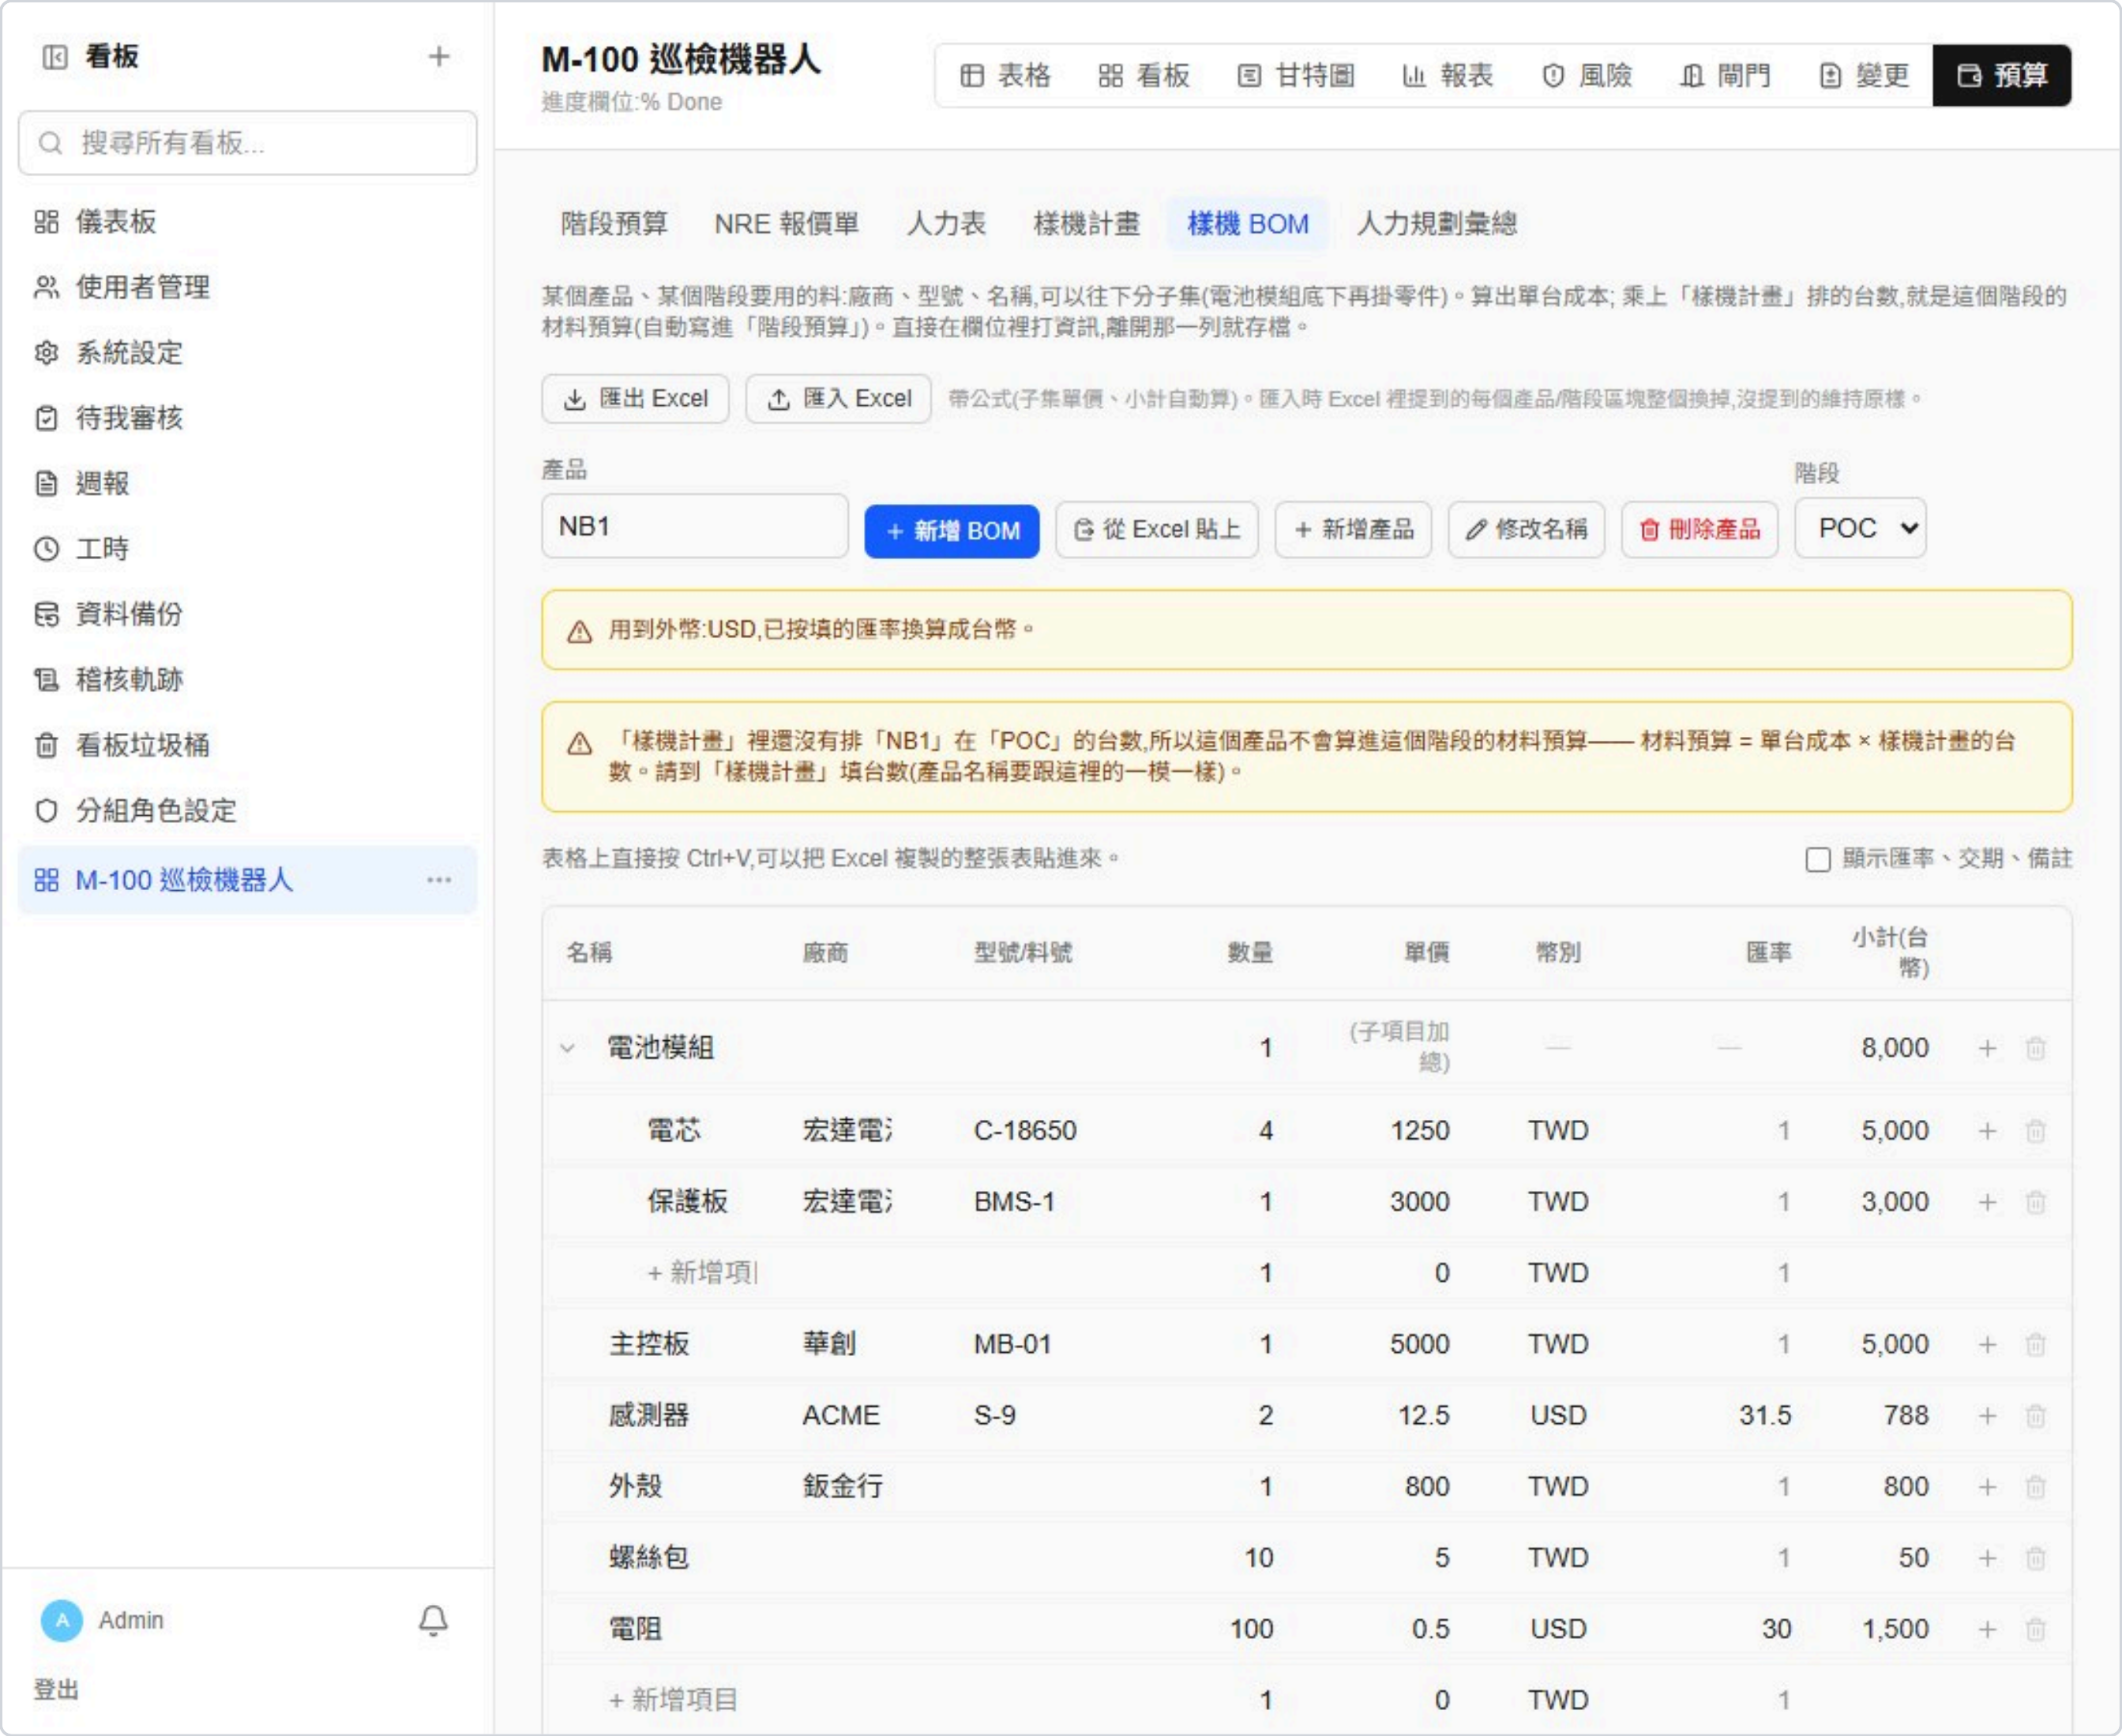
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
Admin
登出
M-100 巡檢機器人
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
階段預算
NRE 報價單
人力表
樣機計畫
樣機 BOM
人力規劃彙總
匯出 Excel
匯入 Excel
產品
NB1
+ 新增 BOM
從 Excel 貼上
+ 新增產品
修改名稱
刪除產品
階段
POC
☐ 顯示匯率、交期、備註

某個產品、某個階段要用的料:廠商、型號、名稱,可以往下分子集(電池模組底下再掛零件)。算出單台成本; 乘上「樣機計畫」排的台數,就是這個階段的材料預算(自動寫進「階段預算」)。直接在欄位裡打資訊,離開那一列就存檔。

帶公式(子集單價、小計自動算)。匯入時 Excel 裡提到的每個產品/階段區塊整個換掉,沒提到的維持原樣。

⚠ 用到外幣:USD,已按填的匯率換算成台幣。

⚠ 「樣機計畫」裡還沒有排「NB1」在「POC」的台數,所以這個產品不會算進這個階段的材料預算—— 材料預算 = 單台成本 × 樣機計畫的台數。請到「樣機計畫」填台數(產品名稱要跟這裡的一模一樣)。

表格上直接按 Ctrl+V,可以把 Excel 複製的整張表貼進來。

名稱	廠商	型號/料號	數量	單價	幣別	匯率	小計(台幣)
電池模組			1	(子項目加總)	—	—	8,000
電芯	宏達電	C-18650	4	1250	TWD	1	5,000
保護板	宏達電	BMS-1	1	3000	TWD	1	3,000
+ 新增項			1	0	TWD	1	
主控板	華創	MB-01	1	5000	TWD	1	5,000
感測器	ACME	S-9	2	12.5	USD	31.5	788
外殼	鈑金行		1	800	TWD	1	800
螺絲包			10	5	TWD	1	50
電阻			100	0.5	USD	30	1,500
+ 新增項目			1	0	TWD	1	

- **新增 BOM**:「樣機 BOM」分頁左上的藍色按鈕,一個視窗選好**產品**(按下面「現有產品」的按鈕,或直接打一個新的名字,會一起建立)與**階段**,再選**從哪裡開始**——空白,或**複製一份現有的 BOM**(任何產品、任何階段,整棵子集一起複製)當起點再改。建好就切到那一份。目標已經有 BOM 時不會蓋掉,會說明並留在視窗裡。

- **從 Excel 貼上**:把 Excel 或 Google 試算表的整張表複製,按「**從 Excel 貼上**」(或直接在 BOM 表格上按 **Ctrl+V**——一次貼多格的文字會自動開這個視窗,貼單一格的文字照常進輸入框)。視窗會**先預覽**讀到幾列、哪幾列有問題,按「貼上 N 列」才寫入,接在現有的列後面。
  - 欄位順序:**名稱、廠商、型號/料號、數量、單價、幣別、匯率、交期、備註**。第一列如果是表頭(欄名寫得跟上面一樣,或英文 Name / Vendor / P/N / Qty / Unit Price / Currency),就照表頭的字找欄位,順序不拘、多的欄位(例如小計)忽略。
  - **上下層**:表頭多一欄「階層」(**BOM LEVEL**、Level、層級、Lv 也認——ERP / PLM 匯出的 BOM 常見這一欄;0 起算或 1 起算都行,最小的就是最上層,2 = 它的子項目…),或沒有表頭時名稱前面縮排(每兩個空白一層),子項目就掛在前面最近一列比它淺一層的那一列底下。
  - 空白的欄位用預設:數量 1、單價 0、幣別 TWD。外幣沒填匯率的,用系統設定裡目前的匯率;沒有那個幣別的匯率就略過那一列。金額可以寫 NT$1,250、1,250、300 元。底下的「小計」「合計」列自動略過。

  - 有問題的列(沒有名稱、數量不是正數、單價是負的、幣別不是三個字母...)整列略過並說明是第幾列、什麼原因,其他列照貼;一次最多 300 列。
  - **自訂欄位**(見下面「BOM 的欄位設定」):表頭寫看板設定的欄位名稱就讀得進來,內建欄位改過的新名字也行(例如把「廠商」改成「供應商」,表頭寫「供應商」)。下拉選單、數字、日期、勾選(是 / Y / 1 / ✓)、人員(寫姓名)都讀得懂,讀不懂的那一格留空並說明,其他格照貼。**表頭裡沒有的自訂欄位,新增的列帶預設值;表頭有、格子空白,就是空白。**自訂欄位沒辦法照順序猜,所以要有表頭。

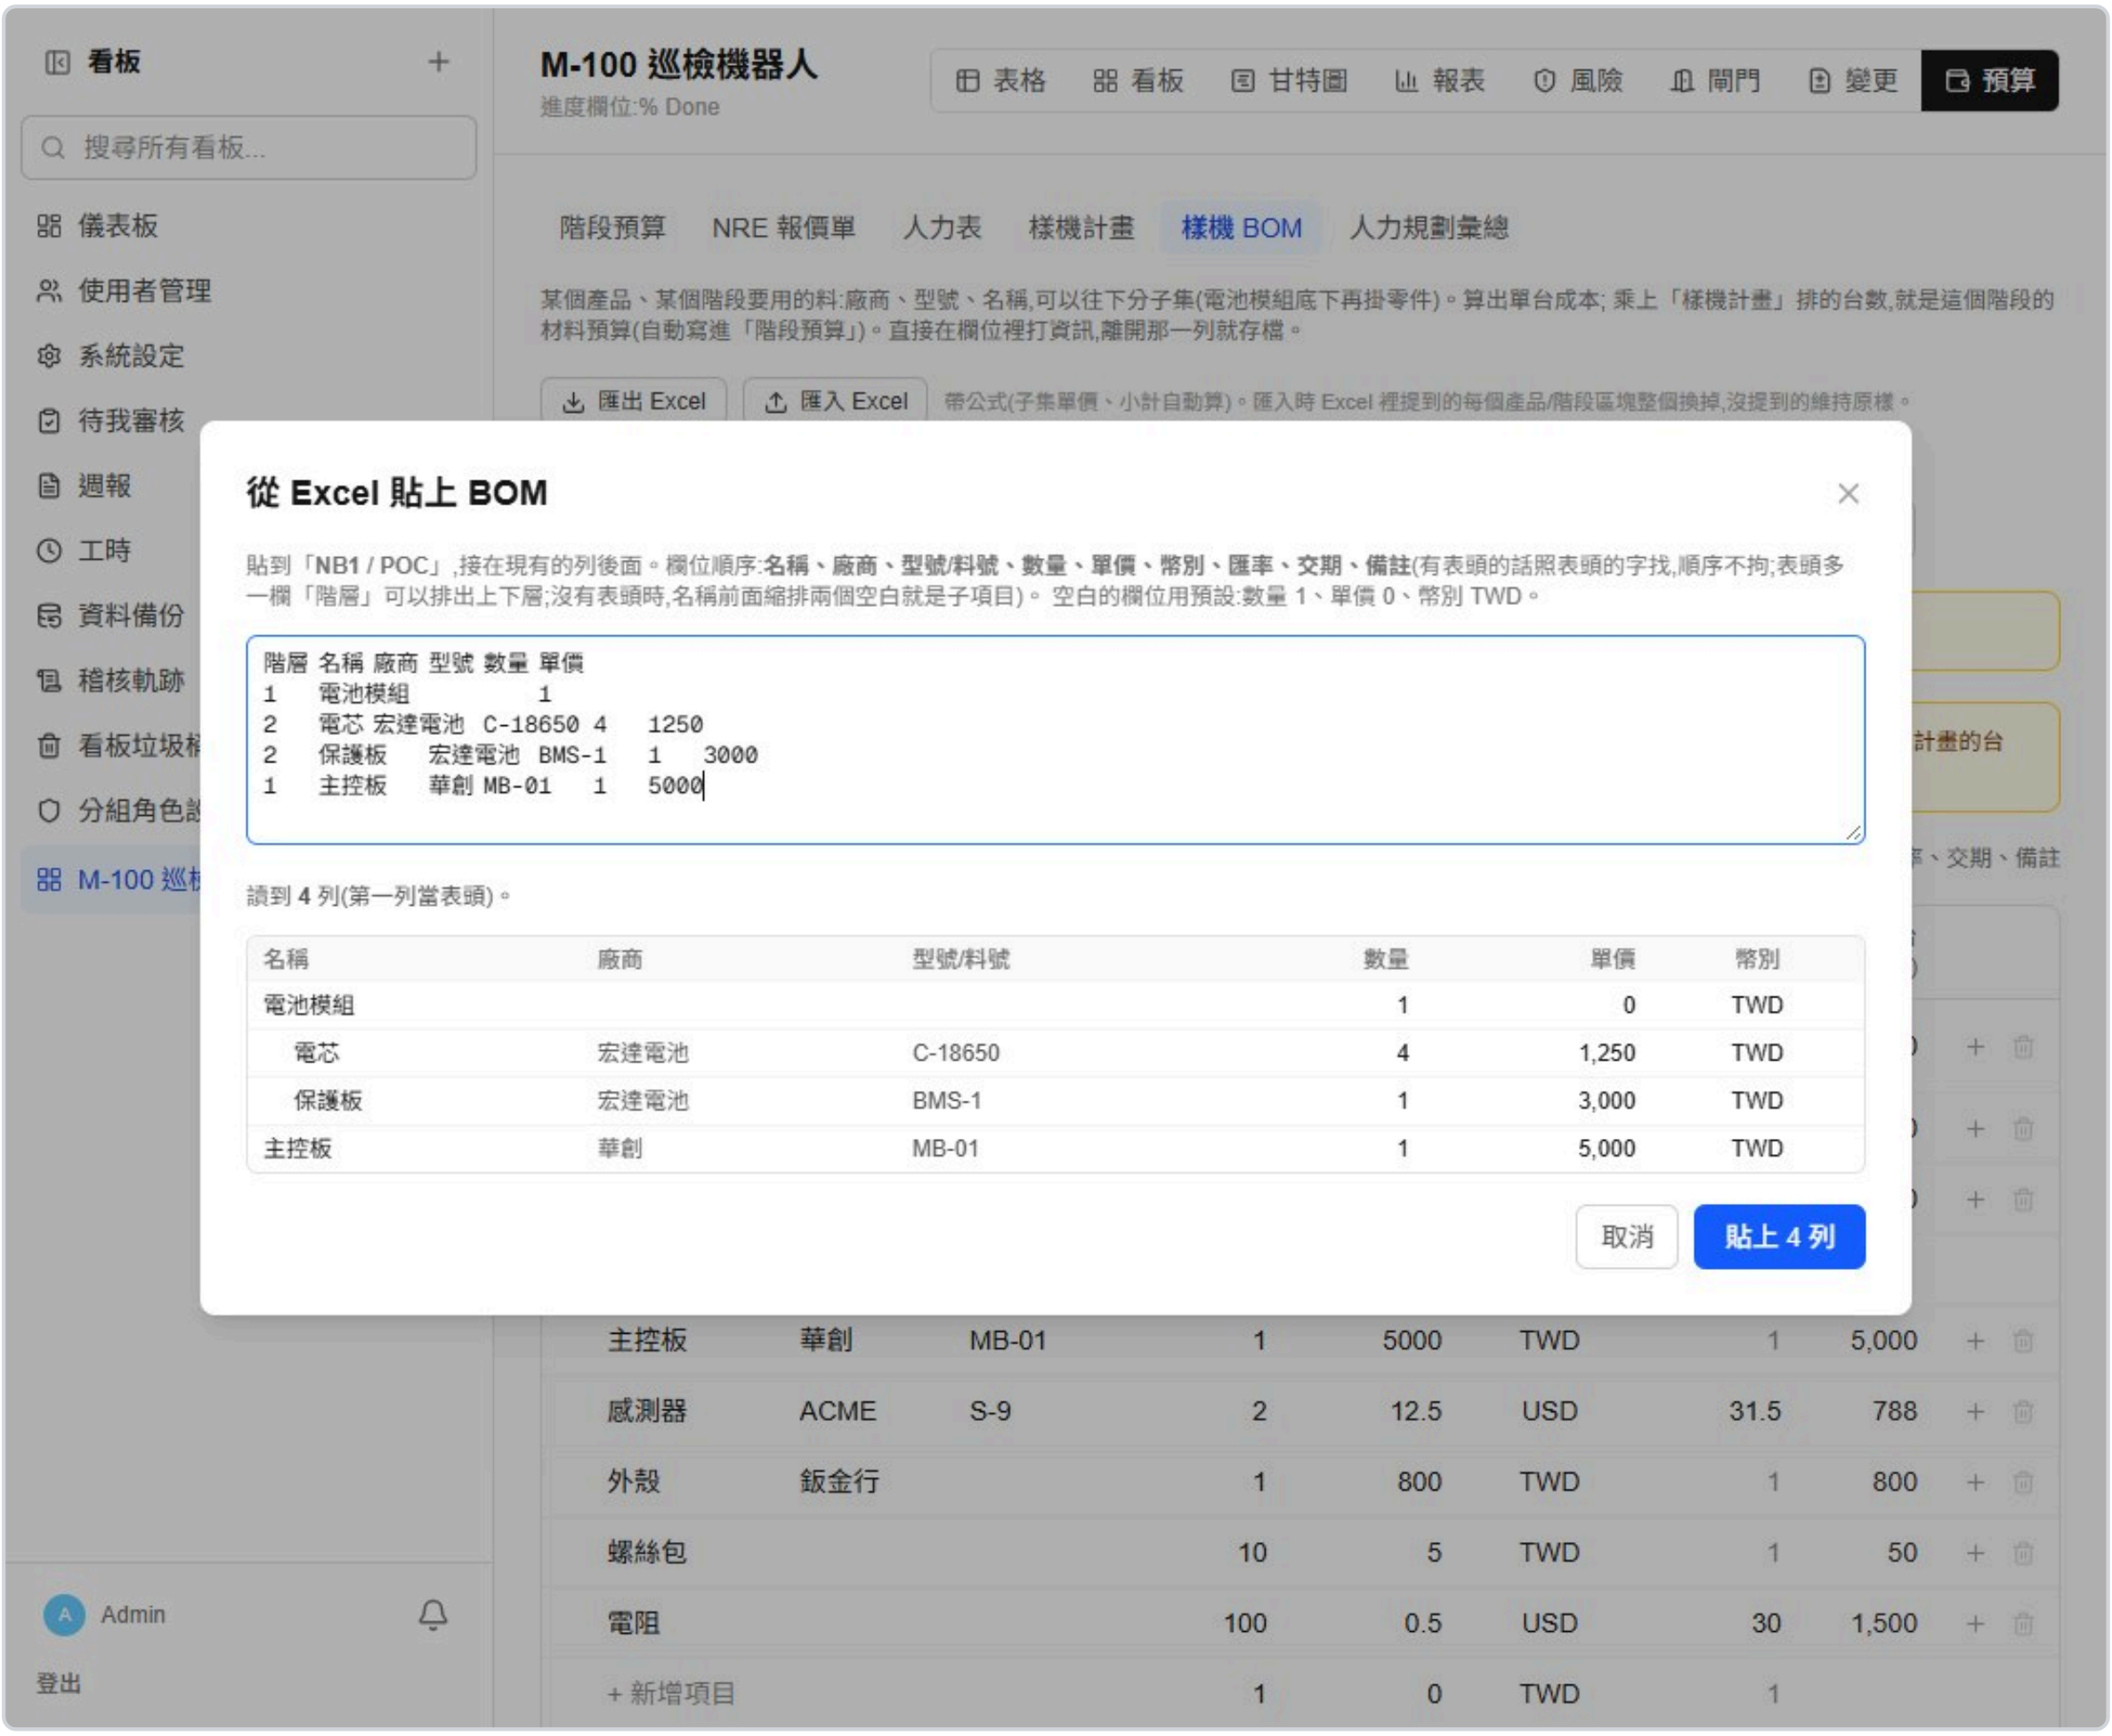
看板
+
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設
M-100 巡檢
Admin
登出
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
階段預算
NRE 報價單
人力表
樣機計畫
樣機 BOM
人力規劃彙總
匯出 Excel
匯入 Excel
取消
貼上 4 列

M-100 巡檢機器人

進度欄位:% Done

某個產品、某個階段要用的料:廠商、型號、名稱,可以往下分子集(電池模組底下再掛零件)。算出單台成本; 乘上「樣機計畫」排的台數,就是這個階段的材料預算(自動寫進「階段預算」)。直接在欄位裡打資訊,離開那一列就存檔。

帶公式(子集單價、小計自動算)。匯入時 Excel 裡提到的每個產品/階段區塊整個換掉,沒提到的維持原樣。

從 Excel 貼上 BOM

貼到「NB1 / POC」,接在現有的列後面。欄位順序:**名稱、廠商、型號/料號、數量、單價、幣別、匯率、交期、備註**(有表頭的話照表頭的字找,順序不拘;表頭多一欄「階層」可以排出上下層;沒有表頭時,名稱前面縮排兩個空白就是子項目)。 空白的欄位用預設:數量 1、單價 0、幣別 TWD。

```
階層 名稱 廠商 型號 數量 單價
1    電池模組          1
2    電芯 宏達電池  C-18650 4    1250
2    保護板    宏達電池  BMS-1    1    3000
1    主控板    華創 MB-01    1    5000
```

讀到 **4** 列(第一列當表頭)。

名稱	廠商	型號/料號	數量	單價	幣別
電池模組			1	0	TWD
電芯	宏達電池	C-18650	4	1,250	TWD
保護板	宏達電池	BMS-1	1	3,000	TWD
主控板	華創	MB-01	1	5,000	TWD

主控板	華創	MB-01	1	5000	TWD	1	5,000
感測器	ACME	S-9	2	12.5	USD	31.5	788
外殼	鈑金行		1	800	TWD	1	800
螺絲包			10	5	TWD	1	50
電阻			100	0.5	USD	30	1,500
+ 新增項目			1	0	TWD	1	

- **表格不用左右捲**:匯率、交期、備註三欄預設收起來(那一份有資料、或欄位設了必填時會自動顯示);要看或要填,勾表格上方的「**顯示匯率與收起來的欄位**」。外幣的匯率在收起來時填在幣別格底下。

- **新增一列不用重打**:新增列(最下面的空白列)送出後,**幣別與匯率沿用剛送出的那一筆**;在任何一格按 Enter 送出,游標會回到名稱欄,可以一路打下去。廠商欄會建議這個看板填過的廠商。

BOM 的階層:BOM LEVEL【可以編輯這個看板 BOM 的人】

每一列的名稱後面固定有一欄「**BOM LEVEL**」(①,跟「名稱」一樣固定有,不能隱藏或刪除)。**1 = 最上層**,2 = 它的子項目,3 = 子項目的子項目......有子項目的列,單價格顯示「(子項目加總)」,**它的價錢就是底下所有子項目加起來**(每一層的數量都乘進去),最後算出單台成本。

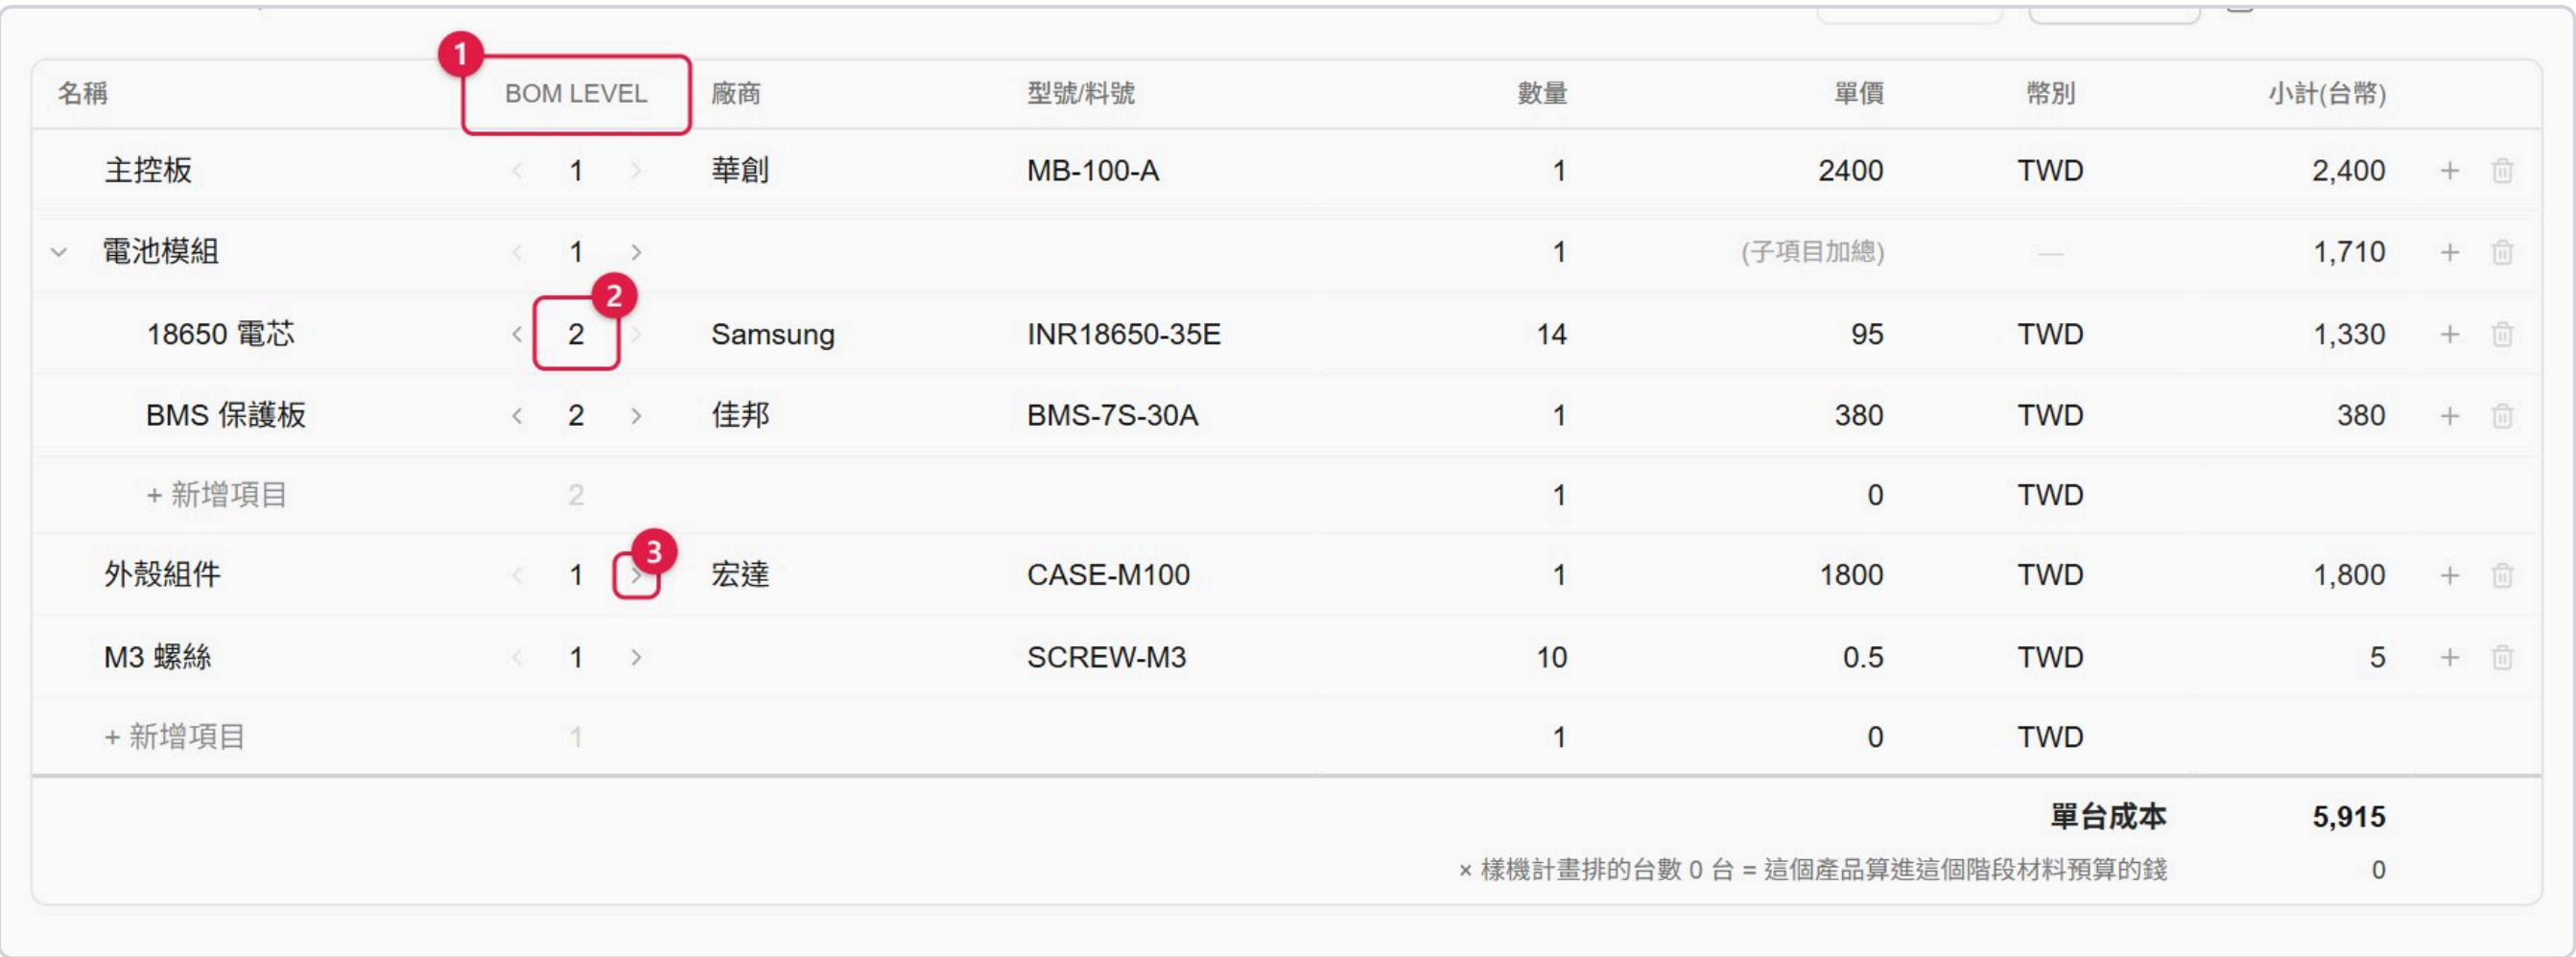

名稱	BOM LEVEL	廠商	型號/料號	數量	單價	幣別	小計(台幣)
主控板	1	華創	MB-100-A	1	2400	TWD	2,400
電池模組	1			1	(子項目加總)	—	1,710
18650 電芯	2	Samsung	INR18650-35E	14	95	TWD	1,330
BMS 保護板	2	佳邦	BMS-7S-30A	1	380	TWD	380
+ 新增項目	2			1	0	TWD	
外殼組件	1	宏達	CASE-M100	1	1800	TWD	1,800
M3 螺絲	1		SCREW-M3	10	0.5	TWD	5
+ 新增項目	1			1	0	TWD	
						單台成本	5,915
						× 樣機計畫排的台數 0 台 = 這個產品算進這個階段材料預算的錢	0

- **改階層**:直接改「BOM LEVEL」的數字(② 按 Enter 或點到別處就送出,按 Esc 放棄),或按數字兩側的箭頭(③):‹ **升階**(往外一層)、› **降階**(變成前一列的子項目)。要新增子項目,也可以按列尾的「+」。
- **底下的子項目整串一起走**:一個子集降階或升階,它的子項目跟著位移一層,內部的上下關係不變。
- **升階會接管後面的列**:一列升階之後,排在它後面、原本跟它同一層的列,會變成它的子項目——跟看板表格升階是同一個規則。不想要的話,先把後面那幾列也一起升階。
- **一列最多只能比前一列深一層**:第一列只能是 1;打得太深,會說明這一列最多可以到第幾層,什麼都不會改。
- **單價的提醒**:一列變成子集(有了子項目)之後,它**自己填的單價就不再計算**(改算底下的加總);調整後系統會跳出提醒,說明哪幾列因此不再算自己的單價、原本填多少。反過來,一列失去全部的子項目,就改回算它自己填的單價,同樣會提醒。
- **貼上與 Excel**:貼上時表頭寫「BOM LEVEL」(也認「階層」「Level」「Lv」)就會自動排出上下層,0 起算或 1 起算都行。Excel 匯出入的「階層」欄是 0 起算,畫面上的 BOM LEVEL 是 1 起算(Excel 的 0 = 畫面的 1)。
- 自訂欄位**不能再取名「BOM LEVEL」**(跟固定欄位同名)。以前自己加過同名的自訂欄位的看板,要把它改名或刪掉,才能儲存欄位設定。

BOM 勾選後的批次操作:升階、降階、編輯、移動、複製、刪除【可以編輯這個看板 BOM 的人】

BOM 表格每一列前面有**勾選框**,表頭的勾選框是**全選 / 取消全選**這一份 BOM 的所有列。勾選之後,表格上方出現操作列:

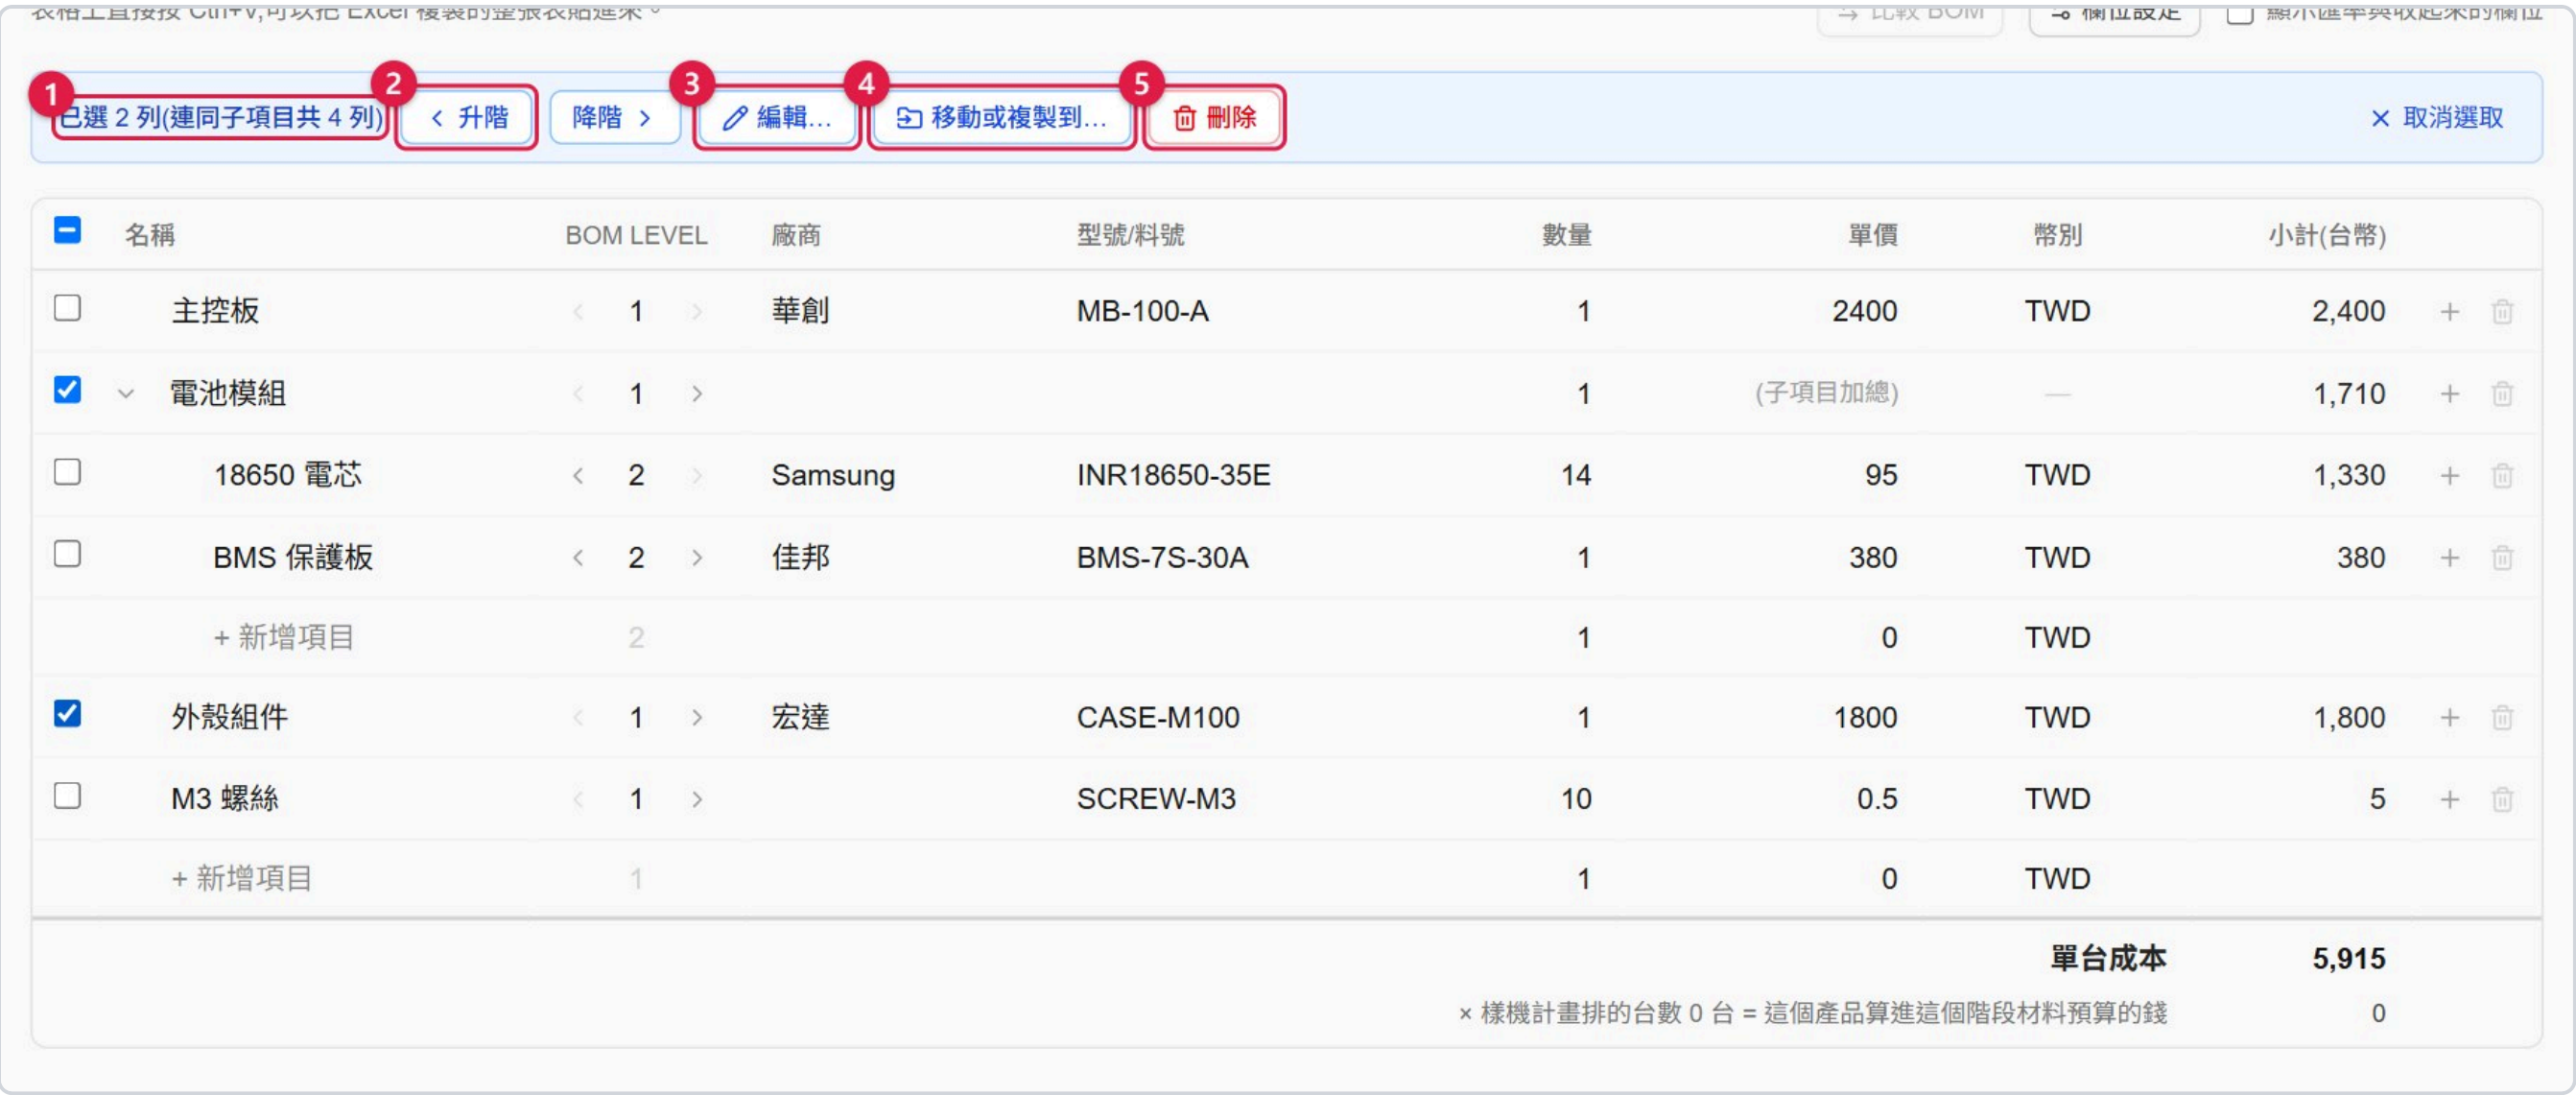

☐	名稱	BOM LEVEL	廠商	型號/料號	數量	單價	幣別	小計(台幣)
☐	主控板	1	華創	MB-100-A	1	2400	TWD	2,400
☑	電池模組	1			1	(子項目加總)	—	1,710
☐	18650 電芯	2	Samsung	INR18650-35E	14	95	TWD	1,330
☐	BMS 保護板	2	佳邦	BMS-7S-30A	1	380	TWD	380
	+ 新增項目	2			1	0	TWD	
☑	外殼組件	1	宏達	CASE-M100	1	1800	TWD	1,800
☐	M3 螺絲	1		SCREW-M3	10	0.5	TWD	5
	+ 新增項目	1			1	0	TWD	
							單台成本	**5,915**
							× 樣機計畫排的台數 0 台 = 這個產品算進這個階段材料預算的錢	0

編號	功能
① 已選 N 列	括號內會標出連同子項目一共幾列
② 升階 / 降階	勾選的列(連同子項目)一起往外、往內一層
③ 編輯…	把勾選的列的某個欄位一次改成同一個值
④ 移動或複製到…	搬到(或複製到)同一份或別份 BOM 的指定位置
⑤ 刪除	連同子項目一起刪除
取消選取	清除勾選

重點規則:升階、降階、移動、複製、刪除:勾選一列,它底下的**子項目一起被處理**;父項與子項都被勾,只算父項(不會處理兩次)。**「編輯」例外,只改打勾的列本身**。

- **升階 / 降階**:規則跟上一節的 BOM LEVEL 一樣。做完勾選還在,可以接著再按。**全有或全無**:只要有一列做不到(已經是 BOM LEVEL 1 還要升階、前面沒有可以掛的上層還要降階),整批都不動,並說明是哪一列。
- **編輯…**:選一個欄位、填一個值、按「套用到 N 列」。可以改的欄位:
  - **取代名稱**:「尋找」換成「取代為」(留空 = 刪掉那段字);照字面比對、區分大小寫;取代之後名稱會變空白的列略過。
  - **數量、單價、幣別**:單價與幣別**只套用在零件**,有子項目的列(單價是底下加總算出來的)略過,並說明有幾列。幣別選外幣時要填**匯率**;留空就用系統設定裡目前的匯率,沒有的話會說明請你填。
  - **廠商、交期、備註**(這個看板 BOM 有顯示的),與所有**自訂欄位**(文字、數字、日期、下拉選單、人員、勾選、連結)。勾「**清空這個欄位**」就是把值拿掉。
  - **型號/料號與檔案附件不開放批次改**(每一列都不一樣)。
- **移動或複製到…**:選目標的**產品與階段**(預設是目前這一份)、**放在哪一列底下**(最上層,或某一列底下)、**位置**(最後面、最前面、接在某一列後面)。
  - **移動**:同一份 BOM 內就是重新排序或換上層;搬到別份時,列連同子項目與它們的**檔案附件**一起換過去,原本那一份同層的順序遞補。目標不能是被搬的列自己,或它底下的列。
  - **複製**:連同子項目複製一份放到目標,**不帶檔案附件**(檔案留在原本那一列)。可以複製到別的階段(例如把 EVT 的一個子集複製到 DVT)、別的產品,也可以複製在同一份裡。

- **刪除**:先列出要刪的列名稱與連同子項目一共幾列,確認後連同子項目與它們的檔案附件(含磁碟上的檔案)一起刪除,**無法復原**。
- 這些動作**不能用「上一步」還原**(BOM 沒有上一步),每一個動作都會在稽核紀錄留一筆。一列因此變成子集(單價不再算)或回到零件時,會跳出提醒,跟 BOM LEVEL 一樣。

BOM 的欄位設定:自訂欄位、必填、預設值【可以編輯這個看板 BOM 的人:管理者、專案建立者、分組的 Team Leader】

BOM 表格上方的「**欄位設定**」。想多記一個資訊(驗證狀態、採購負責人、規格書連結、採購量......)就加一個欄位,像工作項的欄位一樣:

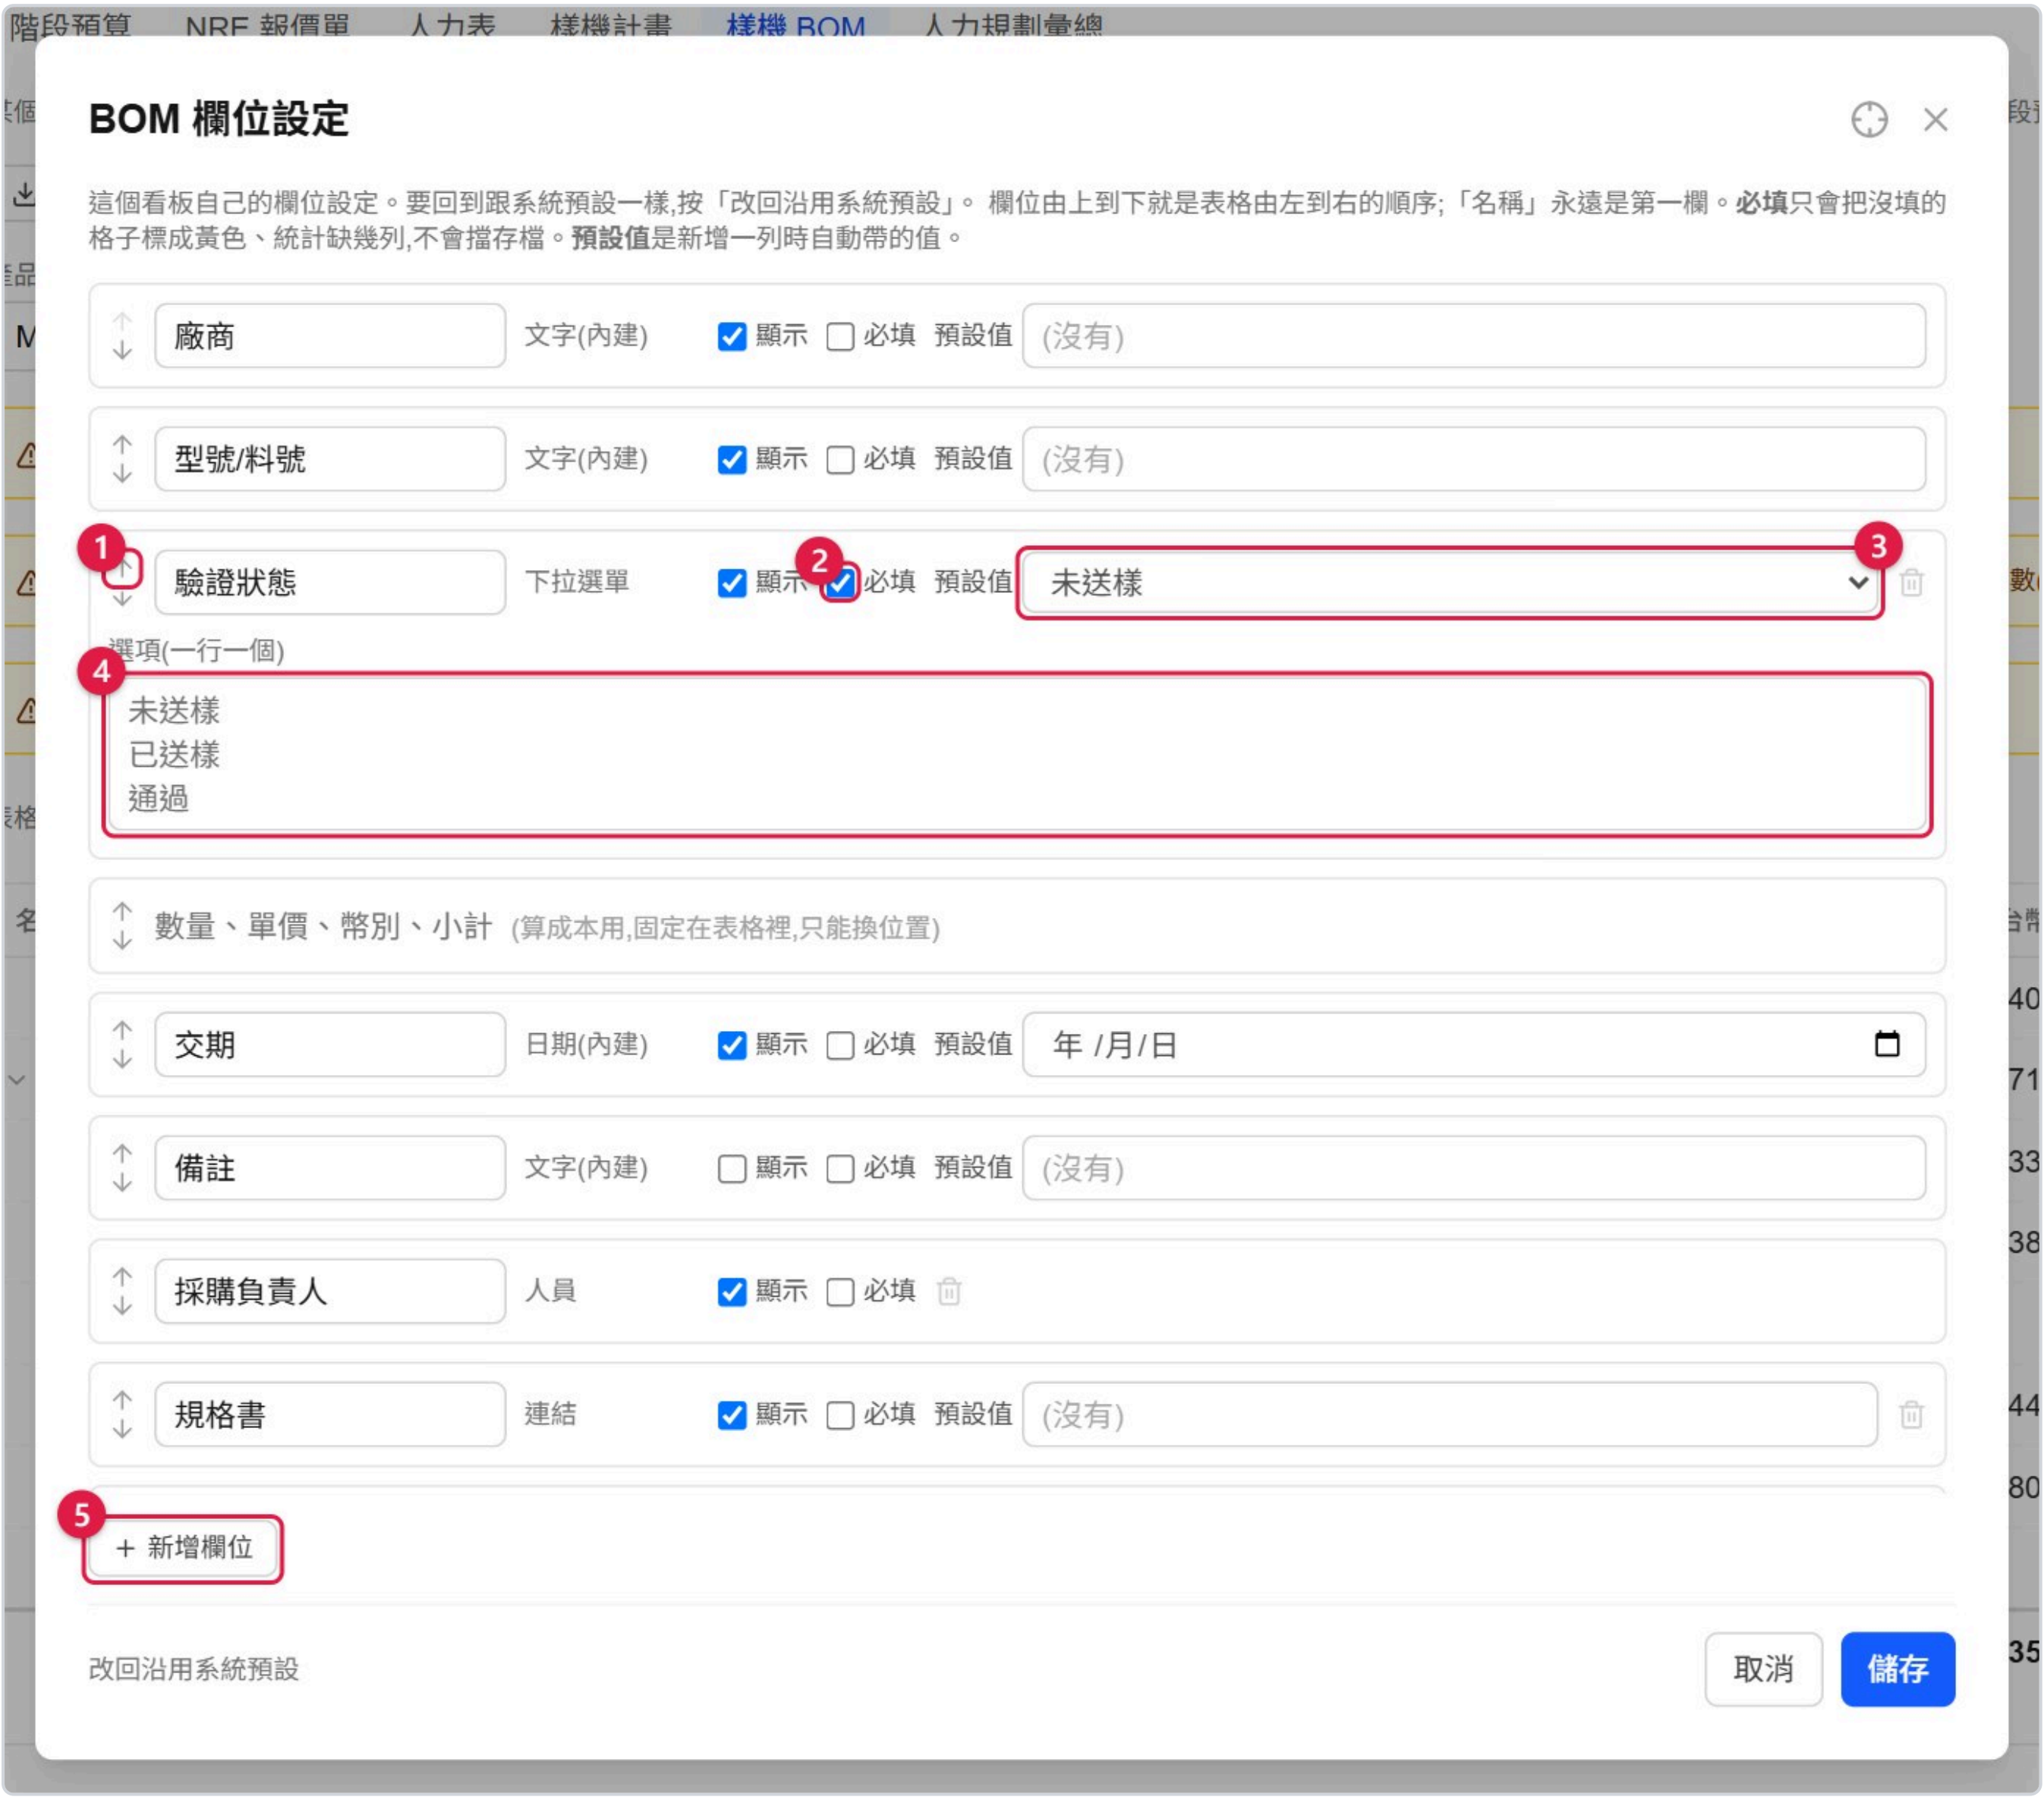

BOM 欄位設定

這個看板自己的欄位設定。要回到跟系統預設一樣,按「改回沿用系統預設」。 欄位由上到下就是表格由左到右的順序;「名稱」永遠是第一欄。**必填**只會把沒填的格子標成黃色、統計缺幾列,不會擋存檔。**預設值**是新增一列時自動帶的值。

廠商 文字(內建) ☑ 顯示 ☐ 必填 預設值 (沒有)

型號/料號 文字(內建) ☑ 顯示 ☐ 必填 預設值 (沒有)

驗證狀態 下拉選單 ☑ 顯示 ☑ 必填 預設值 未送樣

選項(一行一個)

未送樣
已送樣
通過

數量、單價、幣別、小計 (算成本用,固定在表格裡,只能換位置)

交期 日期(內建) ☑ 顯示 ☐ 必填 預設值 年 /月/日

備註 文字(內建) ☐ 顯示 ☐ 必填 預設值 (沒有)

採購負責人 人員 ☑ 顯示 ☐ 必填

規格書 連結 ☑ 顯示 ☐ 必填 預設值 (沒有)

BOM 一列固定有**名稱**與**金額那一塊**(數量、單價、幣別、匯率、小計)——算成本用,不能改;其餘都能設定:

- **自訂欄位**:按「**新增欄位**」,取名、選類型——**文字、數字、日期、下拉選單**(選項一行一個)、**人員**(從使用者挑)、**勾選**、**連結**(旁邊會出現可以點的圖示)、**檔案附件**(見下)。最多 30 個欄位,名稱不能重複,也不能跟表格固定的「名稱、數量、單價、幣別、匯率、小計」重名。

- **檔案附件**:每一列、每個「檔案附件」欄位可以掛規格書、報價單、承認書這類檔案。格子上按「**上傳**」(迴紋針),可以一次選好幾個;**點檔名**開啟——PDF、圖片、純文字直接在瀏覽器裡開,其他(Office 檔、壓縮檔、SVG...)一律下載;檔名旁的 × 刪除(要確認)。每一格最多 20 個檔案、每個最多 50 MB。**那一列要先存過**(空白列先打名稱存起來)才有地方掛檔案;檔案附件沒有預設值。設成**必填**的話,沒有檔案的列會標黃。誰可以做:能編輯這個看板 BOM 的人可以上傳與刪除;**能看到預算金額的人才能下載**(BOM 有單價與報價,看不到預算金額的人不行,跟 BOM 表格本身同一條規則)。
- **內建欄位**(廠商、型號/料號、交期、備註):可以**改名、隱藏、換順序、設預設值與必填**,不能刪、類型固定(Excel 匯入匯出、成本頁都靠它們)。
- **順序**:欄位由上到下就是表格由左到右。「數量、單價、幣別、小計」那一塊也在清單裡,可以跟別的欄位換位置;出廠的順序是 廠商、型號/料號、金額、交期、備註(交期現在排在小計後面)。「名稱」永遠是第一欄。
- **必填**:欄位名稱旁標 *。沒填的格子標成黃色,表格上方統計「有 N 列還有必填欄位沒填」。**不會擋存檔**——BOM 常常整張從 Excel 貼上,擋了反而貼不進來。補齊之後標記就消失。
- **預設值**:**新增一列時自動帶**(最下面的空白列一開始就是預設值)。人員欄位沒有預設值。
- **顯示 / 刪除**:取消勾選「顯示」只是不顯示,值還在;**刪除**(只有自訂欄位能刪)會連同每一列填的值一併刪掉,要先確認。已經存過的欄位不能換類型。
- **系統預設 + 各看板調整**:管理者在「系統設定」的「**BOM 預設欄位**」設一份,**還沒有自己設定的看板都沿用它**(這裡改了,它們立刻跟著變);看板在自己的「欄位設定」改過,就是這個看板自己的,之後系統預設再改也不動它。看板的欄位設定視窗左下的「**改回沿用系統預設**」可以回去(看板自己加的、預設裡沒有的自訂欄位,值會一併清掉)。

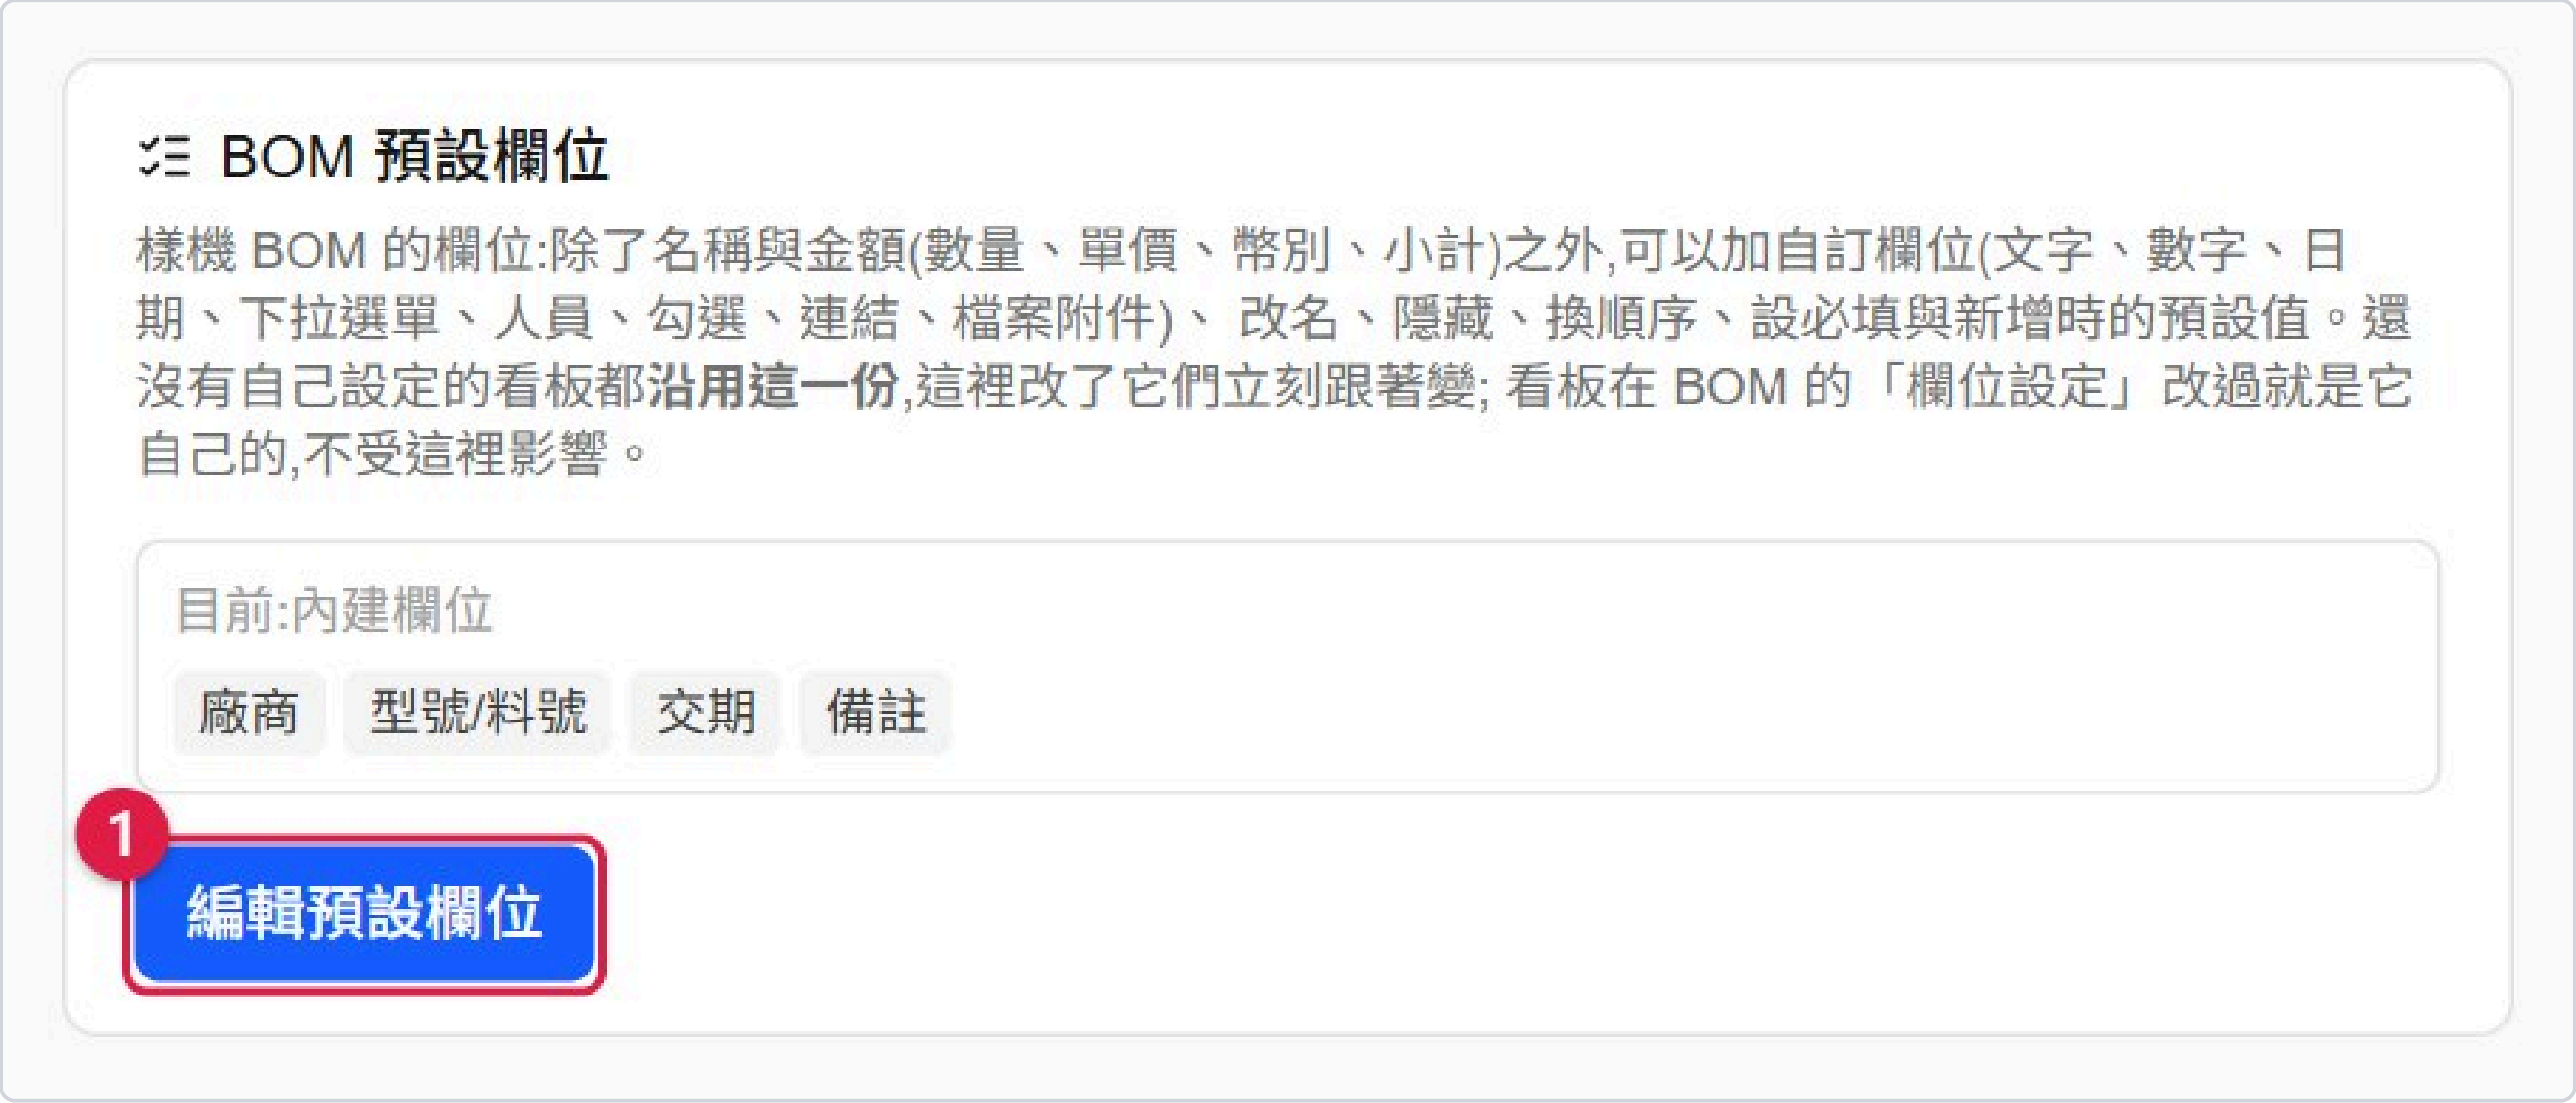

BOM 預設欄位

樣機 BOM 的欄位:除了名稱與金額(數量、單價、幣別、小計)之外,可以加自訂欄位(文字、數字、日期、下拉選單、人員、勾選、連結、檔案附件)、 改名、隱藏、換順序、設必填與新增時的預設值。還沒有自己設定的看板都**沿用這一份**,這裡改了它們立刻跟著變; 看板在 BOM 的「欄位設定」改過就是它自己的,不受這裡影響。

目前:內建欄位

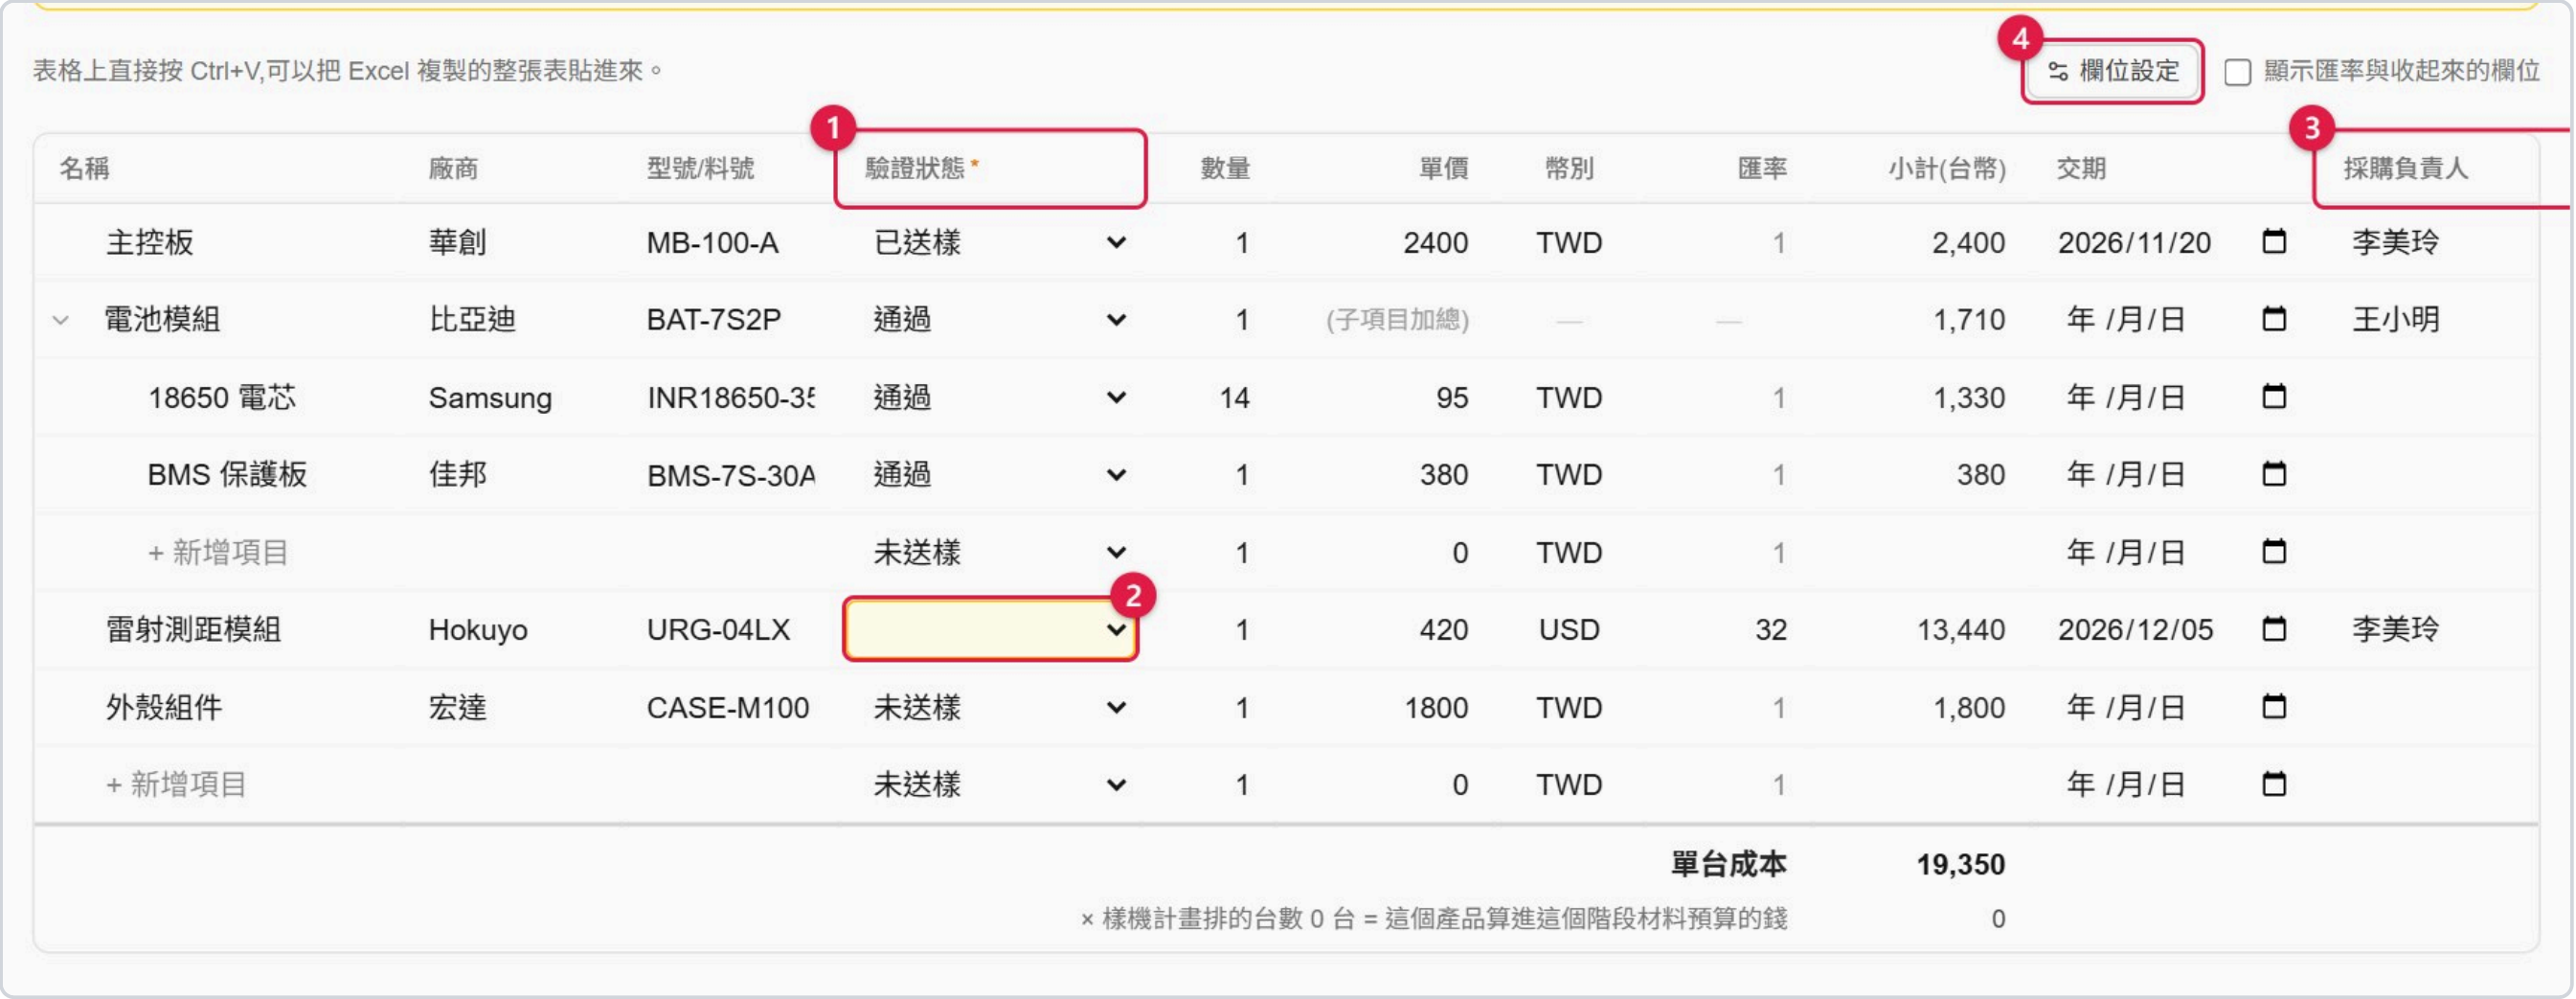

表格上直接按 Ctrl+V,可以把 Excel 複製的整張表貼進來。

☐ 顯示匯率與收起來的欄位

名稱	廠商	型號/料號	驗證狀態 *	數量	單價	幣別	匯率	小計(台幣)	交期	採購負責人
主控板	華創	MB-100-A	已送樣	1	2400	TWD	1	2,400	2026/11/20	李美玲
電池模組	比亞迪	BAT-7S2P	通過	1	(子項目加總)	—	—	1,710	年 /月/日	王小明
18650 電芯	Samsung	INR18650-35	通過	14	95	TWD	1	1,330	年 /月/日	
BMS 保護板	佳邦	BMS-7S-30A	通過	1	380	TWD	1	380	年 /月/日	
+ 新增項目			未送樣	1	0	TWD	1		年 /月/日	
雷射測距模組	Hokuyo	URG-04LX		1	420	USD	32	13,440	2026/12/05	李美玲
外殼組件	宏達	CASE-M100	未送樣	1	1800	TWD	1	1,800	年 /月/日	
+ 新增項目			未送樣	1	0	TWD	1		年 /月/日	
							單台成本	**19,350**		
							× 樣機計畫排的台數 0 台 = 這個產品算進這個階段材料預算的錢	0		

- **匯出 / 匯入 Excel**:固定的 12 欄後面接自訂欄位(第 13 欄起,標題就是欄位名稱,照看板設定的順序);人員寫姓名、勾選寫「是」;**檔案附件**欄位只列檔名(唯讀,檔案要在系統上傳 / 下載,Excel 帶不進來)。**匯入靠標題對欄位**:標題對不上的欄略過並說明;Excel 裡沒有的自訂欄位帶預設值。以前匯出的舊檔(只有固定 12 欄)照樣匯得進來。
- **匯入 Excel 時的檔案附件**:匯入是整個區塊換掉,但**名稱與型號/料號都沒改的列,它的檔案附件會跟著走**;改了名稱或型號、或這一列從 Excel 裡刪掉,它的檔案就對不上,匯入後會**移除並說明**——要改名,先在系統裡改,不要靠匯入。
- **複製 BOM** 到別的階段:自訂欄位的值一起帶過去;**檔案附件不會複製**(檔案留在原本那一列)。
- **刪除**:刪掉 BOM 的一列(連同子項目)、刪掉產品、刪掉「檔案附件」欄位,它們的檔案一併刪除(連磁碟上的檔案),無法復原。
- 看板沒有設定過時,表格跟以前一樣(廠商、型號/料號、數量...小計;交期、備註有資料時才顯示)。

比較兩份 BOM:EVT 到 DVT 增減了什麼【能看到預算金額的人都能用,唯讀,不會動到任何 BOM】

BOM 表格上方的「**比較 BOM**」。要有兩份以上的 BOM(不同階段,或不同產品)才能按。

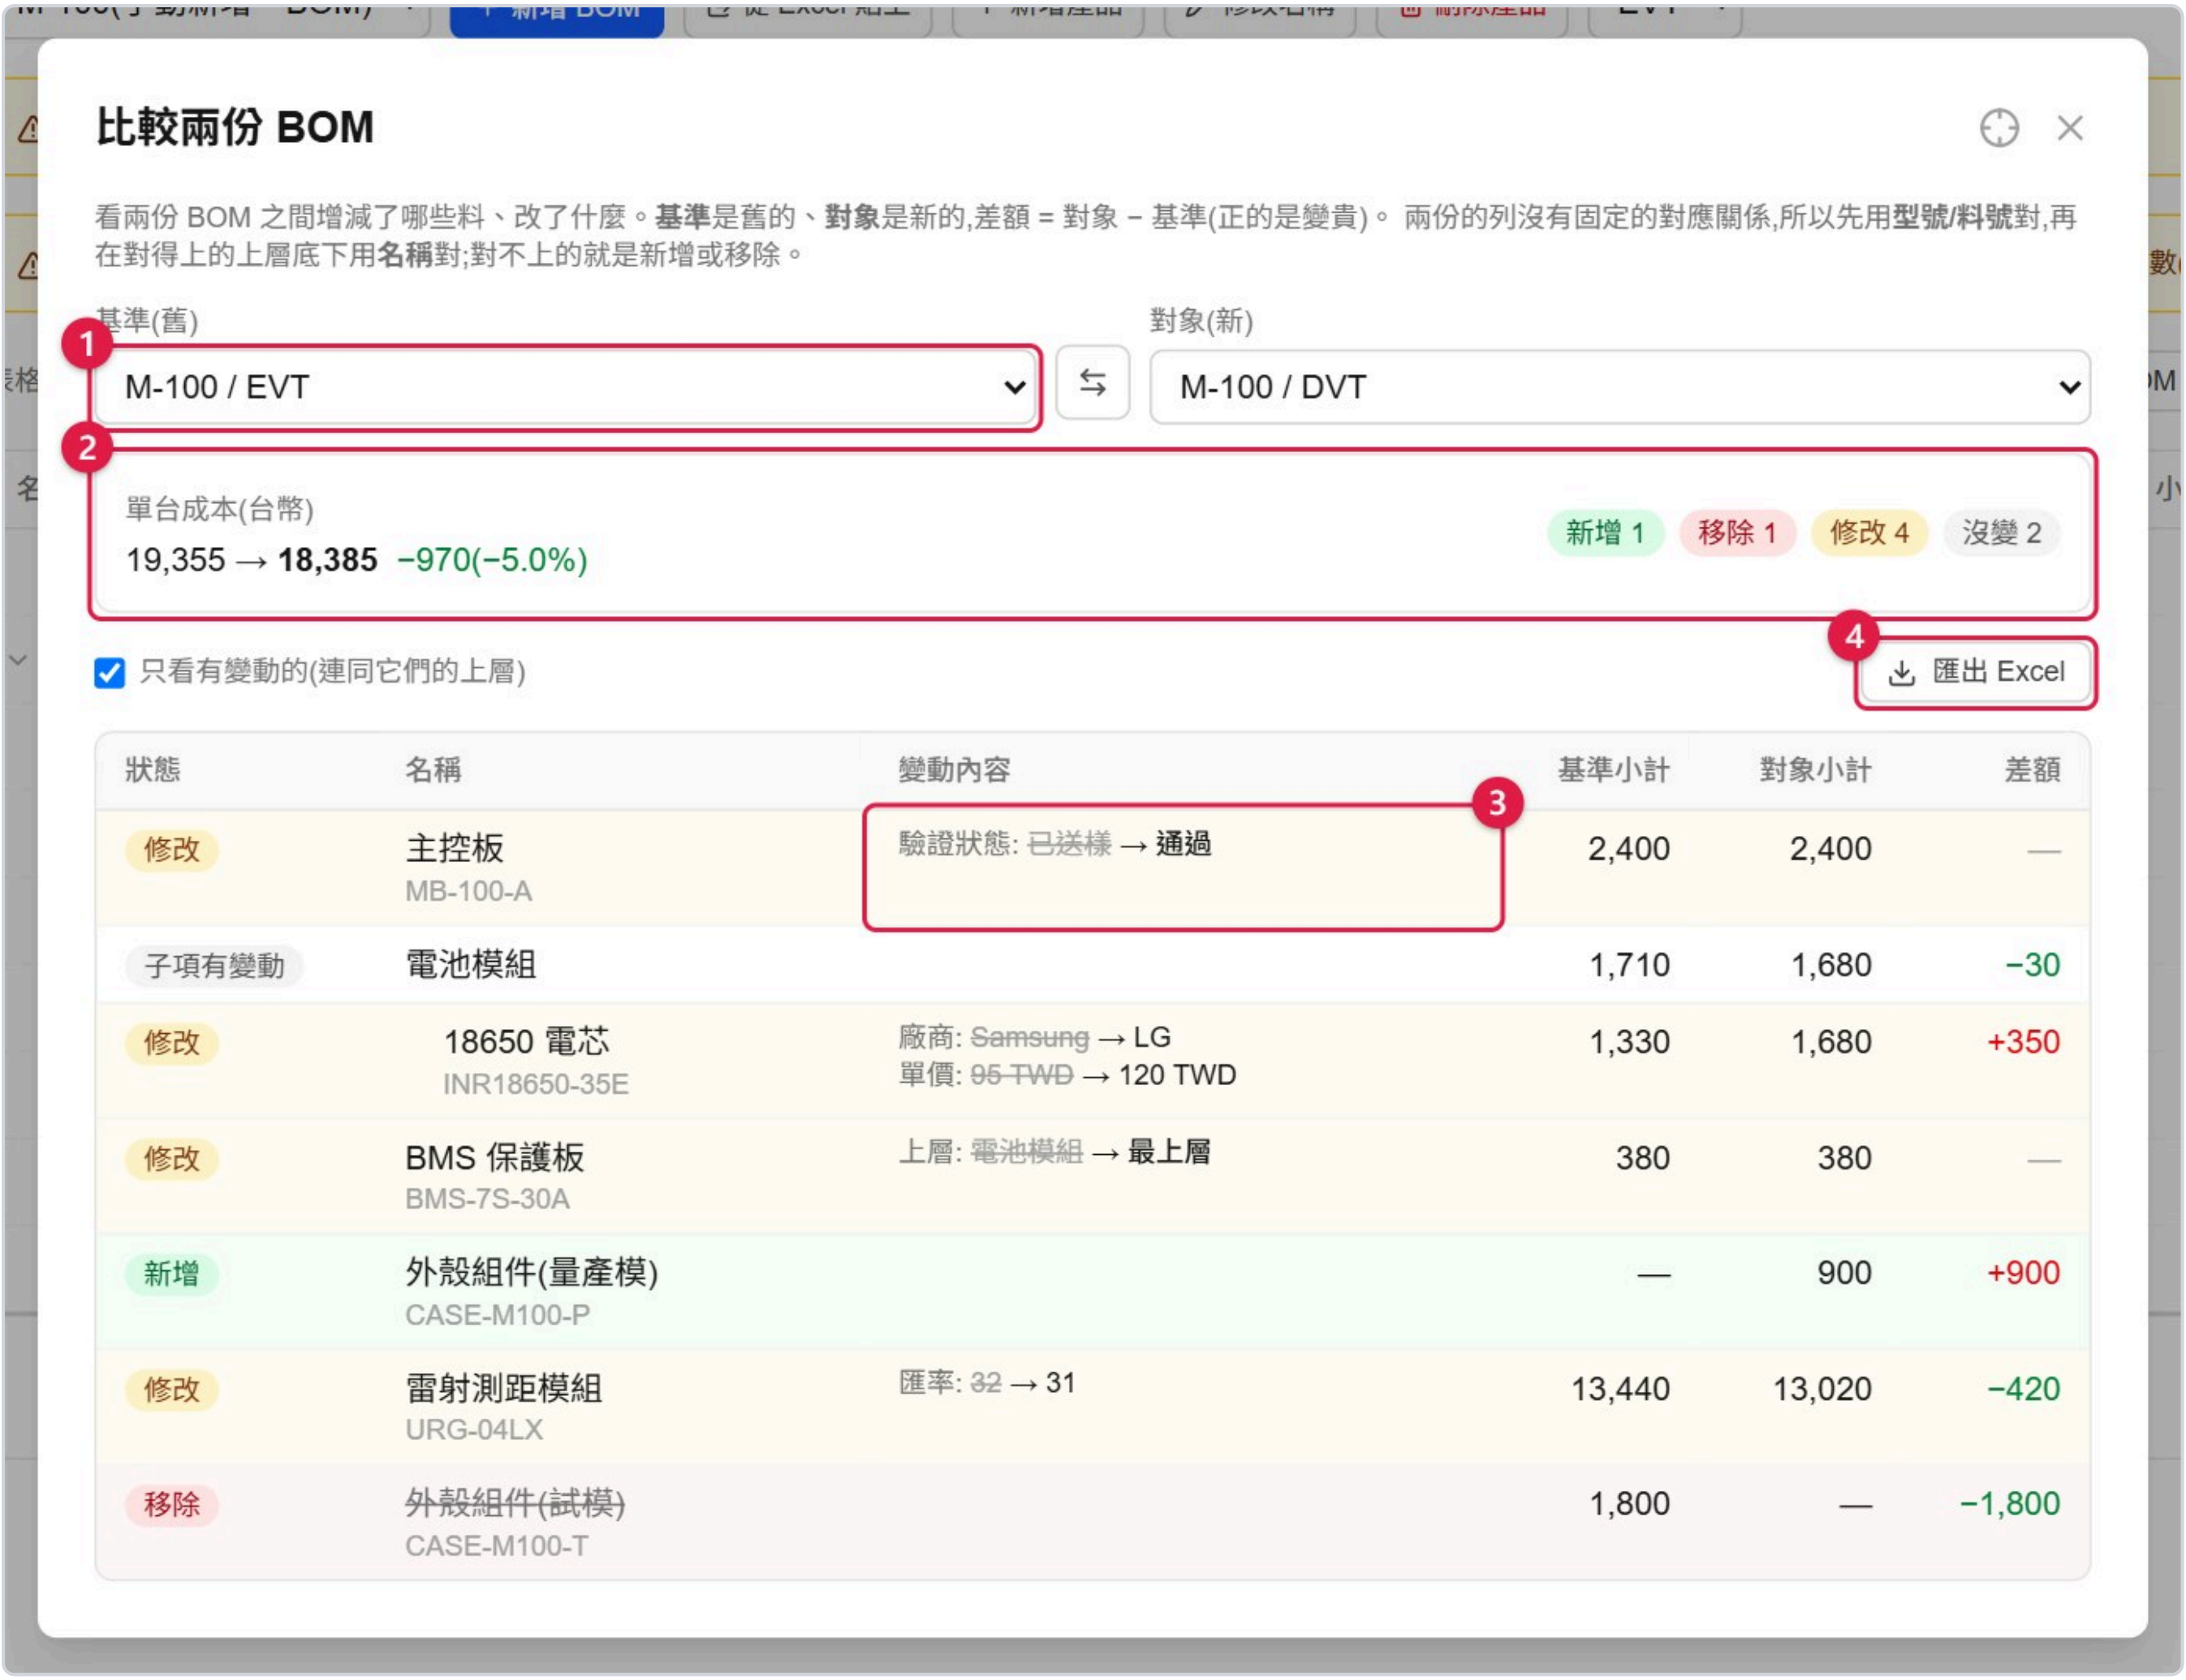

比較兩份 BOM

看兩份 BOM 之間增減了哪些料、改了什麼。**基準**是舊的、**對象**是新的,差額 = 對象 − 基準(正的是變貴)。 兩份的列沒有固定的對應關係,所以先用**型號/料號**對,再在對得上的上層底下用**名稱**對;對不上的就是新增或移除。

① 基準(舊): M-100 / EVT ⇆ 對象(新): M-100 / DVT

② 單台成本(台幣)
19,355 → **18,385** −970(−5.0%)

新增 1 移除 1 修改 4 沒變 2

☑ 只看有變動的(連同它們的上層)

④ 匯出 Excel

狀態	名稱	變動內容	基準小計	對象小計	差額
修改	主控板 MB-100-A	③ 驗證狀態: ~~已送樣~~ → **通過**	2,400	2,400	—
子項有變動	電池模組		1,710	1,680	−30
修改	18650 電芯 INR18650-35E	廠商: ~~Samsung~~ → LG 單價: ~~95 TWD~~ → 120 TWD	1,330	1,680	+350
修改	BMS 保護板 BMS-7S-30A	上層: ~~電池模組~~ → **最上層**	380	380	—
新增	外殼組件(量產模) CASE-M100-P		—	900	+900
修改	雷射測距模組 URG-04LX	匯率: ~~32~~ → 31	13,440	13,020	−420
移除	~~外殼組件(試模)~~ CASE-M100-T		1,800	—	−1,800

- **選兩份**:**基準**是舊的、**對象**是新的,差額 = 對象 − 基準(正的是變貴,紅色)。打開時預設是表格上目前那份,跟同一個產品相鄰的階段比——前面有 BOM 的階段當基準,沒有就往後找;中間的「⇄」把兩邊對調。
- **怎麼知道哪一列對哪一列**:BOM 的列複製到下一個階段之後就是新的一列,系統沒有記「從哪一列來」,所以靠內容對:① 先用**型號/料號**對(同一顆料搬到別的子集底下也認得,算「上層」變了);② 剩下的在對得上的上層底下用**名稱**對(**換料**:名稱一樣、料號變了,算同一列、改了型號/料號);③ 都對不上的,只在基準裡 = **移除**、只在對象裡 = **新增**。大小寫與多餘的空白不影響。**沒填型號/料號、又改了名稱的列對不上**,會變成「移除一列 + 新增一列」,看到這種情形請自己對一下;料號填得完整,比對最準。
- **看到什麼**:上面是**單台成本**(基準 → 對象、差額與百分比)與四個數字:新增、移除、修改、沒變。下面一列一列:**狀態**(新增綠、移除紅、修改黃)、名稱(縮排跟 BOM 一樣)、**變動內容**(「單價:95 TWD → 120 TWD」這種一項一行)、兩邊的小計與差額。子集自己沒改、但底下有變動,標「**子項有變動**」,它的小計變了就是底下的結果。
- **比哪些欄位**:名稱、廠商、型號/料號、數量、單價(含幣別)、匯率、交期、備註、自訂欄位(人員寫姓名)、**上層**(搬到別的子集)、**類型**(零件 ↔ 子集)。欄位設定裡**隱藏的欄位不比**,檔案附件不比;子集自己的單價是底下加起來的,也不比。
- **只看有變動的**:預設勾選,只列有變動的列與它們的上層;取消勾選就是整張表。
- **匯出 Excel**:一張「BOM 差異」表,最上面是摘要(基準、對象、單台成本、變動數),下面是有變動的列(新增綠、移除紅、修改黃),金額都是台幣。**這是給人看的報表,不是匯入用的檔案**;要匯入請用上面的「匯出 / 匯入 Excel」。
- **權限**:跟 BOM 同一條規則——比出來的是單價與小計,看不到預算金額的人看不到。

樣機 BOM 的產品:「樣機 BOM」分頁的「產品」欄旁有「**新增產品**」「**修改名稱**」與「**刪除產品**」。

- 新增產品:輸入名稱就建好並切過去,**不必先填一列 BOM**——先建好產品,再慢慢填各階段的 BOM 與樣機計畫。名稱已經存在不能重複新增。
- 修改名稱:按「修改名稱」,輸入新名字,這個看板上用到舊名字的地方(各階段的 BOM、樣機計畫的各列、單獨建立的產品)**一起換成新名字**,BOM 與台數都不動、材料預算也不受影響,畫面自動切到新名字。新名字不能跟看板上現有的任何產品重名——不會自動合併(兩個產品併成一個會把它們各階段的 BOM 混在一起);真的要合併,請自己刪掉一個、把料填到另一個。改名會記進稽核軌跡。
- 刪除產品:會先列出它**一併會刪掉什麼**(在幾個階段的幾筆 BOM〔含子項目〕與幾列樣機計畫),確認後才刪,**無法復原**;受影響階段由 BOM 算出的材料預算會重算,其他產品不受影響。
- 「產品」欄是**下拉選單**,列出這個看板所有的產品;名字後面的括號寫它**出現在哪裡**:「手動新增」(按「新增產品」建的)、「樣機計畫」(樣機計畫裡排過的)、「BOM」(填過 BOM 的)。產品清單是這三處名字的聯集。
- 看到兩個很像的名字(例如「EVT1(BOM)」與「P100_EVT1(樣機計畫)」),通常是樣機計畫與 BOM 各自打了不同的名字——它們會被當成兩個產品,材料預算算不出來。「修改名稱」不能改成已經存在的名字(不自動合併),所以要統一的話:留一個名字,另一個產品先刪掉(連同它的 BOM 或樣機計畫台數),再到對應的分頁用留下的名字重新填。
- 要新增產品用「新增產品」或「新增 BOM」;選單裡只能選現有的,不能直接打字。

NRE 報價單:NRE(Non-Recurring Engineering)是新產品量產前,設計、開發、驗證、導入生產所產生的一次性費用,跟之後的產品單價分開計費。報價單按「預算階段」(POC、EVT、DVT......)各填一份,分五大項:

類別	放什麼
研發人力工時	**外部單位 / 外部人員**投入的設計工時(電路、機構、韌體、軟體):填外部單位或人員、**工時(小時)與時薪**,金額自動相乘
委託開發	委託外部單位開發的項目(委外設計、委託開發軟體或模組):填**委託單位**、**委託項目**、**時間範圍**(開始日、結束日),以及**範圍**——是哪一個階段,或**涵蓋整個專案**
模具與治具	外殼鋼模、生產組裝治具、電測夾具(通常佔 NRE 最大一塊)
打樣與樣品	PCB 打樣、3D 列印、CNC 外觀樣品、小批量試產
驗證與認證	環境與壽命測試、法規認證(CE、FCC、BSMI)的實驗室費用與規費

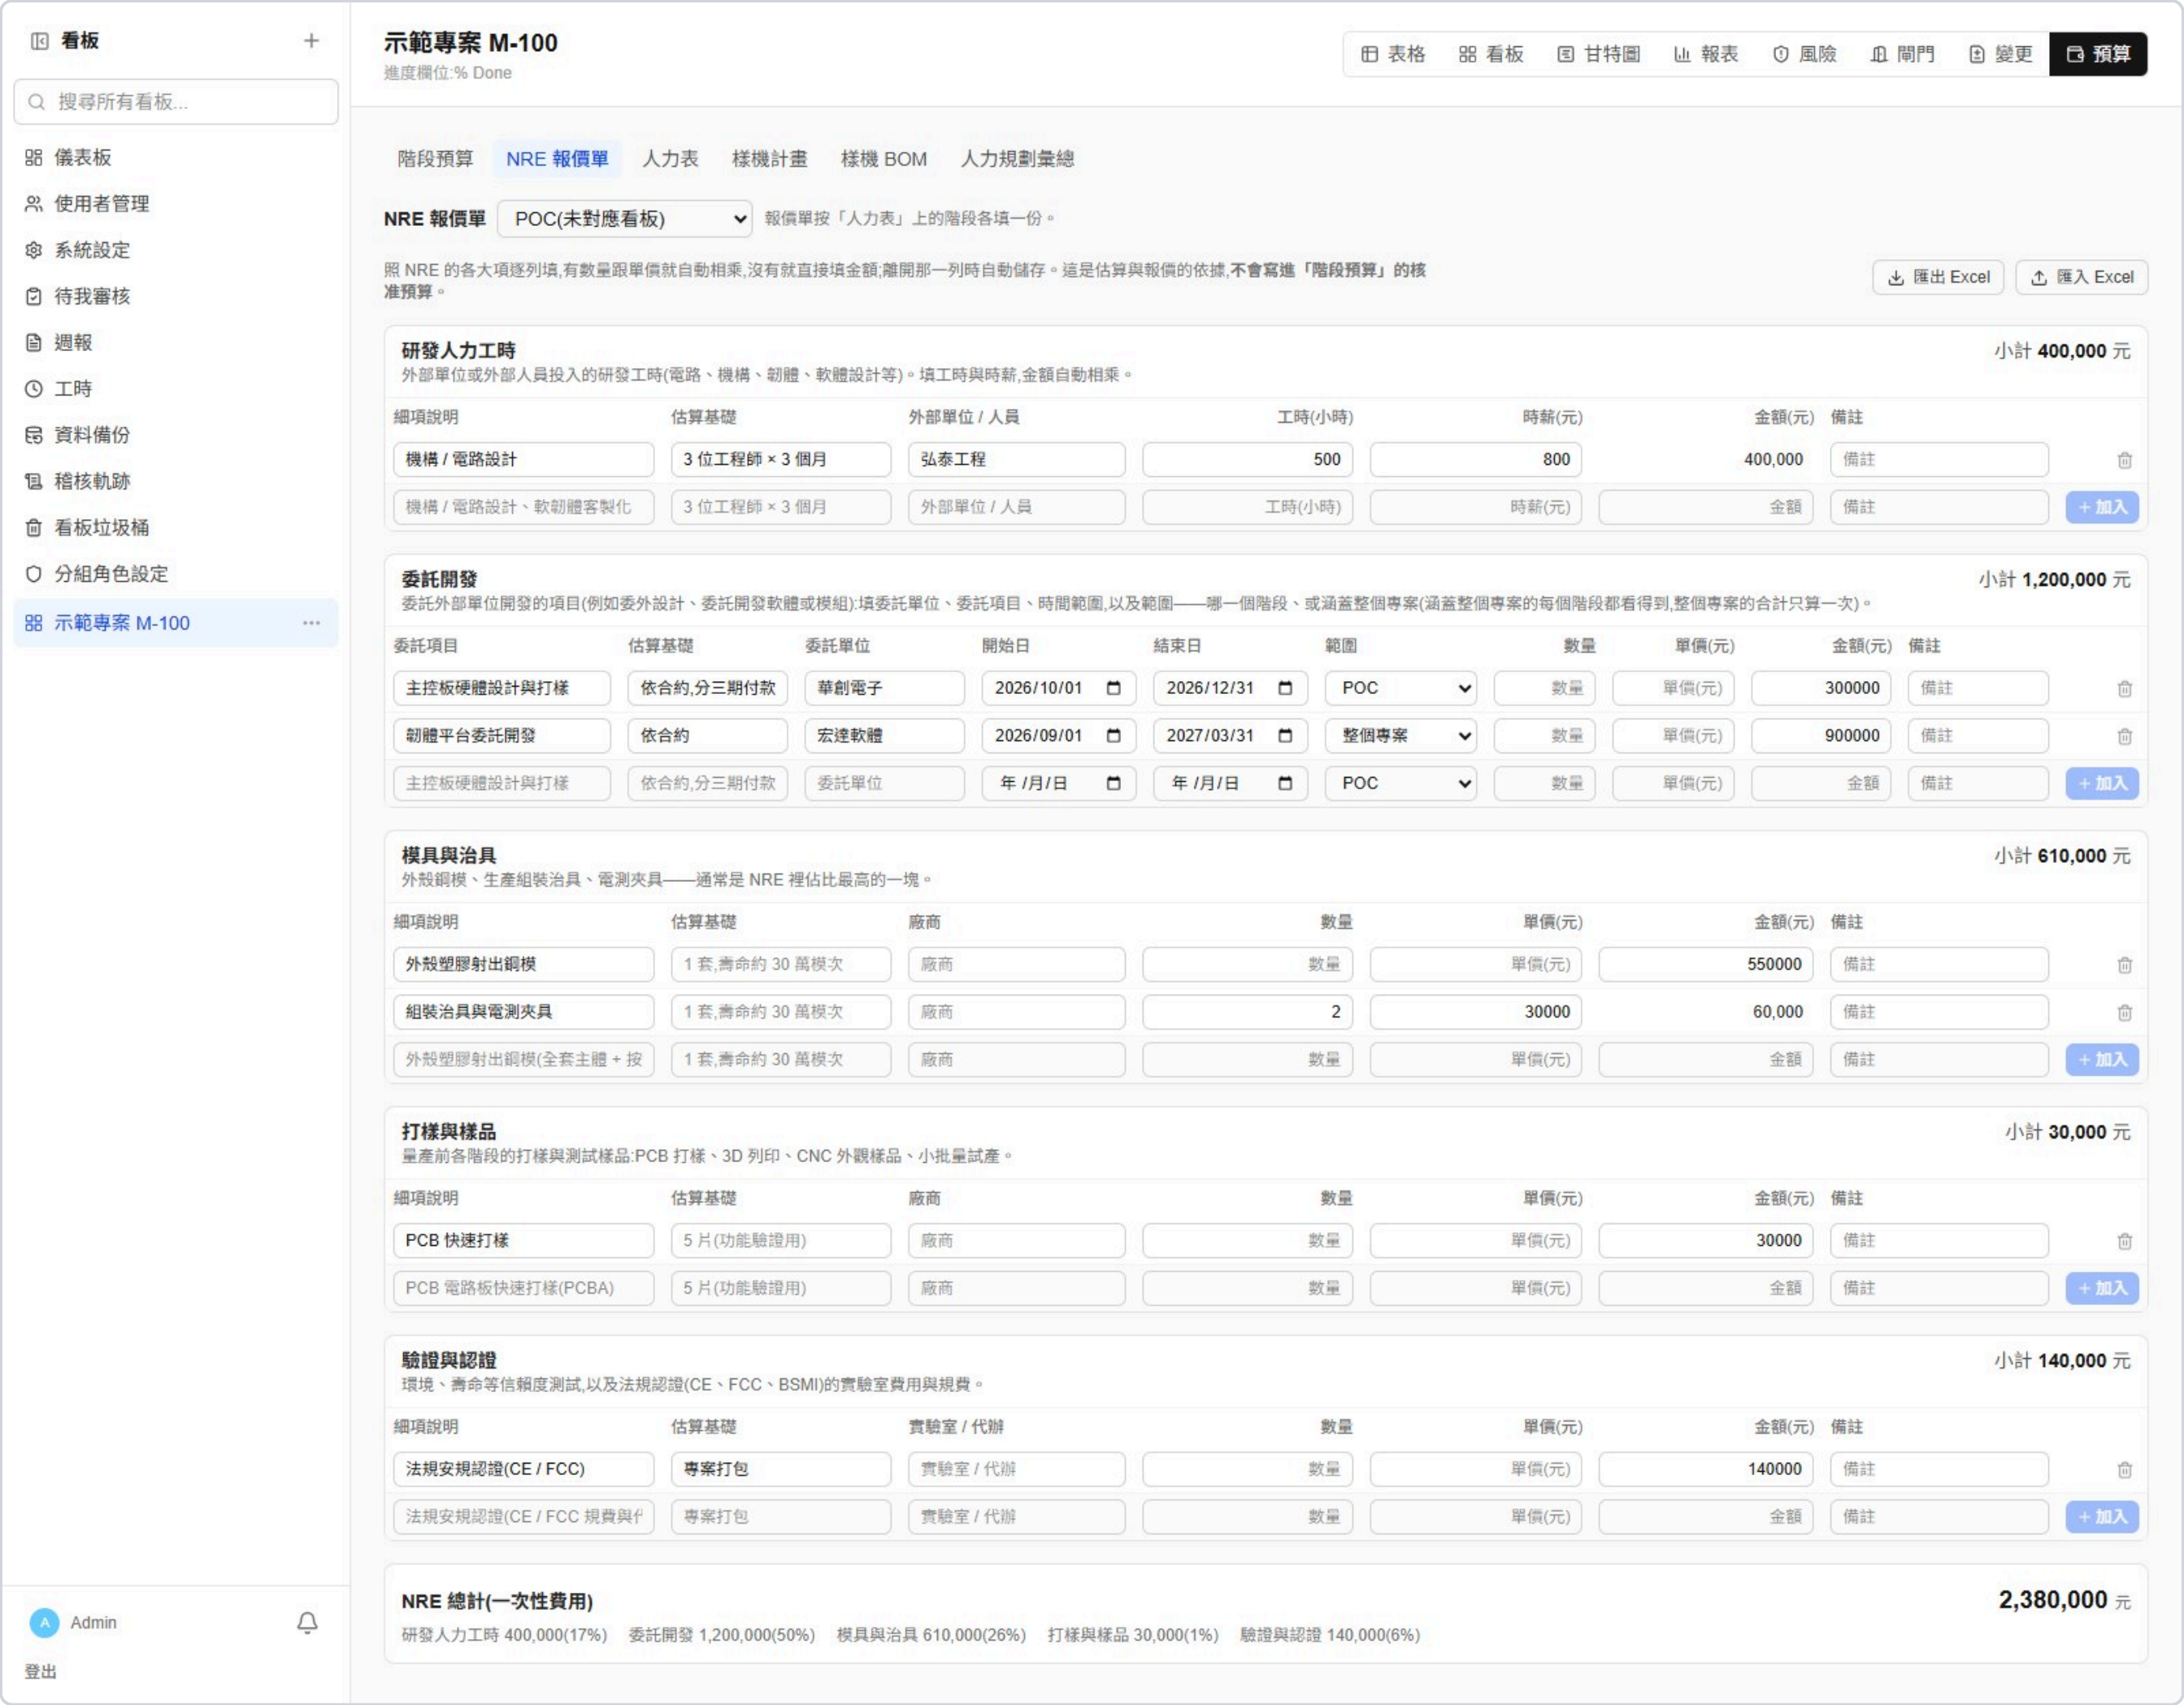

示範專案 M-100

進度欄位:% Done

NRE 報價單 POC(未對應看板) 報價單按「人力表」上的階段各填一份。

照 NRE 的各大項逐列填,有數量跟單價就自動相乘,沒有就直接填金額;離開那一列時自動儲存。這是估算與報價的依據,**不會寫進「階段預算」的核准預算**。

研發人力工時 小計 **400,000** 元

外部單位或外部人員投入的研發工時(電路、機構、韌體、軟體設計等)。填工時與時薪,金額自動相乘。

細項說明	估算基礎	外部單位 / 人員	工時(小時)	時薪(元)	金額(元)	備註
機構 / 電路設計	3 位工程師 × 3 個月	弘泰工程	500	800	400,000	備註
機構 / 電路設計、軟韌體客製化	3 位工程師 × 3 個月	外部單位 / 人員	工時(小時)	時薪(元)	金額	備註

委託開發 小計 **1,200,000** 元

委託外部單位開發的項目(例如委外設計、委託開發軟體或模組):填委託單位、委託項目、時間範圍,以及範圍——哪一個階段、或涵蓋整個專案(涵蓋整個專案的每個階段都看得到,整個專案的合計只算一次)。

委託項目	估算基礎	委託單位	開始日	結束日	範圍	數量	單價(元)	金額(元)	備註
主控板硬體設計與打樣	依合約,分三期付款	華創電子	2026/10/01	2026/12/31	POC	數量	單價(元)	300000	備註
韌體平台委託開發	依合約	宏達軟體	2026/09/01	2027/03/31	整個專案	數量	單價(元)	900000	備註
主控板硬體設計與打樣	依合約,分三期付款	委託單位	年 /月/日	年 /月/日	POC	數量	單價(元)	金額	備註

模具與治具 小計 **610,000** 元

外殼鋼模、生產組裝治具、電測夾具——通常是 NRE 裡佔比最高的一塊。

細項說明	估算基礎	廠商	數量	單價(元)	金額(元)	備註
外殼塑膠射出鋼模	1 套,壽命約 30 萬模次	廠商	數量	單價(元)	550000	備註
組裝治具與電測夾具	1 套,壽命約 30 萬模次	廠商	2	30000	60,000	備註
外殼塑膠射出鋼模(全套主體 + 按	1 套,壽命約 30 萬模次	廠商	數量	單價(元)	金額	備註

打樣與樣品 小計 **30,000** 元

量產前各階段的打樣與測試樣品:PCB 打樣、3D 列印、CNC 外觀樣品、小批量試產。

細項說明	估算基礎	廠商	數量	單價(元)	金額(元)	備註
PCB 快速打樣	5 片(功能驗證用)	廠商	數量	單價(元)	30000	備註
PCB 電路板快速打樣(PCBA)	5 片(功能驗證用)	廠商	數量	單價(元)	金額	備註

驗證與認證 小計 **140,000** 元

環境、壽命等信賴度測試,以及法規認證(CE、FCC、BSMI)的實驗室費用與規費。

細項說明	估算基礎	實驗室 / 代辦	數量	單價(元)	金額(元)	備註
法規安規認證(CE / FCC)	專案打包	實驗室 / 代辦	數量	單價(元)	140000	備註
法規安規認證(CE / FCC 規費與化	專案打包	實驗室 / 代辦	數量	單價(元)	金額	備註

NRE 總計(一次性費用) **2,380,000** 元

研發人力工時 400,000(17%) 委託開發 1,200,000(50%) 模具與治具 610,000(26%) 打樣與樣品 30,000(1%) 驗證與認證 140,000(6%)

- 每一列:**細項說明**(必填)、**估算基礎**(例如「3 位工程師 × 3 個月」)、外部單位 / 廠商、**數量**、**單價**、**金額**、備註。數量與單價都填了,金額就自動相乘(四捨五入到元);沒填的話直接填金額。
- 每一類最下面那一列空白列是新增:填好按「**加入**」(或在欄位裡按 Enter)。已經存在的列直接改,**離開那一列時自動儲存**;右邊的垃圾桶刪除(會先確認)。
- 每一類有小計,最下面是 **NRE 總計**與各類佔比。
- **委託開發的範圍**:每一列的「範圍」下拉可以選「整個專案」或這個看板的任一個階段(新增時預設是現在這個階段)。選「整個專案」的列(例如橫跨 EVT 到 DVT 的外包開發)**每個階段的報價單都看得到、也算進那個畫面的總計**,但在「整個專案」的合計裡只算一次;選了別的階段,存好之後那一列就屬於那個階段的報價單,畫面會告訴你存到哪裡。時間範圍的開始日和結束日要一起填(或都不填),結束日不能早於開始日。
- 這個分類在「階段預算」的各類別叫「委託開發」(原本叫「委外」)——名稱只是改了,原本記在這一類的預算、訂單與支出都不變。
- **匯出 Excel**:右上角「匯出 Excel」把這個階段的報價單存成 .xlsx(檔名「看板-階段-NRE報價單.xlsx」)。每一類一個區塊——表頭、逐列明細、小計,最後是 NRE 總計;有數量與單價的金額、各類小計與總計都是 Excel **公式**,在 Excel 裡改數量或單價,金額會跟著算。沒有項目的類別整塊省略;橫向 A4、寬度自動縮到一頁,可以直接列印或附在報價信裡。報價單還沒有任何項目時按鈕是停用的。看得到報價單的人都能匯出。
- **匯入 Excel**(只有能編預算的人看得到這顆按鈕):把「匯出 Excel」下載的檔案在 Excel 裡改好,再匯回來——一份一份對、也可以拿來一次補很多列。

    1. 按「匯入 Excel」選檔。**先不會寫入**,會跳出視窗列出「新增幾列、更新幾列、沒有變動幾列」與每一筆改了什麼(例如「金額 550,000 → 560,000」),按「匯入」才真的寫。
    2. 怎麼對:**同一類別、同一個範圍(階段或整個專案)、同一個細項說明**就是同一列——內容不一樣就更新那一列、Excel 才有的就新增(排在該類別最後)。所以在 Excel 裡改金額、備註、數量,匯回來是更新,不會多出一列;改了細項說明的字,就會當成新的一列。
    3. **不會刪列**:報價單裡有、但 Excel 沒提到的列維持原樣(視窗會告訴你有幾列)。要刪請在畫面上按垃圾桶。
    4. 數量與單價都有就以相乘為準(跟畫面一樣);只填金額就讀金額。
    5. 有問題的列(沒有細項說明、數量不是數字、字太長...)整列略過並說明是第幾列、什麼原因,其他列照常匯入;檔案不是 Excel、或找不到任何一類的區塊時整份不匯入。
    6. 版面照匯出的樣子:每一類一個區塊,區塊表頭那一列的第一格是類別名稱(研發人力工時 / 委託開發 / 模具與治具 / 打樣與樣品 / 驗證與認證),欄位照表頭的文字找;小計與總計那幾列會被忽略。委託開發的區塊多「開始日」「結束日」「範圍」三欄:日期寫 2026-10-08 或 Excel 的日期格式都可以;範圍寫這個階段的名字或「整個專案」(空白當作這個階段),寫成別的階段的列會略過並提醒(請到那個階段匯入)。匯出的檔案包含這個階段的列,加上涵蓋整個專案的委託開發。
- 這是**估算與報價的依據,不會自己改「階段預算」的核准預算**——要把報價帶進去,到「階段預算」的「各類別」按「帶入」(見下)。
- **階段預算會顯示 NRE 報價做對照**:報價單有金額的話,「階段預算」上方多一張「**NRE 報價(估算)**」卡片,「各類別」表多一欄「**NRE 報價**」,放在核准預算旁邊,方便對照「報價多少、核准多少」。報價的每一類對到預算的費用類別:研發人力工時 → 人力、委託開發 → 委託開發、模具與治具 → 模具與治具、打樣與樣品 → 材料(打樣與樣品)、驗證與認證 → 驗證與認證。單一階段看的是那個階段的報價單;「整個專案」看全部(含涵蓋整個專案的委託開發);單一階段下方會註明「另有涵蓋整個專案的委託開發 N 元」。報價本身不影響剩餘與用掉的計算。
- **把 NRE 報價帶入核准預算**(只有單一階段、而且能編預算的人):「各類別」表的「NRE 報價」欄,報價跟核准預算不同的那一格旁邊有「**帶入**」,按了會先列出「核准預算 800,000 → 610,000」確認,才把那一類的核准預算改成報價(備註寫「由 NRE 報價單帶入」,稽核軌跡留下改之前與改之後);表格上方的「**全部帶入核准預算**」一次帶入所有不同的類別。
    - **人力、材料不帶入**:這個階段的人力預算已由人力規劃表算出來、材料預算已由樣機 BOM 算出來時,那一格是算出來的,帶入會被下一次重算蓋掉,所以略過,報價仍留在「NRE 報價」欄對照(把滑鼠停在那一格會說明原因)。還沒有人力規劃、沒有 BOM 的階段,研發人力 → 人力、打樣與樣品 → 材料也可以帶入。
    - **報價是 0 的類別不會動**核准預算;已經跟報價一樣的不用帶。涵蓋整個專案的委託開發不屬於任何階段,不會帶進單一階段。
    - 帶入是**當下的一次動作**:之後報價單再改,核准預算不會自己跟著動——兩邊不同時,「帶入」會再出現。
- 報價單是金額,看得到的人跟預算一樣(見第 2 章「預算金額的可見範圍」);編輯的權限也跟預算一樣(管理者、看板擁有者、該看板任一分組的 Team Leader)。

重點:

- 實際花費記在對應到的那一列工作項底下;人力的「已花費」由**核准的工時**算出。
- 準備金不能直接花,要先**動支**撥進某個費用類別;動支時必須寫理由。專案總額不變,動支是搬錢不是生錢。

- 外幣支出與訂單會依輸入當下的匯率換算,事後改匯率不會動到已記的帳(匯率在系統設定)。
- 超支或預算將盡時,**儀表板**最上面會出現「預算警示」。
- **誰能編預算**:管理者、看板擁有者、或這個看板任一分組的 Team Leader;其他人唯讀。
- 整個專案群組的總預算在「專案群組」頁。

---

15. 看板的進階功能

側邊欄看板名稱右邊的「...」選單:

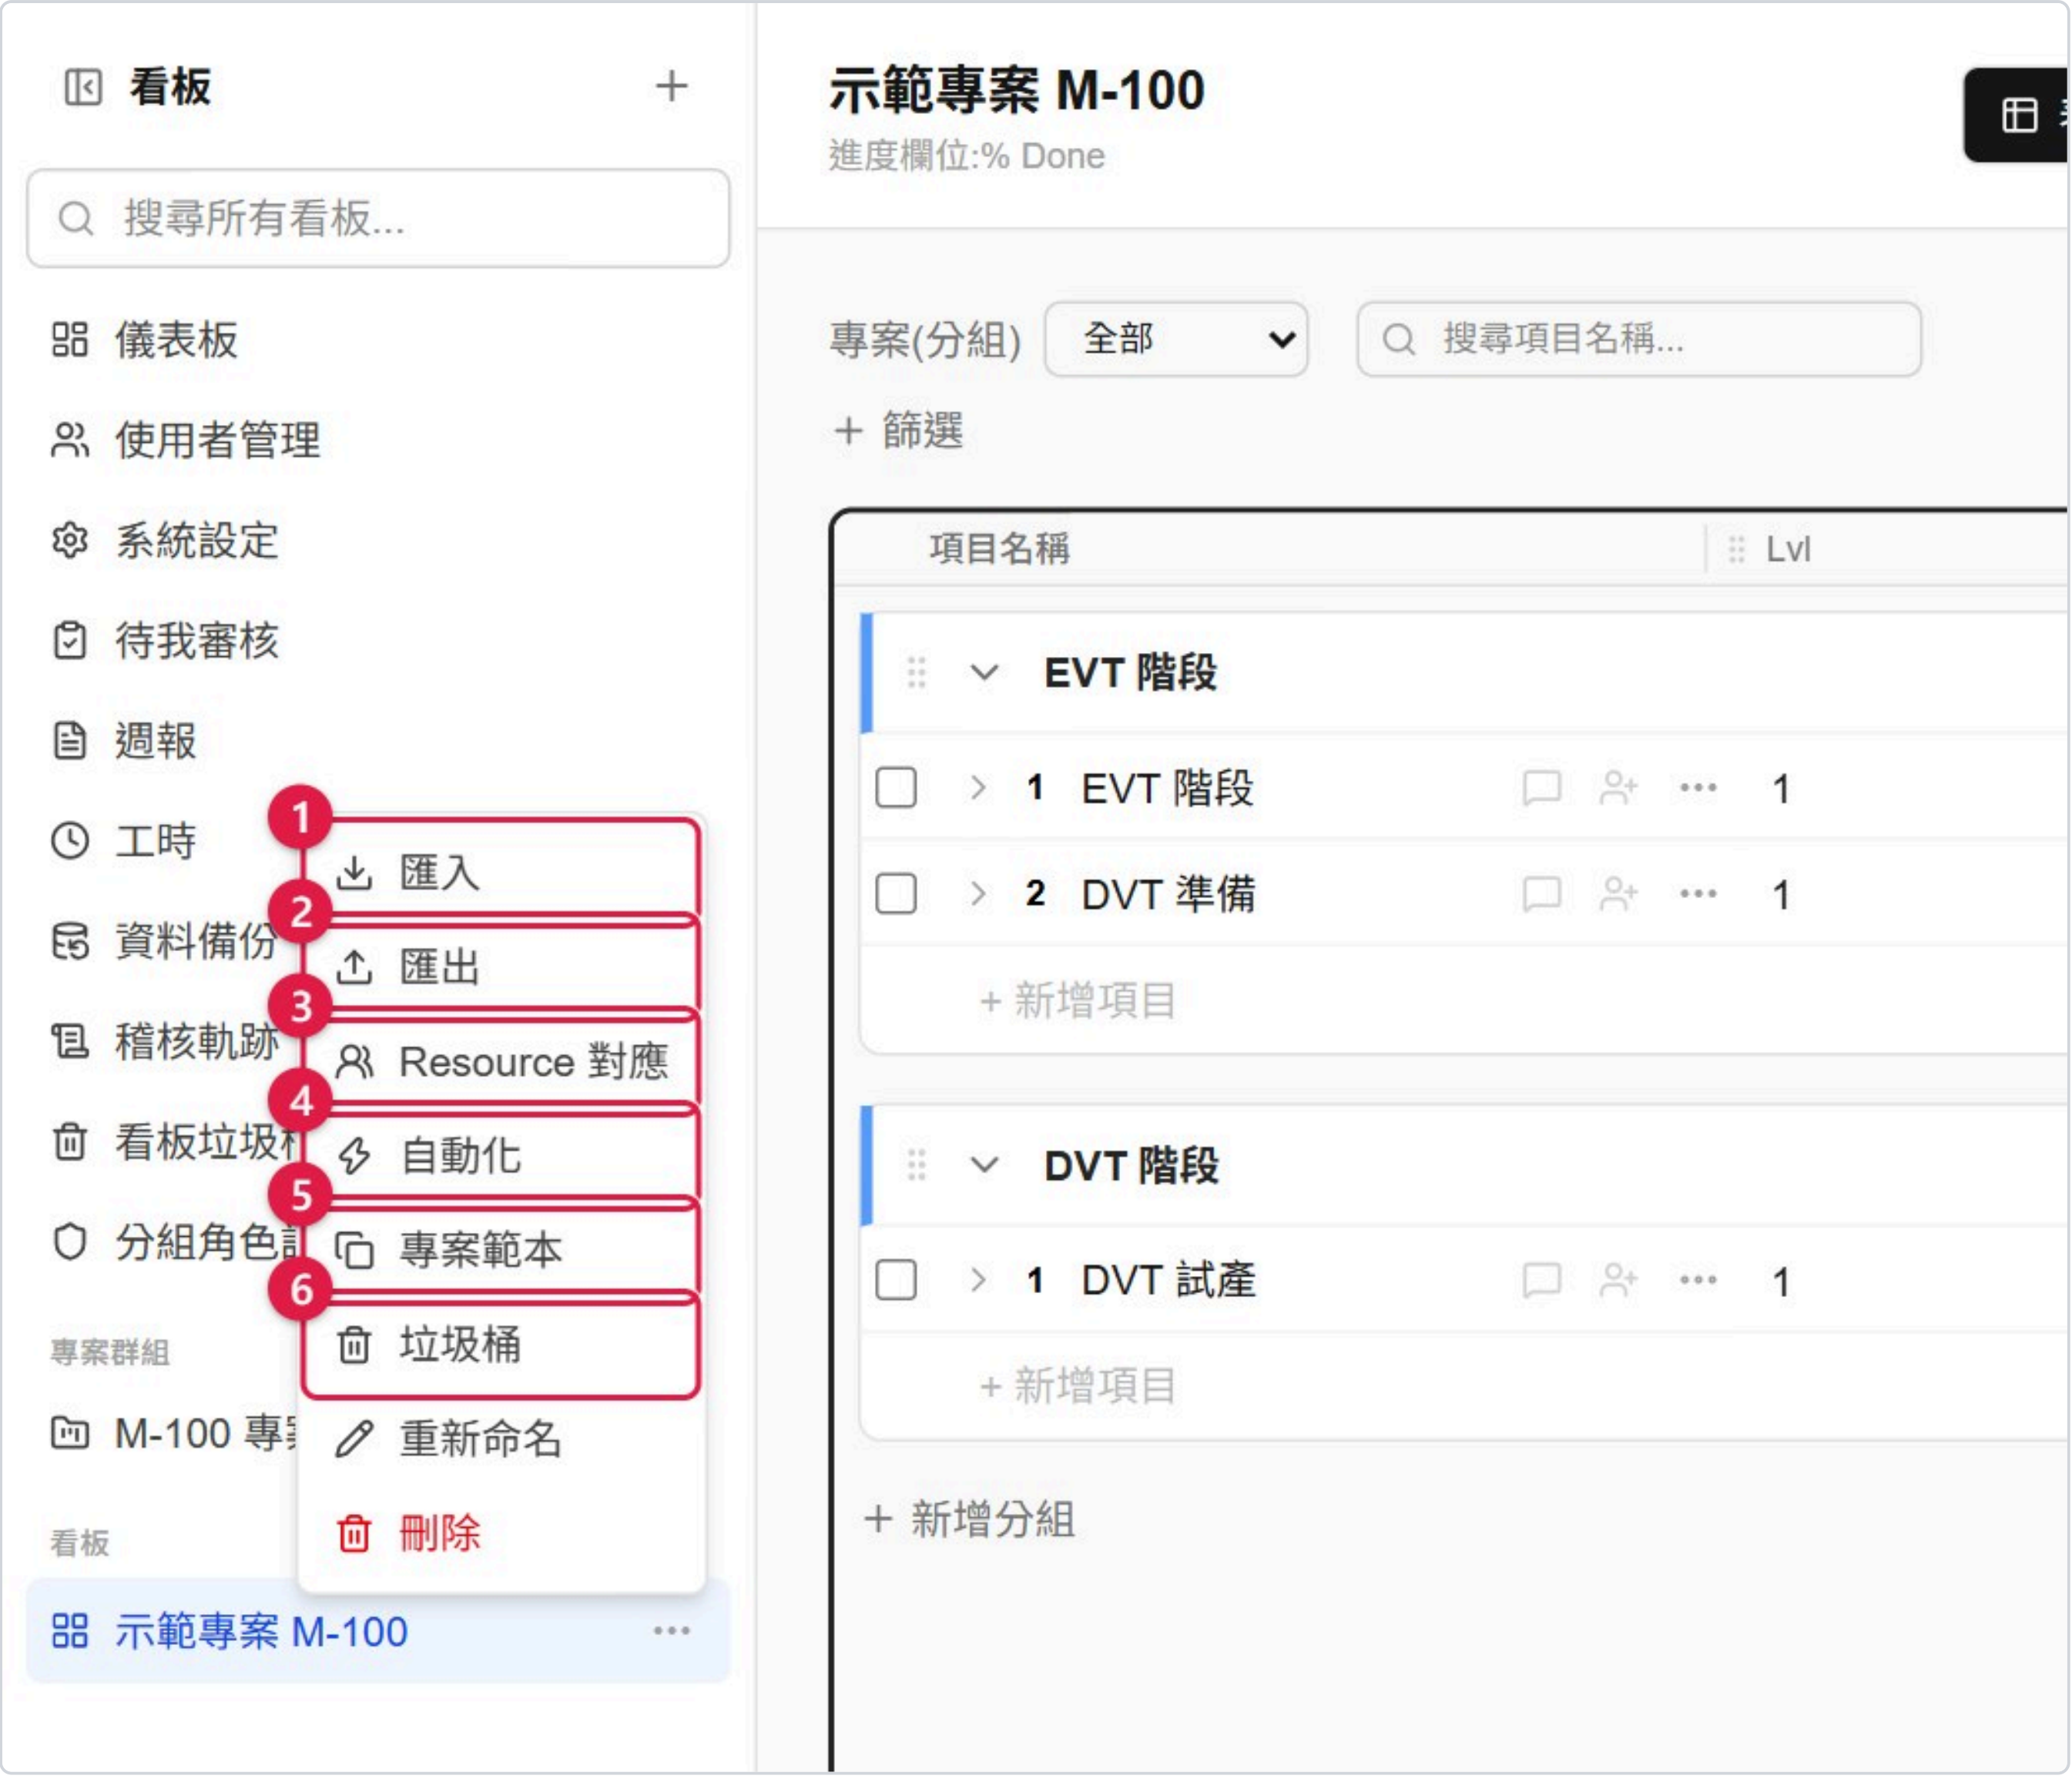
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色
專案群組
M-100 專案
看板
示範專案 M-100
1
匯入
2
匯出
3
Resource 對應
4
自動化
5
專案範本
6
垃圾桶
重新命名
刪除
示範專案 M-100
進度欄位:% Done
專案(分組)
全部
搜尋項目名稱...
+ 篩選
項目名稱
Lvl
EVT 階段
1 EVT 階段
1
2 DVT 準備
1
+ 新增項目
DVT 階段
1 DVT 試產
1
+ 新增項目
+ 新增分組

編號	功能	誰能用
① 匯入	從 Excel / CSV / Google Sheet 匯入工作項	管理者
② 匯出	匯出成 Google Sheet 用的 Gantt 檔	管理者
③ Resource 對應	把文字欄位裡的名字對應到帳號	管理者
④ 自動化	狀態變更時自動動作	主管以上
⑤ 專案範本	存成範本、套用範本	主管以上
⑥ 垃圾桶	還原被刪除的工作項	主管以上
重新命名 / 刪除	看板本身	管理者,或主管自己建立的看板

15.1 匯入

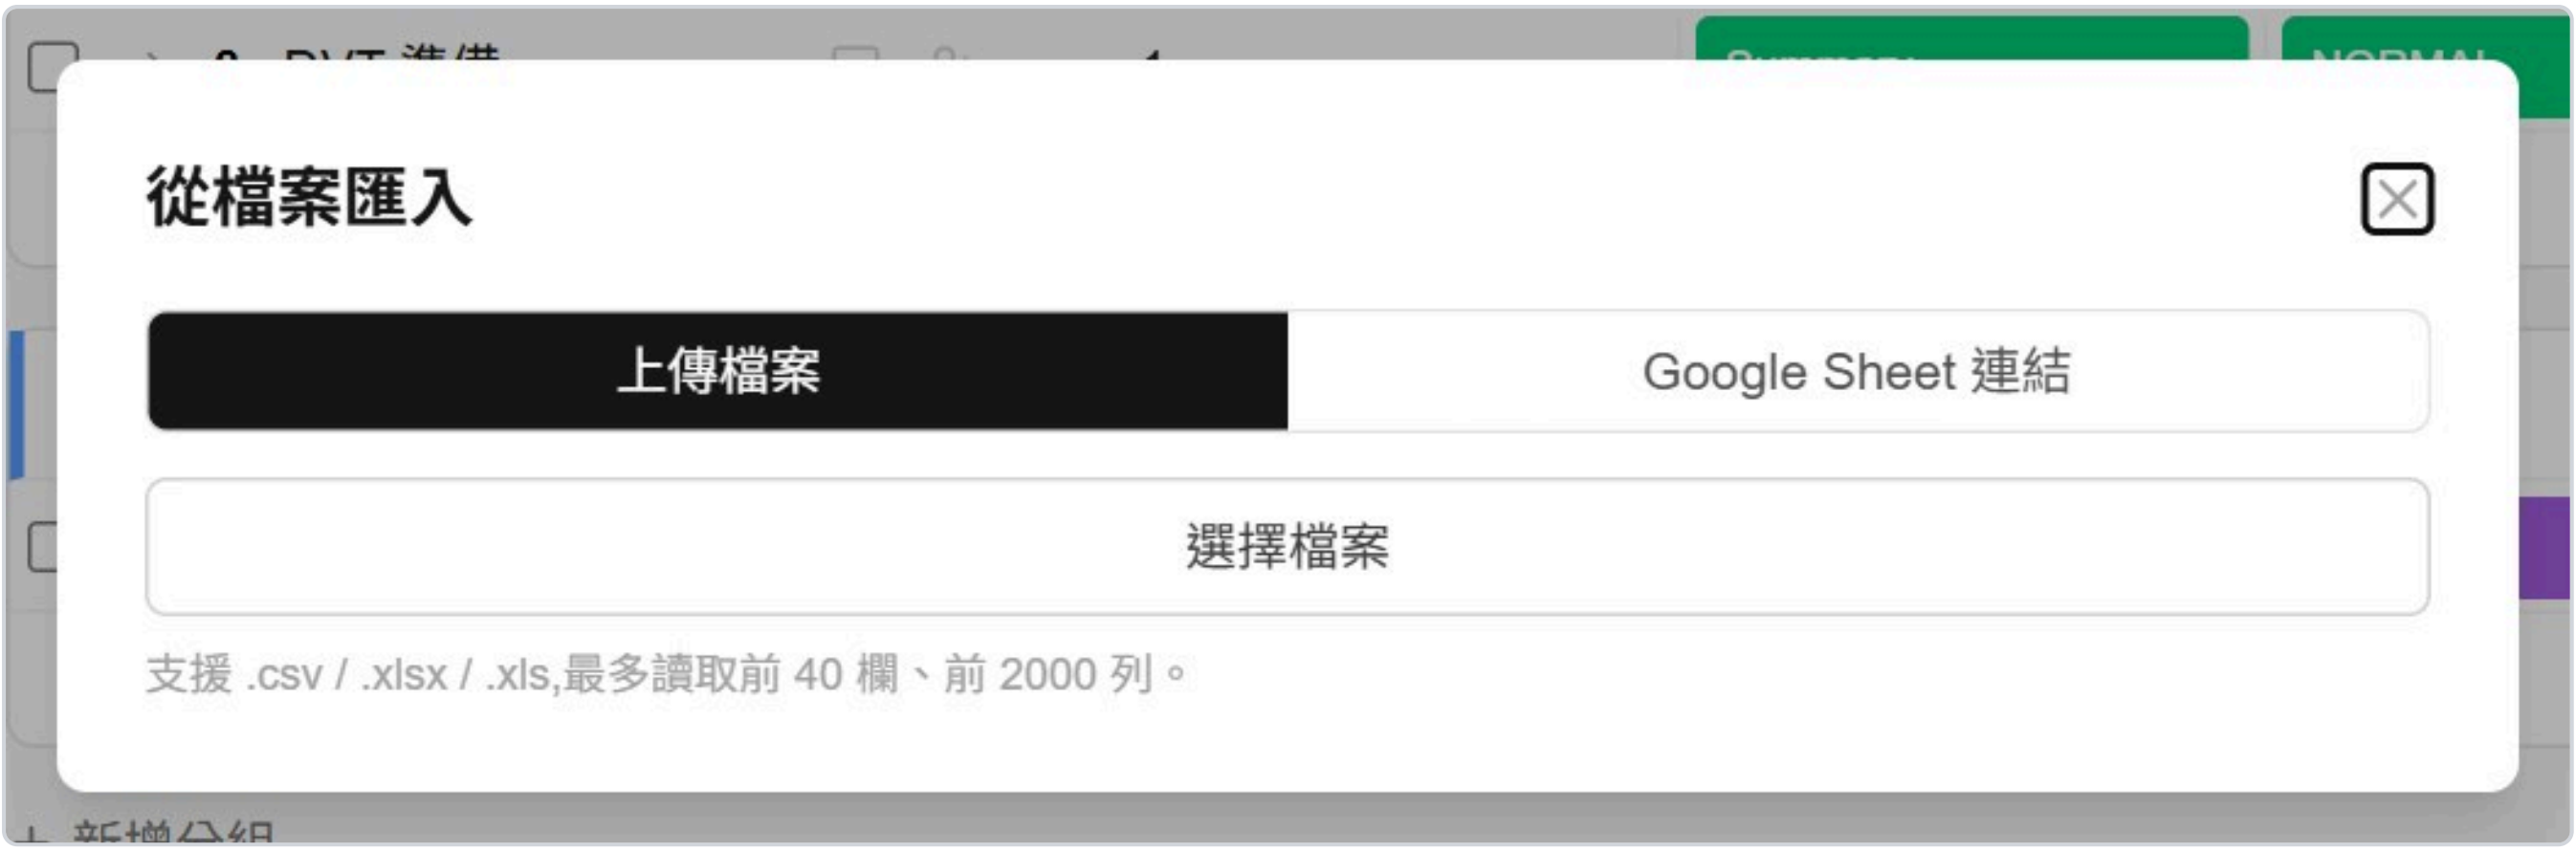

支援 .csv / .xlsx / .xls,最多讀取前 40 欄、前 2000 列。

1. 選擇**上傳檔案**(.csv / .xlsx / .xls,最多讀前 40 欄、2000 列),或貼上 **Google Sheet 連結**(需設為「知道連結的使用者」皆可檢視)。
2. 選擇工作表。
3. 點選**哪一列是欄位標題列**。
4. 設定**每一欄要匯入成什麼**:忽略、項目名稱(只能剛好一欄)、階層層級(最多一欄,用來決定子項目)、對應現有欄位、或新增文字 / 狀態 / 人員 / 日期 / 數字欄位。
5. 選擇匯入到新分組或現有分組,按「開始匯入」。

注意:人員欄位只能對應到已註冊的帳號,找不到的會略過(外部人員名稱請改選「新增文字欄位」);數字欄位遇到「1.1.3」這類編號會略過,也請改用文字欄位。

15.2 匯出 Google Sheet(Gantt)

下載一個 .xlsx(含甘特條、要徑標記、相依連線、階層顏色、日期約束、預算、燃盡圖、延遲追因共九個分頁)與一份 Apps Script(.gs)。把 .xlsx 上傳到 Google 雲端硬碟並以「Google 試算表」開啟,再到「擴充功能 → Apps Script」貼上 .gs 內容並儲存,重新整理後就有「Gantt」選單。可選擇匯出的分組、深度與額外欄位。

15.3 Resource 對應

把某個文字欄位(例如 Resource 欄裡的 "SW")的每一個不同的值,對應到系統裡的使用者帳號,並可選擇同時建立人員分配。適合匯入之後整批補上負責人。

15.4 自動化規則

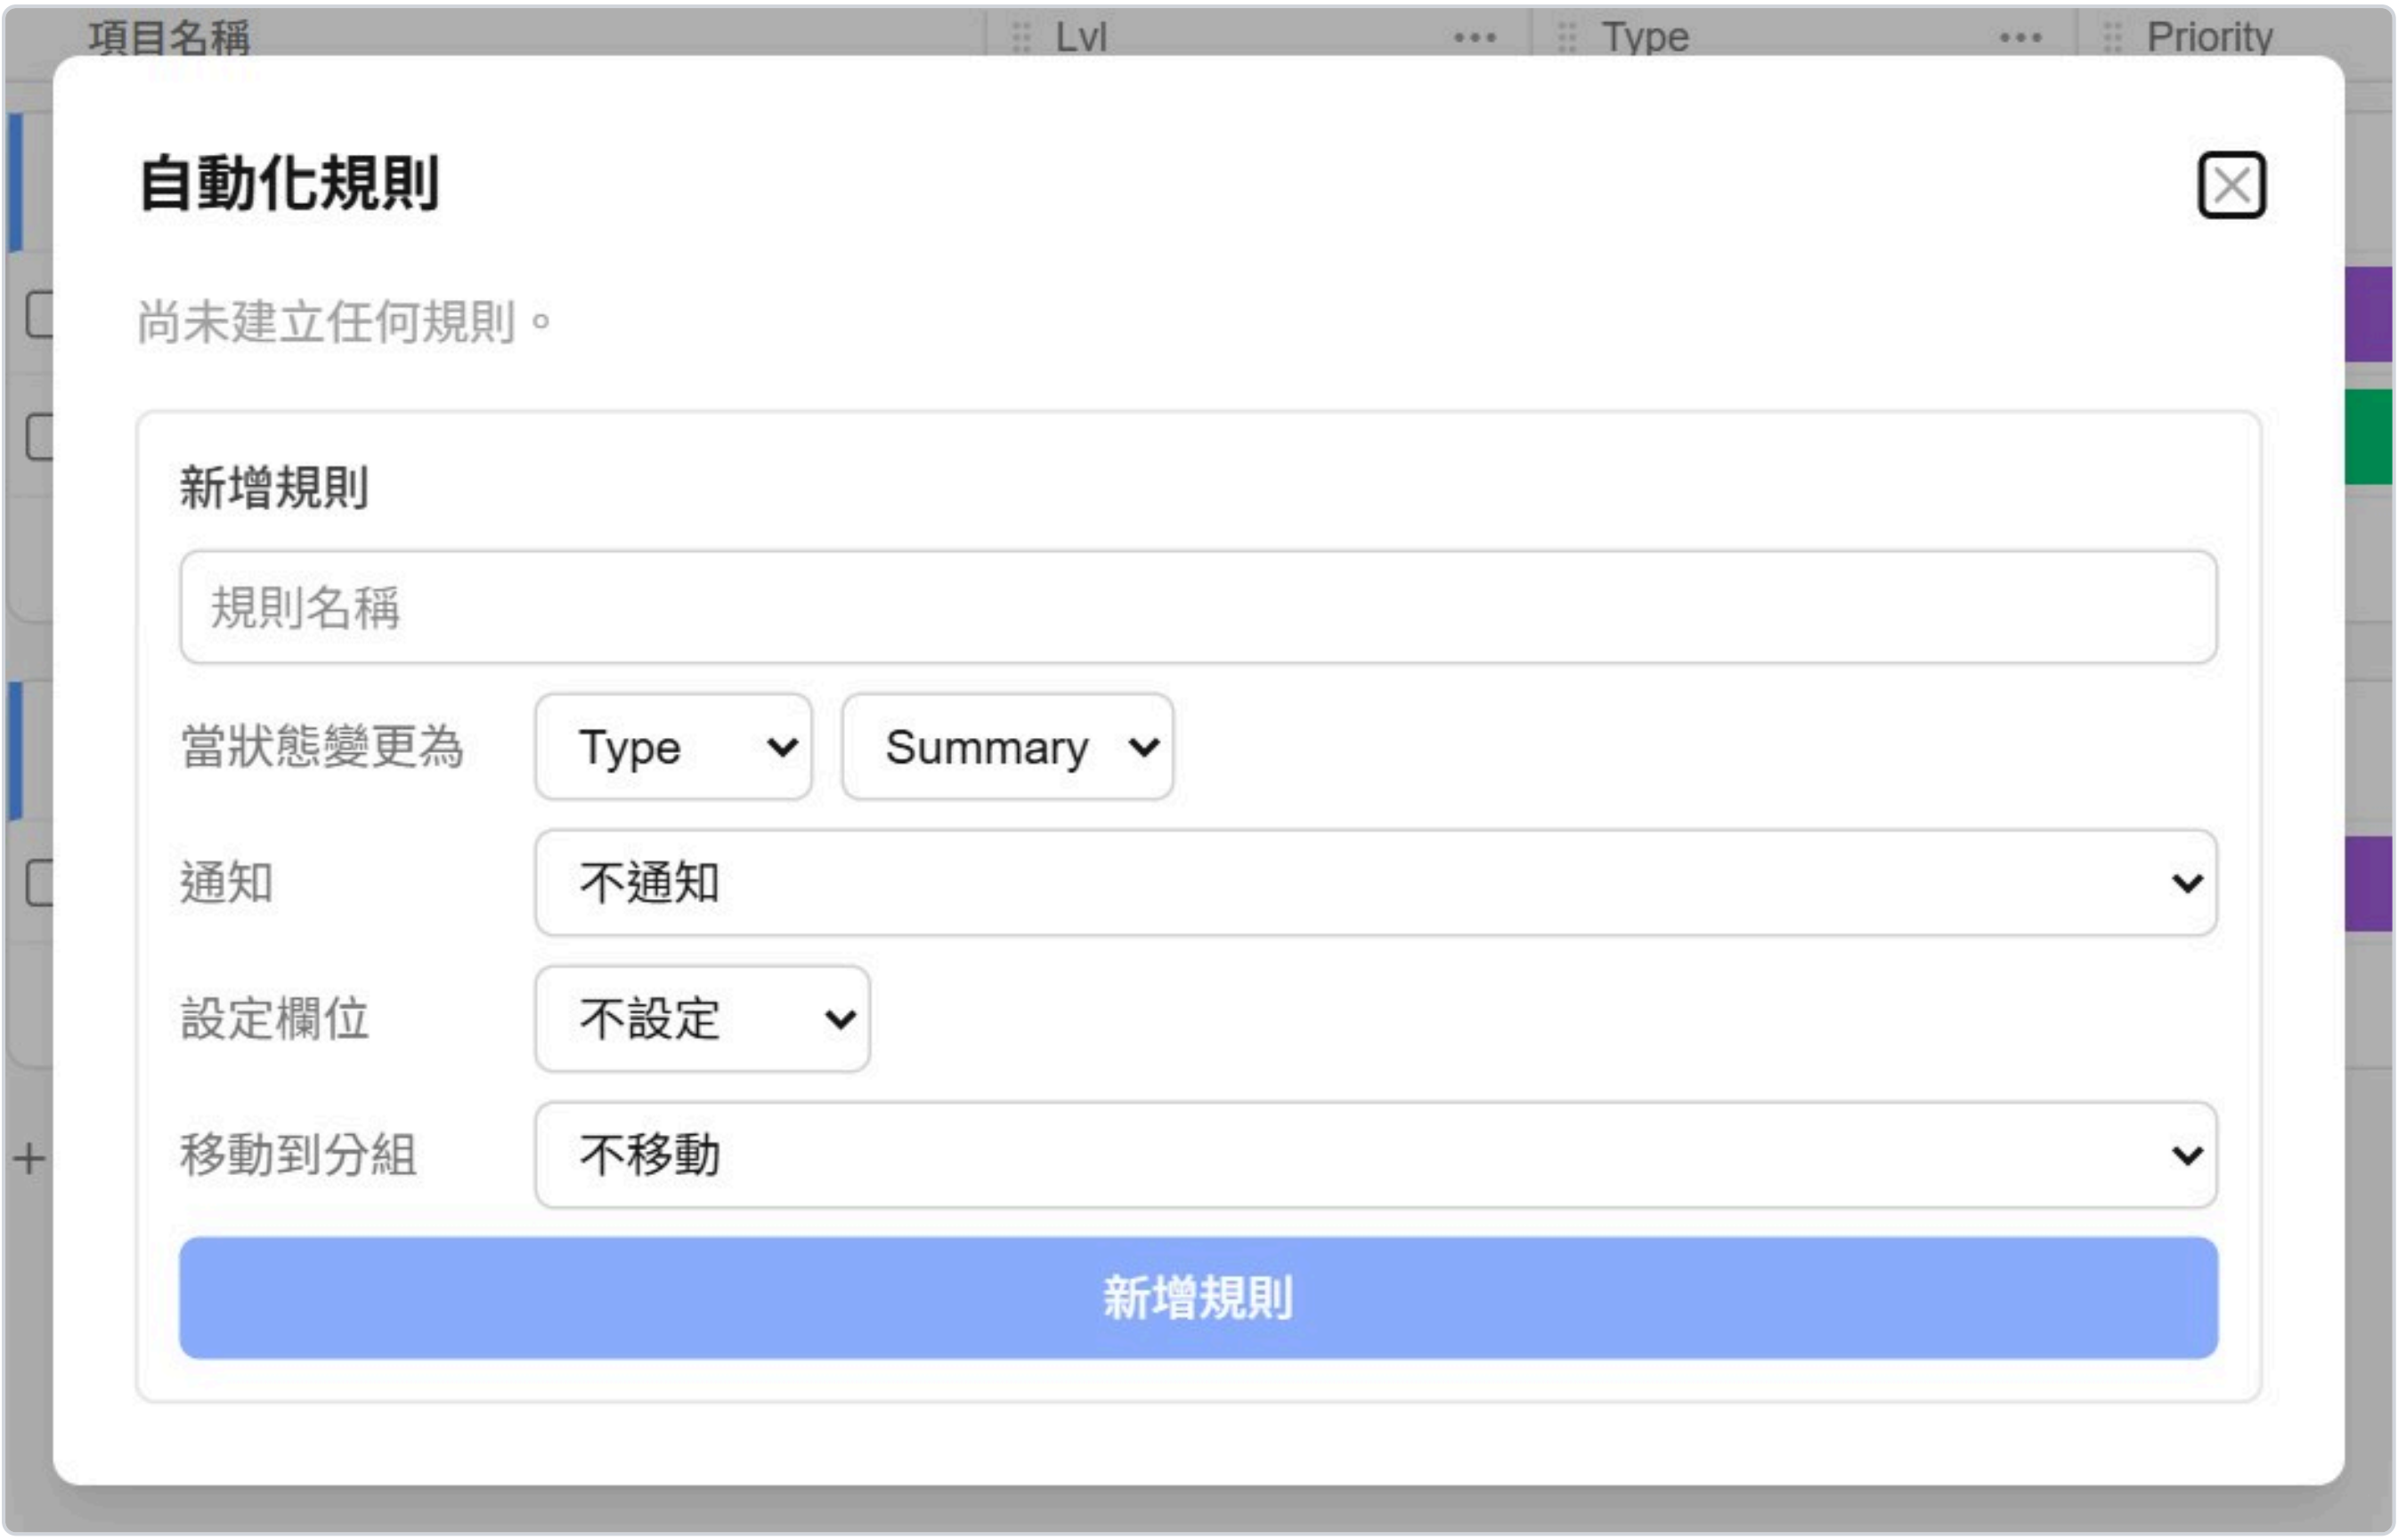

自動化規則

尚未建立任何規則。

新增規則

規則名稱

當狀態變更為 Type Summary

通知 不通知

設定欄位 不設定

移動到分組 不移動

每一條規則:**當某個狀態欄位變更為某個值時**,可以同時:通知某個人、把另一個欄位設為某個值、把項目移到某個分組。規則可以隨時啟用或停用。

15.5 專案範本

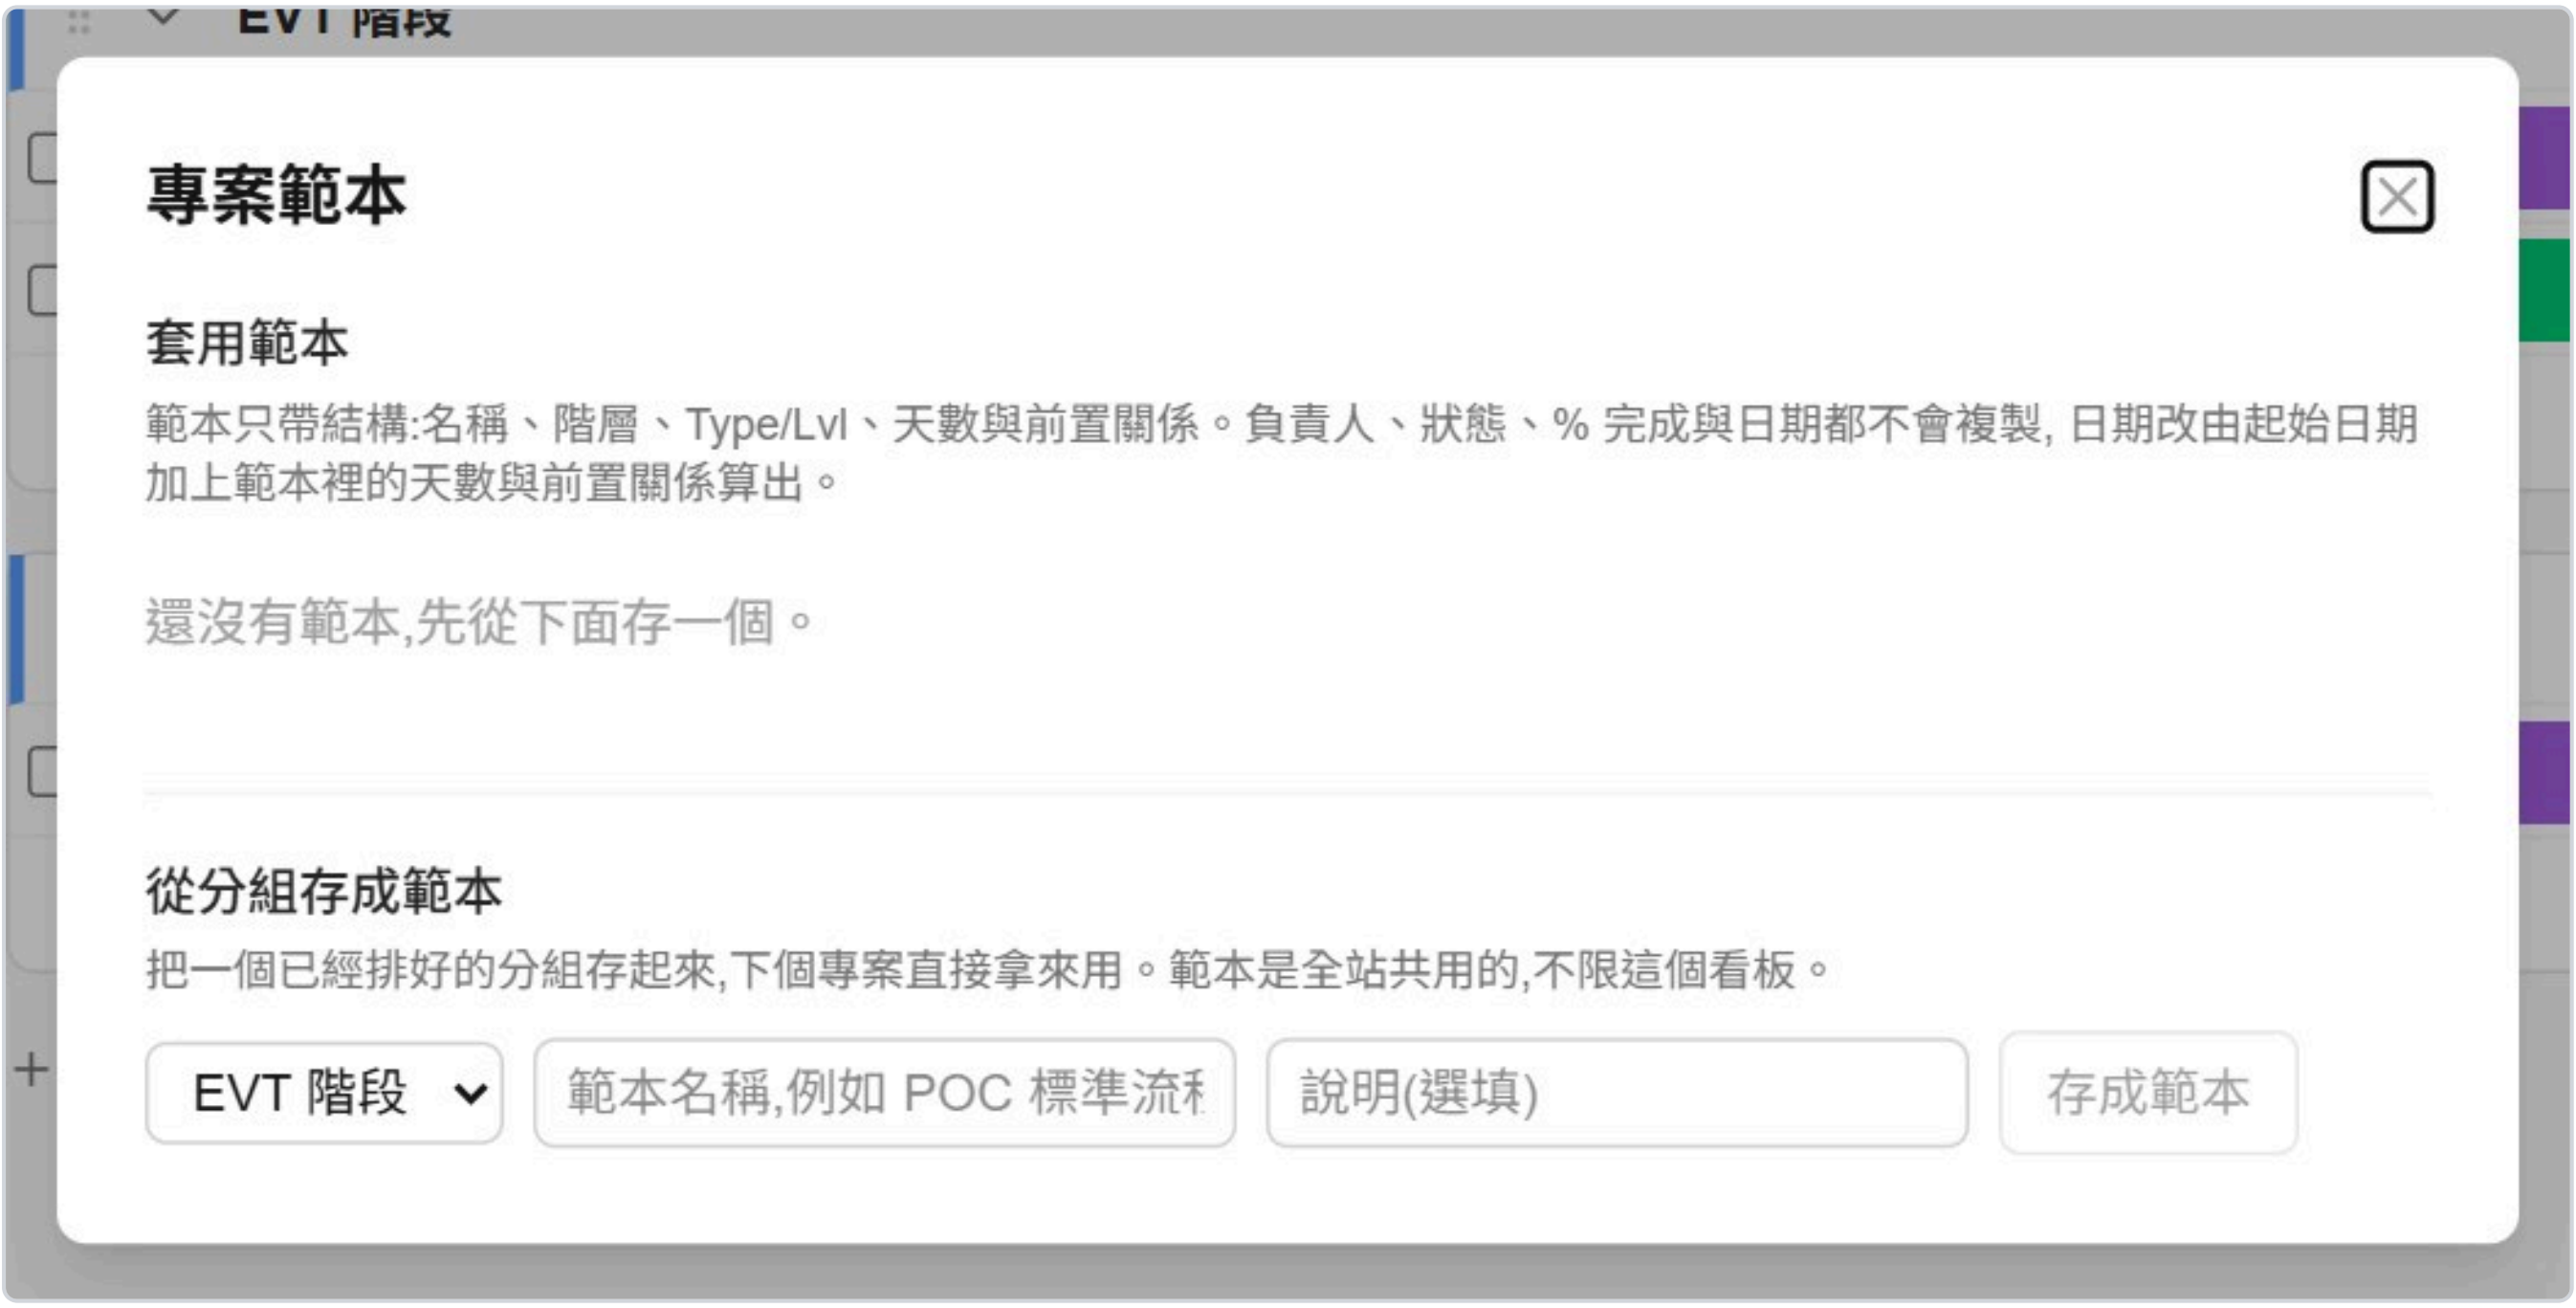

專案範本

套用範本

範本只帶結構:名稱、階層、Type/Lvl、天數與前置關係。負責人、狀態、% 完成與日期都不會複製, 日期改由起始日期加上範本裡的天數與前置關係算出。

還沒有範本,先從下面存一個。

從分組存成範本

把一個已經排好的分組存起來,下個專案直接拿來用。範本是全站共用的,不限這個看板。

EVT 階段 範本名稱,例如 POC 標準流程 說明(選填)

- **從分組存成範本**:把一個排好的分組存起來,範本全站共用。
- **套用範本**:選範本、目標分組、起始日期,建立一批工作項。

- 範本只帶**結構**:名稱、階層、Type / Lvl、天數與前置關係。負責人、狀態、% 完成與日期都不會複製,日期由起始日期加上天數與前置關係算出。

15.6 垃圾桶(項目)與看板垃圾桶

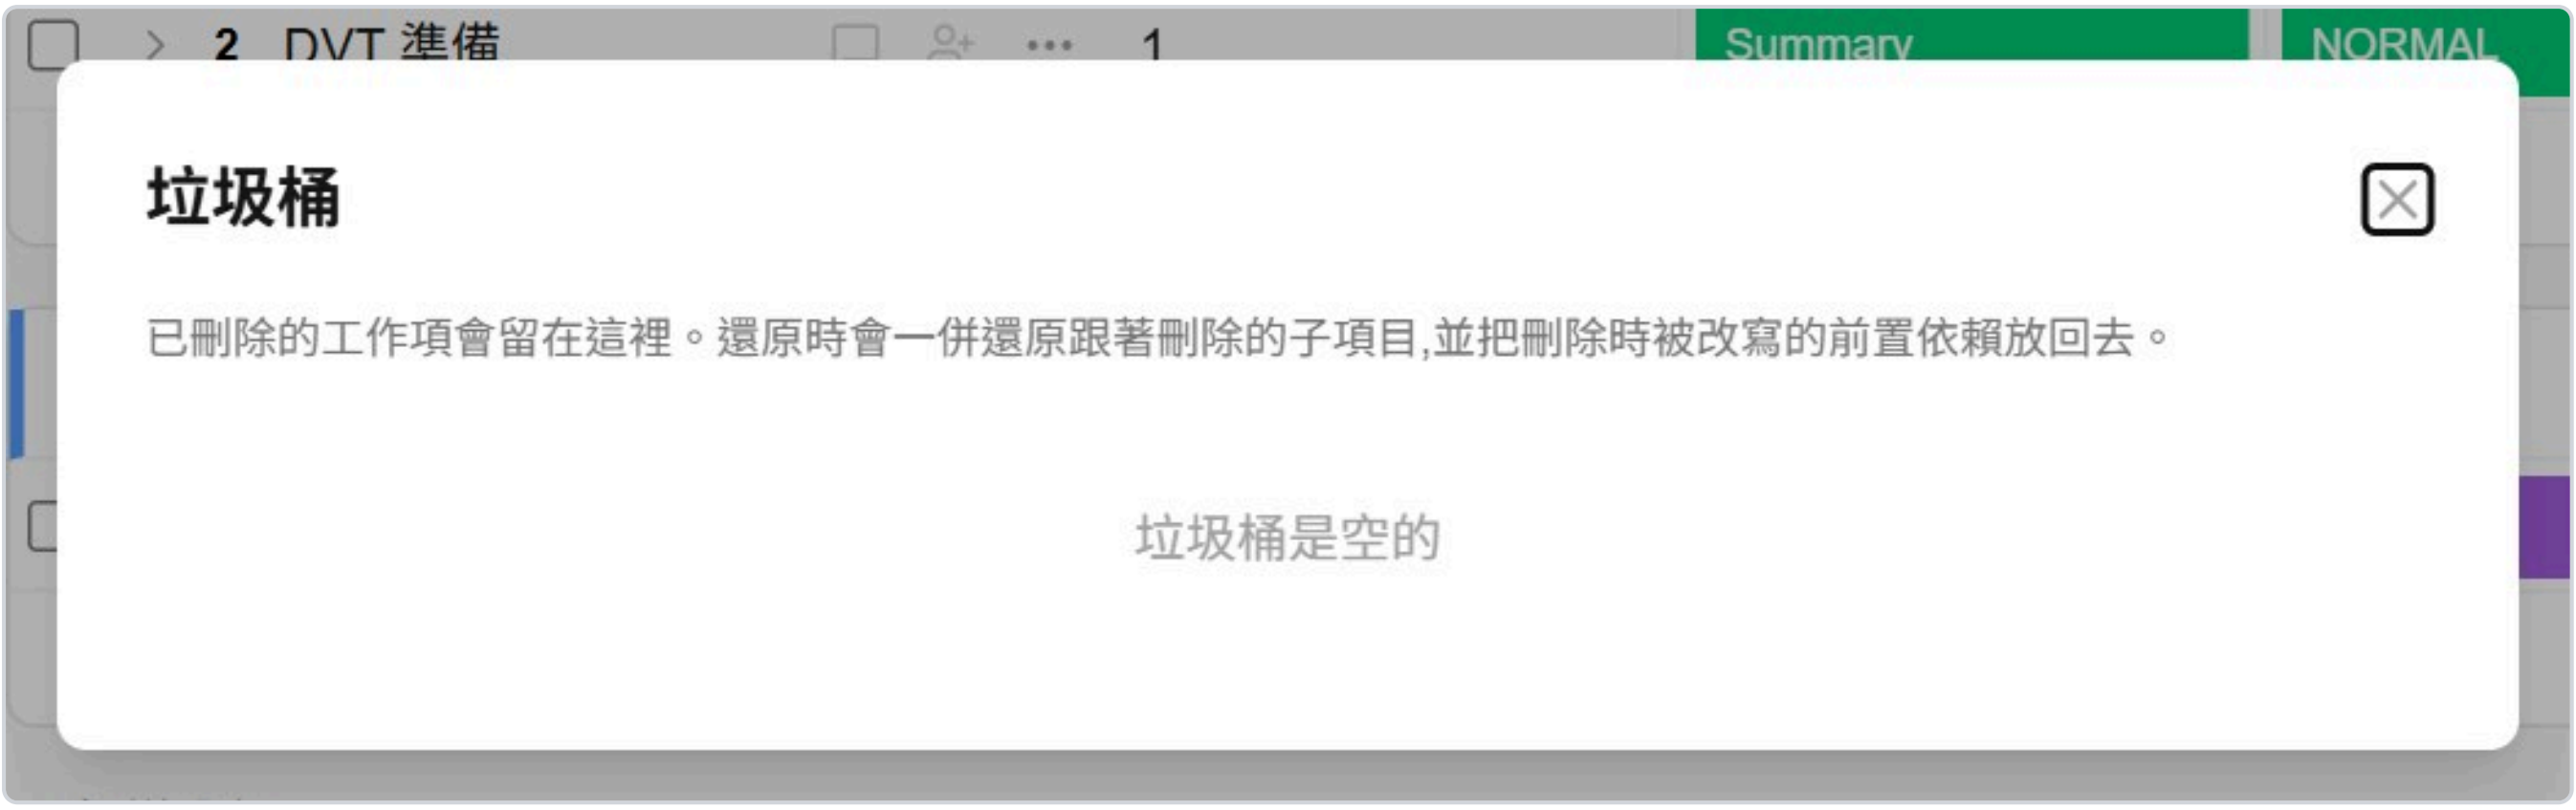

垃圾桶

已刪除的工作項會留在這裡。還原時會一併還原跟著刪除的子項目,並把刪除時被改寫的前置依賴放回去。

垃圾桶是空的

- 被刪除的工作項會留在垃圾桶(含留言、檔案與歷史)。按「**還原**」會連同一起刪除的子項目一起還原,並把刪除時被改寫的前置依賴放回去。
- 「**永久刪除**」連留言、檔案與歷史一併消失,**無法復原**。
- **被刪除的整個看板**在側邊欄「看板垃圾桶」,主管以上可以還原,永久刪除限管理者。

---

16. 儀表板

登入後的首頁。右上角的「**看板篩選**」可以**複選**:點開下拉選單,勾一個或好幾個看板(勾了看板會自動取消「全部看板」,勾「全部看板」會取消其他),按「**套用**」之後,儀表板所有區塊(工作量、過度配置、進度總覽、到期清單、我的項目……)只算勾選的看板;按鈕上會顯示選了什麼(一個看板顯示名字,多個顯示「2 個看板」)。

會記住你的選擇:套用之後,下次打開儀表板(或換頁再回來)還是同樣的看板,不用重選;要看全部就勾回「全部看板」再套用。記的是**這個瀏覽器**上這個帳號的選擇(換電腦或換瀏覽器要重選);記住的看板如果被刪掉或你看不到了,會自動忽略、改看其他,不會變成空白。網址帶 `?board=看板代號` 時(例如舊的書籤)以網址為準;按「套用」會改用你新選的,並回到一般的儀表板網址。

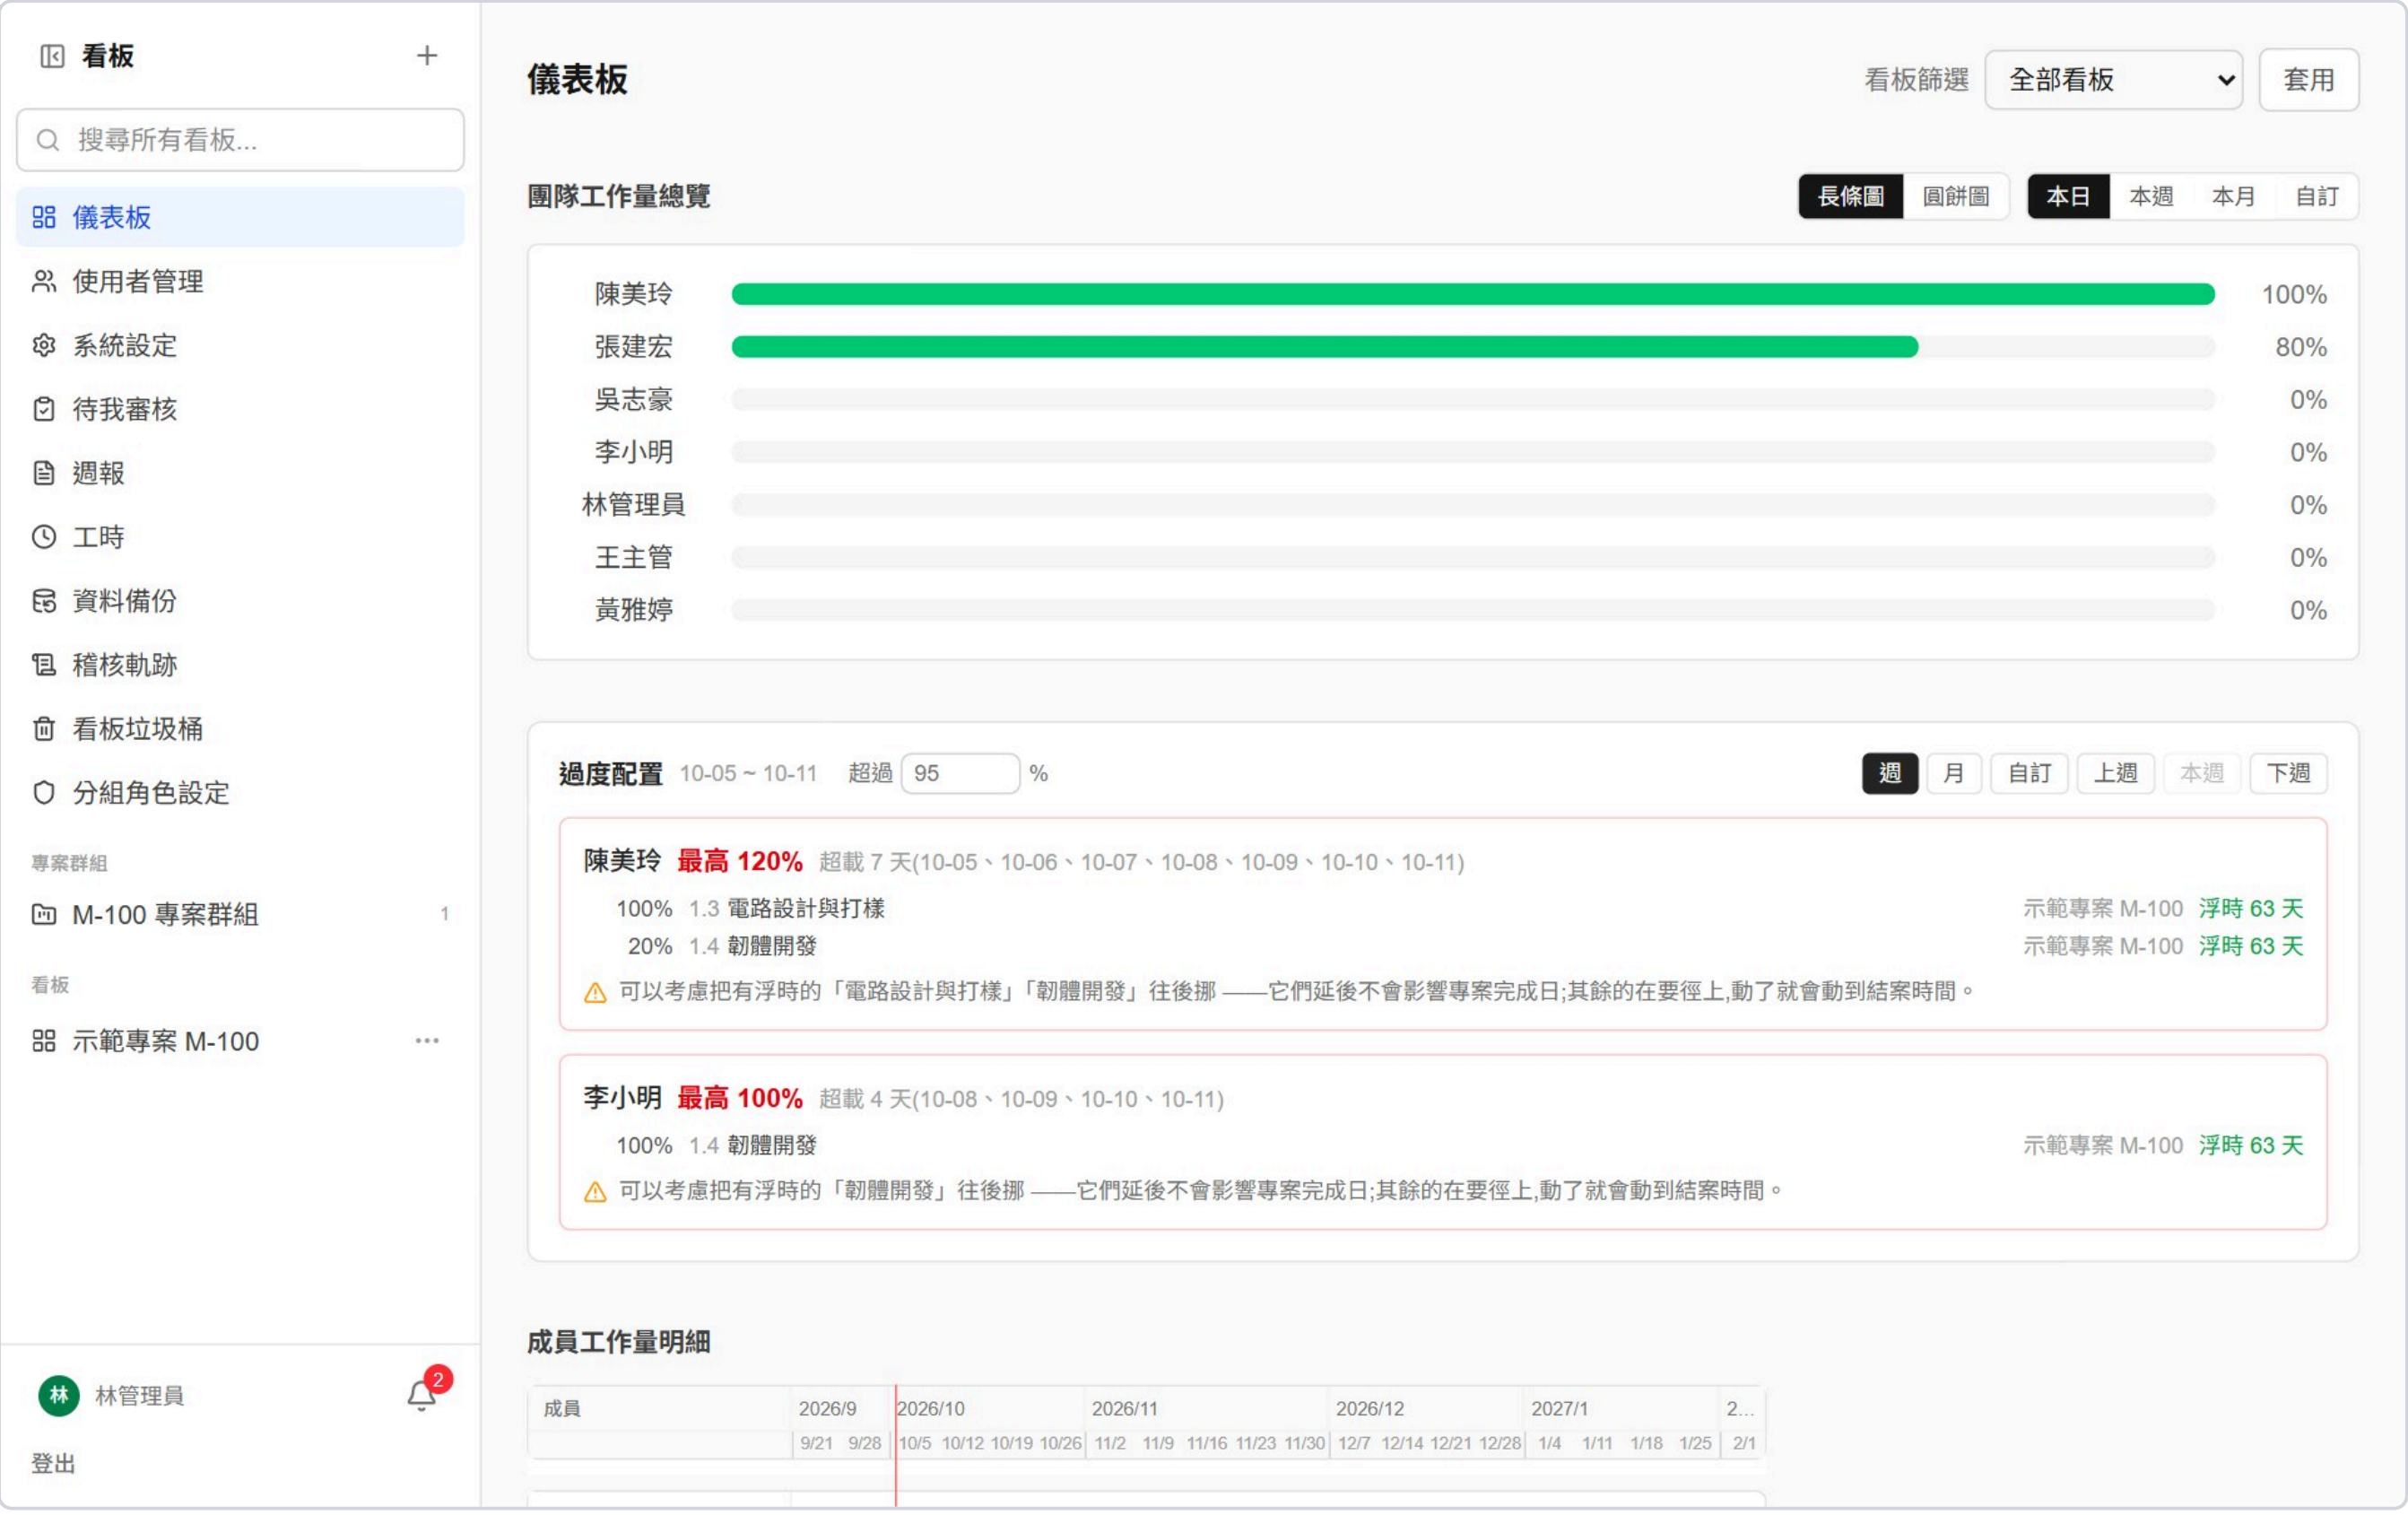
看板
+
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林
林管理員
2
登出
儀表板
看板篩選
全部看板
套用
團隊工作量總覽
長條圖
圓餅圖
本日
本週
本月
自訂
陳美玲 100%
張建宏 80%
吳志豪 0%
李小明 0%
林管理員 0%
王主管 0%
黃雅婷 0%
過度配置
10-05 ~ 10-11
超過
95
%
週
月
自訂
上週
本週
下週
成員工作量明細
成員
2026/9
2026/10
2026/11
2026/12
2027/1
2…
9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/23 11/30 12/7 12/14 12/21 12/28 1/4 1/11 1/18 1/25 2/1

陳美玲 最高 120% 超載 7 天(10-05、10-06、10-07、10-08、10-09、10-10、10-11)
100% 1.3 電路設計與打樣 示範專案 M-100 浮時 63 天
20% 1.4 韌體開發 示範專案 M-100 浮時 63 天
⚠ 可以考慮把有浮時的「電路設計與打樣」「韌體開發」往後挪 ——它們延後不會影響專案完成日;其餘的在要徑上,動了就會動到結案時間。

李小明 最高 100% 超載 4 天(10-08、10-09、10-10、10-11)
100% 1.4 韌體開發 示範專案 M-100 浮時 63 天
⚠ 可以考慮把有浮時的「韌體開發」往後挪 ——它們延後不會影響專案完成日;其餘的在要徑上,動了就會動到結案時間。

排列順序:想先看哪一塊,按標題列右上的「**排列順序**」,列出你看得到的每一個區塊,用 ↑ ↓ 把想先看的往上移;每按一下就存一次,**順序記在你自己的帳號上**(換電腦、換瀏覽器也一樣),不影響別人。「**還原預設順序**」清掉你的排法。之後系統新增的區塊會接在最後;只有主管才有的區塊(團隊項目)沒有的人不會列出來。管理者代操作別人的帳號時只能看、不能改對方的排法。

區塊	說明
預算警示	超支、需動用準備金、接近上限的預算(沒有警示時不顯示)

區塊	說明
未結案的風險與議題	風險登記冊裡**還沒結案**的風險與議題(含 Mantis 同步來的:未處理、處理中、待審核),最嚴重的在最前面。每一筆有**分數**(機率 × 衝擊,依高低上色)、類型(風險 / 議題 / Mantis #編號)、標題、看板、狀態、負責人、到期日(逾期標紅)。上面的**「與我有關」**是你負責、或正在等你同意結案的(主管連部屬的一起算),**「全部」**是目前看的這幾個看板上所有未結案的;管理者預設看全部,其他人預設看「與我有關」。點一筆跳到那個看板的風險分頁
團隊工作量總覽	每個人在選定期間(本日 / 本週 / 本月 / 自訂)的負載百分比;可切換長條圖 / 圓餅圖。主管看自己的團隊,**副主管看他擔任副主管的部門的人(加上自己)**,管理者看全部,成員看自己
過度配置	一天配置總和超過門檻(預設 95%,可改)的人與日期,並提示哪些有浮時的項目可以往後挪;休假日的工作也會被點出來
成員工作量明細	以時間軸列出每個人的任務與每週負載(顏色代表負載高低),可展開查看、點選調整
樣機使用時程	同樣的時間軸,一台樣機一列,看它每一週被哪些工作項使用、佔用多少(預設 100%);沒有工作項選樣機的看板不出現這一區,見下方「樣機使用時程」

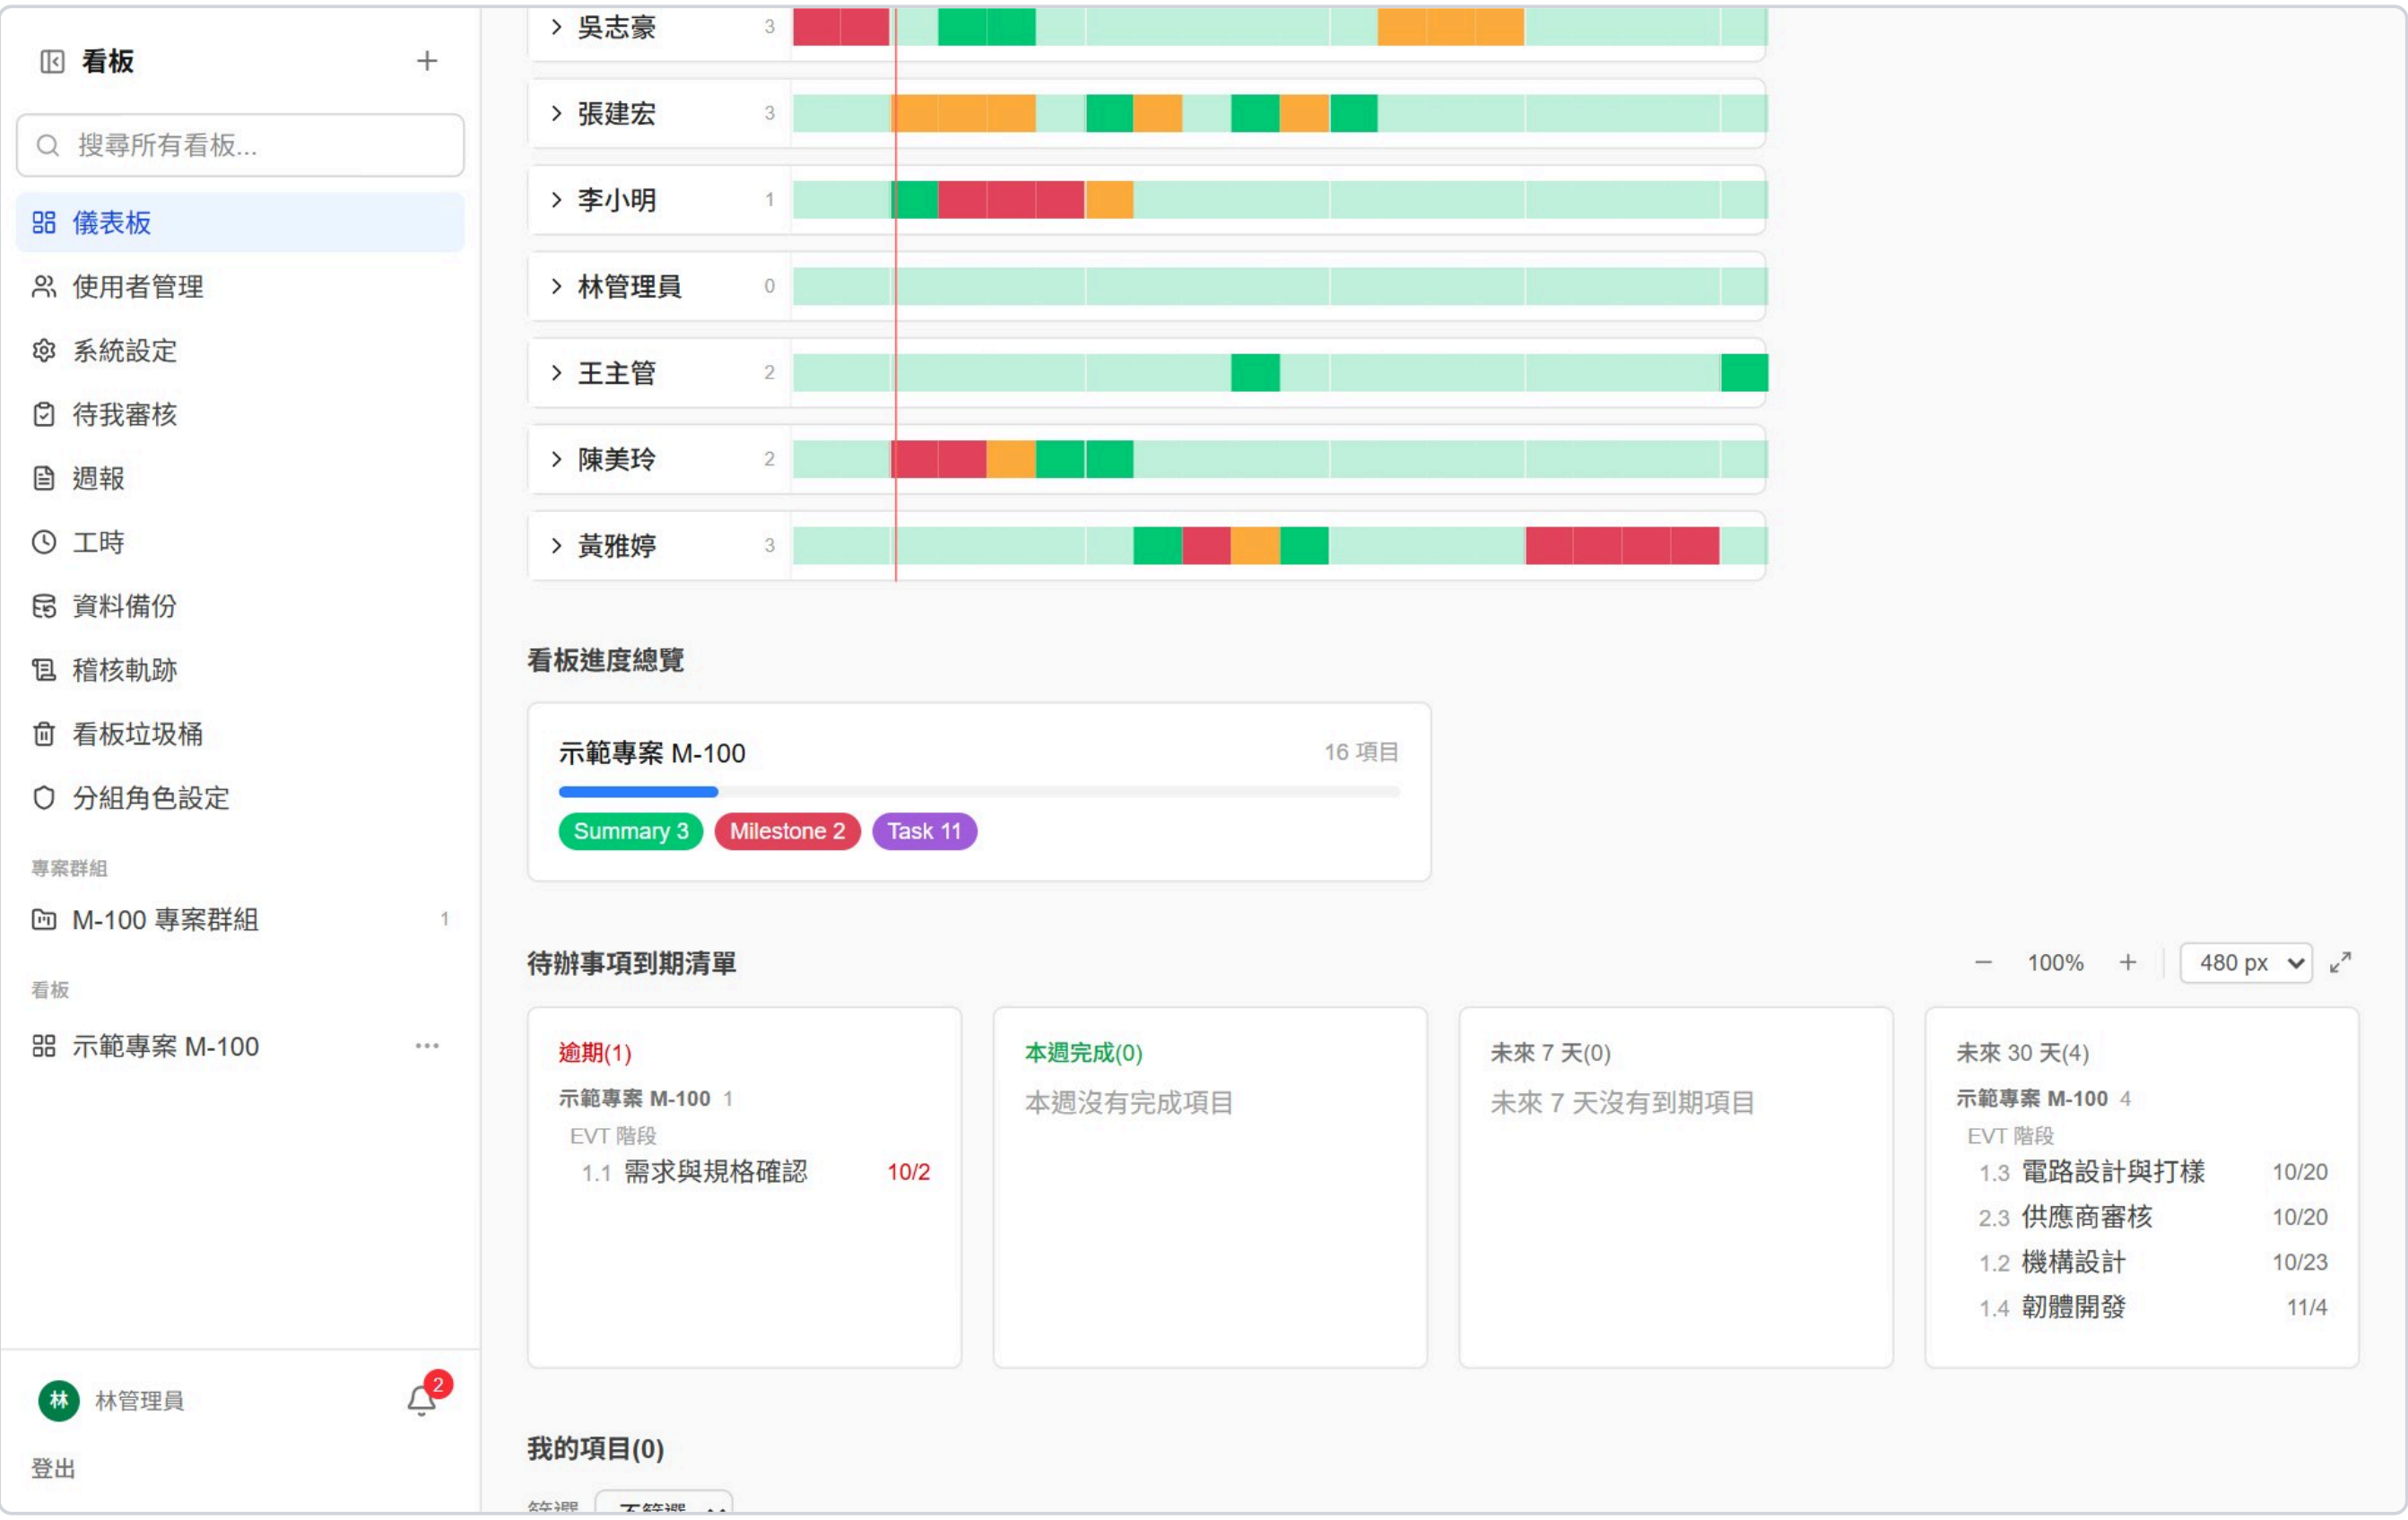
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組 1
看板
示範專案 M-100
林管理員
2
登出
吳志豪 3
張建宏 3
李小明 1
林管理員 0
王主管 2
陳美玲 2
黃雅婷 3
− 100% +
480 px

看板進度總覽

示範專案 M-100　16 項目

Summary 3　Milestone 2　Task 11

待辦事項到期清單

逾期(1)
示範專案 M-100 1
EVT 階段
1.1 需求與規格確認 10/2

本週完成(0)
本週沒有完成項目

未來 7 天(0)
未來 7 天沒有到期項目

未來 30 天(4)
示範專案 M-100 4
EVT 階段
1.3 電路設計與打樣 10/20
2.3 供應商審核 10/20
1.2 機構設計 10/23
1.4 韌體開發 11/4

我的項目(0)

區塊	說明
看板進度總覽	每個看板的平均完成度與各狀態數量
待辦事項到期清單	**逾期 / 本週完成 / 未來 7 天 / 未來 30 天**,可放大縮小、調整清單高度。**本週完成**以**實際把狀態切成完成的時間**為準(台灣時間,本週一到今天)——計畫完成日在上週、這週才切成完成的也算,提早完成的也算;沒有切換紀錄的舊資料才退回用計畫完成日在本週的判斷。看板視圖「依到期時間分組」的「本週完成」那一欄也是同一套
待辦事項期限	工作項目、風險 / 議題底下**有設期限、還沒完成**的待辦事項,依期限由近到遠排:每一列寫「**工作項目 - 待辦事項**」、期限日期(例如「10/28 · 明天到期」,逾期的標紅)與看板名稱;**風險 / 議題**的待辦事項前面多標一個「風險」或「議題」。範圍跟上面的到期清單一樣:一般成員看自己負責的項目(與自己新增的待辦事項),主管加上團隊,管理者看全部。**指定給你處理的待辦事項**一定會列出來(風險 / 議題的待辦事項沒指定處理者,就算那一筆的負責人)。**點一列**:工作項目直接跳出那個項目、停在「待辦事項」分頁;風險 / 議題跳到那一塊看板的風險分頁、開那一筆。
團隊項目【主管、副主管】	部屬被指派的項目(副主管看他擔任副主管的那個部門的人)
我的項目	指派給你的項目
我負責窗口的資源的項目	你擔任窗口的資源(治具、廠商這類沒有帳號的負責人)被指派的項目。以前叫「我的團隊項目」,跟主管的「團隊項目」(部屬的項目)太像,已改名

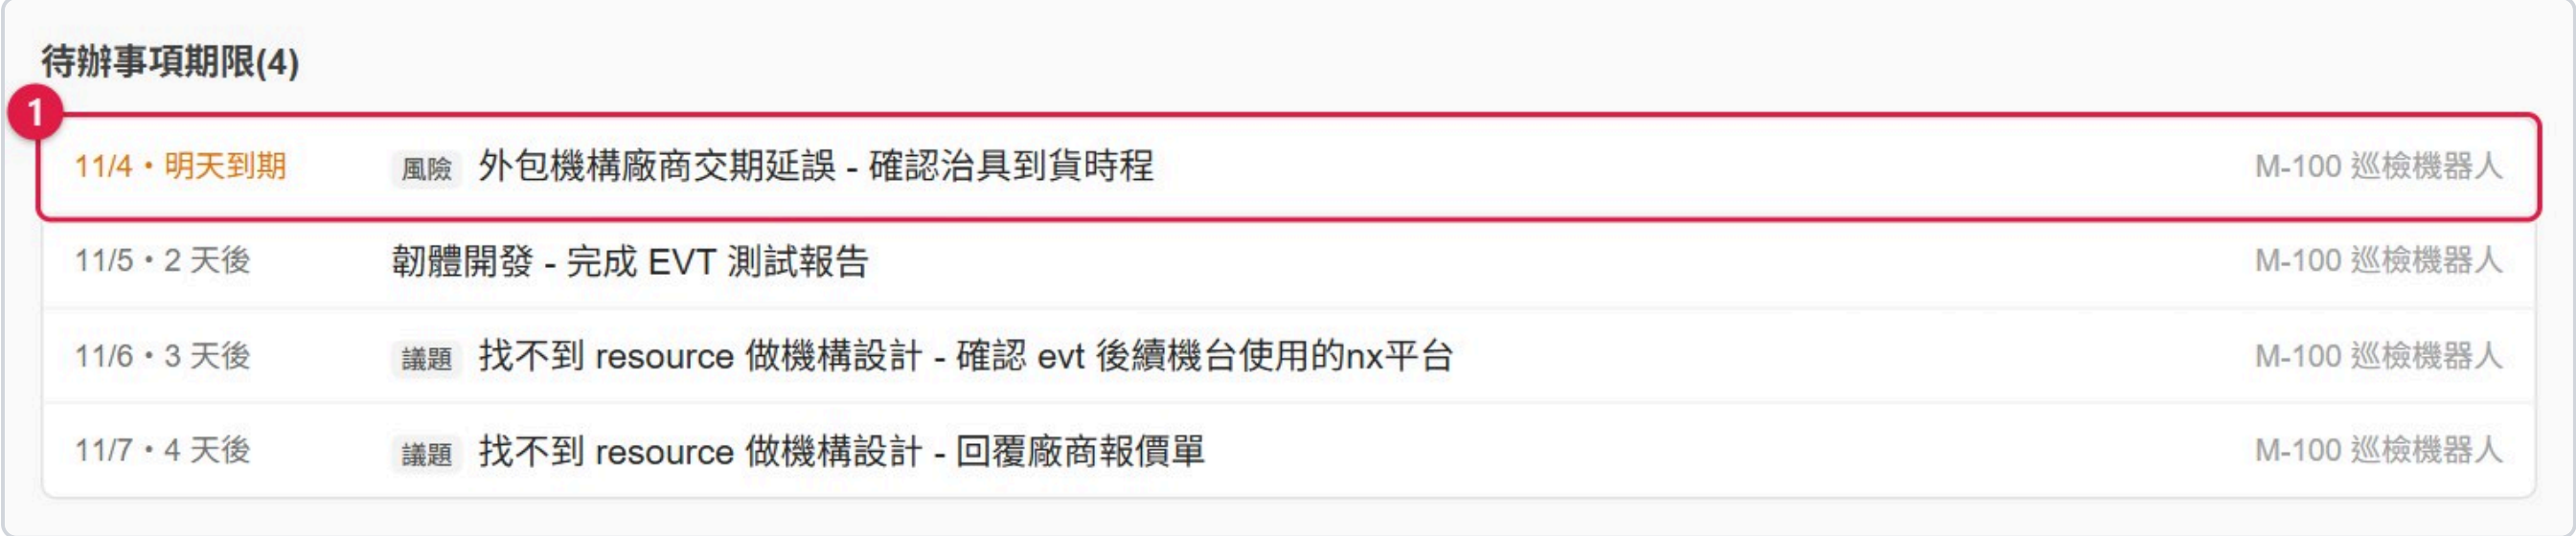
待辦事項期限(4)

11/4 • 明天到期	風險 外包機構廠商交期延誤 - 確認治具到貨時程	M-100 巡檢機器人
11/5 • 2 天後	韌體開發 - 完成 EVT 測試報告	M-100 巡檢機器人
11/6 • 3 天後	議題 找不到 resource 做機構設計 - 確認 evt 後續機台使用的nx平台	M-100 巡檢機器人
11/7 • 4 天後	議題 找不到 resource 做機構設計 - 回覆廠商報價單	M-100 巡檢機器人

「工作量顏色門檻」(幾 % 算偏高、超載)由管理者在系統設定調整。

管理者的儀表板最上面,伺服器磁碟快滿時會多一張黃色(快滿了)或紅色(危險)的警示卡,連到系統設定看哪個資料夾最大(見 21.4);平常不出現,也不在上面「排列順序」的清單裡。

樣機使用時程(「我的儀表板」與每個專案的專案儀表板都有):看每一台樣機什麼時候被哪些工作項使用。畫法跟「成員工作量明細」一樣——一台樣機就像一個人,用它的工作項就像他的任務。

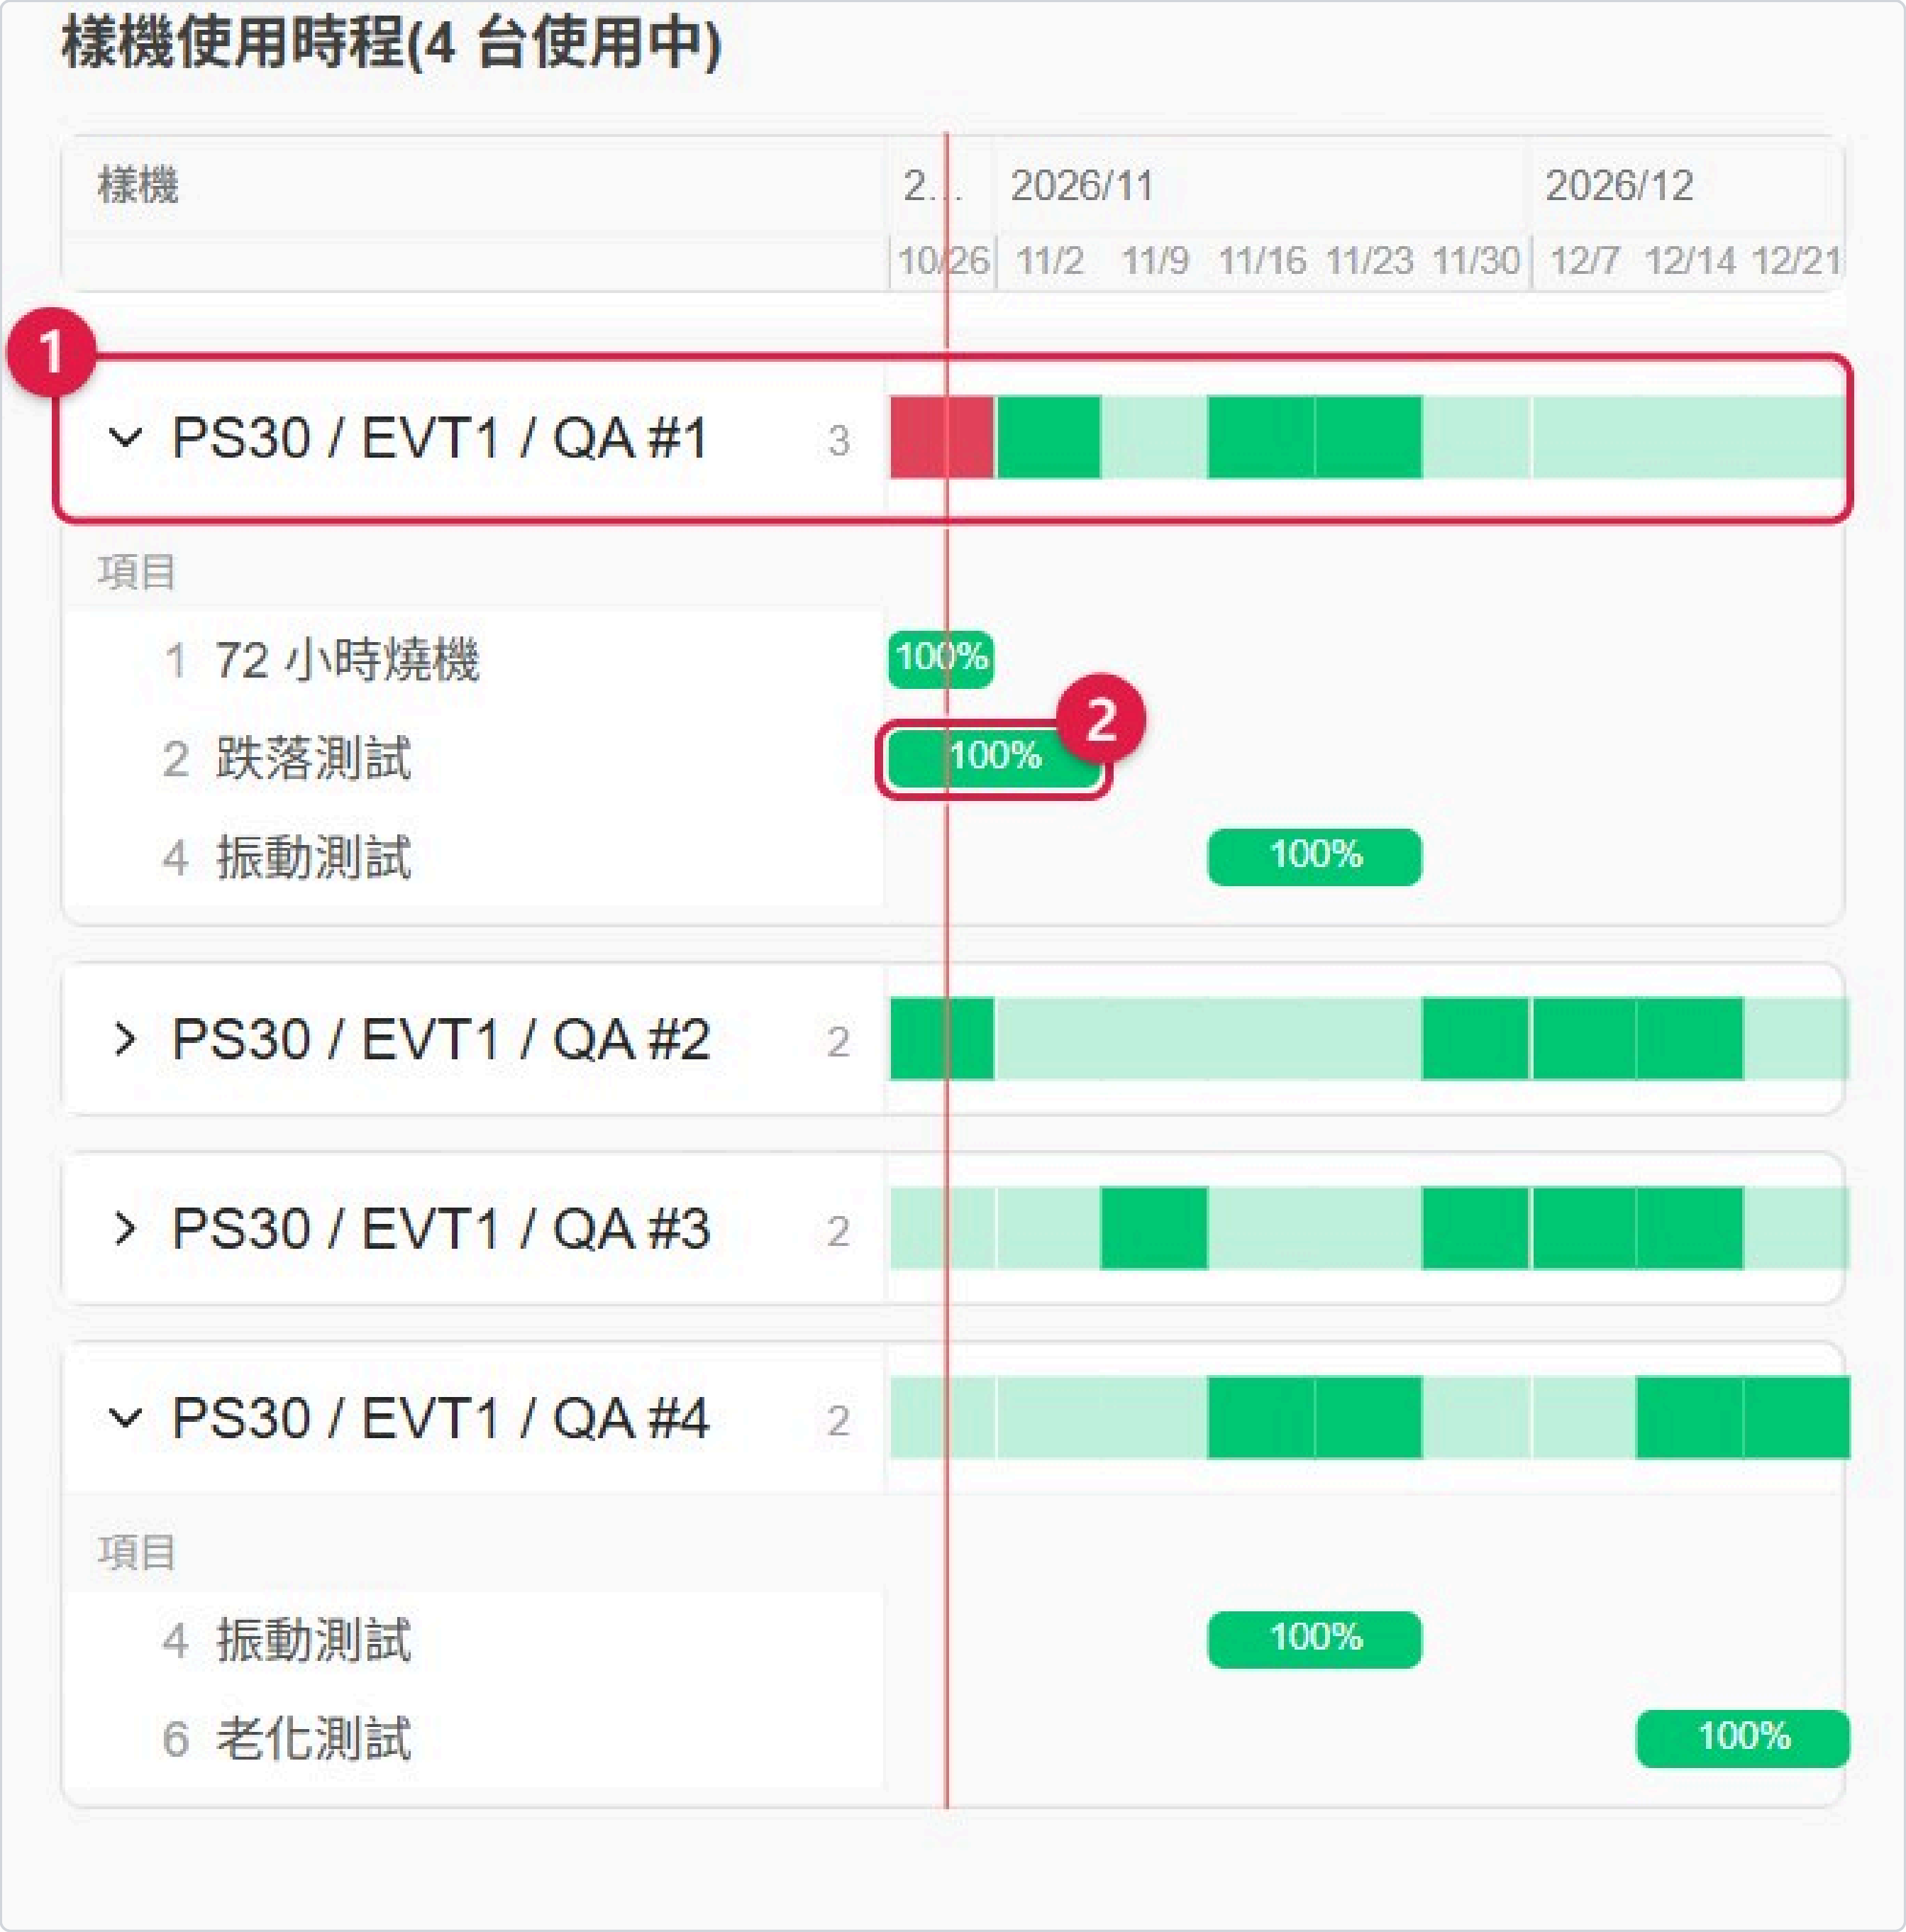
樣機使用時程(4 台使用中)
樣機
2...
2026/11
2026/12
10/26
11/2
11/9
11/16
11/23
11/30
12/7
12/14
12/21
1
PS30 / EVT1 / QA #1
3
項目
1 72 小時燒機
100%
2 跌落測試
100%
2
4 振動測試
100%
PS30 / EVT1 / QA #2
2
PS30 / EVT1 / QA #3
2
PS30 / EVT1 / QA #4
2
項目
4 振動測試
100%
6 老化測試
100%

- **哪些樣機會出現**:至少有一個工作項選了它(在表格的「使用樣機」欄、項目卡片或甘特圖的人員分配視窗選,見第 14 章「每一台樣機與使用樣機」)。沒有人用的樣機不列在上面,而是收在這一區最下面的「**閒置的樣機**(N 台)」,點開看是哪幾台;整個看板都沒有人選樣機,這一區就不出現。只算你**看得到的工作項**(私人項目、被「DM 的可見範圍」擋住的不算)。「我的儀表板」跟著上方的看板篩選走;專案儀表板是那一個專案。
- ① **每一列是一台樣機**:名字是「產品 / 階段 / 用途 #第幾台」(好幾個看板的樣機放在一起時,前面多標看板名稱),右邊的小數字是用它的工作項數。每一格是一週:**綠色**表示那週有工作項在用,淡色表示沒人用,**紅色表示同一天不只一個工作項在用這台**(佔用加起來超過 100%),要排開或改用別台。滑鼠停在格子上看那一週的百分比。
- **樣機欄的寬度**:一打開就依樣機名字的長度算好,寬到看得到每一台的全名(最窄 200、最寬是這一區的一半,名字都很短就維持 200);要更寬或更窄,拖「樣機」標題的**右邊緣**(滑鼠移上去會變成左右箭頭),可以拉到 120 到 720。寬度只留在這次的畫面,重新整理會依名字重新算;點開一台之後,工作項的名稱也跟著這一欄的寬度。

- **點開一台**,列出用它的工作項(依分組、WBS 排),② **長條**從開始畫到完成,上面寫這個工作項佔用這台的百分比,**預設 100%**(這段時間整台都被它用著)。點工作項的名字跳到看板打開那個項目。沒有排程(沒有開始日期與天數)的工作項寫「未排程 · 100%」,不算進每週的格子。
- **改百分比**:點長條,在小視窗改「佔用這台的百分比」(1 到 100),按「儲存」,上面每週的格子馬上重算,工作項的活動紀錄留一筆。例如兩個測試各只用這台一半的時間,各改成 50%,同一天加起來 100%,就不會變紅。誰能改:跟「使用樣機」欄一樣——管理者、主管、被指派到這個工作項的人;其他人會看到「權限不足」。

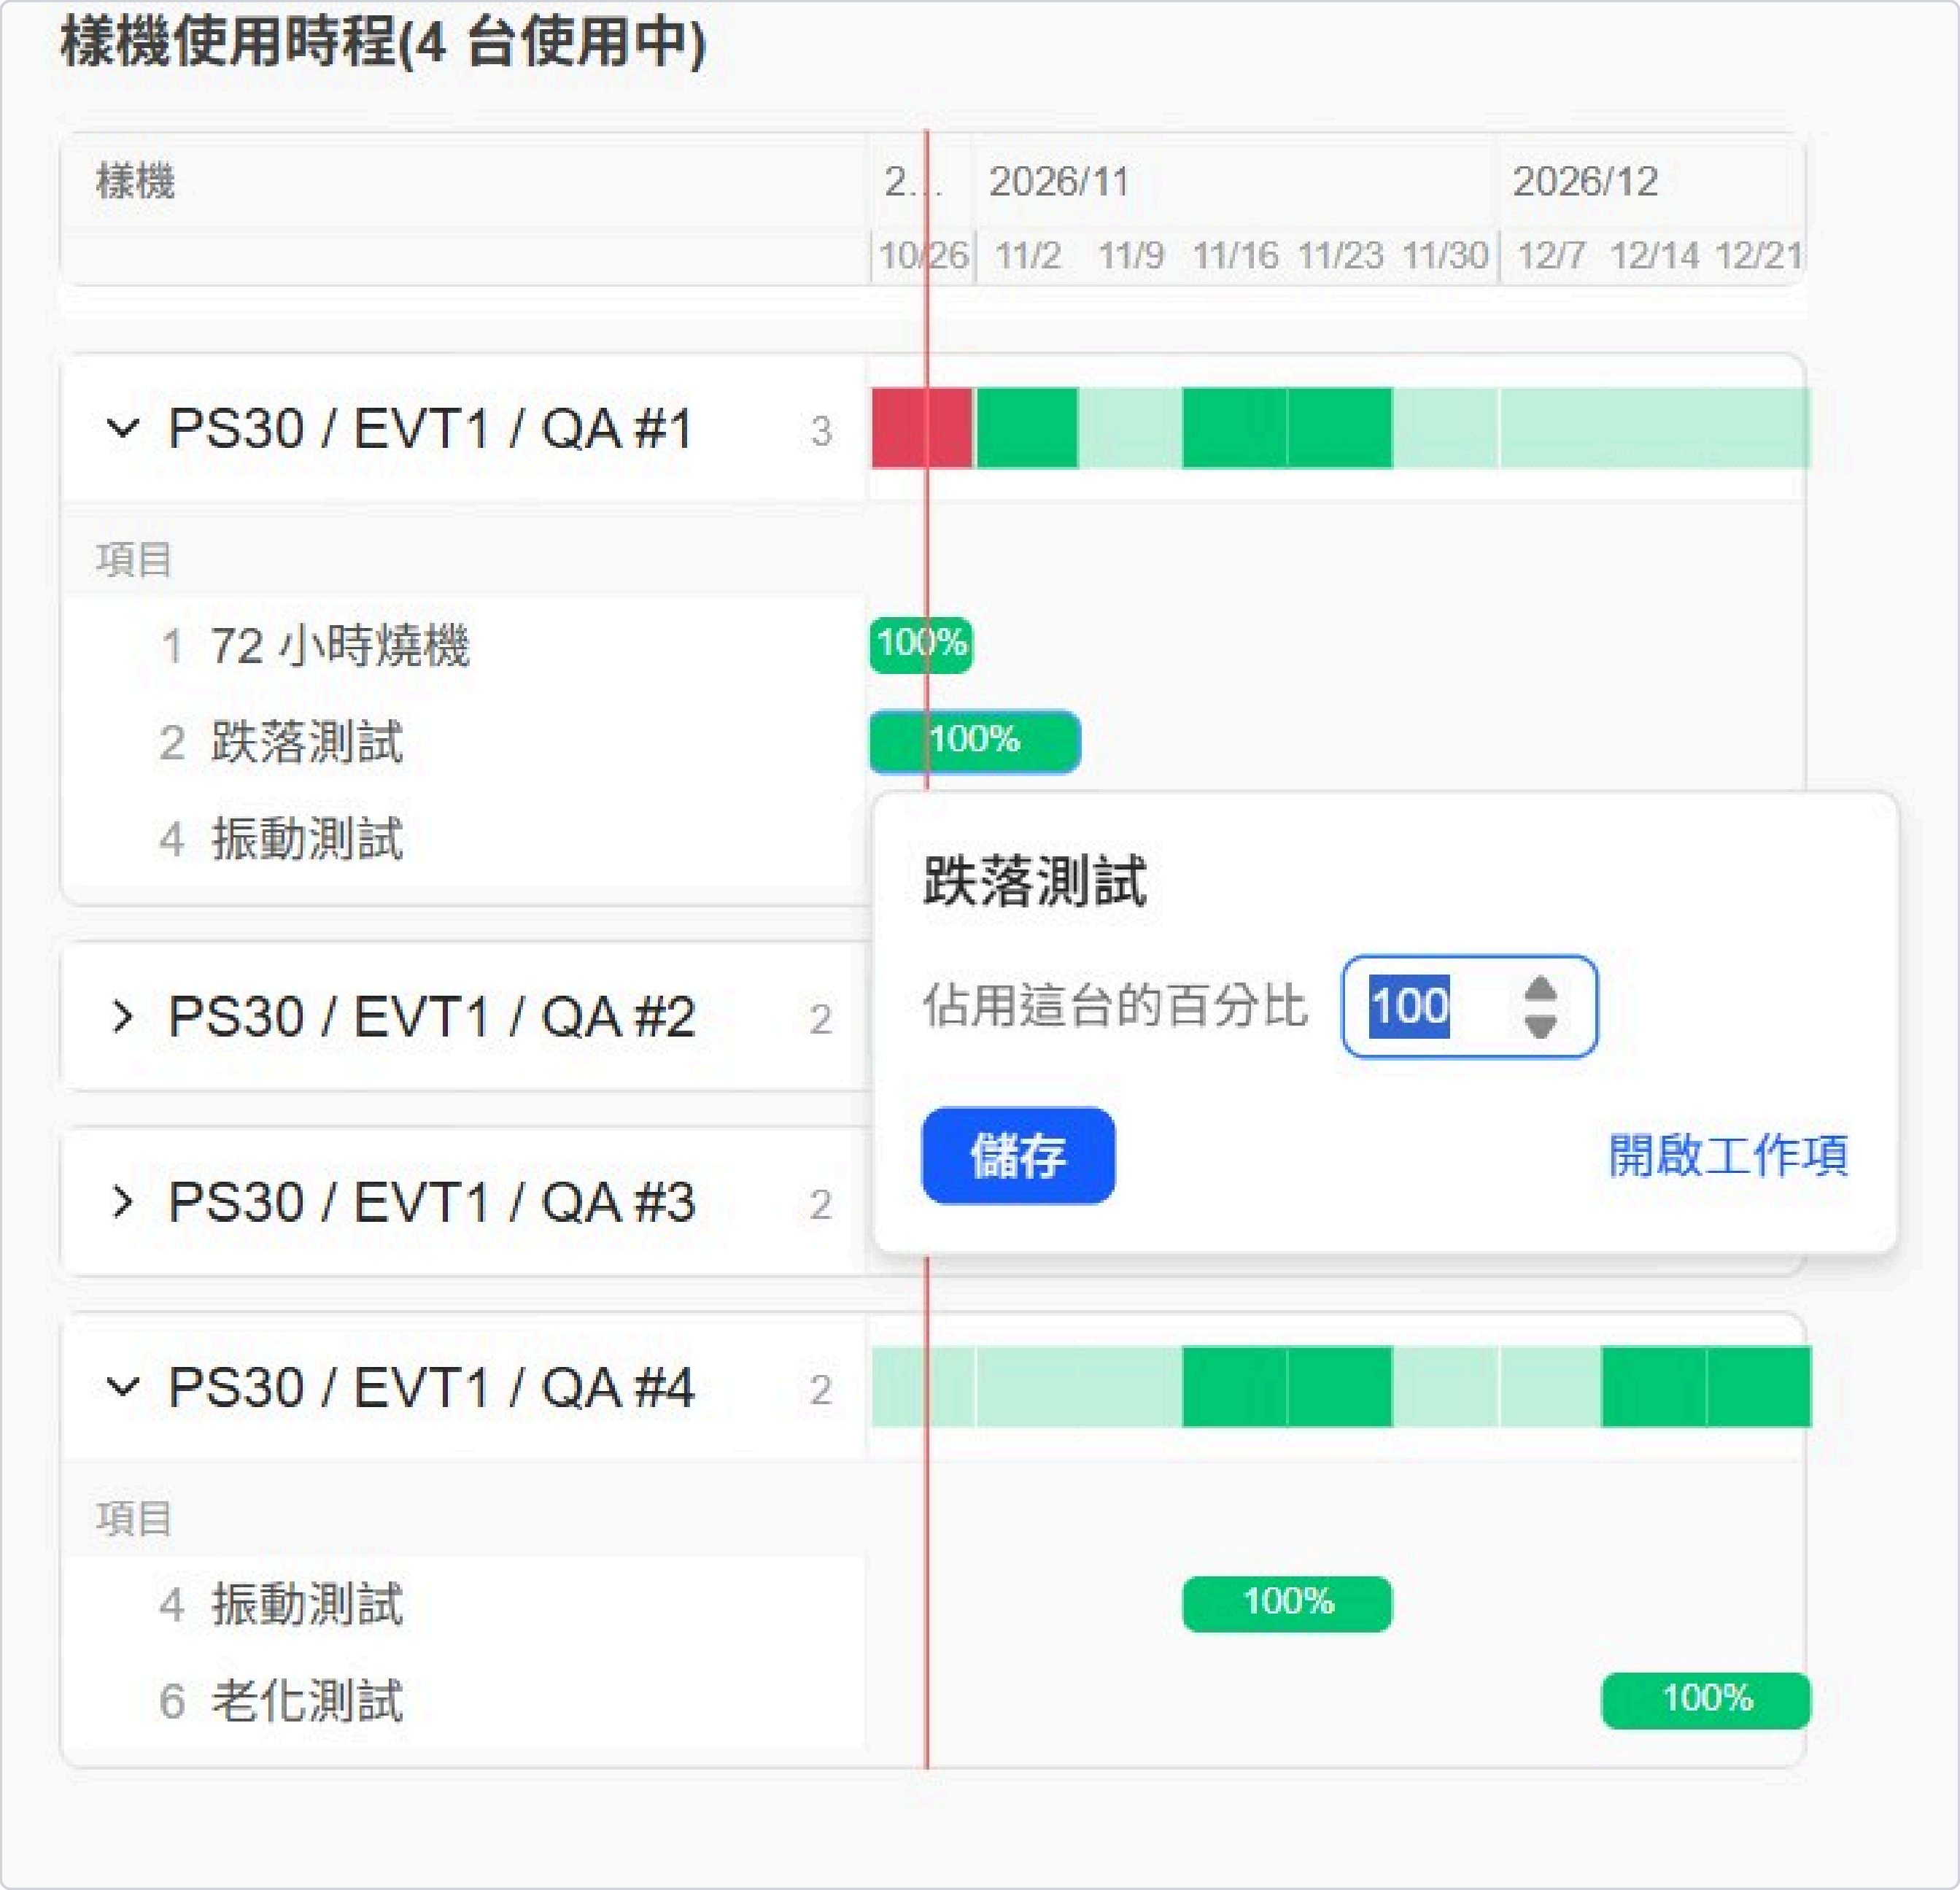
樣機使用時程(4 台使用中)
樣機
2...
2026/11
2026/12
10/26
11/2
11/9
11/16
11/23
11/30
12/7
12/14
12/21
PS30 / EVT1 / QA #1
3
項目
1 72 小時燒機
100%
2 跌落測試
100%
4 振動測試
PS30 / EVT1 / QA #2
2
PS30 / EVT1 / QA #3
2
PS30 / EVT1 / QA #4
2
項目
4 振動測試
100%
6 老化測試
100%
跌落測試
儲存
開啟工作項

佔用這台的百分比 100

- **一次改好幾台**:一個工作項用到好幾台樣機時,小視窗多一個「**這個工作項用到的 N 台樣機都改成這個百分比**」,勾了再按「儲存」就一次全改(活動紀錄只留一筆)。
- **同一天超過 100% 時的提醒**:選樣機、或把百分比調高之後,如果讓某幾天的合計超過 100%,**操作的人**會跳出提醒(寫哪幾天、跟哪幾個工作項重疊、合計最高多少),另外那幾個工作項的**負責人**會收到一則通知(站內,Email 照各人設定,點進去就是他的工作項)。把樣機拿掉、把百分比調低只會讓重疊變少,不會通知;用「上一步 / 下一步」重做同一個選擇也不會再通知一次。

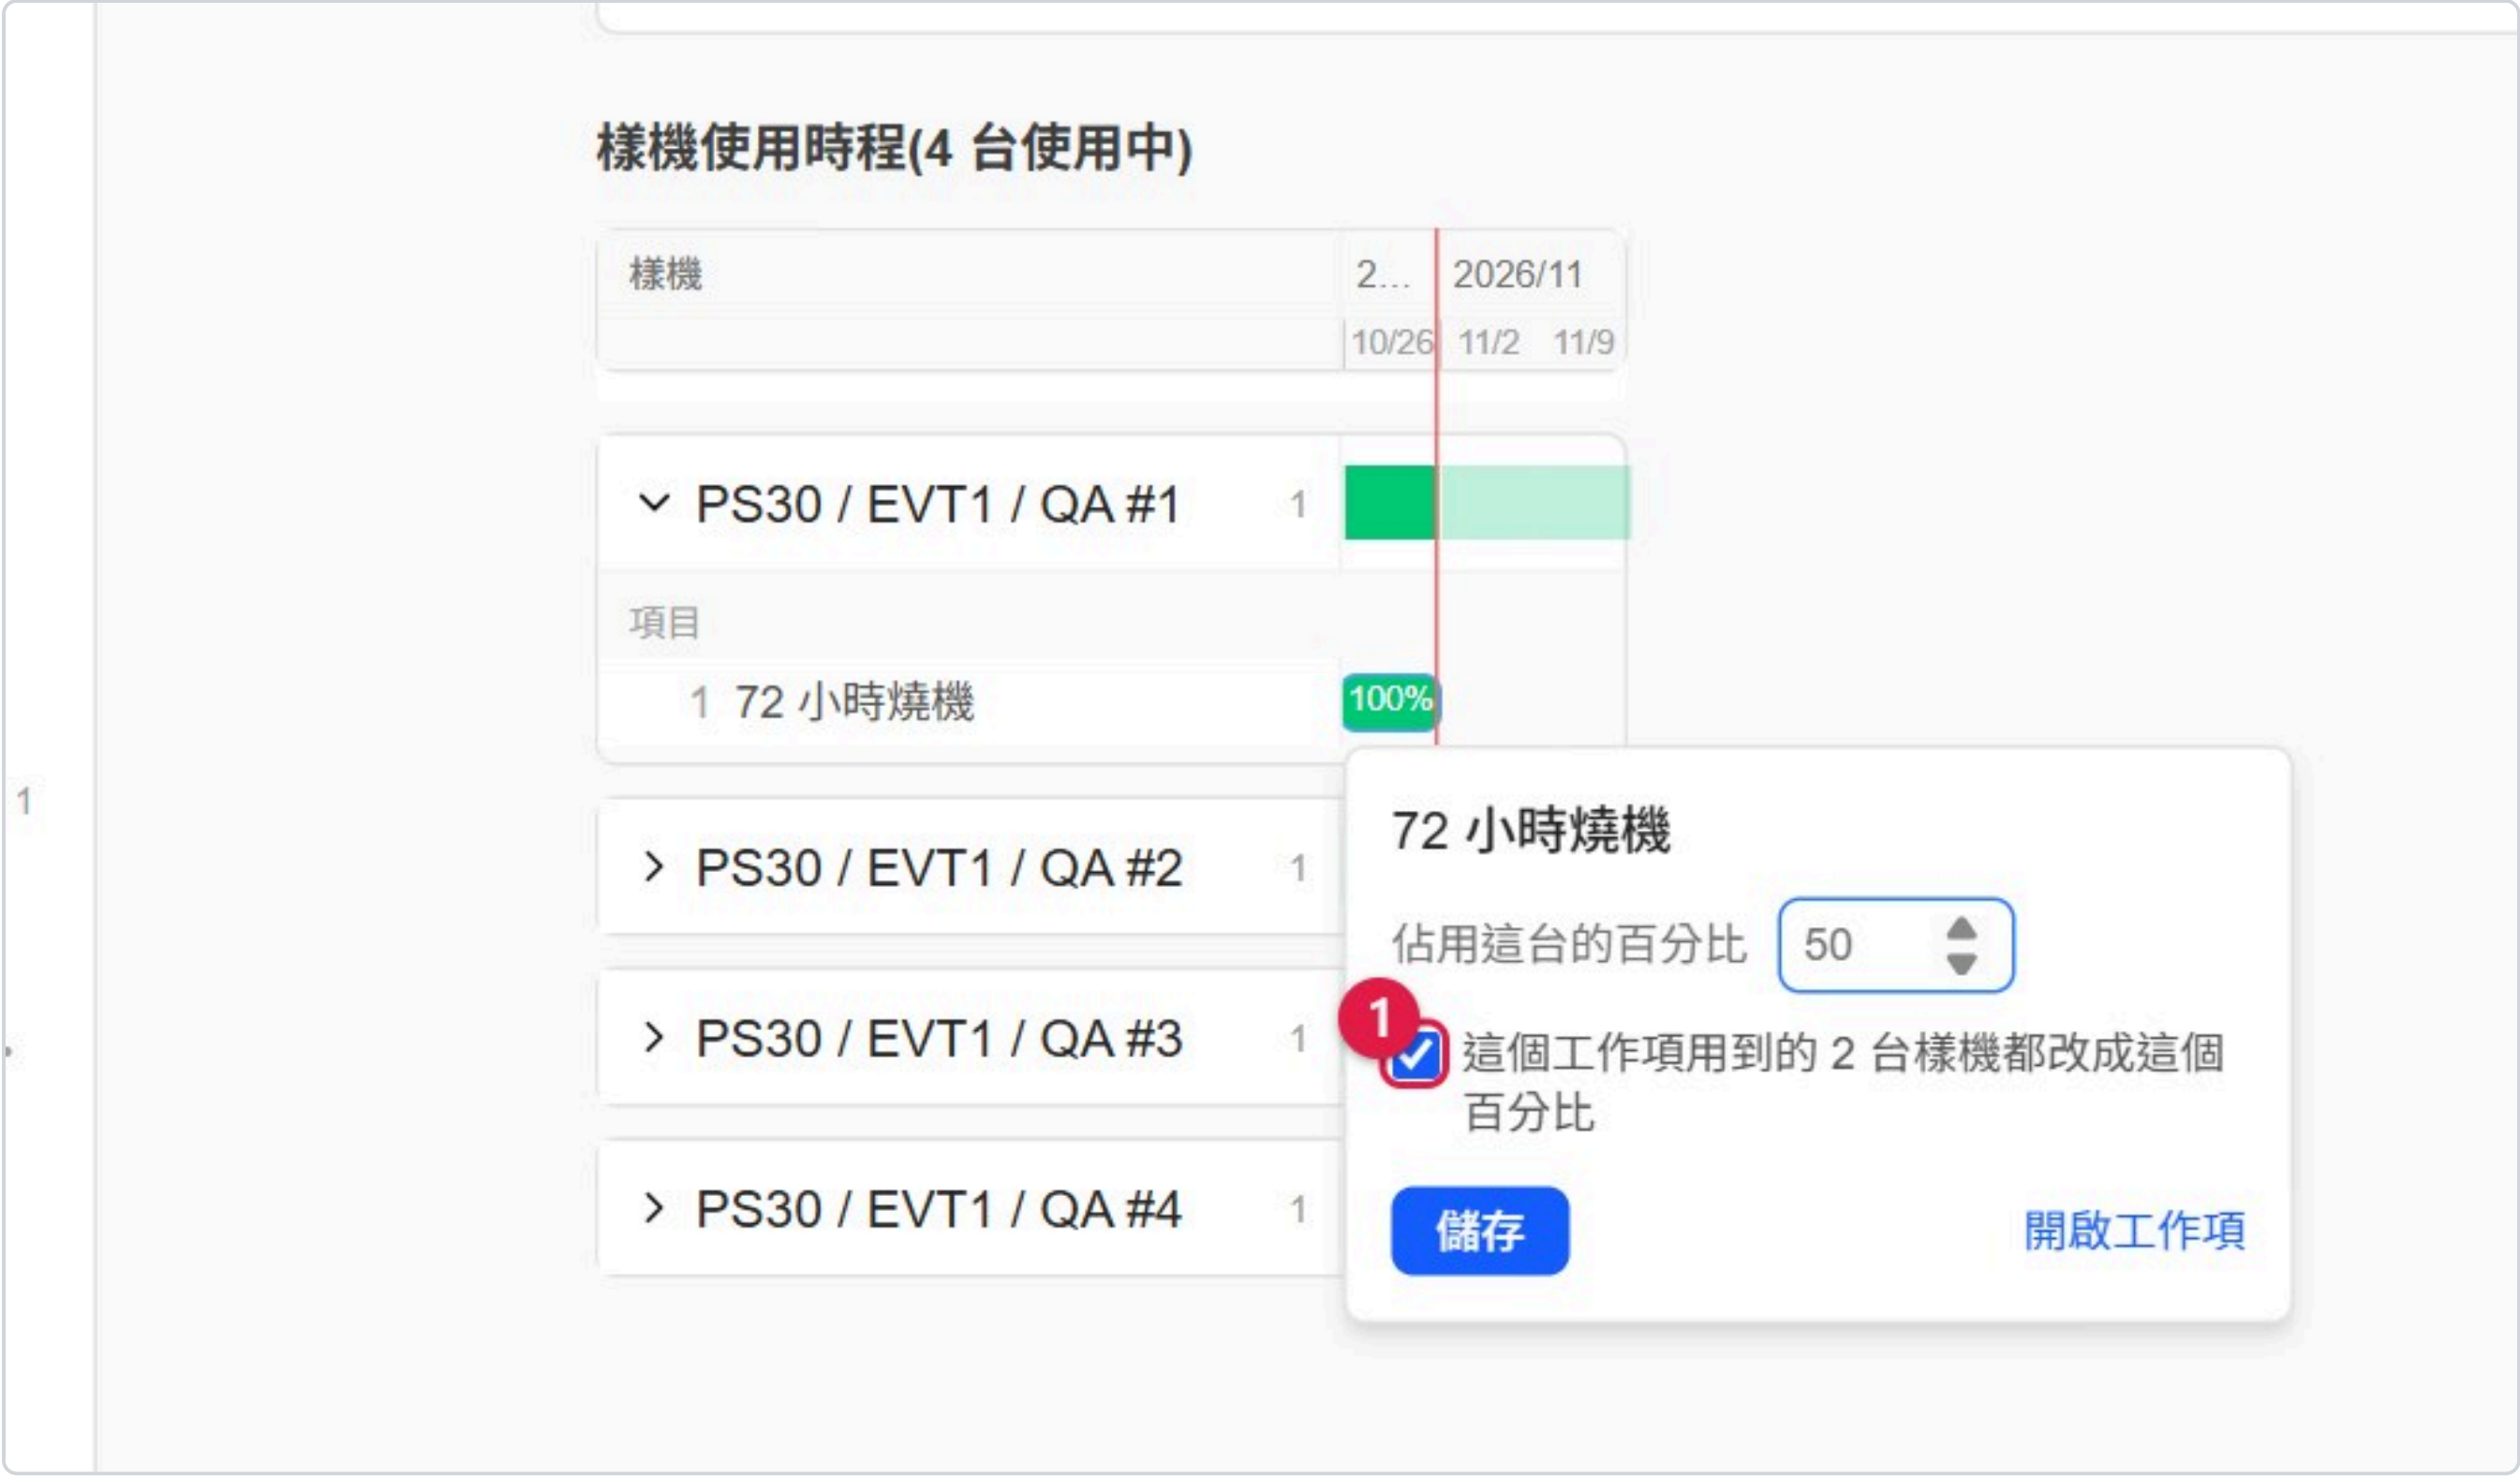
樣機使用時程(4 台使用中)
樣機
2...
2026/11
10/26
11/2
11/9
PS30 / EVT1 / QA #1
1
項目
1 72 小時燒機
100%
PS30 / EVT1 / QA #2
1
PS30 / EVT1 / QA #3
1
PS30 / EVT1 / QA #4
1
1
72 小時燒機
1
儲存
開啟工作項

佔用這台的百分比 50

☑ 這個工作項用到的 2 台樣機都改成這個百分比

- 每週的顏色看的是**那一週最滿的一天**,不是平均,所以週末沒人用不會把重疊稀釋掉;綠色與紅色沿用系統設定的工作量顏色。樣機不用「偏高」的黃色門檻——對一台樣機來說,100% 就是正常的滿載。

16.1 專案儀表板(看板名稱-儀表板)

儀表板分成**子項**。側邊欄「儀表板」底下:**我的儀表板**(上面講的那一頁:你自己的工作項、你團隊的工作項),以及**你在這個看板上有專案角色的每個看板各一個「看板名稱-儀表板」**——例如你帶三個專案,就有三個。沒有專案角色的人,儀表板還是單一個連結。

誰有:在那個看板的任一分組擔任 Team Leader(專案負責人)、PMD(專案 PM)、SW / EE / ME / QA / PM DM(看板層級的角色已經複製到各分組,見第 2 章)。PMM 只是名冊,不算。

看到誰的工作項(每個分組各算各的):

你的角色	專案儀表板裡的範圍
Team Leader、PMD	這個分組**所有人**的工作項(跟他們能調整時程的範圍一樣)
SW / EE / ME / QA / PM DM	你那個職能在這個分組的「**實作成員**」名單上的人,**加上你自己**。跟名單外的人共同負責的項目也算,但名單外的人不會在人員清單裡單獨列出
管理者	不會出現在側邊欄,但可以用網址(`/dashboard/project/看板編號`)看任何專案的所有人

同時是 Team Leader 又是別組的 DM:A 組整個分組、B 組只有你的組員。沒有角色的人用網址進去會看到「找不到頁面」。

內容:

- 標題寫「**看板名稱-儀表板**」,下面一行說明你的角色與範圍。

- **逾期 / 本週完成 / 未來 7 天**:三顆數量,有工作項沒人負責(Team Leader / PMD 才看得到)時多一顆「沒有人負責」。下面三份清單列出這個範圍裡的工作項,每一列有日期、WBS 與名稱、分組、負責人,**點一列到看板打開那個項目**。算法跟「我的儀表板」的「待辦事項到期清單」完全一樣。
- **未結案的風險與議題**(在最上面):這個專案風險登記冊裡**還沒結案**的風險與議題(含 Mantis 同步來的),格式跟「我的儀表板」的同名區塊一樣:分數、類型、標題、狀態、負責人、到期日(逾期標紅),點一筆跳到看板的風險分頁。風險登記冊本來就是看板成員都看得到,所以**每種專案角色看到的都是整個專案的**;預設看「全部」,按「與我有關」只看你負責的(DM 連組員負責的一起算)。
- **各人員時程**:每個人一列,寫他進行中、逾期、未來 7 天、本週完成各幾項,以及沒完成的項目最早開始到最晚完成的範圍(沒有排程寫「沒有排程」);**逾期最多的排在最前面**。點開一個人,列出他每一項的起訖日與狀態(逾期 / 進行中 / 未開始 / 已完成),沒排程的寫「未排程」。
- **樣機使用時程**(在最下面):這個專案每一台有工作項在使用的樣機,以及用它的工作項與佔用百分比,格式跟「我的儀表板」的同名區塊一樣(見上面的說明)。
- 沒有「開始日期」與「天數」欄位的看板(沒辦法排時程),清單是空的,各人員只有項目數。
- 受「系統設定」的「DM 的可見範圍」影響:被限制的 DM 看不到的工作項,專案儀表板也不會算進去(Team Leader、PMD 不受限)。

工作量怎麼算:

- 有「人員分配」的人,照人員分配裡設的百分比算(第 9.6 節,最小 1%)。
- 只掛在「負責人」欄位、沒有人員分配的人,仍然是這個項目的負責人(出現在他的工作項、逾期清單與週報),工作量算**預設比例**——系統預設 **2%**,管理者可以在「系統設定 → 負責人預設工作量」調整;設成 0 就完全不計入。
- 想讓負責人的工作量更精確,在項目卡片或點甘特圖長條開出的視窗裡,**負責人旁邊有選填的「工作量 %」**:填了就會把他加進這個項目的人員分配、設定那個百分比;不填就用預設比例。清空那一格不會刪除人員分配,要移除請到「人員分配」。

---

17. 工時

側邊欄「工時」,有兩個分頁:「我的工時」是**週行事曆**,「統計」看彙總。工時分兩種,算不算進專案成本的規則不一樣:

- **專案工作項的工時**(掛在指派給你的工作項上):要**核准**才會計入專案成本。
- **會議與其他的工時**(例行會議、部門週會、請假、出差……):預設登記就生效。但如果選了「**對應專案**」(例如為了某個專案開的例行會議、出差交通),就跟專案工時一樣要核准,核准後才計入**那個專案**的成本。

17.1 我的工時(週行事曆)

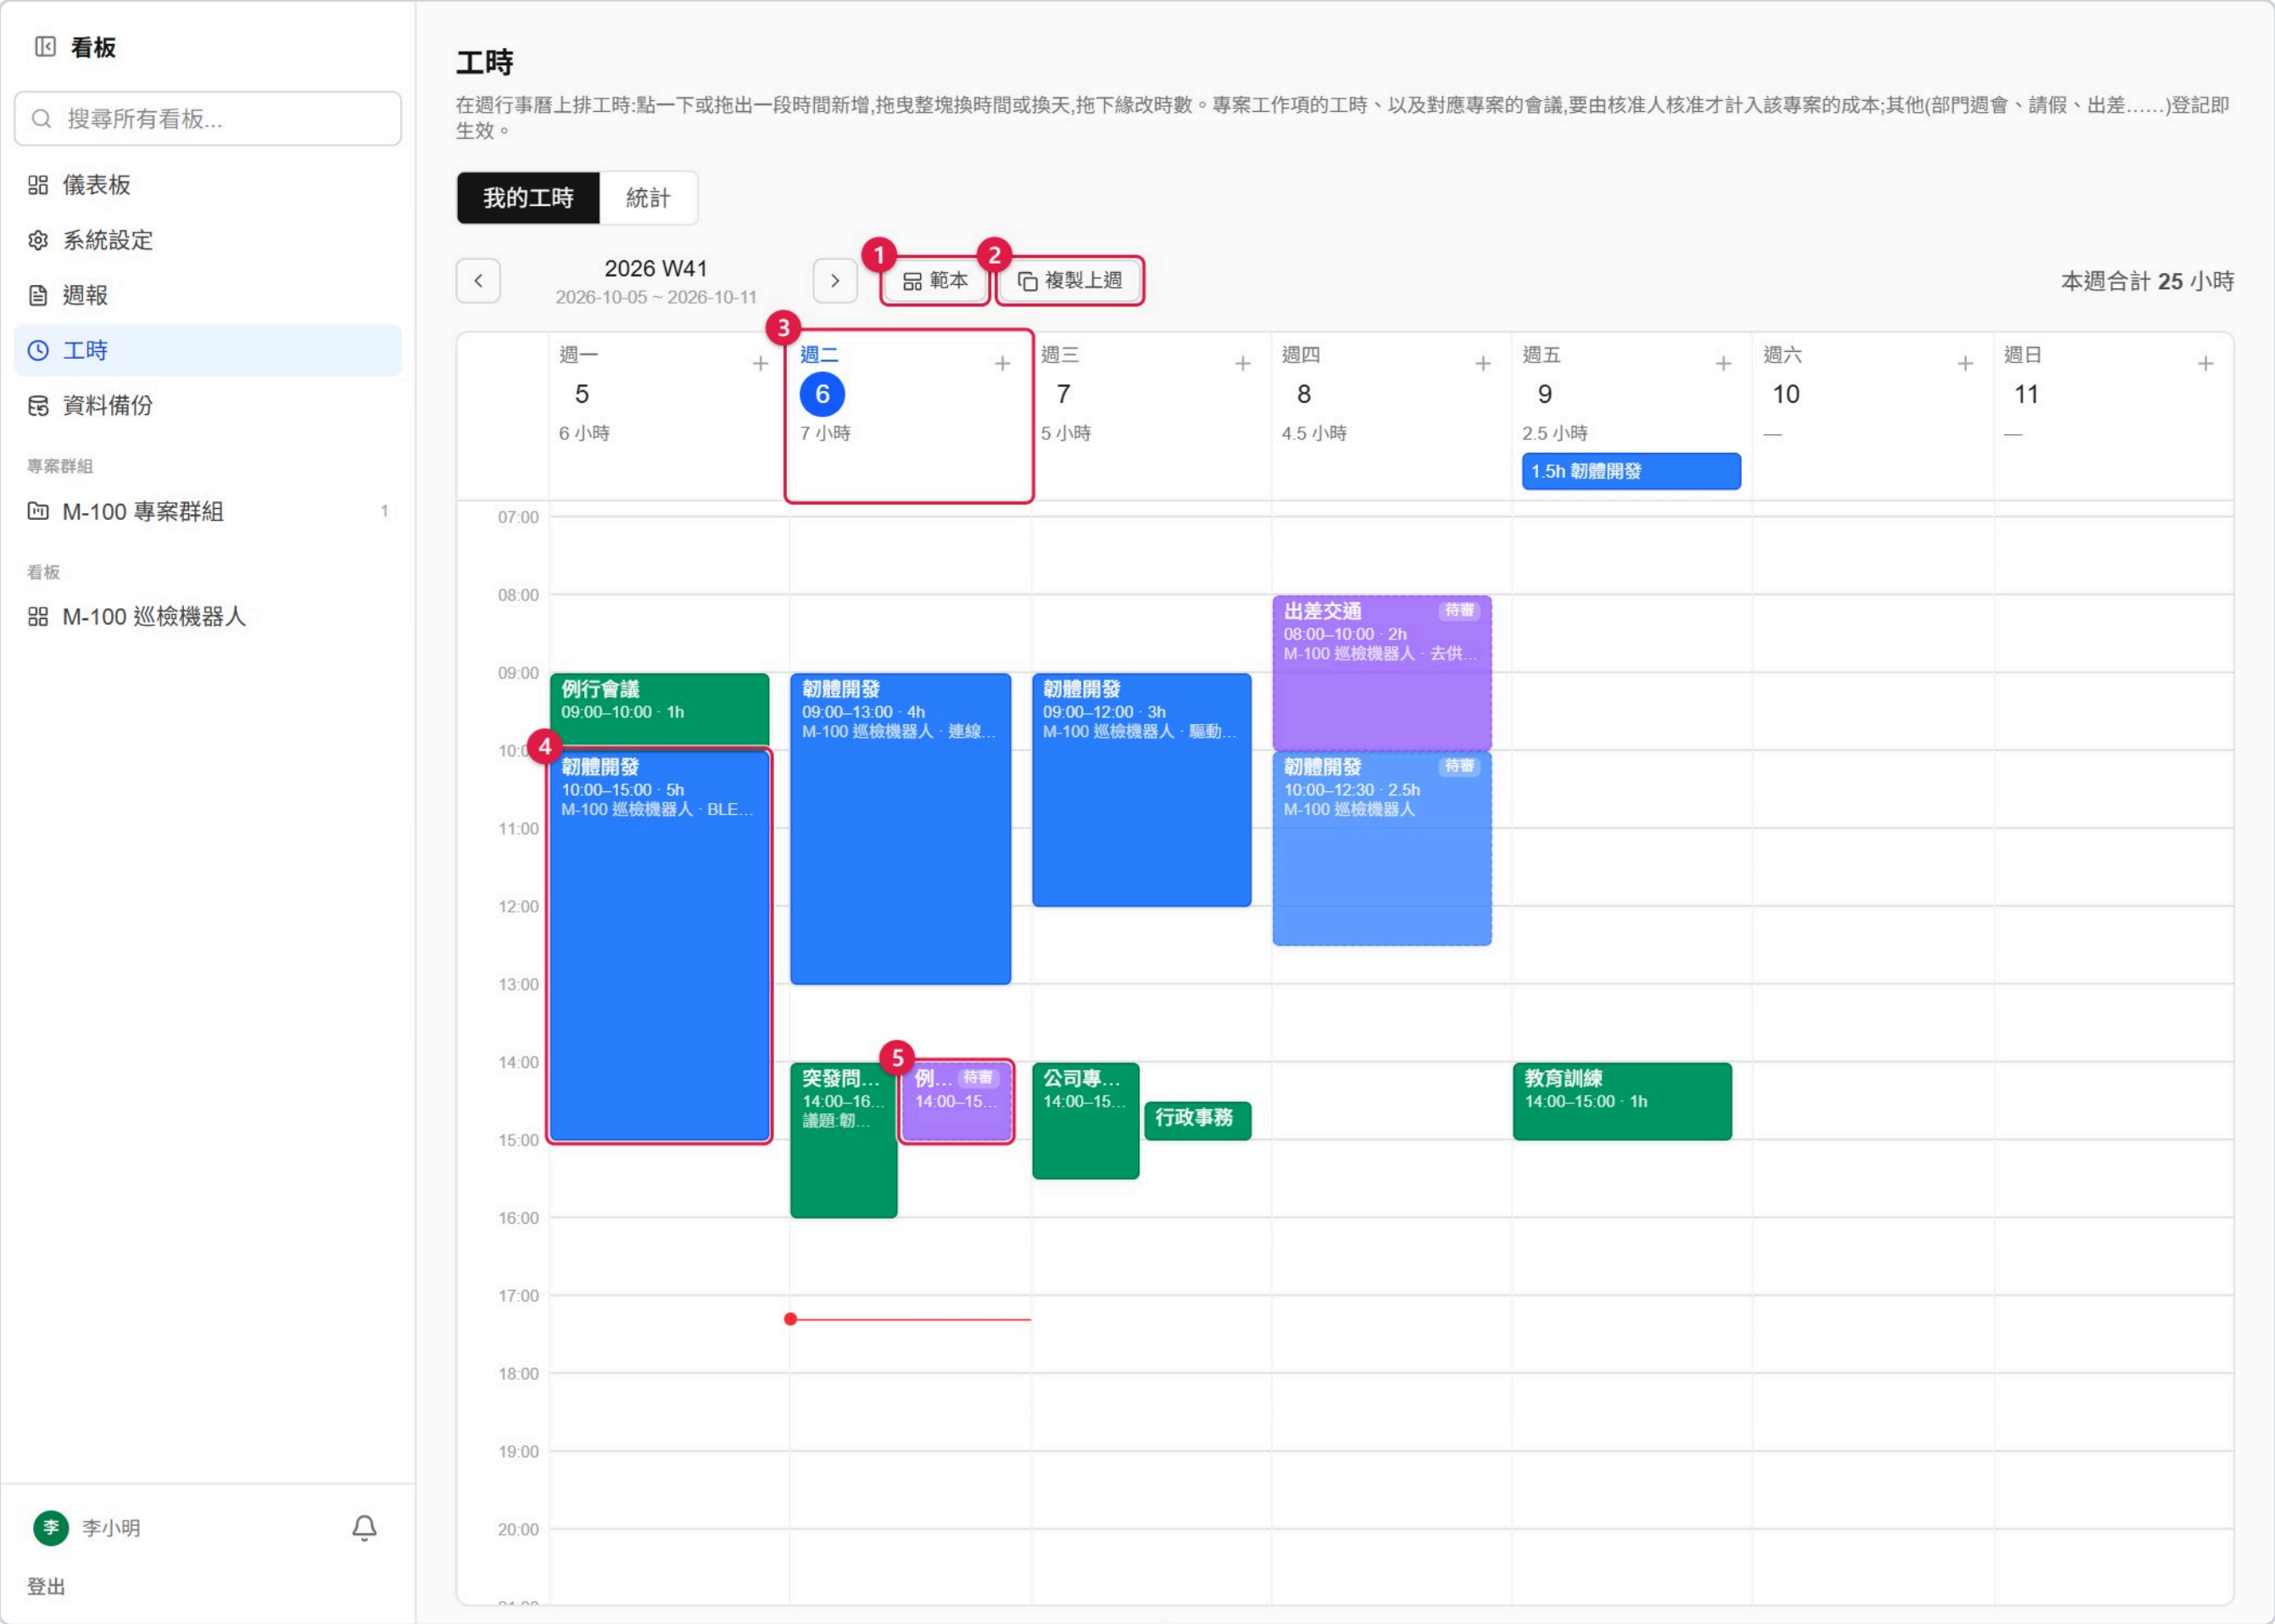
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
週報
工時
資料備份
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
M-100 巡檢機器人
李小明
登出

工時

在週行事曆上排工時:點一下或拖出一段時間新增,拖曳整塊換時間或換天,拖下緣改時數。專案工作項的工時、以及對應專案的會議,要由核准人核准才計入該專案的成本;其他(部門週會、請假、出差……)登記即生效。

我的工時
統計
2026 W41
2026-10-05 ~ 2026-10-11
1
範本
2
複製上週
本週合計 25 小時
3
週一 5 6 小時
週二 6 7 小時
週三 7 5 小時
週四 8 4.5 小時
週五 9 2.5 小時
1.5h 韌體開發
週六 10 —
週日 11 —
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
例行會議
09:00–10:00 · 1h
4
韌體開發
10:00–15:00 · 5h
M-100 巡檢機器人 · BLE…
韌體開發
09:00–13:00 · 4h
M-100 巡檢機器人 · 連線…
韌體開發
09:00–12:00 · 3h
M-100 巡檢機器人 · 驅動…
出差交通
待審
08:00–10:00 · 2h
M-100 巡檢機器人 · 去供…
韌體開發
待審
10:00–12:30 · 2.5h
M-100 巡檢機器人
突發問…
14:00–16…
議題:韌…
5
例…
待審
14:00–15…
公司專…
14:00–15…
行政事務
教育訓練
14:00–15:00 · 1h

- 一週一個畫面,每天一欄、左邊是時間軸。① 「範本」「複製上週」見 17.3;右上角是本週合計小時;左右箭頭切換週,「回到本週」跳回今天。
- ③ 每個日期底下顯示**這一天已登記的小時**(被退回的不算);舊的、沒有排時間的紀錄會列在日期底下(「未排時間」)。
- **新增**:在空白處**點一下**(從那一格排一小時),或**拖出一段時間**;也可以按日期旁的「+」登記一筆不排時間的。
- **修改**:④ 點一筆開啟編輯或刪除;**拖曳整塊**換時間或換天;**拖下緣**改時數(以 15 分鐘為單位)。已經核准、會計入成本的工時改了日期或時數,會重新送審,拖曳前會先問你。
- 時段重疊的會並排顯示;每天欄位的最右邊留一條空白,可以在已有工時的時段旁再拖出新的一筆。

- **重複**(例行會議):新增時在登記表單選「**重複**」——「每週」(選星期幾,有「工作日」快速鍵)或「每月同一天」,再選「重複到」哪一天,下面會預覽共幾筆,按「登記 N 筆」一次建立。每一筆都照一般登記:對應專案的要核准、一天超過 24 小時的那天會被略過並說明、同一天已經有一樣的不重複建立。一次最多 120 筆、範圍不超過 400 天。用重複建立的在行事曆上有「↻」標記,開啟其中一筆可以按「**刪除這筆及之後的重複**」一次刪掉它和之後同一批的(之前的保留);要改內容就逐筆改,或刪掉重建。每週固定的會議也可以改用 17.3 的範本。

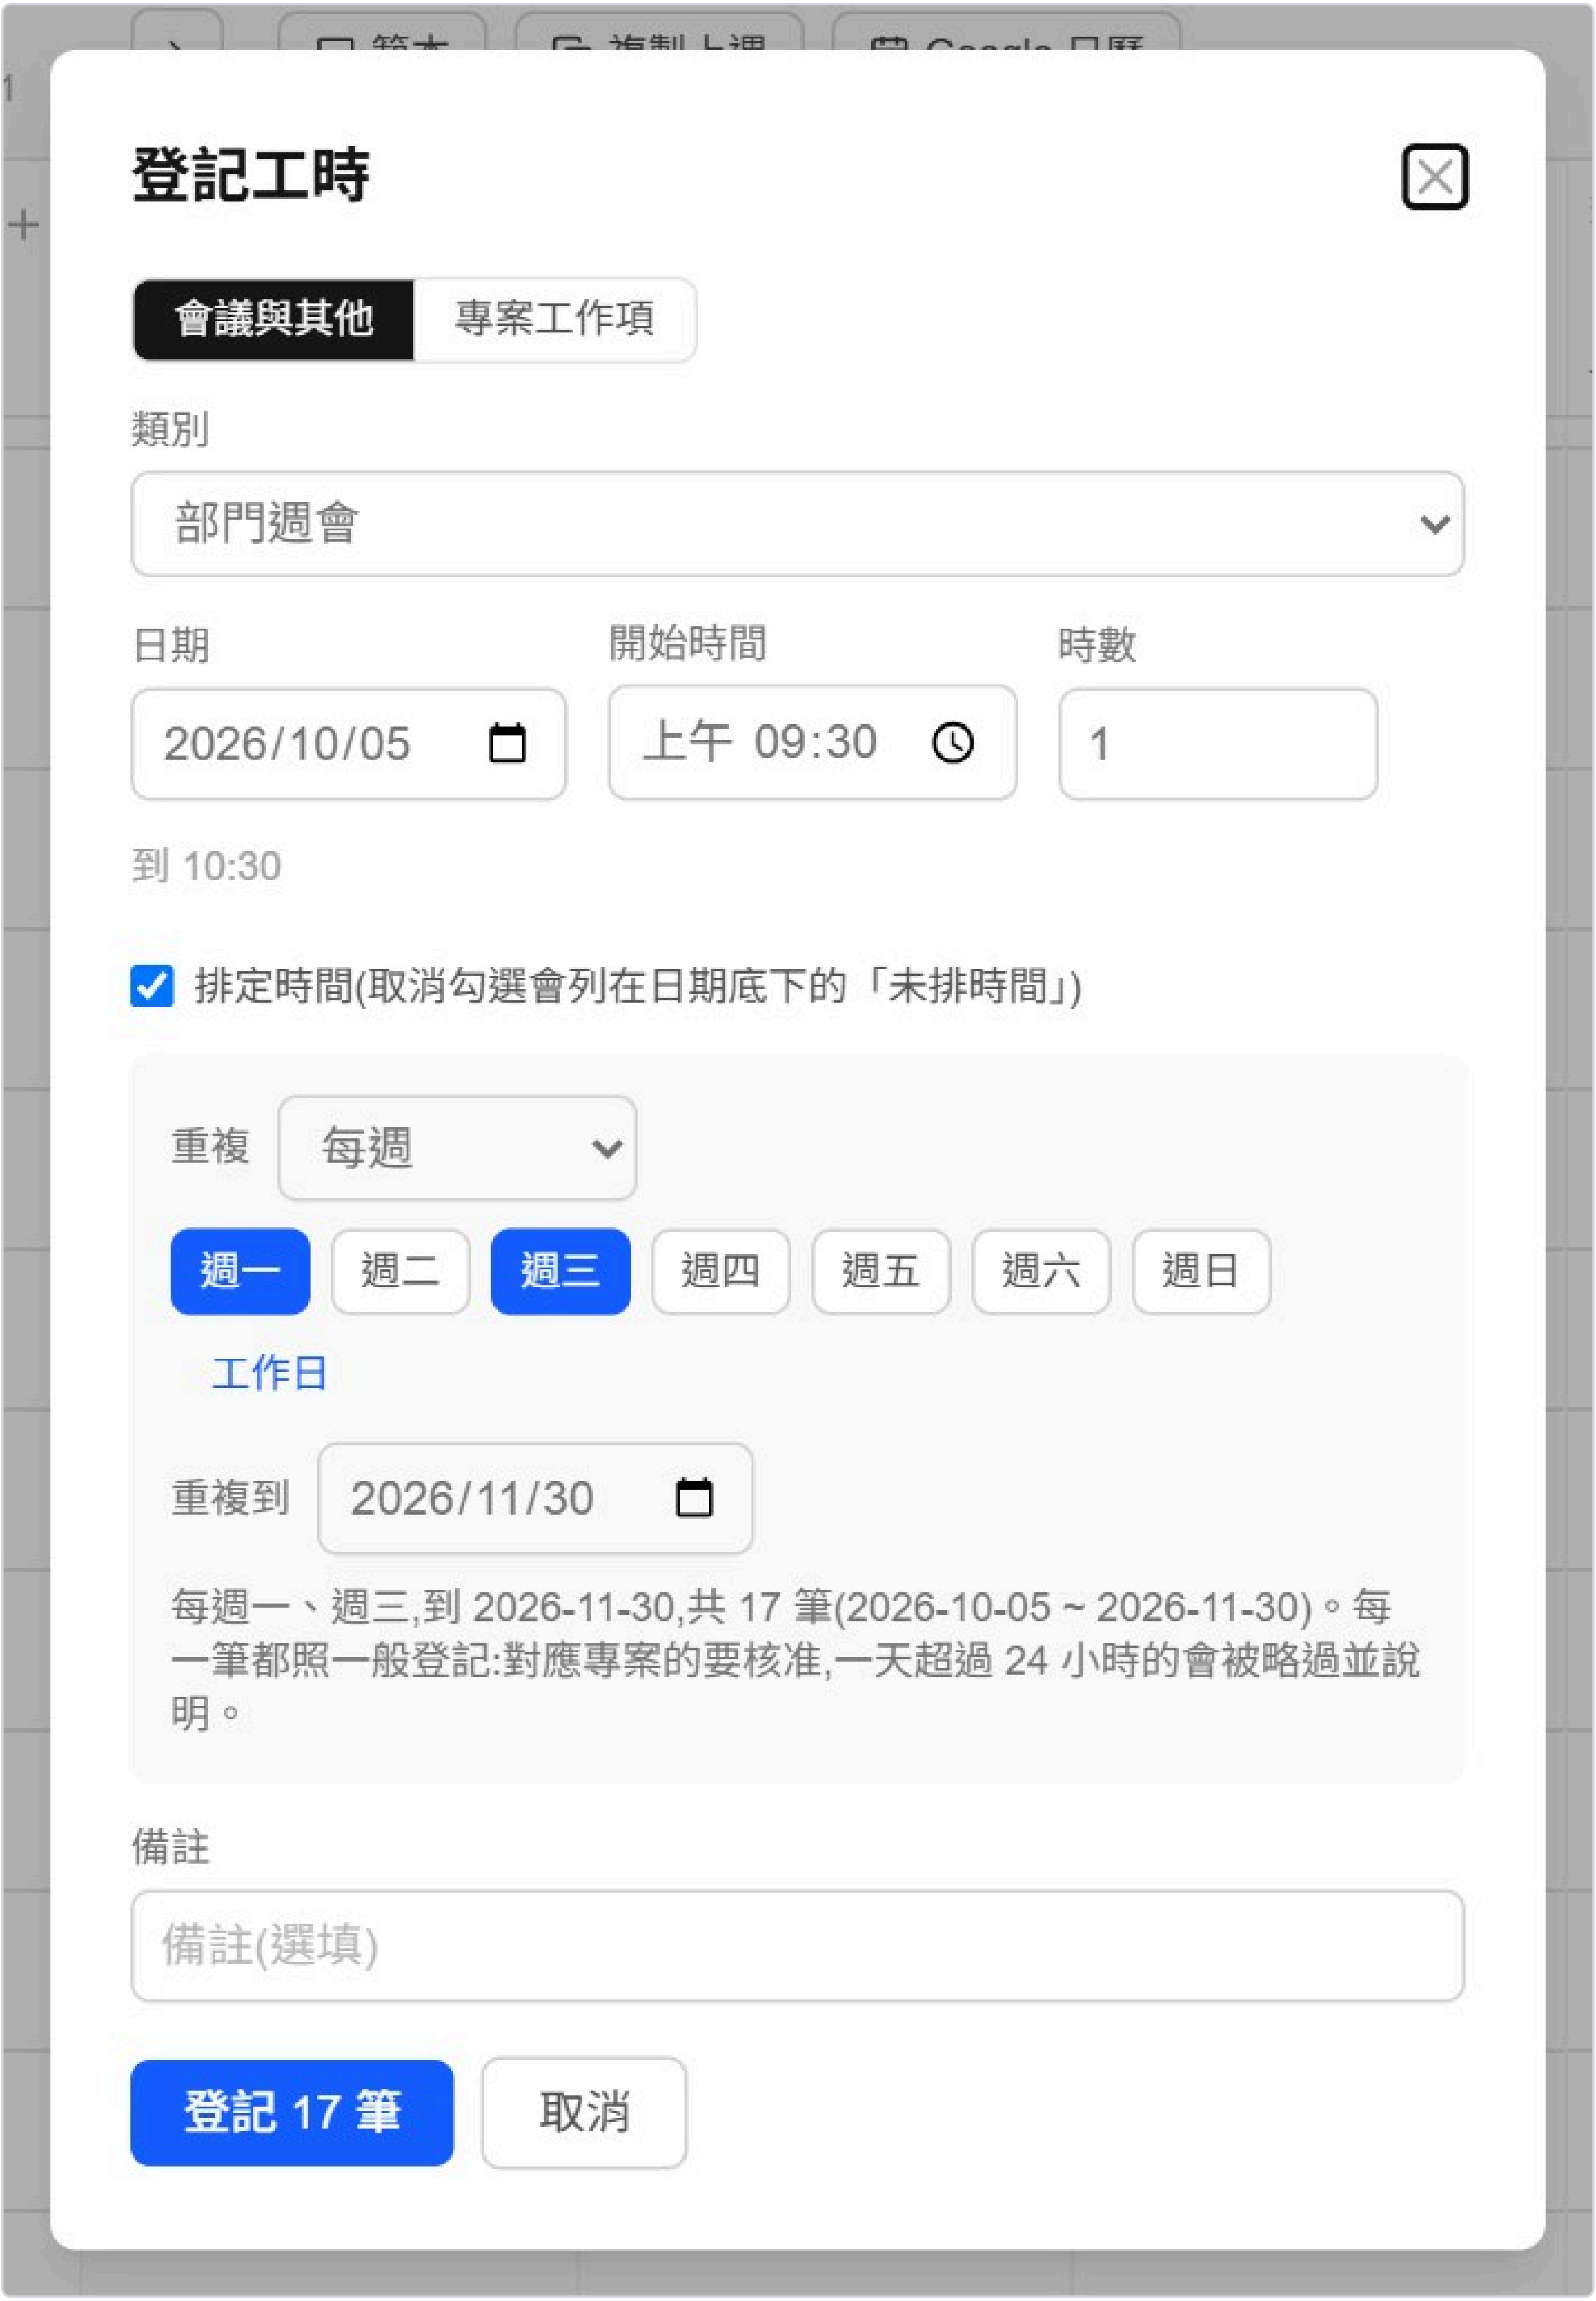

登記工時

會議與其他
專案工作項

類別：部門週會

日期：2026/10/05

開始時間：上午 09:30

時數：1

到 10:30

☑ 排定時間(取消勾選會列在日期底下的「未排時間」)

重複：每週

週一
週二
週三
週四
週五
週六
週日
工作日

重複到：2026/11/30

每週一、週三,到 2026-11-30,共 17 筆(2026-10-05 ~ 2026-11-30)。每一筆都照一般登記:對應專案的要核准,一天超過 24 小時的會被略過並說明。

備註：備註(選填)

登記 17 筆
取消

- **顏色**:藍色是專案工作項、紫色是對應專案的會議(要核准)、綠色是其他;**虛線框 = 待審**,紅色 = 已退回。一天合計不能超過 **24 小時**。

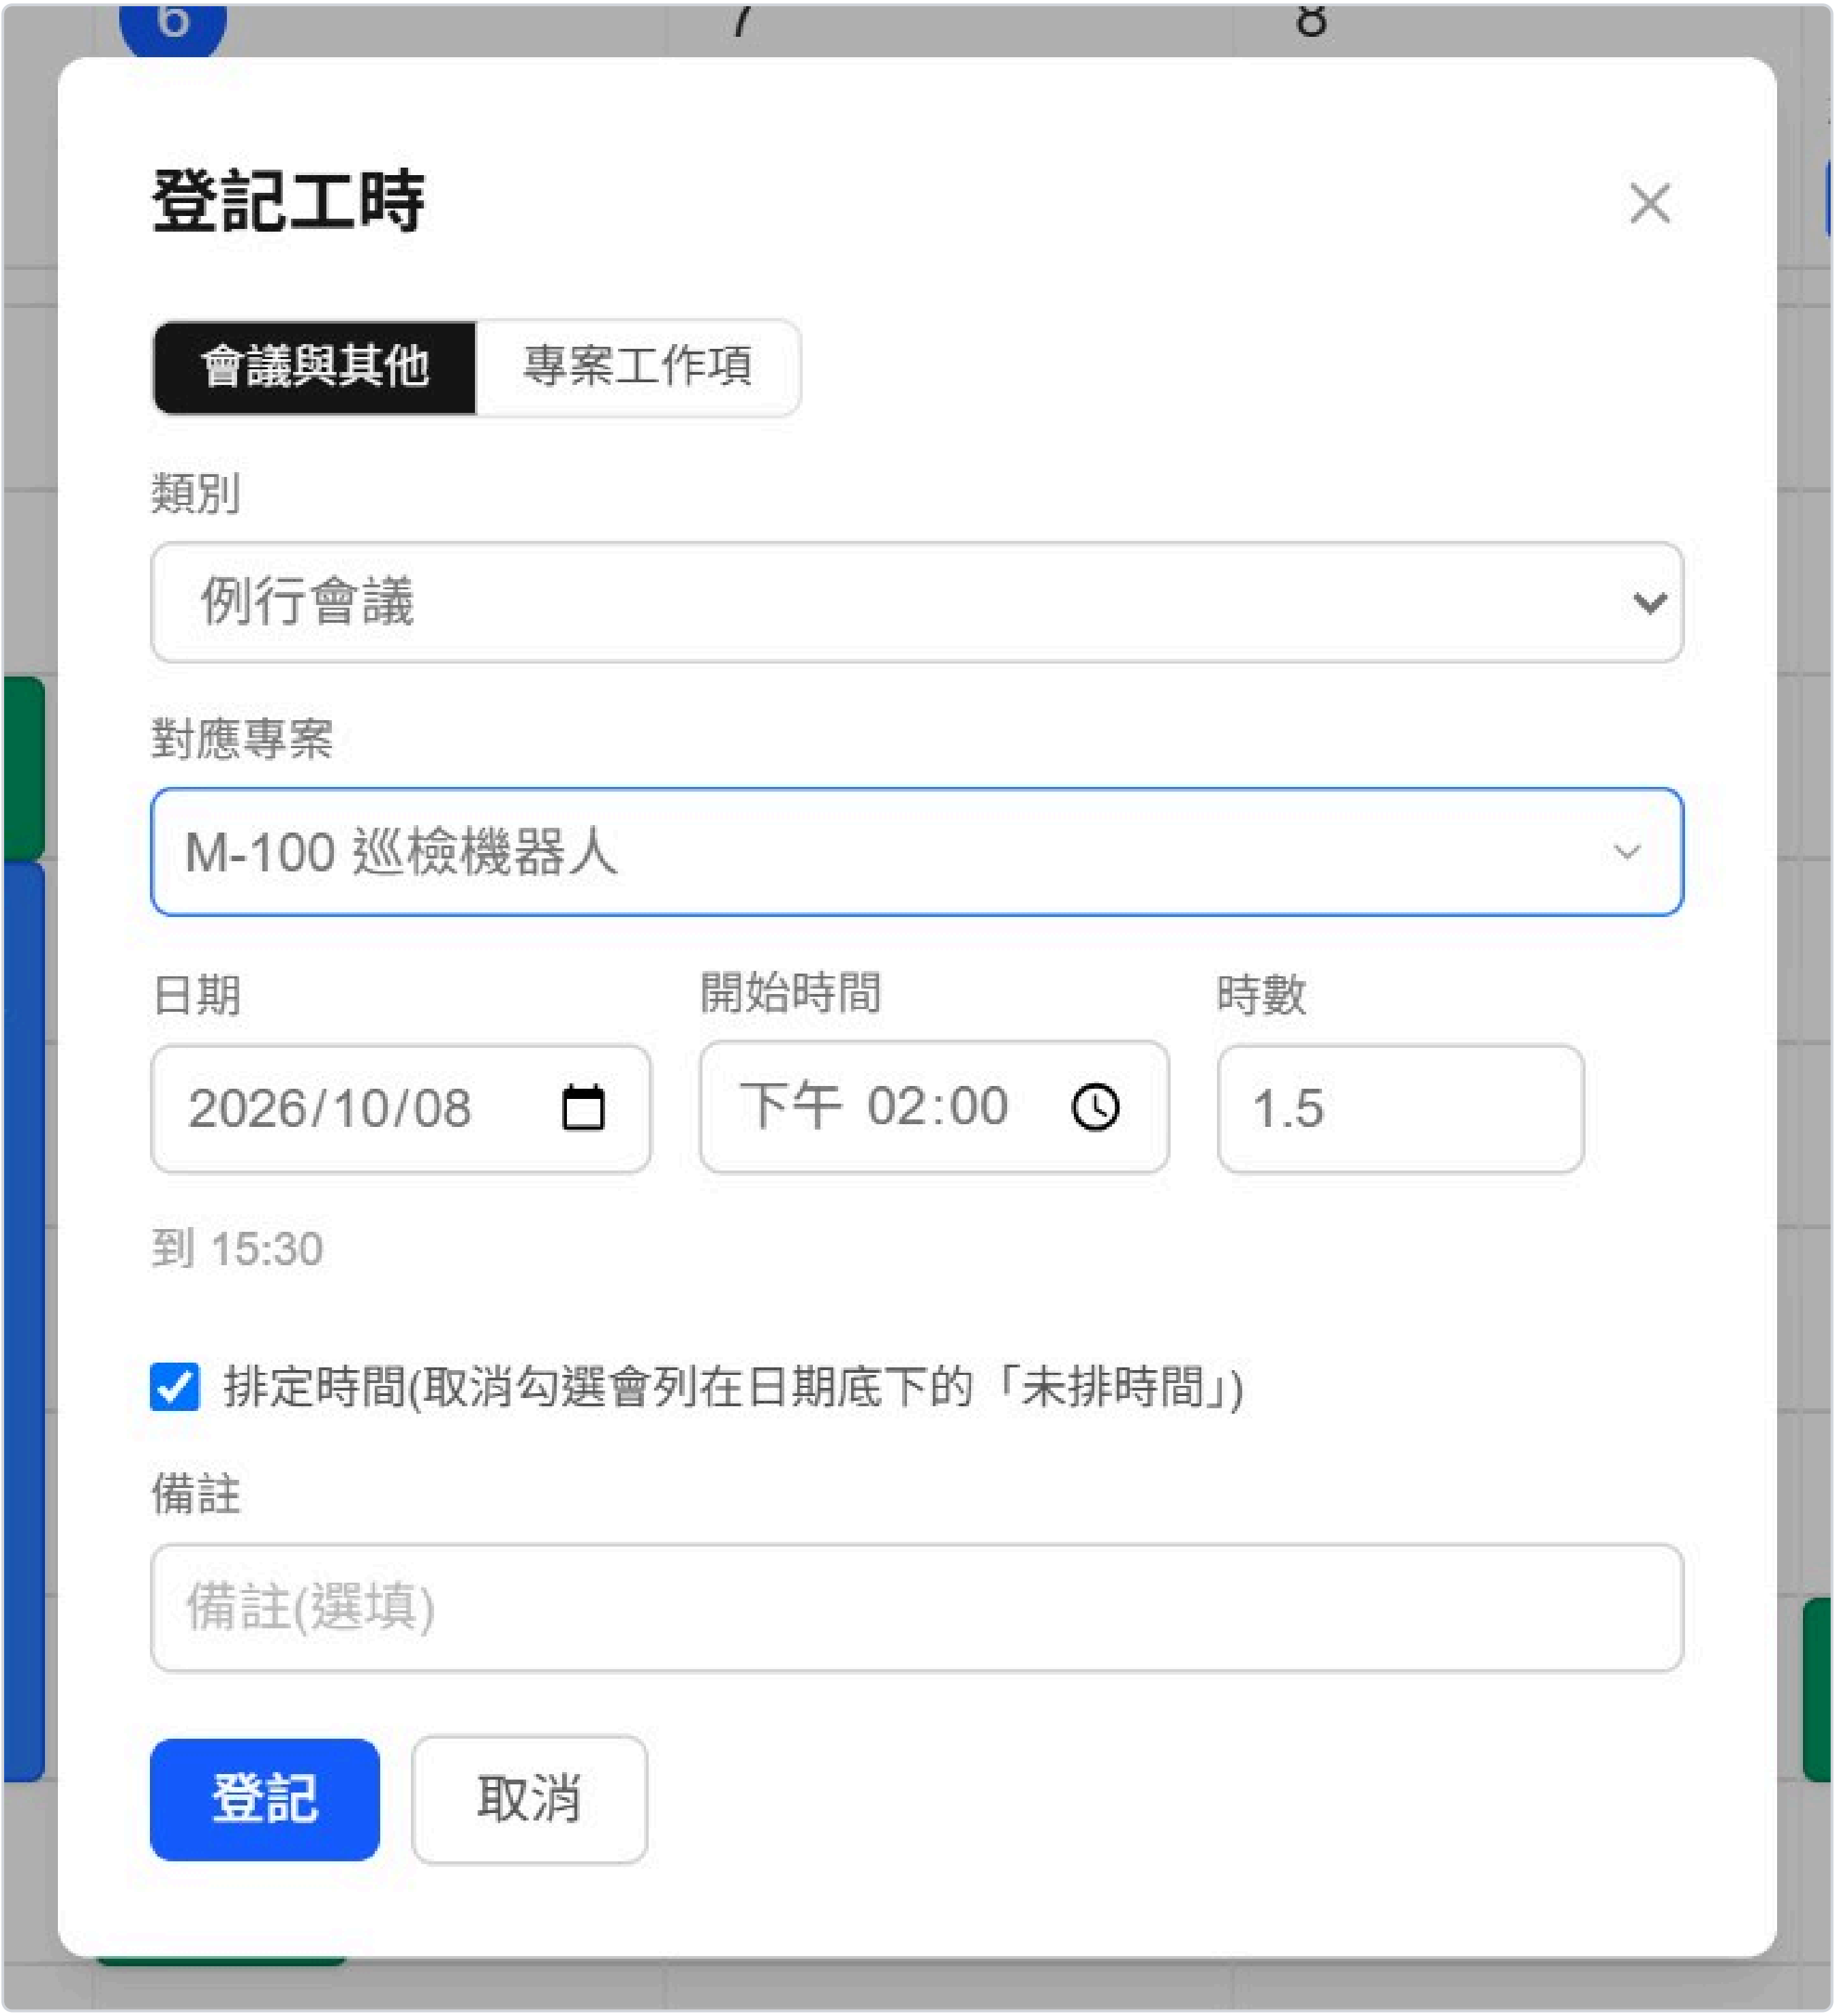

登記工時

類別: 例行會議

對應專案: M-100 巡檢機器人

日期: 2026/10/08

開始時間: 下午 02:00

時數: 1.5

到 15:30

☑ 排定時間(取消勾選會列在日期底下的「未排時間」)

備註: 備註(選填)

- 登記表單:上面切換「**會議與其他**」或「**專案工作項**」。工作項只列指派給你的(也可以到項目卡片的「工時與費用」登記)。
- **類別**預設有:例行會議、突發問題處理、教育訓練、行政事務、其他,以及**部門週會、公司專案週會、請假、出差、出差交通**(管理者可以在系統設定的「工時類別」增減,並決定哪些類別可以選「對應專案」——部門週會、公司專案週會、請假這類不屬於任何專案的,就不開)。「突發問題處理」可以**連結風險登記冊裡的風險或議題**(包含從 Mantis 同步來的議題,選單裡標「Mantis #編號」,可以直接打編號或標題搜尋)。這裡的「請假」只是工時類別,**不會**跟「請假」模組連動。

- 開始時間可以取消勾選「排定時間」,時數以 0.25 小時為單位。
- **備註欄會記得你以前寫過的**:點進備註欄(或開始打字),下面列出你以前登記工時時寫過的備註——這次選的工作項或類別用過的、用得多的排前面;可以打關鍵字過濾(多個關鍵字用空白隔開),用 ↑ ↓ 加 Enter 或直接點一下就填入,Esc 關掉建議。只會列出**你自己**的備註。

待審與核准人:⑤ 待審的工時開啟後,會寫出**誰可以核准**。誰核准的、用什麼身分核准的,都會記錄下來(已核准的會寫「已核准・某某」,退回的帶退回原因)。誰能核准:

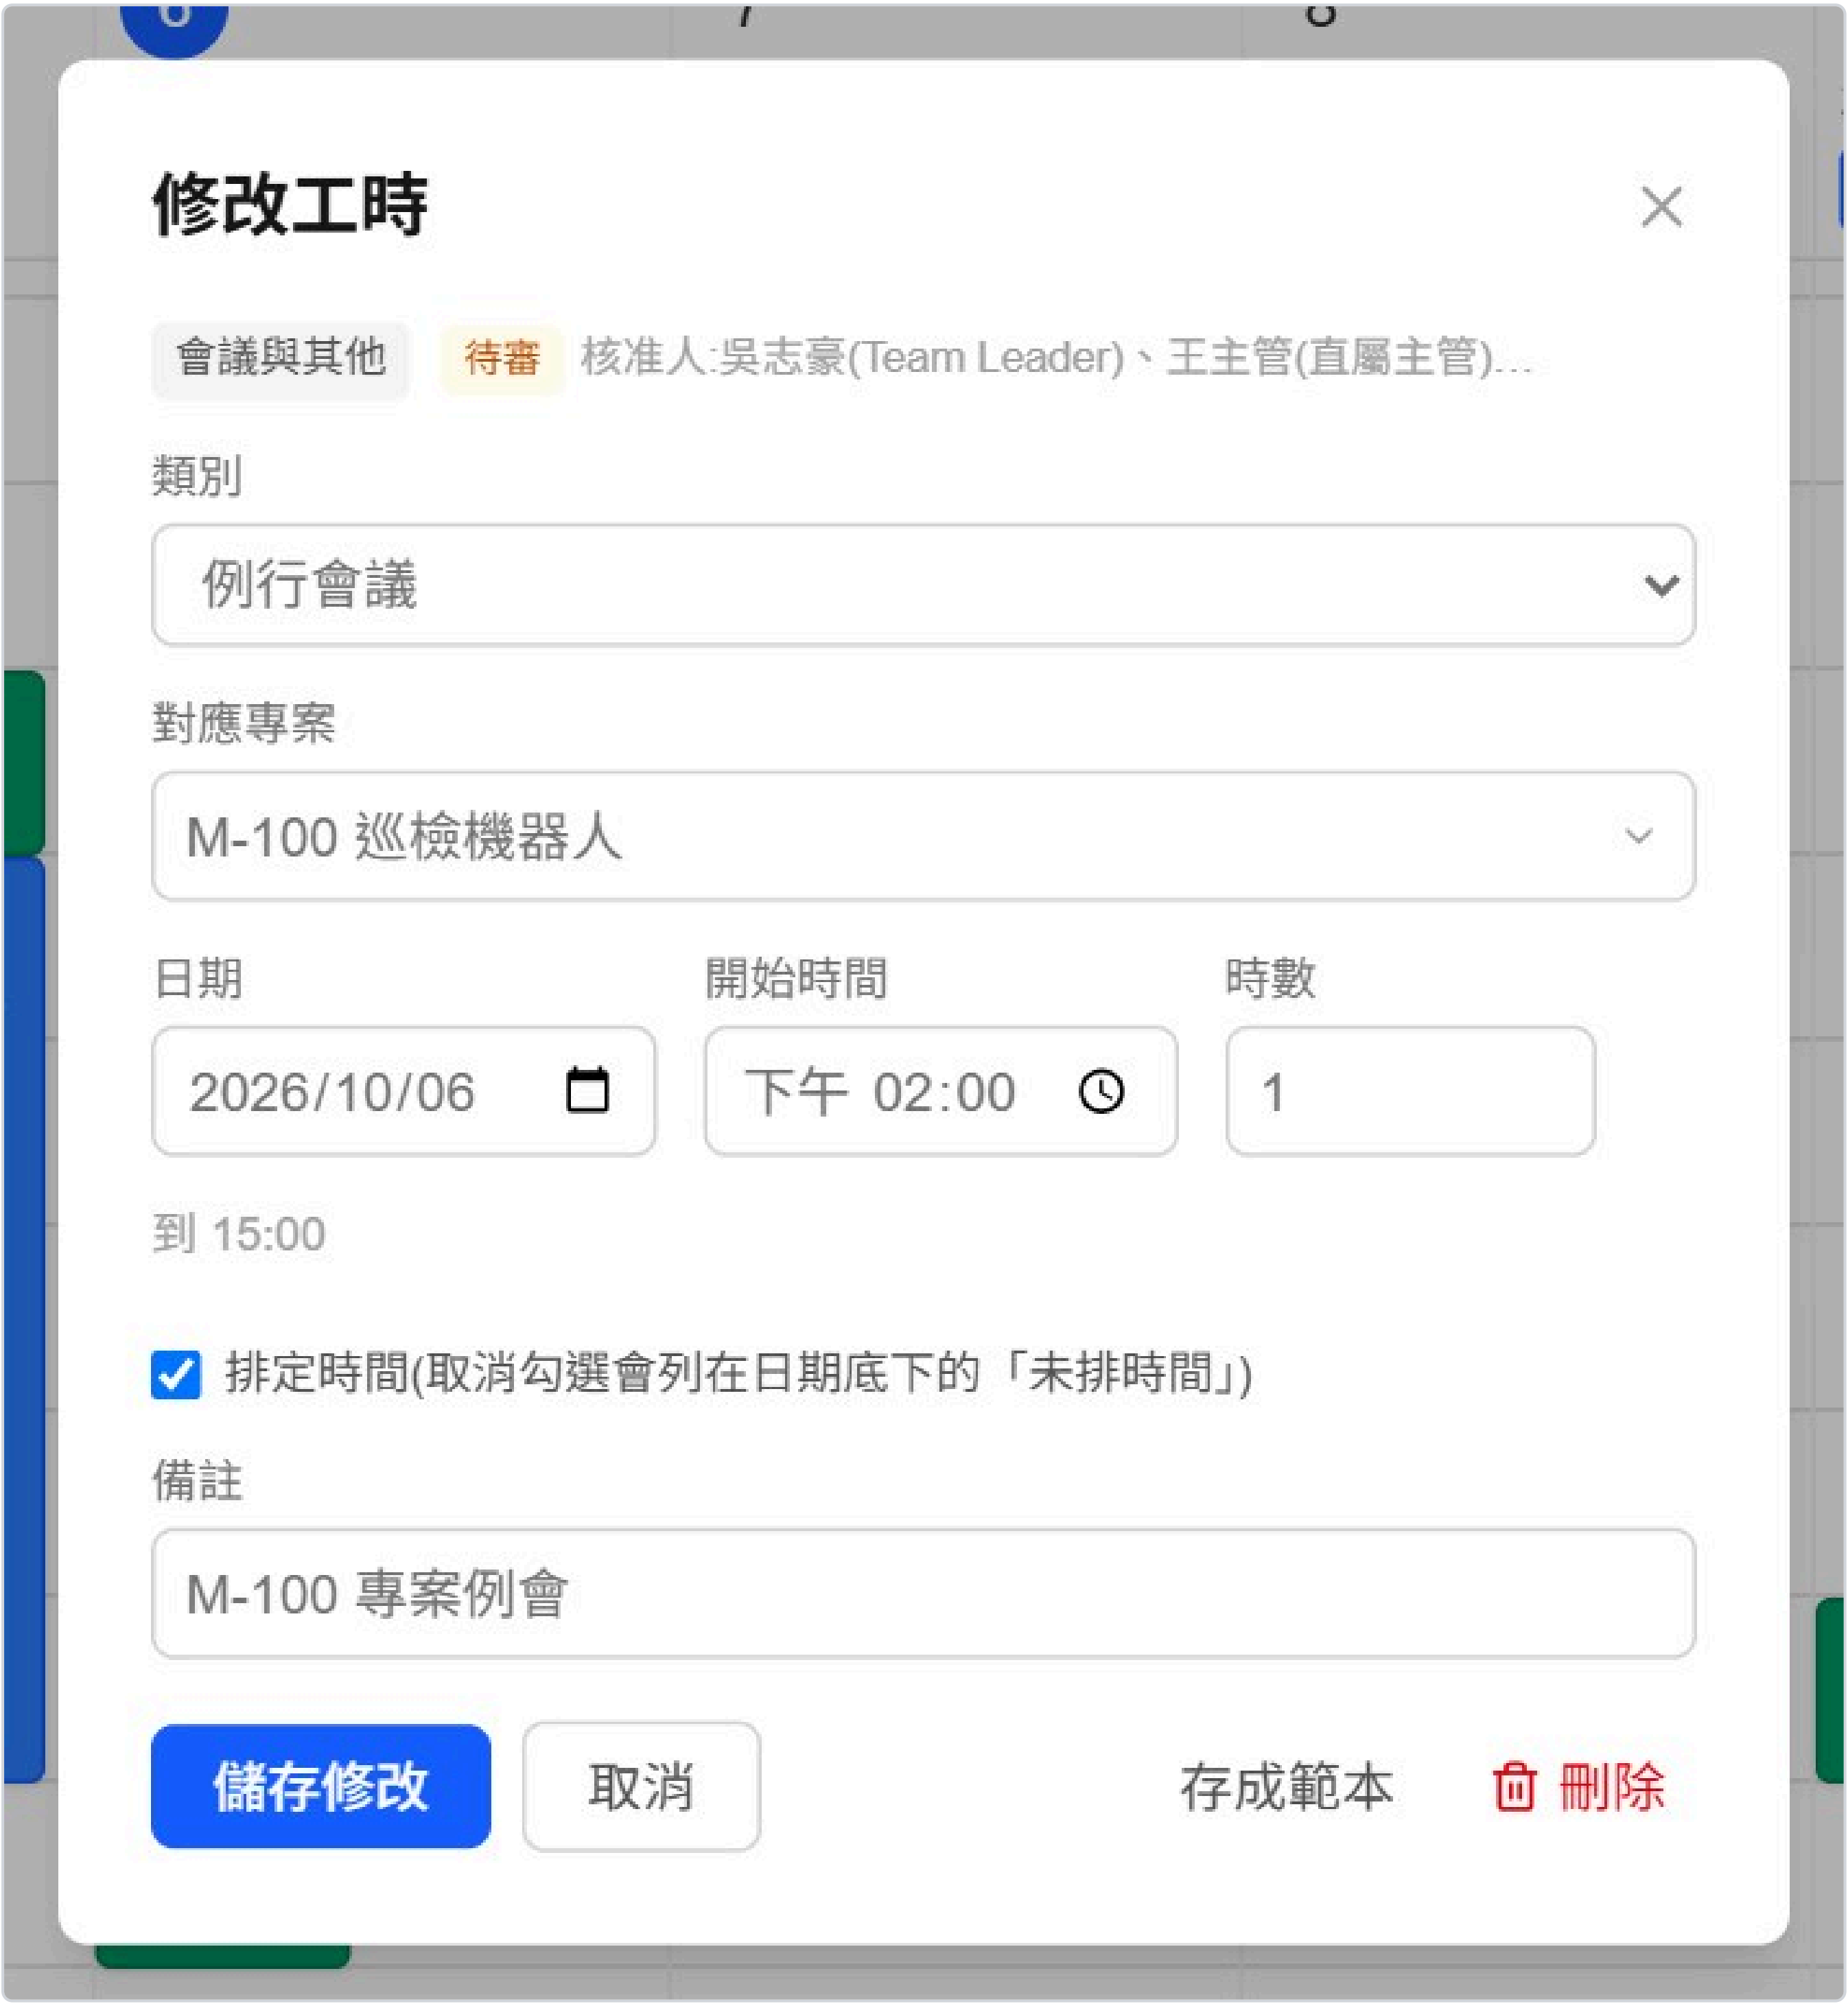

修改工時

會議與其他 待審 核准人:吳志豪(Team Leader)、王主管(直屬主管)…

類別: 例行會議

對應專案: M-100 巡檢機器人

日期: 2026/10/06

開始時間: 下午 02:00

時數: 1

到 15:00

☑ 排定時間(取消勾選會列在日期底下的「未排時間」)

備註: M-100 專案例會

1. 該專案分組的 Team Leader / PMD(會議對應專案時,是這個專案任一分組的 Team Leader / PMD);
2. **同部門的 DM**——只限同部門(單位)的同仁;
3. 送審者的**直屬主管**;

4. **管理者**。

以上任何一位核准就生效,但不能核准自己的工時。管理者可以在使用者管理替某個人勾選「**工時免審核**」(見 21.1):他登記的專案工時與對應專案的會議直接生效,註記為「免審核」。

17.1b 預估對照(人力時間預估 vs 實際工時)

行事曆下面的「**預估對照**」把這一週的**預估**跟你**實際登記的工時**並排,每天、每個專案、每個工作項都看得到差異。

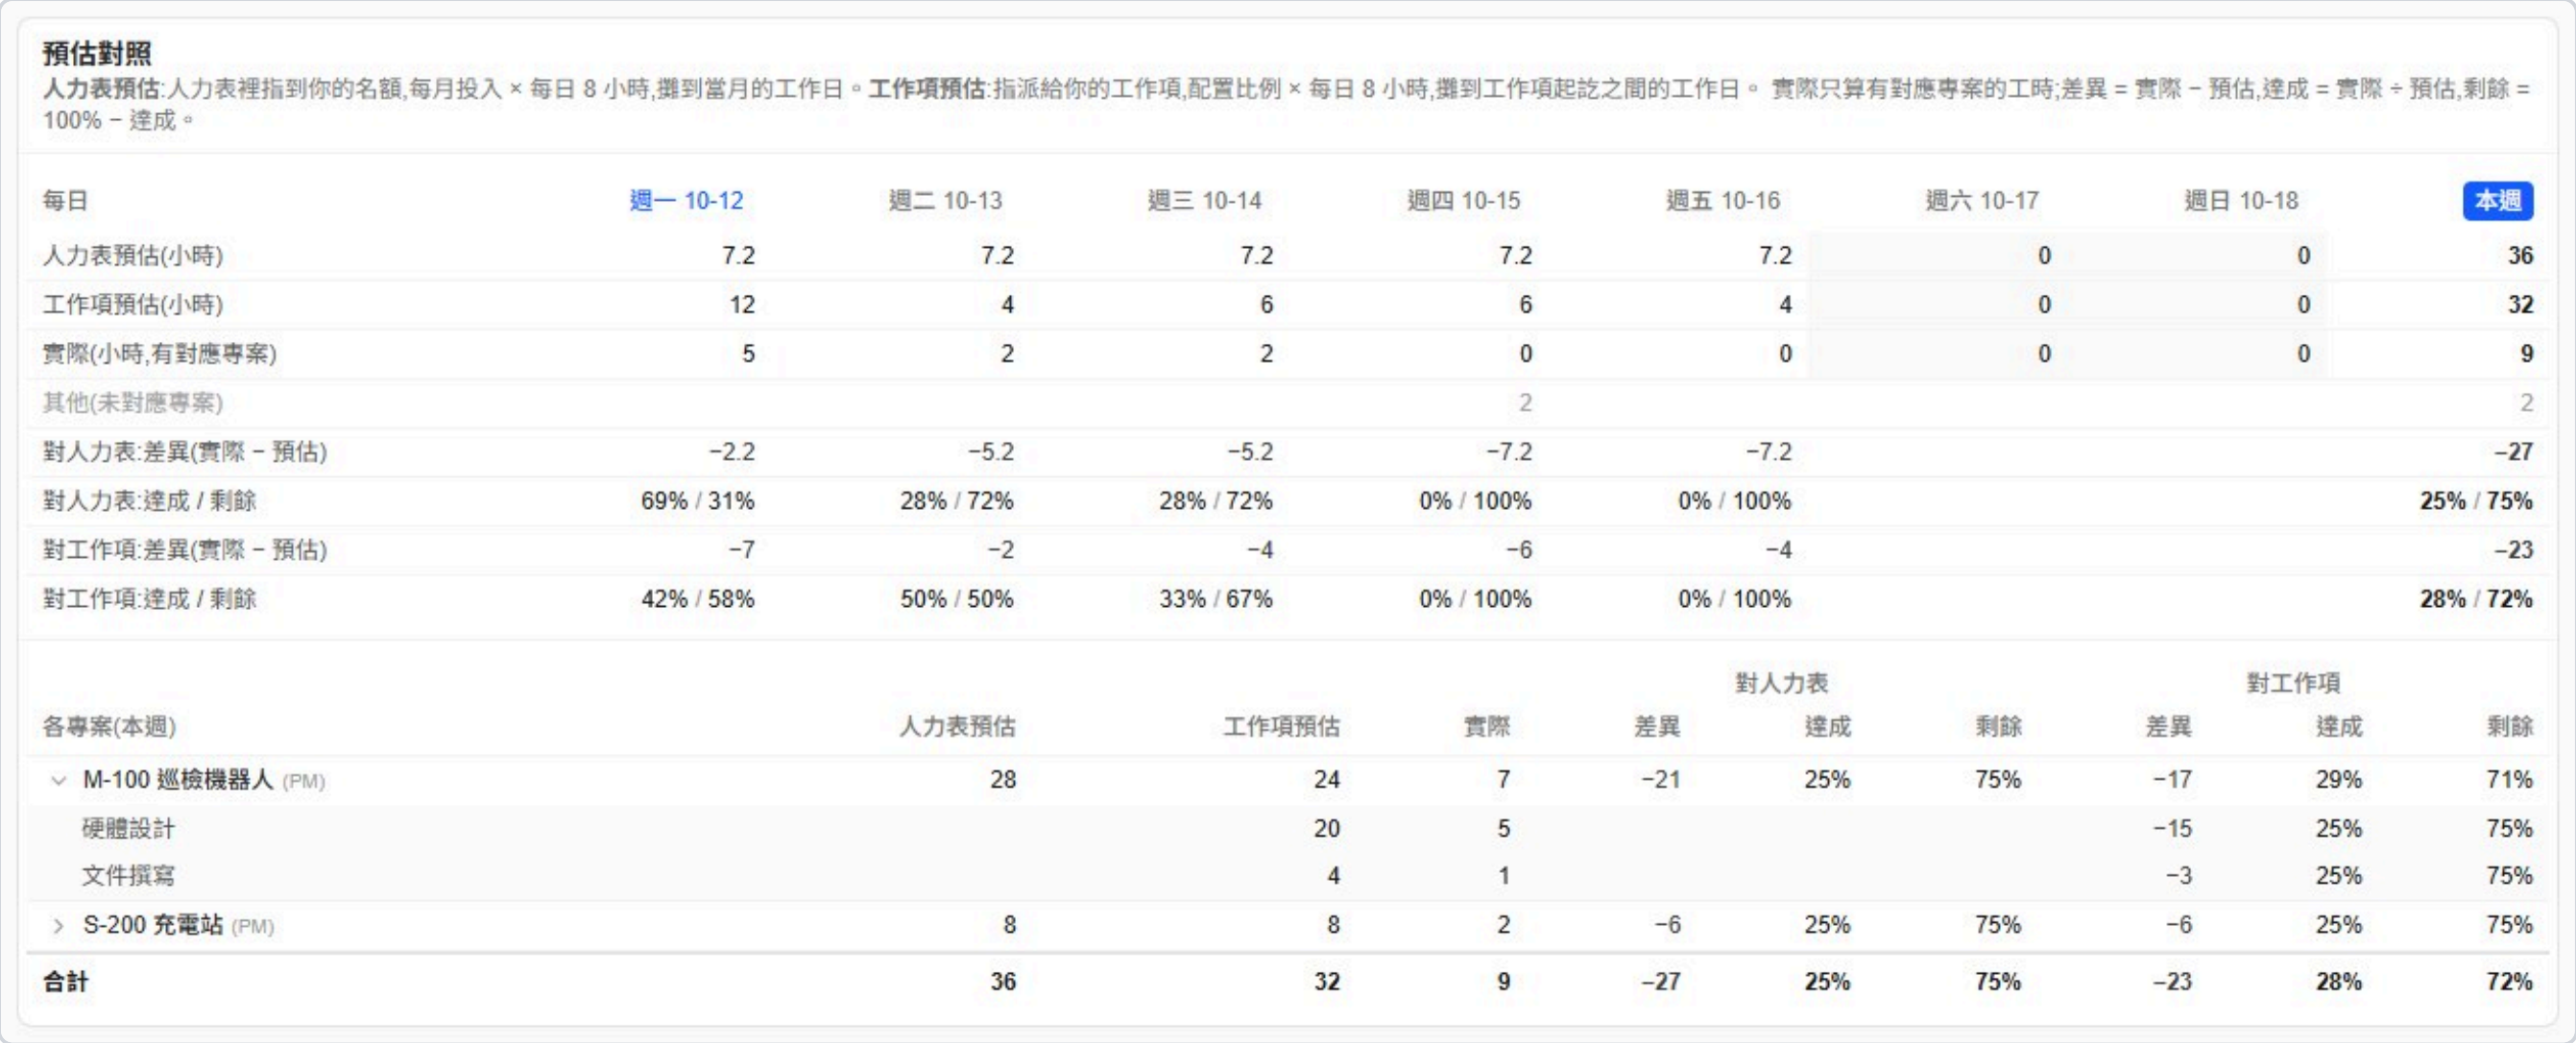

預估對照

人力表預估:人力表裡指到你的名額,每月投入 × 每日 8 小時,攤到當月的工作日。**工作項預估**:指派給你的工作項,配置比例 × 每日 8 小時,攤到工作項起訖之間的工作日。 實際只算有對應專案的工時;差異 = 實際 − 預估,達成 = 實際 ÷ 預估,剩餘 = 100% − 達成。

每日	週一 10-12	週二 10-13	週三 10-14	週四 10-15	週五 10-16	週六 10-17	週日 10-18	本週
人力表預估(小時)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0	0	**36**
工作項預估(小時)	12	4	6	6	4	0	0	**32**
實際(小時,有對應專案)	5	2	2	0	0	0	0	**9**
其他(未對應專案)				2				2
對人力表:差異(實際 − 預估)	−2.2	−5.2	−5.2	−7.2	−7.2			**−27**
對人力表:達成 / 剩餘	69% / 31%	28% / 72%	28% / 72%	0% / 100%	0% / 100%			**25% / 75%**
對工作項:差異(實際 − 預估)	−7	−2	−4	−6	−4			**−23**
對工作項:達成 / 剩餘	42% / 58%	50% / 50%	33% / 67%	0% / 100%	0% / 100%			**28% / 72%**

				對人力表			對工作項		
各專案(本週)	人力表預估	工作項預估	實際	差異	達成	剩餘	差異	達成	剩餘
M-100 巡檢機器人 (PM)	28	24	7	−21	25%	75%	−17	29%	71%
硬體設計		20	5				−15	25%	75%
文件撰寫		4	1				−3	25%	75%
S-200 充電站 (PM)	8	8	2	−6	25%	75%	−6	25%	75%
合計	**36**	**32**	**9**	**−27**	**25%**	**75%**	**−23**	**28%**	**72%**

- **兩種預估**:
    - **人力表預估**:人力表(預算頁)裡指到你的名額,每個月投入多少(1 = 整個月全職),× 每日工時(系統設定,預設 8 小時),攤到當月的每個**工作日**。例如人力表排你 0.7,每天就是 5.6 小時。
    - **工作項預估**:指派給你(而且有排程)的工作項,**配置比例 × 每日工時**,攤到工作項起訖之間的工作日。只算最底層(沒有子項目)的工作項,父項目的日期是子項目滾上來的,不重複算。
- **每天一欄**:表的上半部,每天一欄加「本週」,列出人力表預估、工作項預估、實際(有對應專案的工時),以及**差異**(實際 − 預估,多做是正、還沒做到是負)、**達成**(實際 ÷ 預估)與**剩餘**(100% − 達成;超過預估會寫「超出」)——對人力表與對工作項各算一次。週末與公司假日沒有預估。行事曆每天的日期底下也會寫「預估 N」。
- **各專案**:表的下半部,每個專案一列,有人力表預估、工作項預估、實際與各自的差異、達成、剩餘;按左邊的箭頭展開,看這個專案底下每個工作項的預估與實際。**點上半部某一天的表頭**,下半部就只看那一天;再點一次或點「本週」回到整週。
- **實際**只算有對應專案的工時(專案工作項,以及對應專案的會議)——部門週會、請假這類沒有對應專案的另列為「其他」,不拿去跟專案預估比,不然每開一場週會專案就「少做」兩小時。被退回的工時不算。
- 預估是**參考**,不會自動幫你登記工時;改了工時,對照表馬上跟著變。登記在沒有被指派的專案上,那個專案也會有一列,預估是 0。
- 目前不扣請假:你請假那幾天,預估還是照排。

匯入預估:用工作項的預估直接建立工時

不用一筆一筆新增——行事曆上方的藍色「**匯入預估**」把指派給你的工作項**每一天的預估**直接匯成專案工時:

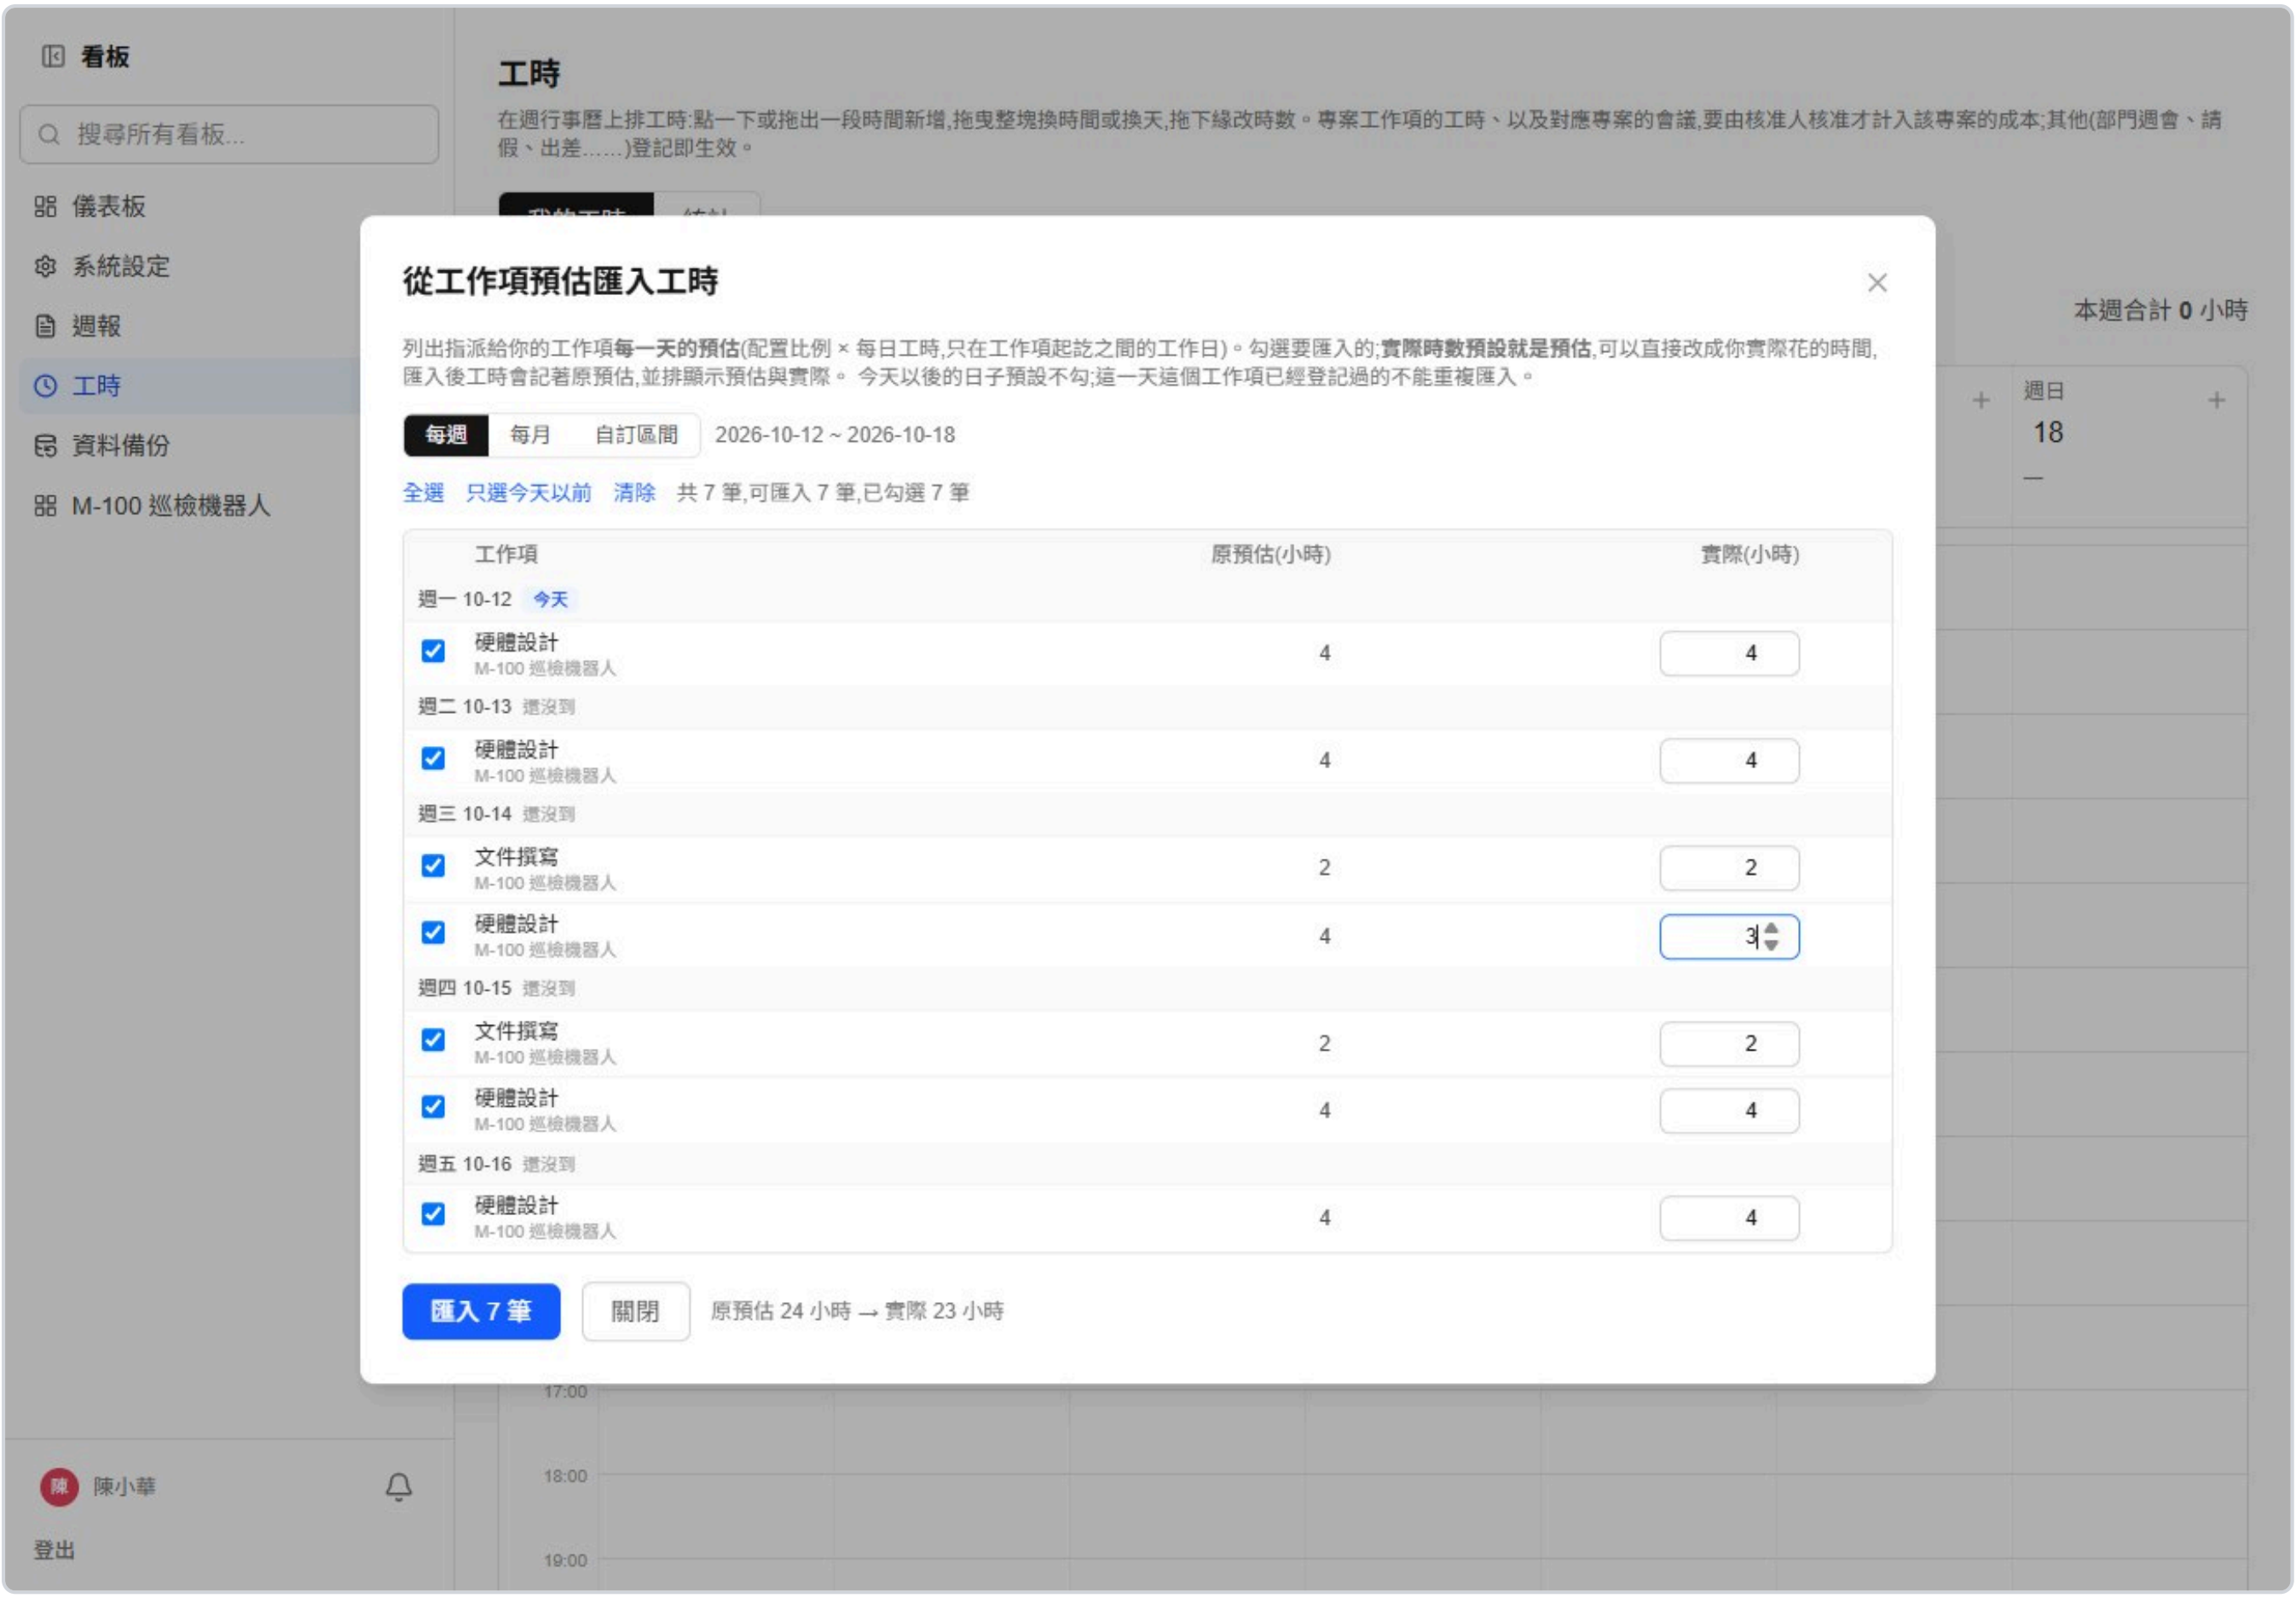

工時

在週行事曆上排工時:點一下或拖出一段時間新增,拖曳整塊換時間或換天,拖下緣改時數。專案工作項的工時、以及對應專案的會議,要由核准人核准才計入該專案的成本;其他(部門週會、請假、出差……)登記即生效。

從工作項預估匯入工時

列出指派給你的工作項**每一天的預估**(配置比例 × 每日工時,只在工作項起訖之間的工作日)。勾選要匯入的;**實際時數預設就是預估**,可以直接改成你實際花的時間,匯入後工時會記著原預估,並排顯示預估與實際。 今天以後的日子預設不勾;這一天這個工作項已經登記過的不能重複匯入。

每週 每月 自訂區間 2026-10-12 ~ 2026-10-18

全選 只選今天以前 清除 共 7 筆,可匯入 7 筆,已勾選 7 筆

	工作項	原預估(小時)	實際(小時)
週一 10-12 今天			
☑	硬體設計 M-100 巡檢機器人	4	4
週二 10-13 還沒到			
☑	硬體設計 M-100 巡檢機器人	4	4
週三 10-14 還沒到			
☑	文件撰寫 M-100 巡檢機器人	2	2
☑	硬體設計 M-100 巡檢機器人	4	3
週四 10-15 還沒到			
☑	文件撰寫 M-100 巡檢機器人	2	2
☑	硬體設計 M-100 巡檢機器人	4	4
週五 10-16 還沒到			
☑	硬體設計 M-100 巡檢機器人	4	4

匯入 7 筆 關閉 原預估 24 小時 → 實際 23 小時

- 列出的是「工作項預估」那一份:**配置比例 × 每日工時**,只在工作項起訖之間的工作日;只算最底層的工作項。一天預估不到 0.25 小時的(例如 2% 的負責人預設比例)不列。範圍可以選「每週」(正在看的那一週)、「每月」或「自訂區間」,一次最多 92 天。
- 每一列有 **原預估** 與 **實際**。**實際預設就是預估**,不用改就等於照預估登記;實際花的時間不一樣,直接在「實際」欄改。底下會即時算「原預估 N 小時 → 實際 M 小時」。
- **今天以後的日子預設不勾**(還沒發生);也可以「全選」或「只選今天以前」。這一天這個工作項**已經登記過**工時的,標「已登記」、不能重複匯入(被退回的不算,可以重新匯入)。
- 匯入後是一般的專案工時:放在日期底下的「未排時間」,要核准的照樣要核准(免審核的人直接生效),一天仍不超過 24 小時。**工時會記著「原預估」**:行事曆上寫「預估 4h」,開啟那一筆會顯示「原預估 4 小時、這筆實際 3 小時(差 −1,75%)」,之後再改實際時數,原預估不變。
- 匯入的預估由系統重算後記下,畫面上改不了「原預估」,只能改實際。

17.2 統計

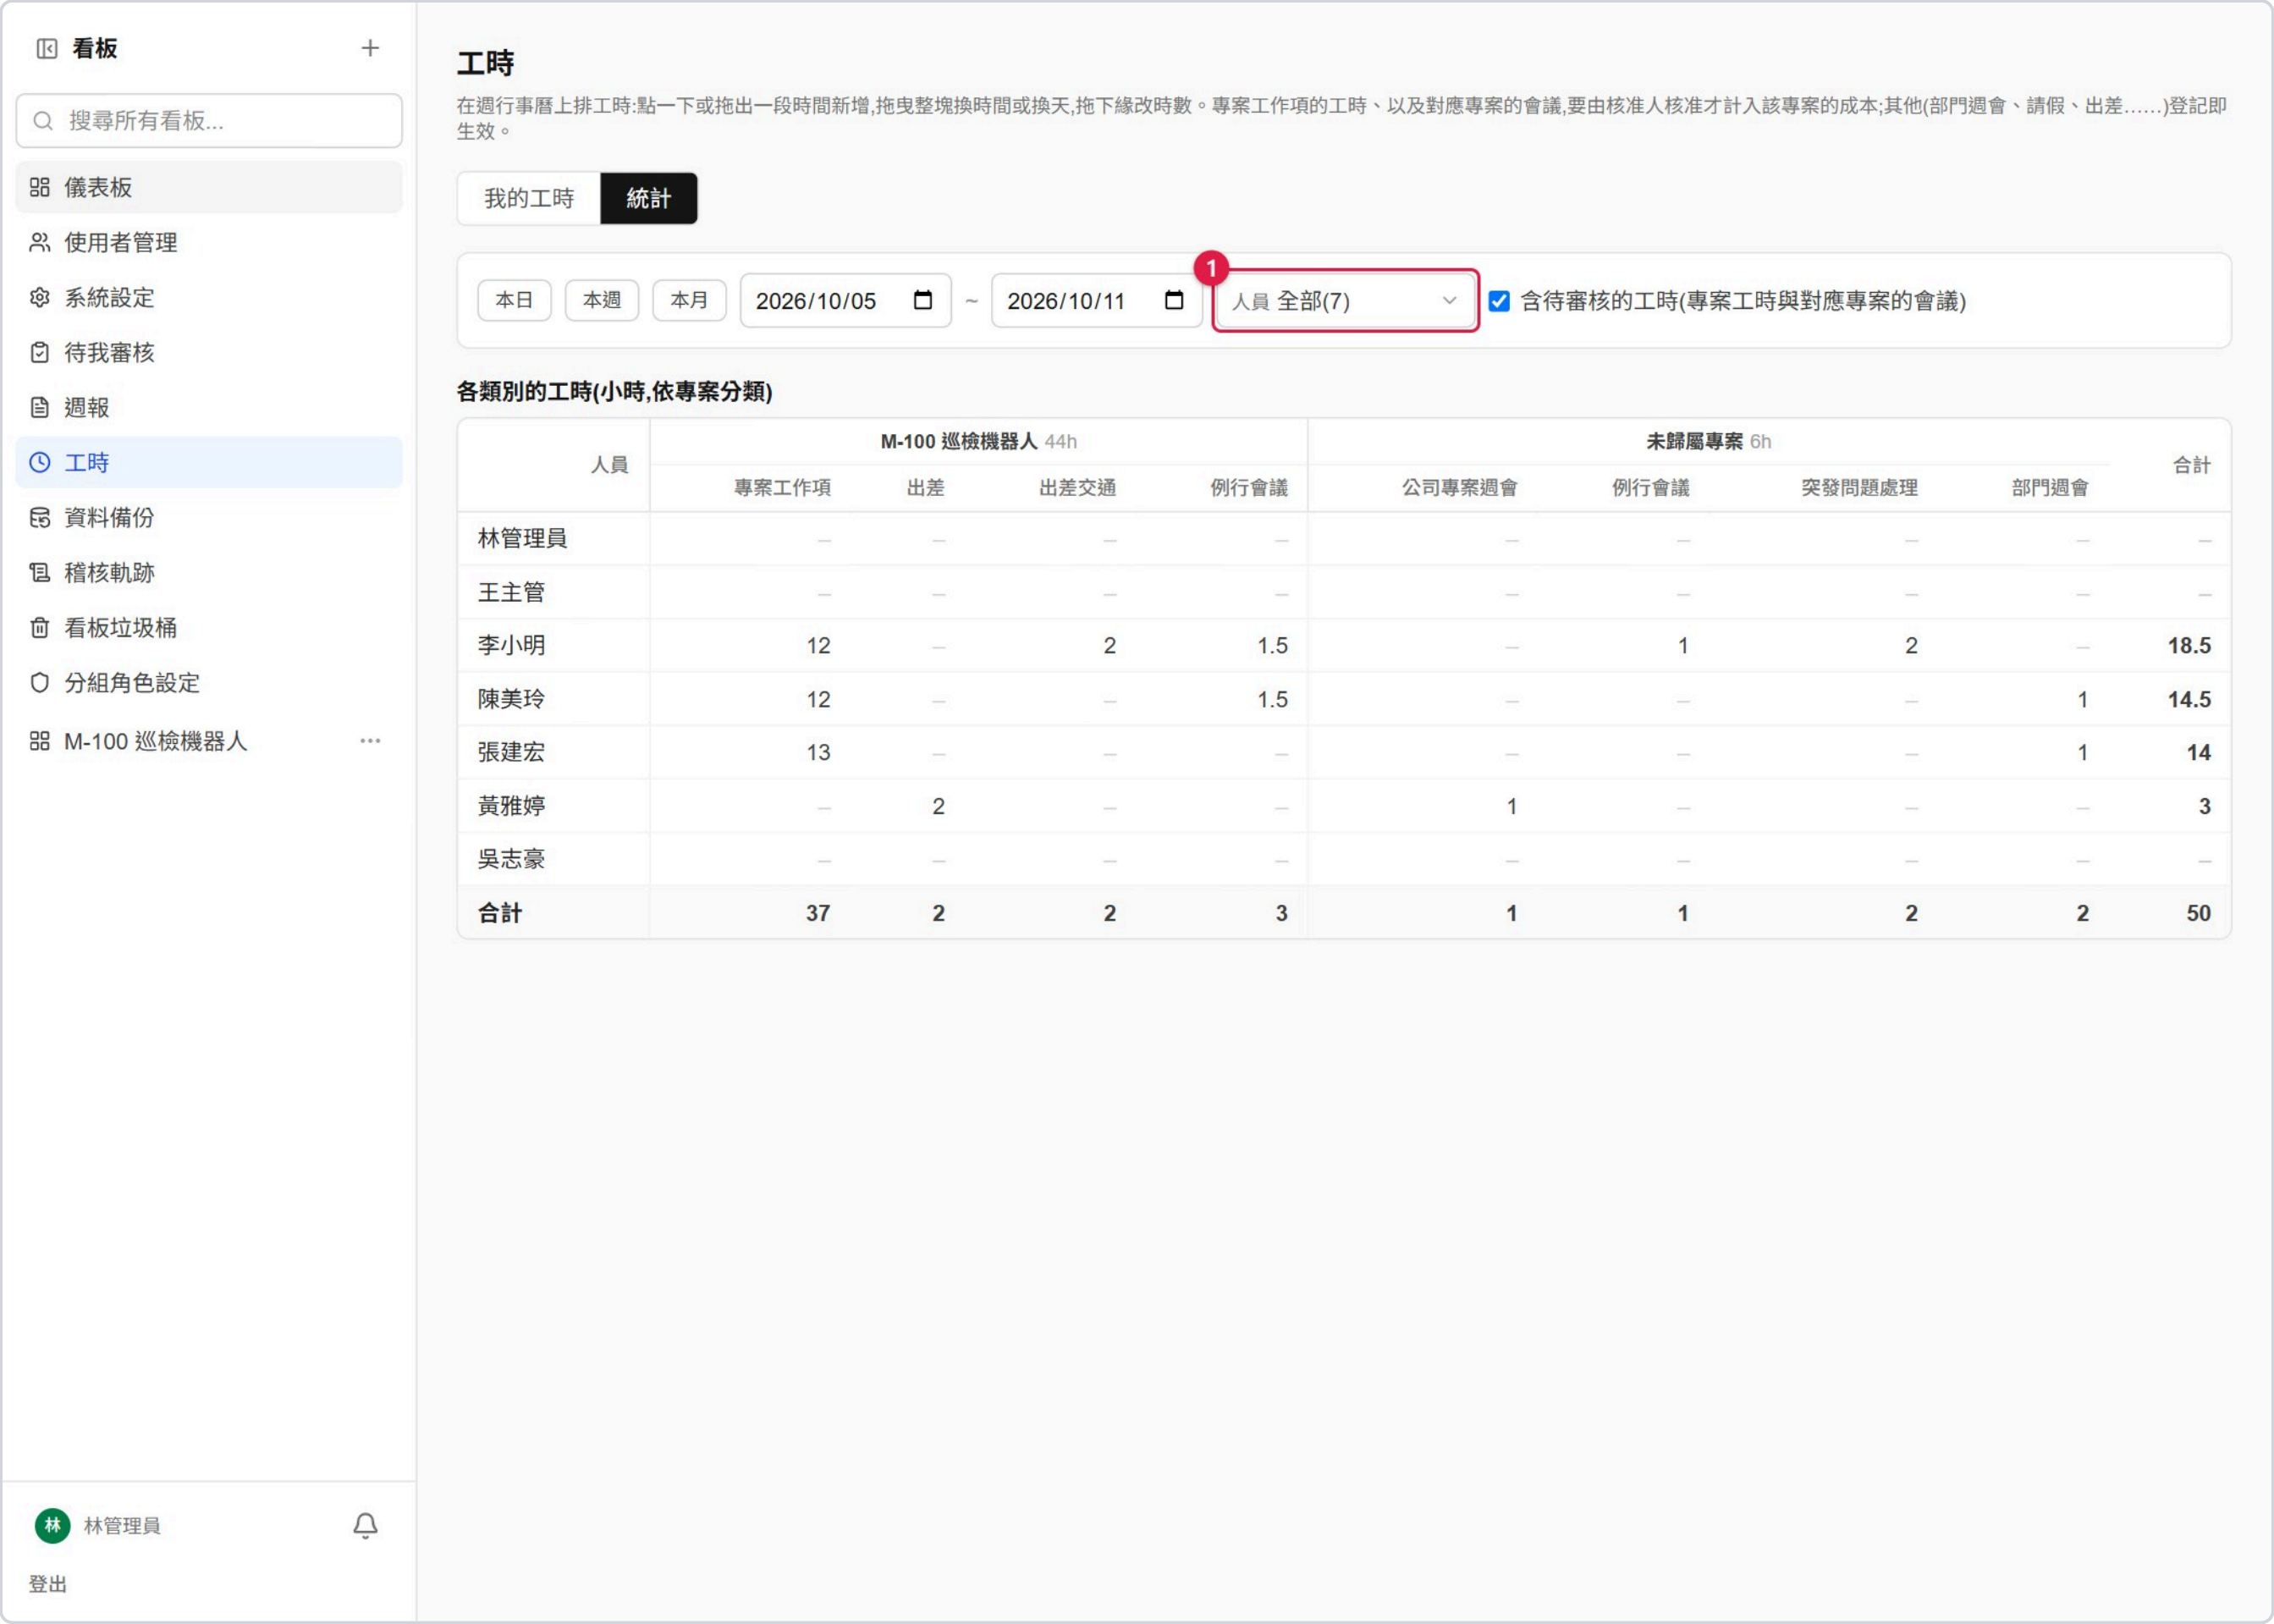
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
林
林管理員
登出
我的工時
統計
本日
本週
本月
1

工時

在週行事曆上排工時:點一下或拖出一段時間新增,拖曳整塊換時間或換天,拖下緣改時數。專案工作項的工時、以及對應專案的會議,要由核准人核准才計入該專案的成本;其他(部門週會、請假、出差......)登記即生效。

2026/10/05 ~ 2026/10/11　人員 全部(7)　☑ 含待審核的工時(專案工時與對應專案的會議)

各類別的工時(小時,依專案分類)

人員	M-100 巡檢機器人 44h				未歸屬專案 6h				合計
	專案工作項	出差	出差交通	例行會議	公司專案週會	例行會議	突發問題處理	部門週會	
林管理員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
王主管	–	–	–	–	–	–	–	–	–
李小明	12	–	2	1.5	–	1	2	–	**18.5**
陳美玲	12	–	–	1.5	–	–	–	1	**14.5**
張建宏	13	–	–	–	–	–	–	1	**14**
黃雅婷	–	2	–	–	1	–	–	–	**3**
吳志豪	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合計	**37**	**2**	**2**	**3**	**1**	**1**	**2**	**2**	**50**

- 選期間:**本日 / 本週 / 本月**,或自己選起訖日(一次最多 366 天)。
- 勾選「**含待審核的工時**」,決定要不要把還沒核准的工時(專案工時與對應專案的會議)算進去。
- ①「**人員**」是下拉選單:可以搜尋、**複選**,有「全選」「清除」,也能**依部門(單位)一次選一整個部門**。
- 一張表:**各類別的工時**(小時),依**專案**分組:每個專案底下是專案工作項與對應這個專案的會議等類別,不屬於任何專案的(部門週會、請假......)歸在「未歸屬專案」;每個人一列,最右邊是合計,最下面是各欄合計。

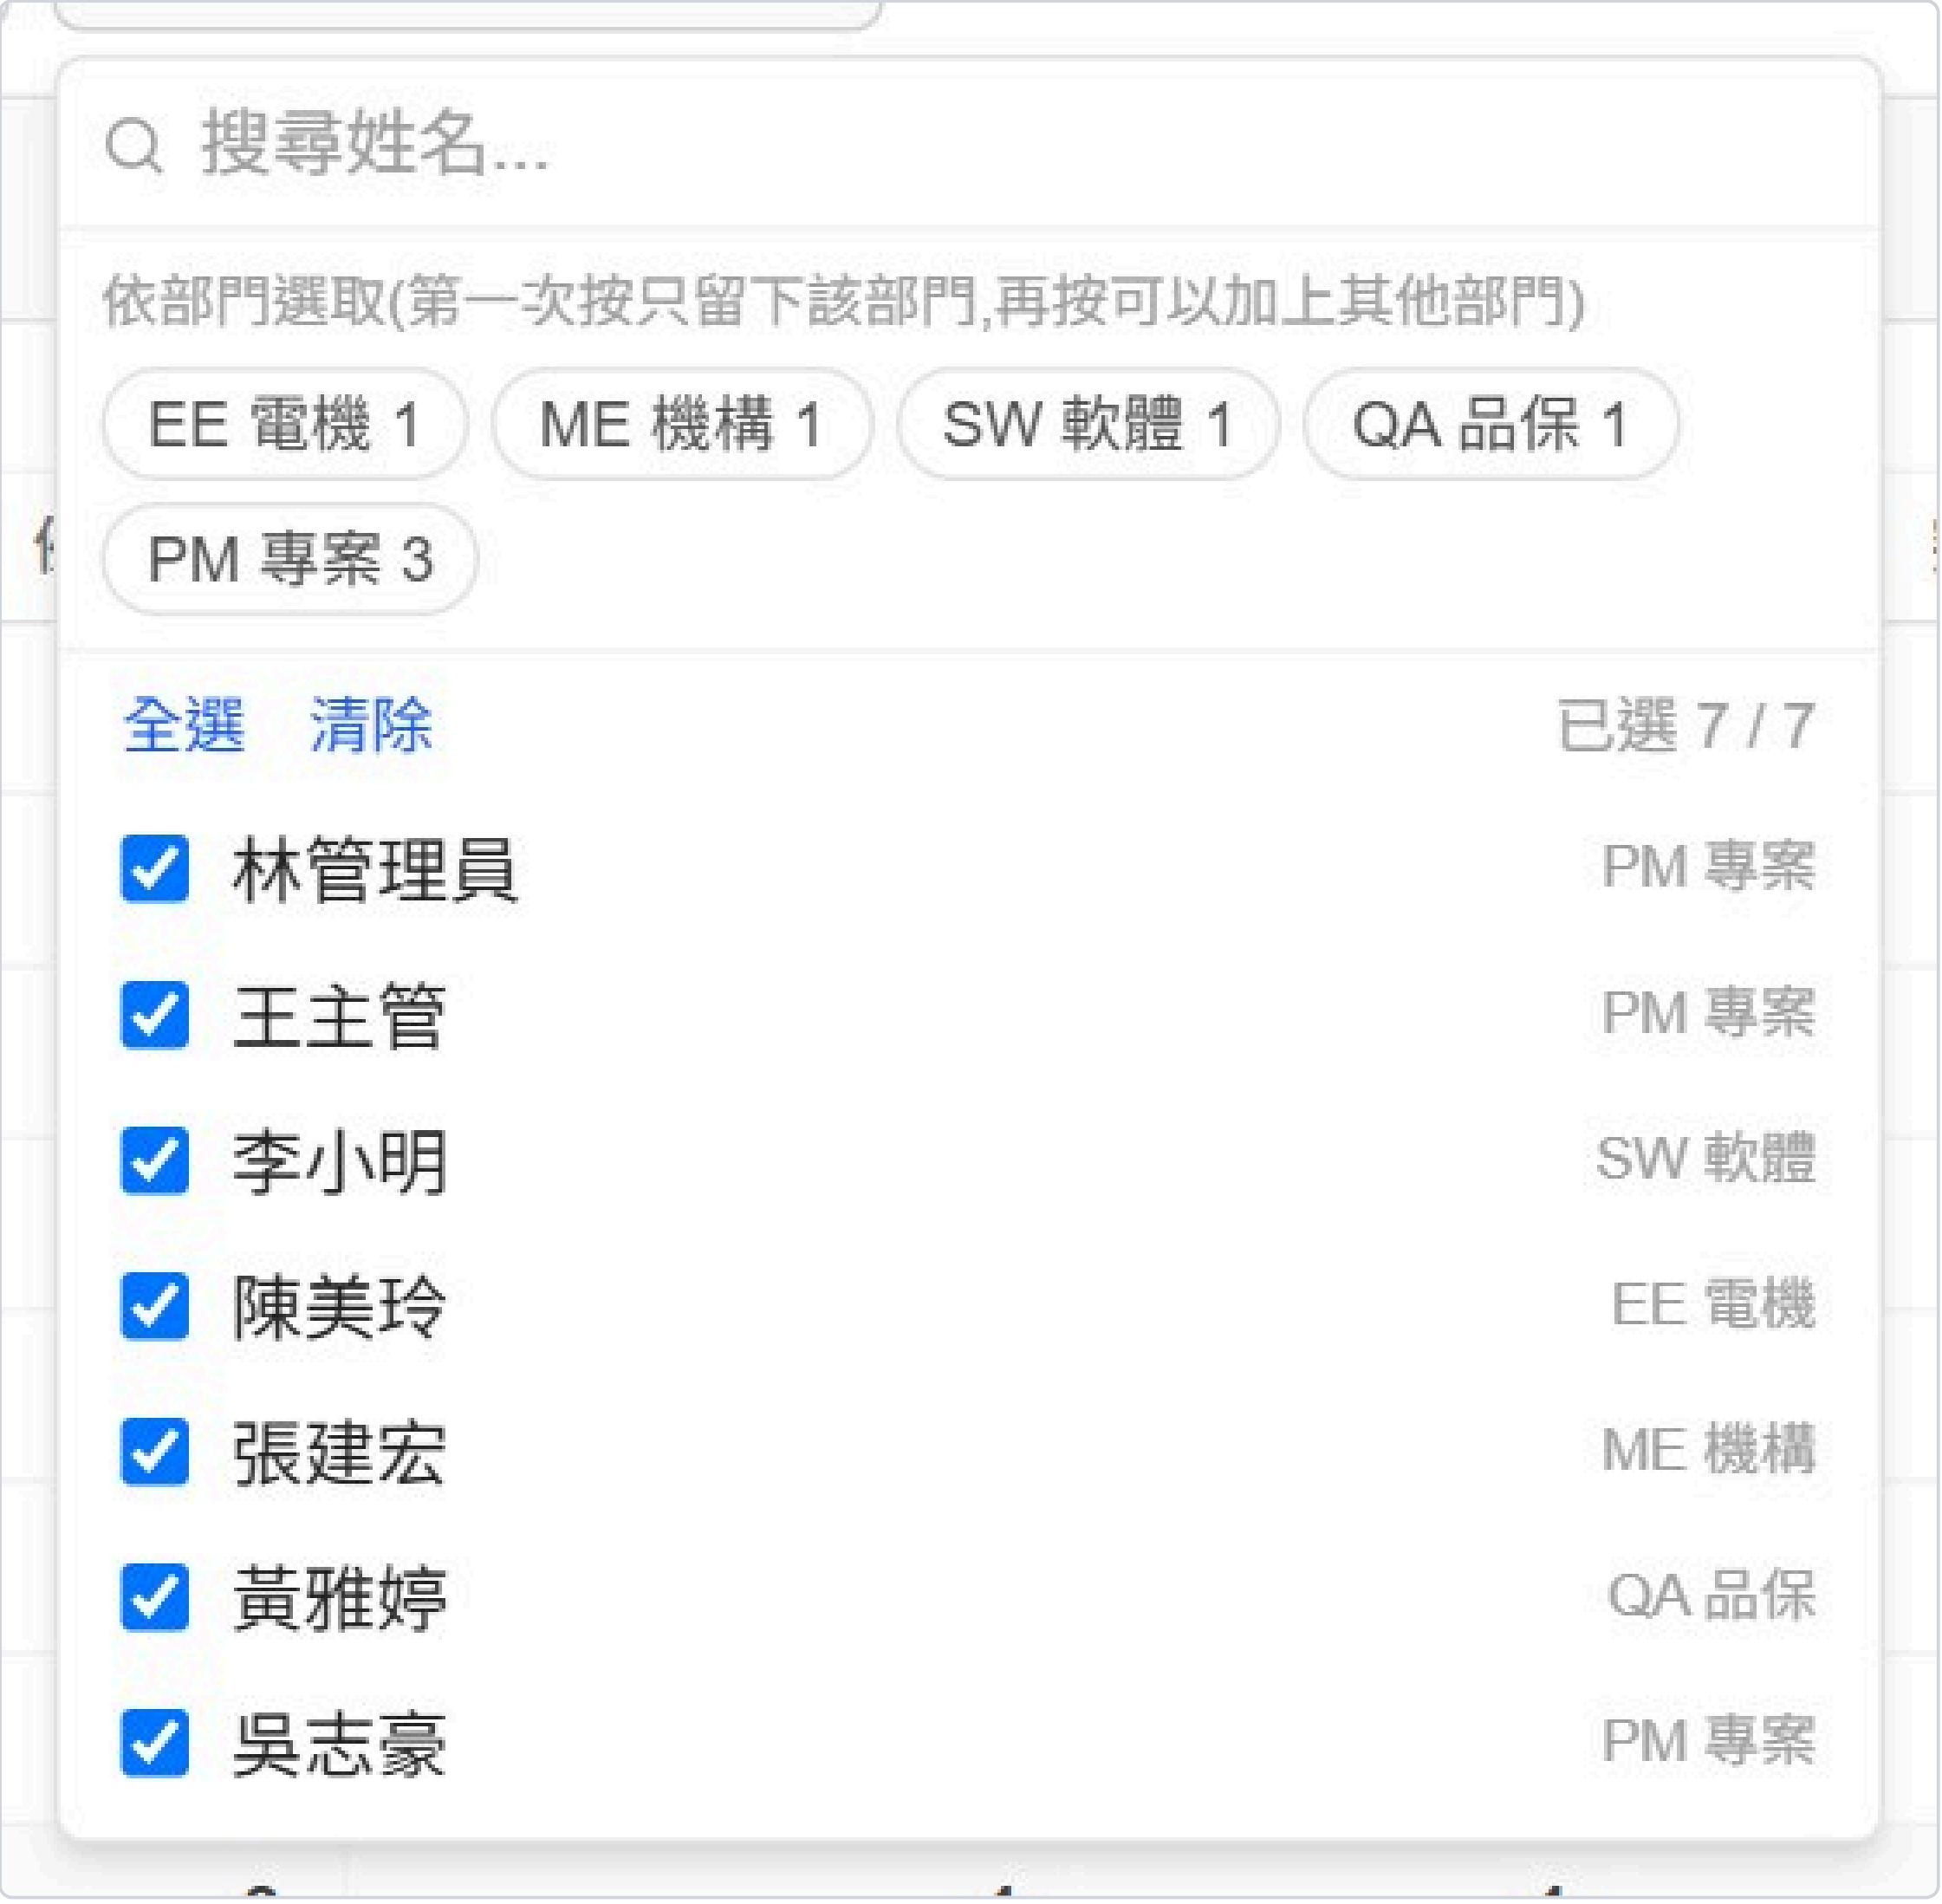

搜尋姓名...

依部門選取(第一次按只留下該部門,再按可以加上其他部門)

EE 電機 1
ME 機構 1
SW 軟體 1
QA 品保 1
PM 專案 3
全選
清除

已選 7 / 7

☑	林管理員	PM 專案
☑	王主管	PM 專案
☑	李小明	SW 軟體
☑	陳美玲	EE 電機
☑	張建宏	ME 機構
☑	黃雅婷	QA 品保
☑	吳志豪	PM 專案

看得到誰的工時:自己;直屬主管看自己的部屬;管理者看全部;另外管理者可以在使用者管理替**個別主管**勾選「可以檢視全部成員的工時」。

17.3 範本與複製上週

例行會議(每週的部門週會、公司專案週會、每日站會……)不必每週重填:

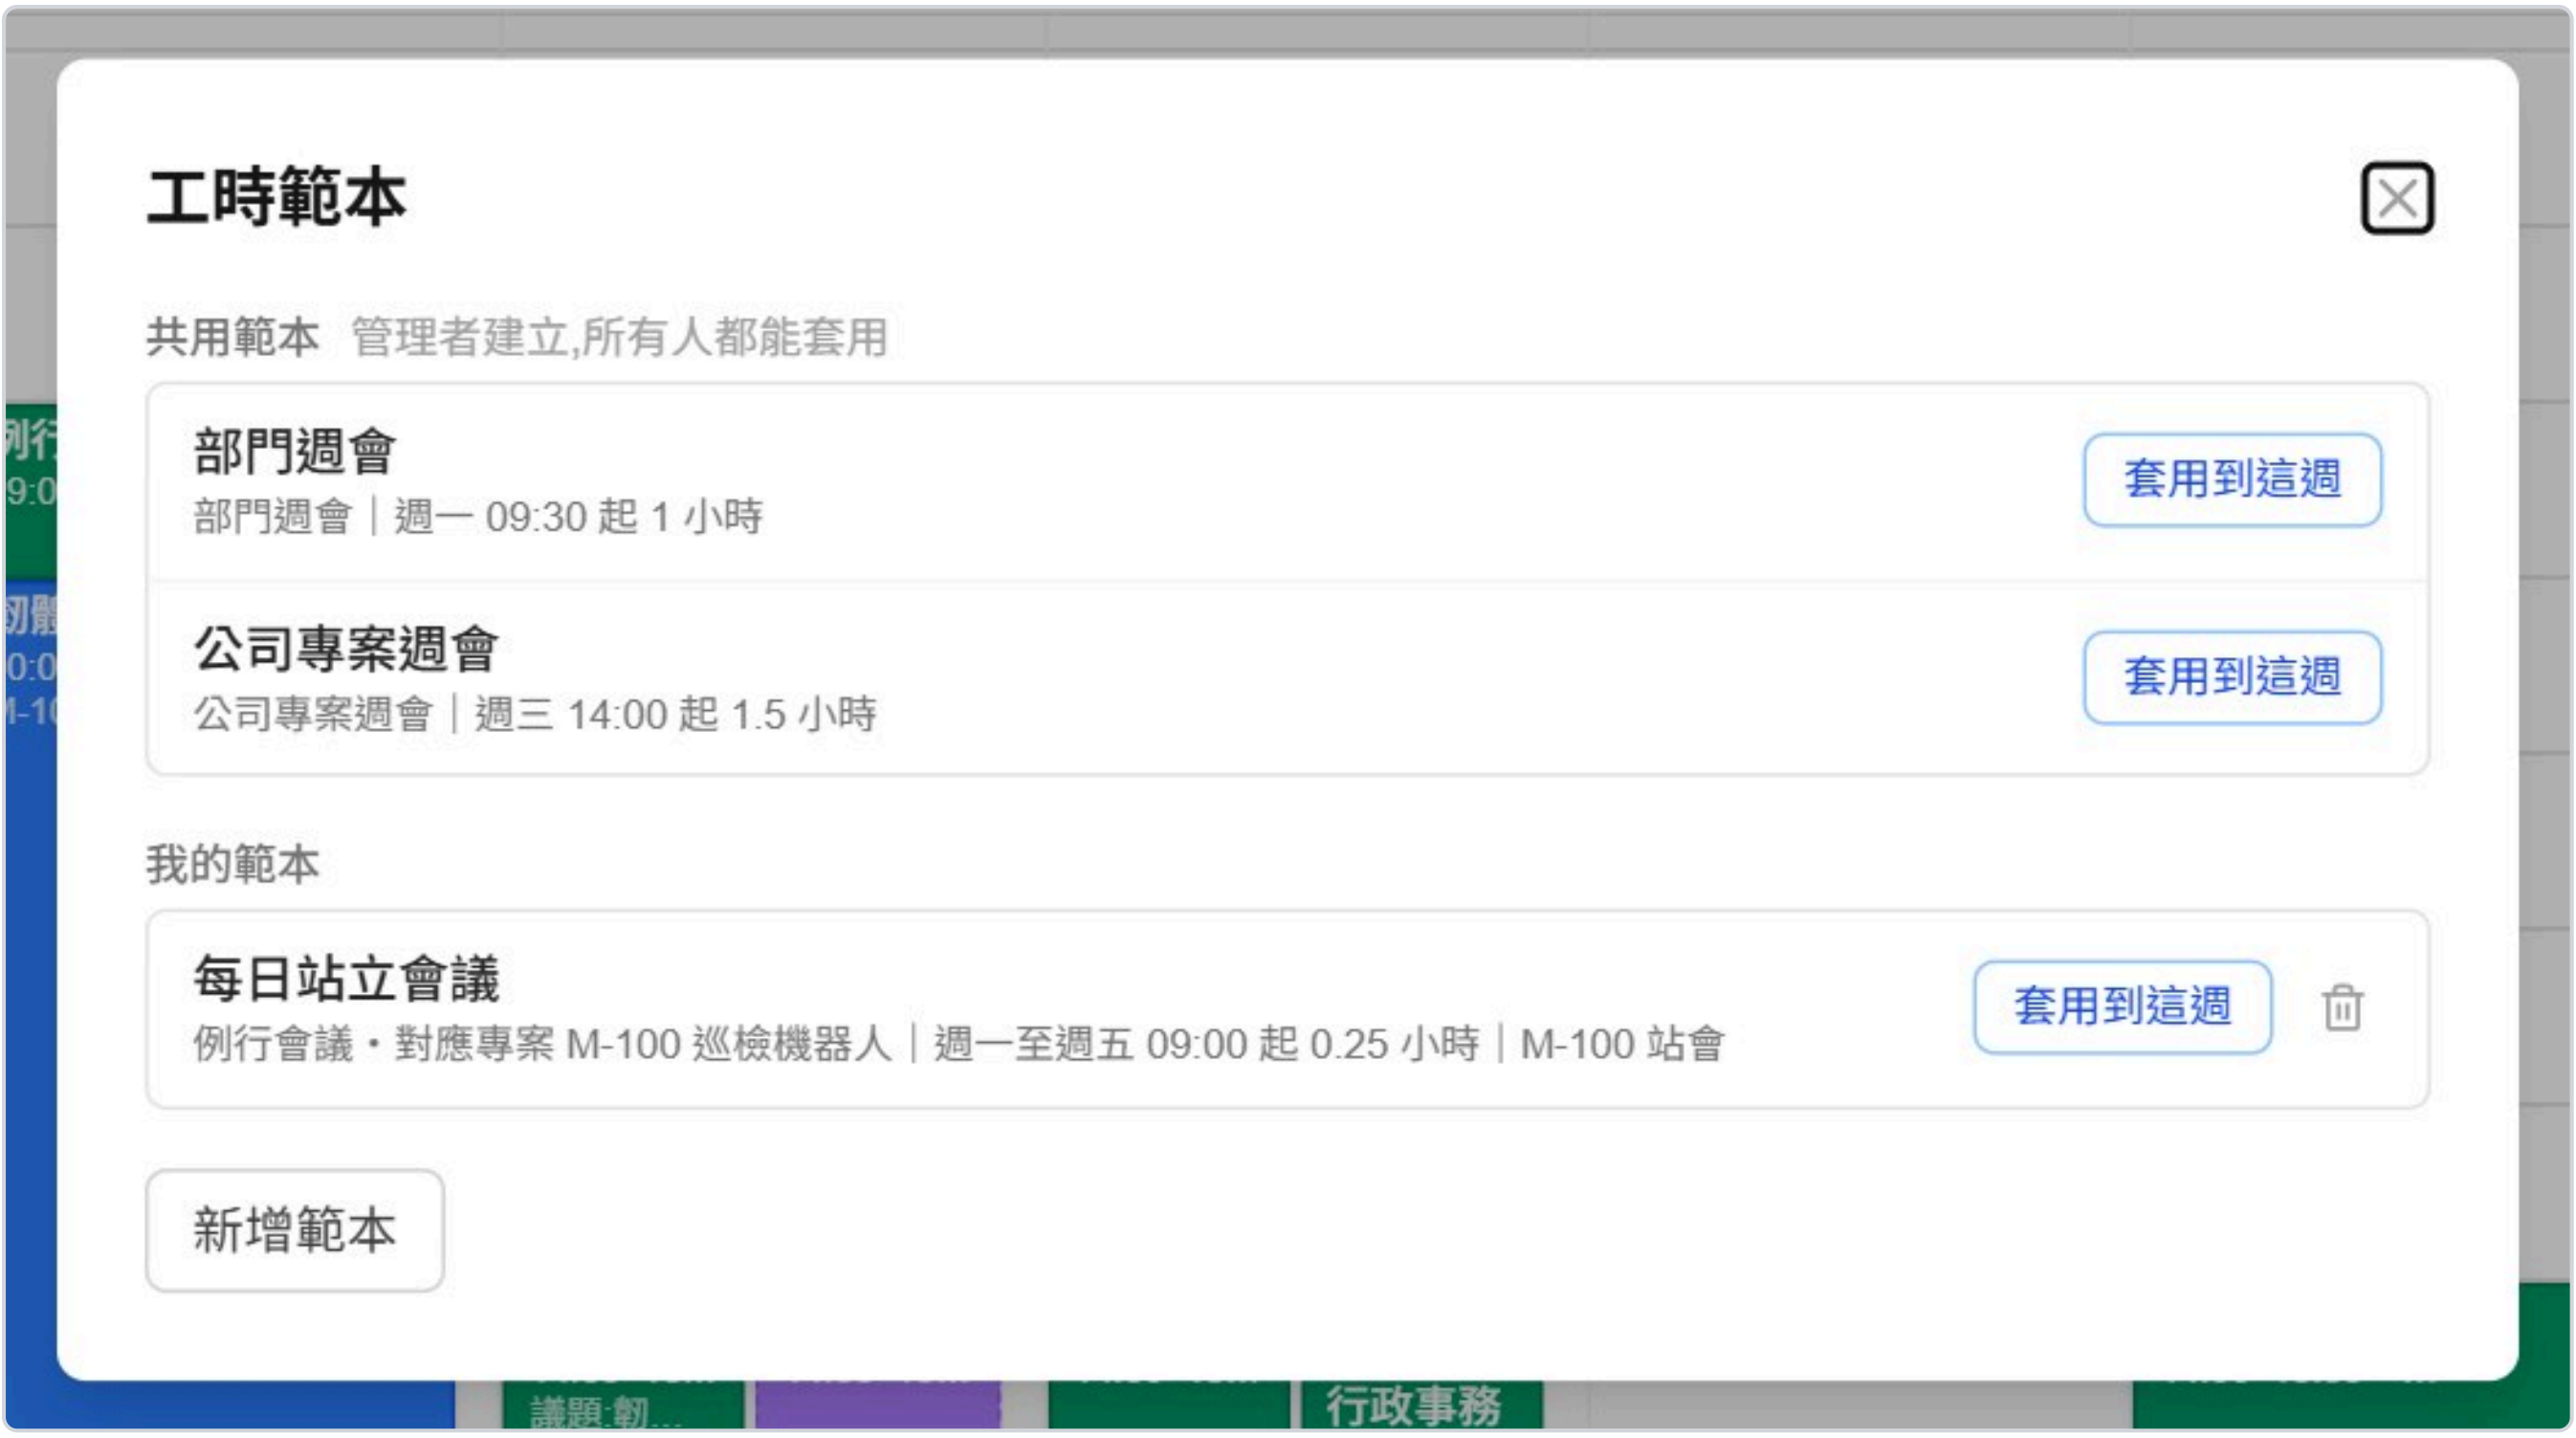

工時範本

共用範本　管理者建立,所有人都能套用

部門週會
部門週會｜週一 09:30 起 1 小時

公司專案週會
公司專案週會｜週三 14:00 起 1.5 小時

我的範本

每日站立會議
例行會議・對應專案 M-100 巡檢機器人｜週一至週五 09:00 起 0.25 小時｜M-100 站會

- 按行事曆上方的「**範本**」。範本分兩種:**我的範本**(只有自己看得到,可以是會議與其他,也可以是專案工作項)和**共用範本**(管理者建立,所有人都能套用,只能是會議與其他)。
- **新增範本**:取名字,選類別(或工作項)、對應專案、開始時間、時數、備註,以及**每週哪幾天**。也可以開啟行事曆上的一筆工時,按「**存成範本**」,表單會帶入那一筆的內容。管理者新增時可以勾「共用範本」。
- **套用到這週**:範本選的每個星期各建立一筆。走一般的登記流程——對應專案的要核准、免審核的人直接生效,一天超過 24 小時的會被擋下並說明;同一天已經有一樣的(類別或工作項、專案、開始時間、時數都相同)就不重複建立。
- 刪除:自己的範本自己刪;共用範本只有管理者能刪。已經建立的工時不受影響。
- **複製上週**:把上一週的工時(被退回的除外)複製到這週,同一個星期、同一個時間,已經有一樣的就略過。複製出來的專案工時與對應專案的會議要重新核准。

17.4 從 Google 日曆匯入

開會的行程已經在 Google 日曆上了,不必再手動輸入一次:



本週合計 **0** 小時

- 按行事曆上方的「**Google 日曆**」。第一次要先**連結**:會跳到 Google 的同意畫面,只授權**唯讀取行程**(標題與時間),同意後自動回到原本看的那一週。系統**不保存**你的 Google 帳號、密碼或任何憑證——授權只暫存在瀏覽器約一小時,過期了再按一次連結就好。(Google 不接受用帳號密碼讀日曆,所以是這種授權方式。)

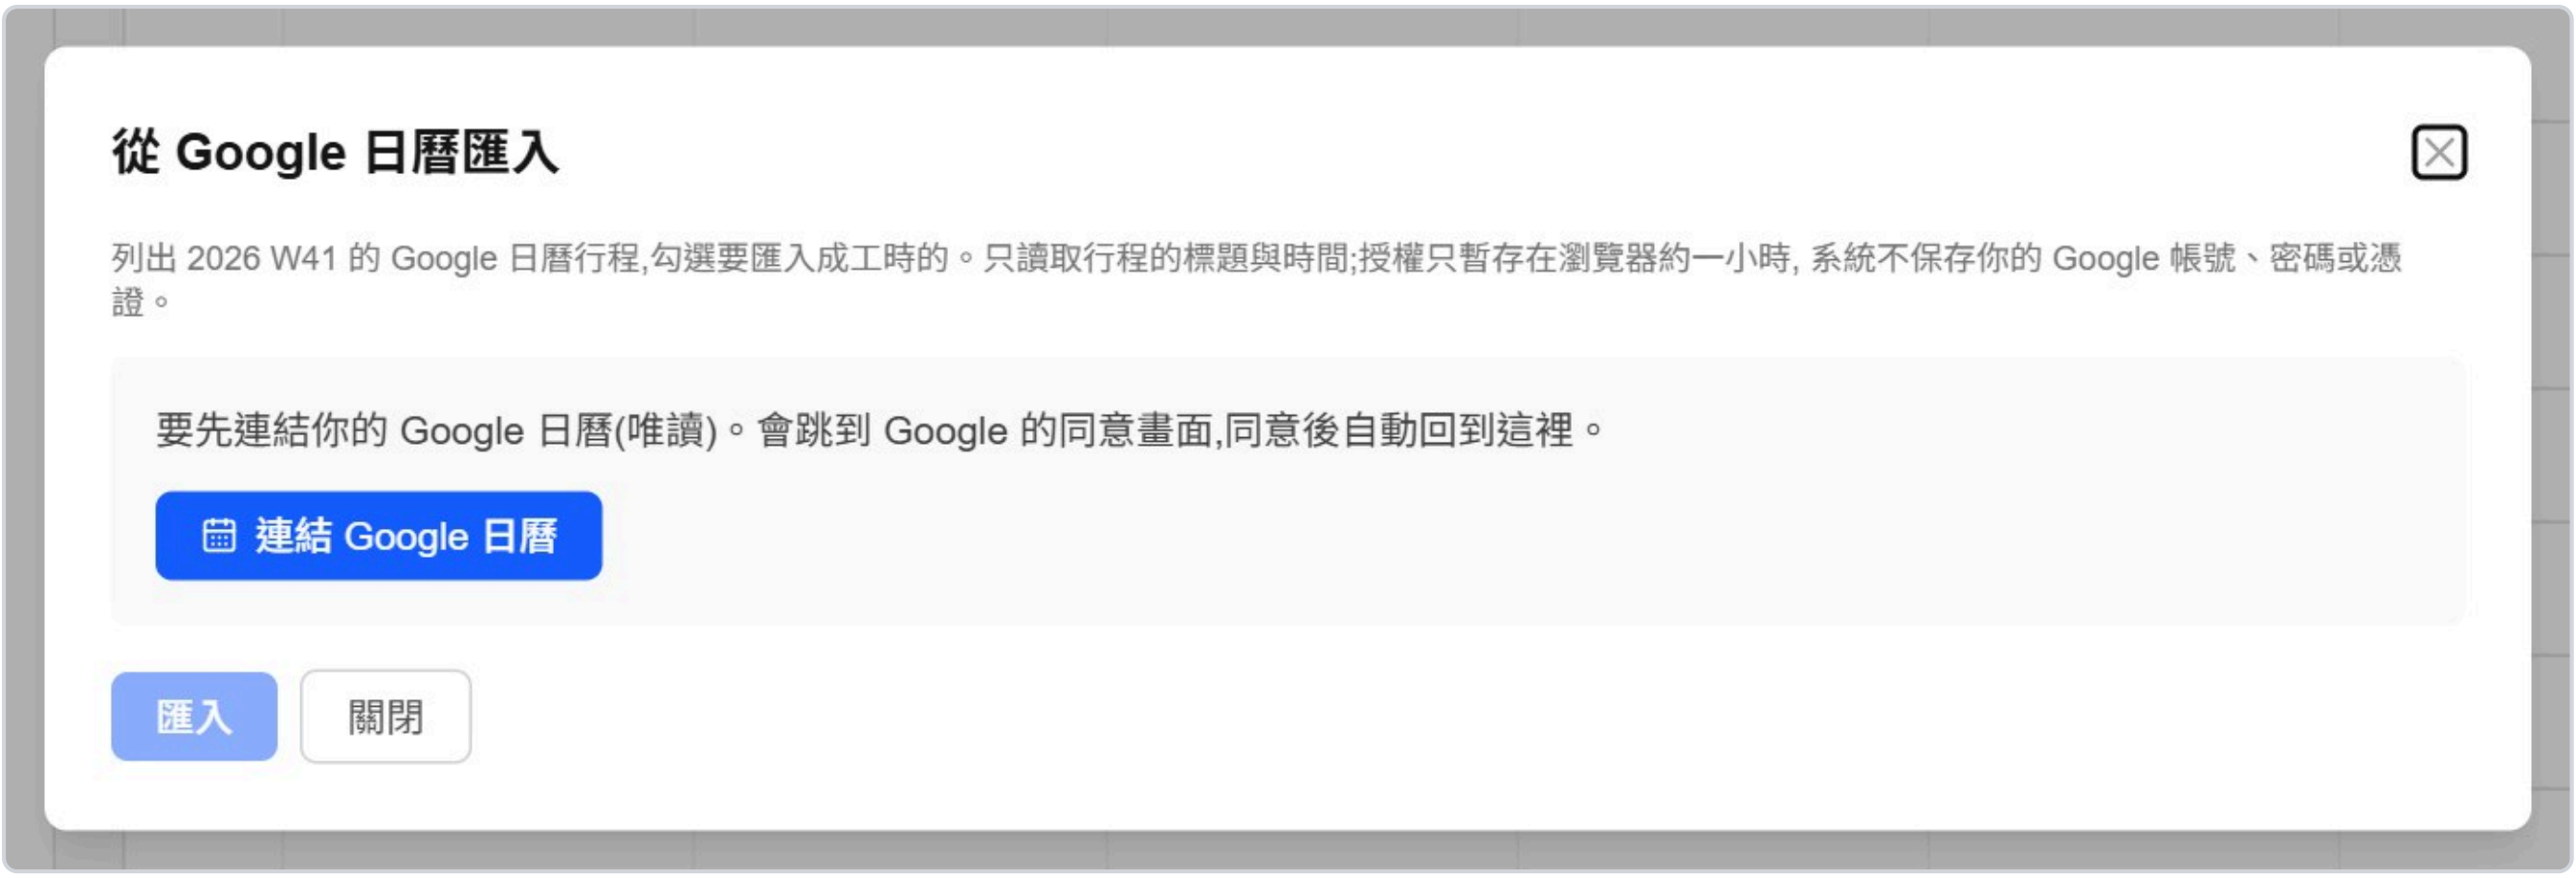

從 Google 日曆匯入

列出 2026 W41 的 Google 日曆行程,勾選要匯入成工時的。只讀取行程的標題與時間;授權只暫存在瀏覽器約一小時, 系統不保存你的 Google 帳號、密碼或憑證。

要先連結你的 Google 日曆(唯讀)。會跳到 Google 的同意畫面,同意後自動回到這裡。

- 連結後視窗上方可以選匯入的範圍:「**每週**」(行事曆正在看的那一週,週一到週日)、「**每月**」(那一週所在的整個月)、「**自訂區間**」(自己選開始與結束日期);選好就會列出那段期間(台灣時間)的行程。一次最多 92 天(約三個月)、500 個行程,超過會提醒你縮小區間。勾選要匯入的;每筆可以選**類別**(預設「例行會議」)和**對應專案**(類別可對應專案時才有)。行程的標題會成為工時的備註,時數以 15 分鐘為單位。
- 已取消的、你已經婉拒的行程不會列出;**全天行程與跨日行程不能匯入**(工時一筆只能在同一天),列在清單下方說明。
- 匯入走一般登記流程:對應專案的要核准、免審核的人直接生效、一天不能超過 24 小時。

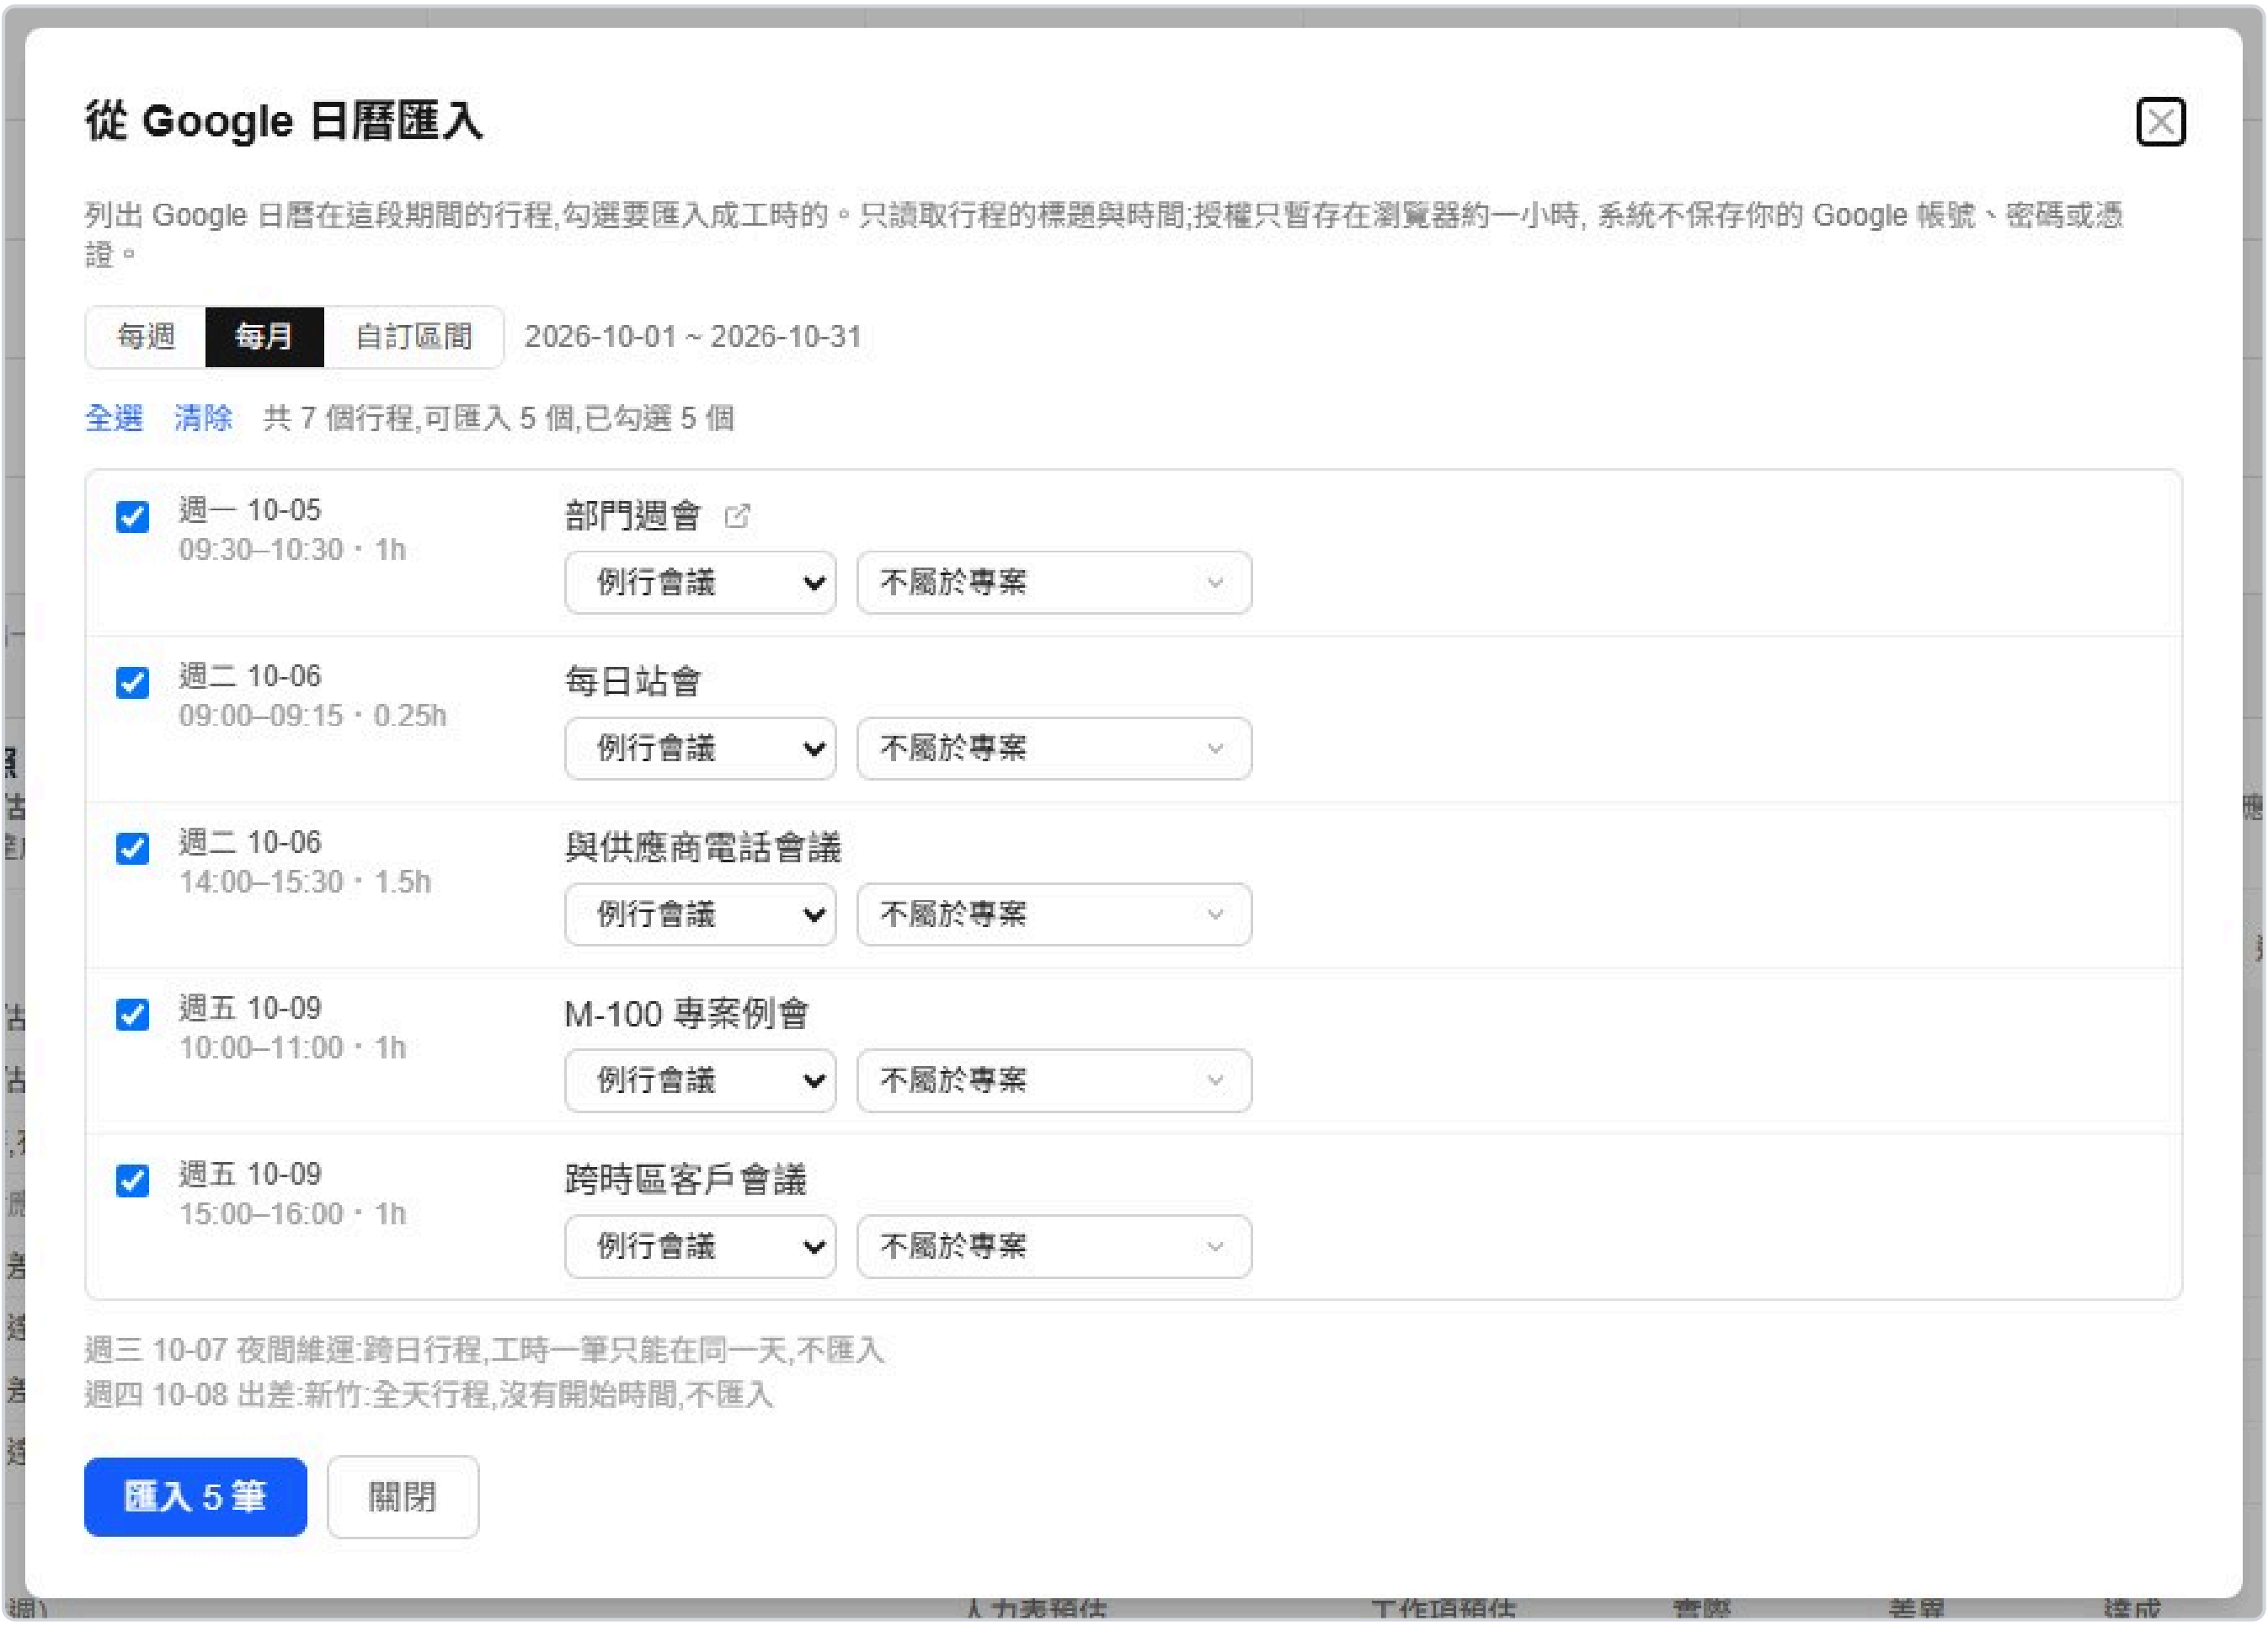

從 Google 日曆匯入

列出 Google 日曆在這段期間的行程,勾選要匯入成工時的。只讀取行程的標題與時間;授權只暫存在瀏覽器約一小時, 系統不保存你的 Google 帳號、密碼或憑證。

每週 **每月** 自訂區間 2026-10-01 ~ 2026-10-31

全選 清除 共 7 個行程,可匯入 5 個,已勾選 5 個

☑ 週一 10-05 09:30–10:30 · 1h 部門週會 例行會議 不屬於專案

☑ 週二 10-06 09:00–09:15 · 0.25h 每日站會 例行會議 不屬於專案

☑ 週二 10-06 14:00–15:30 · 1.5h 與供應商電話會議 例行會議 不屬於專案

☑ 週五 10-09 10:00–11:00 · 1h M-100 專案例會 例行會議 不屬於專案

☑ 週五 10-09 15:00–16:00 · 1h 跨時區客戶會議 例行會議 不屬於專案

週三 10-07 夜間維運:跨日行程,工時一筆只能在同一天,不匯入
週四 10-08 出差:新竹:全天行程,沒有開始時間,不匯入

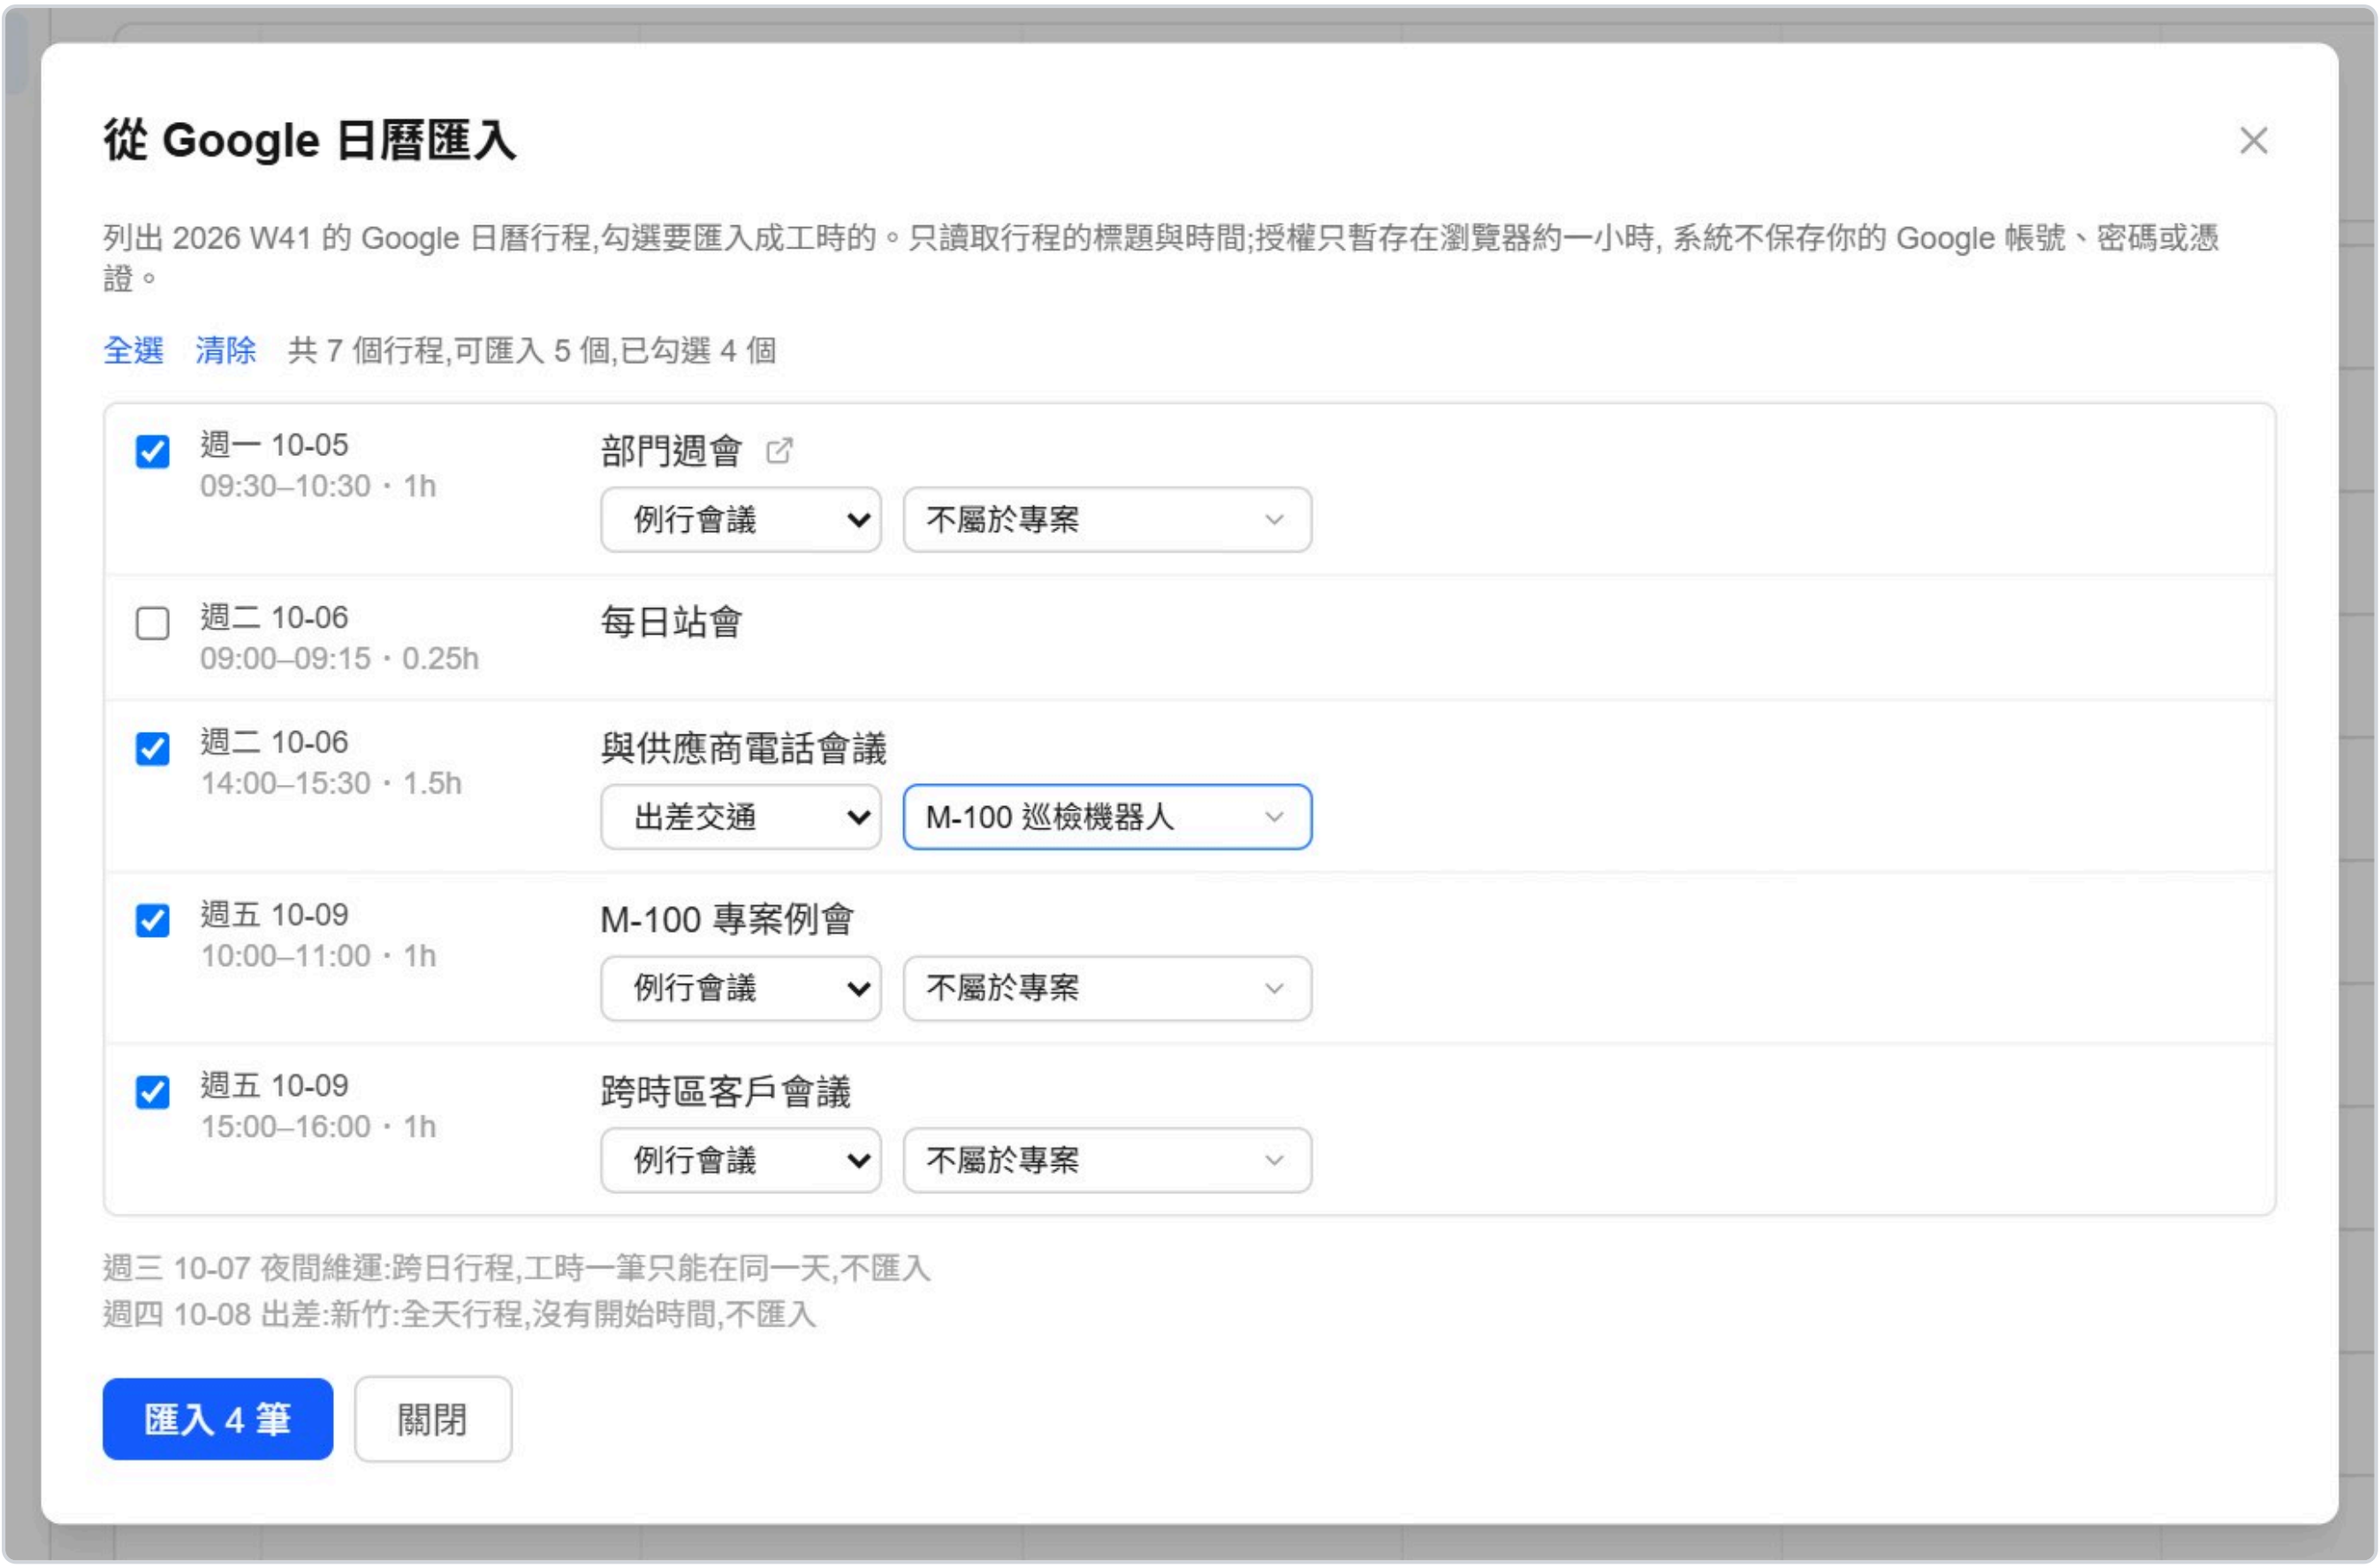

從 Google 日曆匯入

列出 2026 W41 的 Google 日曆行程,勾選要匯入成工時的。只讀取行程的標題與時間;授權只暫存在瀏覽器約一小時, 系統不保存你的 Google 帳號、密碼或憑證。

全選　清除　共 7 個行程,可匯入 5 個,已勾選 4 個

☑ 週一 10-05 09:30–10:30 · 1h　部門週會　例行會議　不屬於專案

□ 週二 10-06 09:00–09:15 · 0.25h　每日站會

☑ 週二 10-06 14:00–15:30 · 1.5h　與供應商電話會議　出差交通　M-100 巡檢機器人

☑ 週五 10-09 10:00–11:00 · 1h　M-100 專案例會　例行會議　不屬於專案

☑ 週五 10-09 15:00–16:00 · 1h　跨時區客戶會議　例行會議　不屬於專案

週三 10-07 夜間維運:跨日行程,工時一筆只能在同一天,不匯入
週四 10-08 出差:新竹:全天行程,沒有開始時間,不匯入

- **重複匯入不會重複建立**:系統記得哪些行程已經匯入(標「已匯入」,不能再勾)。如果日曆上把行程改了時間,會標出「日曆上的時間改了」,再匯入一次**只更新日期、開始時間與時數**,你自己改過的類別、對應專案與備註都保留。
- 之後在行事曆上對這些工時的修改(拖曳、改類別……)都是正常的;匯入只是幫你建立,不會反過來改 Google 日曆。
- **按「連結 Google 日曆」後,Google 的頁面出現「400 發生錯誤。伺服器無法處理格式錯誤的要求」**(網址是 accounts.google.com 或 accounts.google.com.tw 的 `/accounts/SetSID`),或「403 disallowed_useragent」:你用的是**內嵌瀏覽器**——例如 Claude 桌面版的預覽視窗、手機 App 內建的瀏覽器、LINE / Facebook 裡打開的連結。**Google 不允許在這種視窗登入**,跟系統設定、Client ID 都無關。請改用 **Chrome**、**Edge**、**Safari** 這類一般瀏覽器,開啟系統的網址再按連結。系統偵測到內嵌瀏覽器時,連結視窗會直接寫出這段說明,並有「複製這個頁面的網址」可以貼到 Chrome。
- **連結後看到「Google 拒絕讀取日曆」**:畫面會寫明是哪一種原因——「這個 Google Cloud 專案還沒有啟用 Google Calendar API」(附一個可以點的啟用網址,請管理者啟用後等一兩分鐘再按「重試」)、「這次的授權沒有包含讀取日曆行程的權限」(Google 同意畫面上「查看日曆活動」沒有打勾,按「重新連結 Google 日曆」並把權限都勾起來)、額度用完(稍後再試),其他原因會直接顯示 Google 的原話。
- **在 Google 授權完回到工時頁,出現「無法連結 Google 日曆」**:視窗會寫明是哪一步失敗、要怎麼處理,管理者也可以在伺服器的紀錄(`docker logs`,搜尋 `[google-oauth]`)看到同一個原因。常見的幾種:
    - **伺服器連不上 Google(oauth2.googleapis.com)**:公司內部的伺服器要允許對外連線到 Google,請檢查防火牆或代理。
    - **Google 認不得這組用戶端(invalid_client)**:伺服器上的 `GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET` 設錯了。
    - **「已授權的重新導向 URI」沒有登記(redirect_uri_mismatch)**:視窗會附上伺服器用的那個網址,照著一字不差登記到 Google Cloud 的 OAuth 用戶端。

  - **按了取消、或帳號不被允許**:Google Cloud 的 OAuth 同意畫面還在「測試中」時,只有加進「測試使用者」的 Google 帳號能授權。
  - **瀏覽器沒有帶回授權用的暫存資料**:多半是開系統的網址跟伺服器設定的 `APP_BASE_URL` 不是同一個(例如用 IP 或另一個網域開),請改用 `APP_BASE_URL` 那個網址。

---

18. 待我審核與請假

側邊欄「待我審核」(有部屬的主管、專案分組的 Team Leader / PMD / DM 與管理者才看得到)。

- **工時**:你可以核准的專案工時。**核准**之後才計入成本報表的實際成本(AC);**退回**一定要寫原因,讓對方知道要補什麼。
- **專案會議與其他工時**:選了「對應專案」的會議、出差交通等。核准之後才計入那個專案的成本。
- 誰能核准工時:該專案分組的 Team Leader / PMD、同部門的 DM(只限同部門同仁)、送審者的直屬主管、管理者,任何一位就夠;**用什麼身分核准的會記進稽核軌跡**,送審的人也看得到是誰核准的。
- **請假**:你部屬登記的休假。核准後那幾天的產能才歸零,「過度配置」才會把排在假期上的工作點出來。休假**不會**移動任何工作項的日期。
- 不能審核自己送出的紀錄。請假由直屬主管與管理者核准(設了多階簽核時,二階、三階主管也要同意,見下)。

多階簽核(二階、三階主管也要同意):管理者可以在「系統設定 → 簽核層級」分別設定**請假**與**工時(主管這一條路)**要幾階主管同意。預設是「直屬主管」,跟以前完全一樣。誰是誰的幾階主管看「組織架構圖」(見 21.1b)。

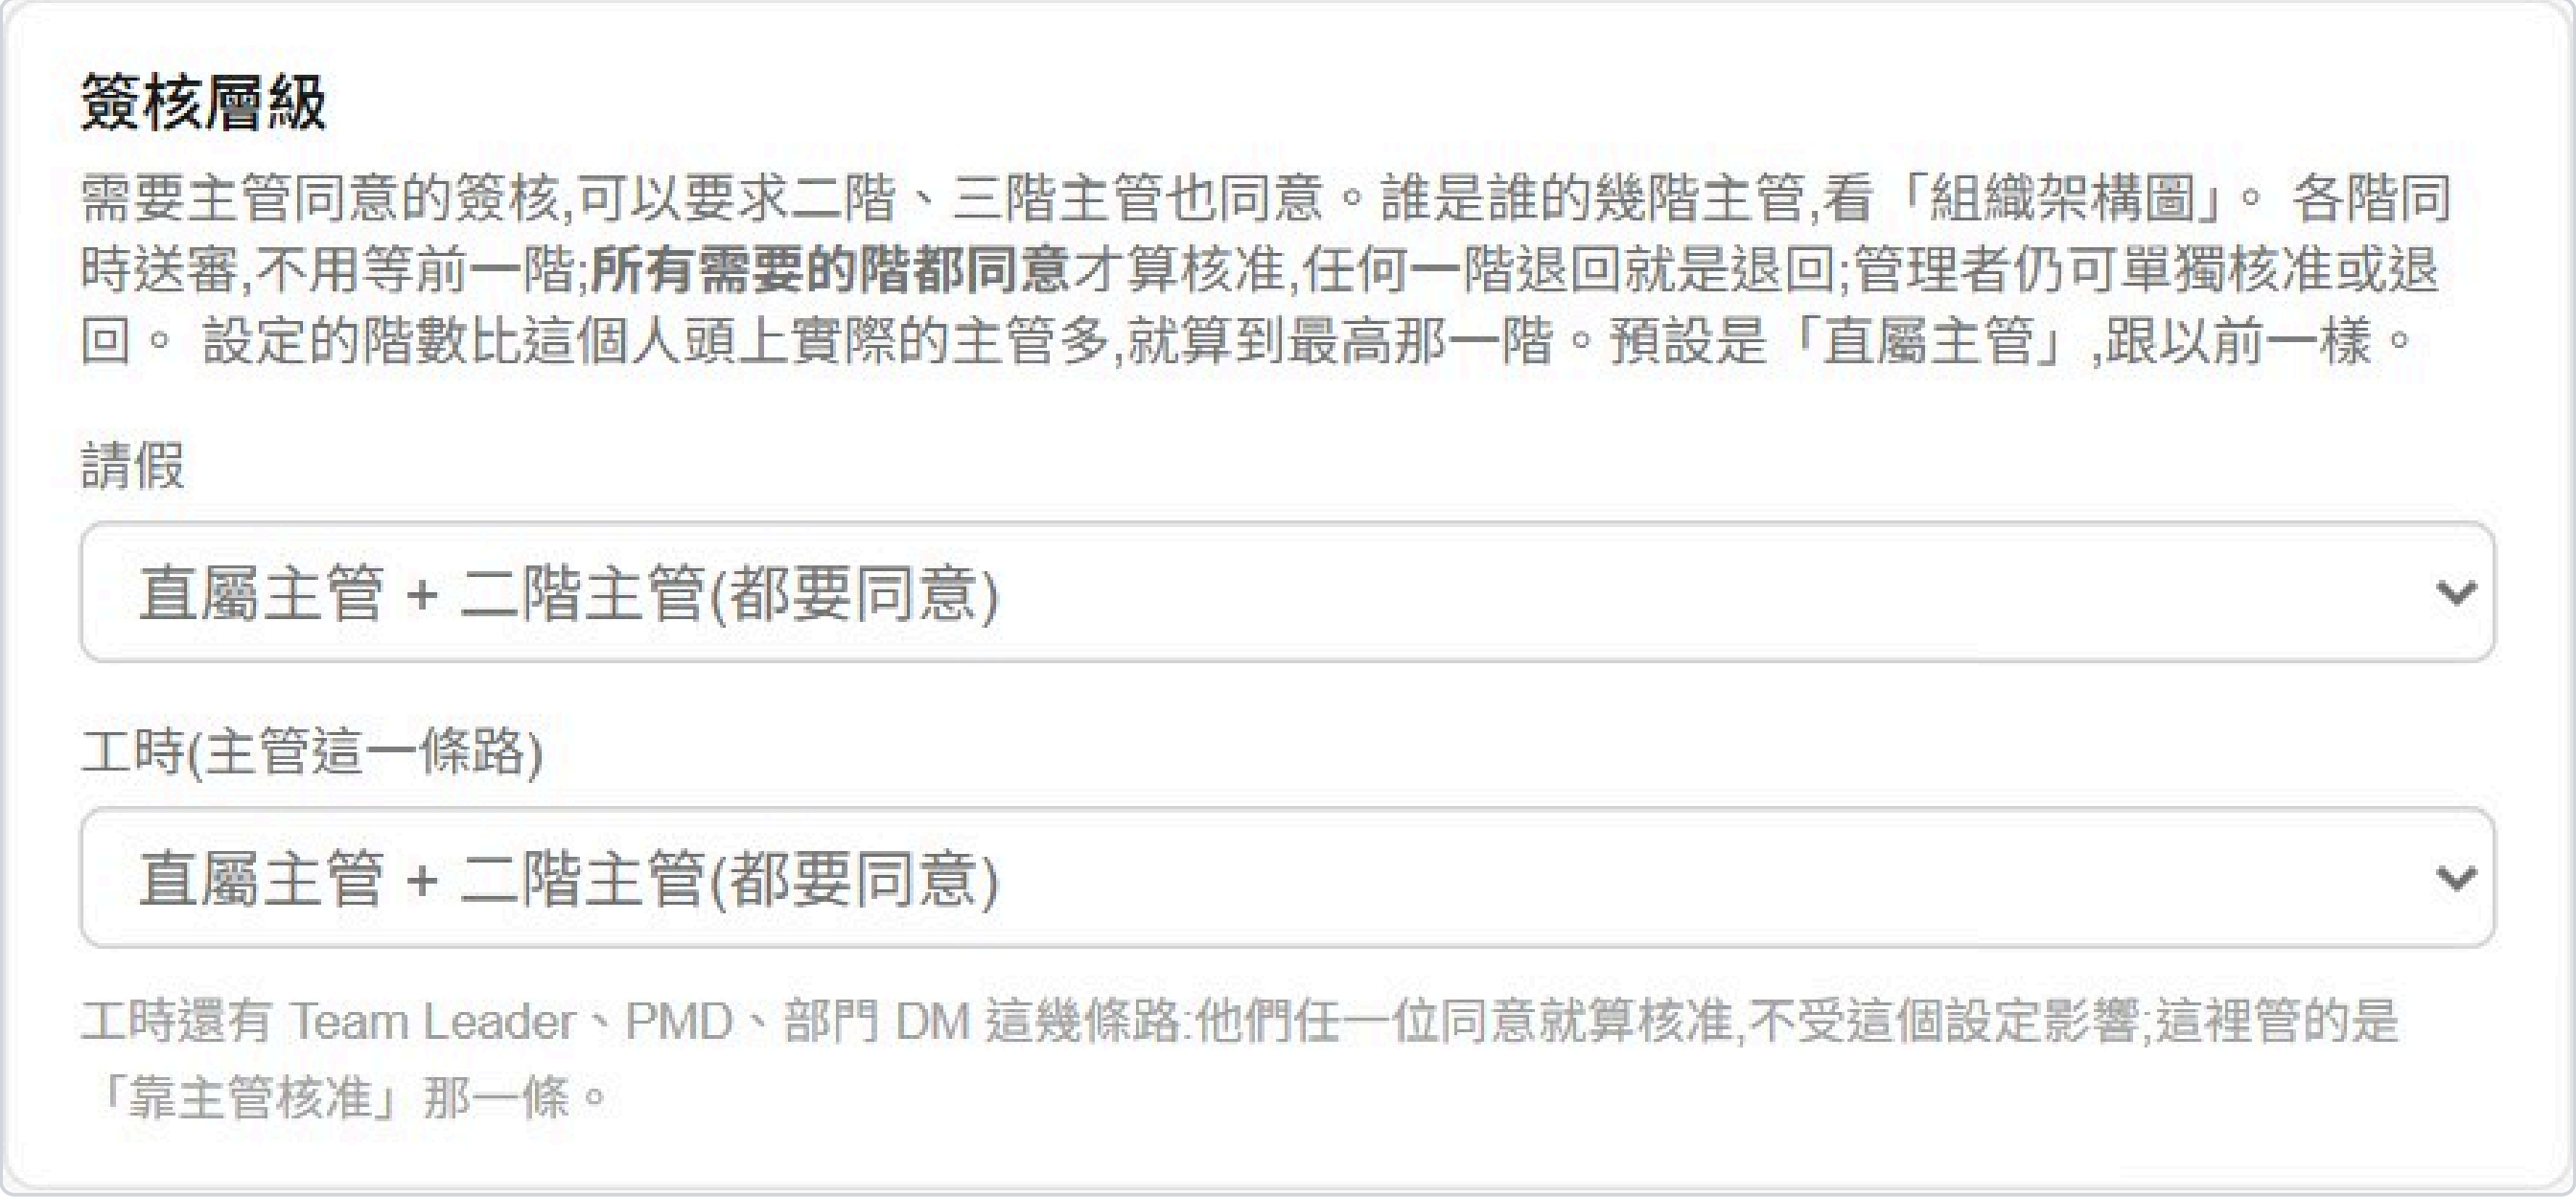

簽核層級

需要主管同意的簽核,可以要求二階、三階主管也同意。誰是誰的幾階主管,看「組織架構圖」。 各階同時送審,不用等前一階;**所有需要的階都同意**才算核准,任何一階退回就是退回;管理者仍可單獨核准或退回。 設定的階數比這個人頭上實際的主管多,就算到最高那一階。預設是「直屬主管」,跟以前一樣。

請假

直屬主管 + 二階主管(都要同意)

工時(主管這一條路)

直屬主管 + 二階主管(都要同意)

工時還有 Team Leader、PMD、部門 DM 這幾條路:他們任一位同意就算核准,不受這個設定影響;這裡管的是「靠主管核准」那一條。

- 設成「直屬主管 + 二階主管(都要同意)」之後,這筆紀錄會**同時**送給直屬主管和二階主管,不用等前一階;**每一階都同意才算核准**,任何一階退回就是退回(要寫原因)。最多可以設到五階。
- 待我審核每一列下面會多一行藍字進度,例如「需 2 階主管同意 — 已簽:直屬主管 朱課長 — 尚待:二階主管 黃部長(你是二階主管)」。你簽過的那一階,這筆就從你的待審清單消失,等其他階。
- 管理者仍然可以單獨核准或退回,不必等各階。
- 設定的階數比這個人頭上實際的主管多(例如設 3 階,但他只有兩位主管),就算到最高那一階。超過設定階數的主管(例如設 2 階時的三階主管)看不到這筆。
- 工時的設定只管「靠主管核准」那一條路;專案分組的 Team Leader / PMD、同部門的 DM 任一位同意就算核准,不受這個設定影響。
- 每一階的核准都各記一筆稽核軌跡。

- **副主管代簽**:組織架構圖裡,部門主管的副主管(或勾了「可代簽」的職能)可以代主管簽那一階——只設一階(直屬主管)時也一樣。他們也會有「待我審核」,看到「你可代簽二階主管」這樣的說明;他簽了就算那一階簽過,**主管本人不用再簽**(那一階從主管的待審清單裡消失);退回也是一位就夠。稽核軌跡會寫明是「代簽」。沒勾「可代簽」的職能(例如行政)看不到、也簽不了。

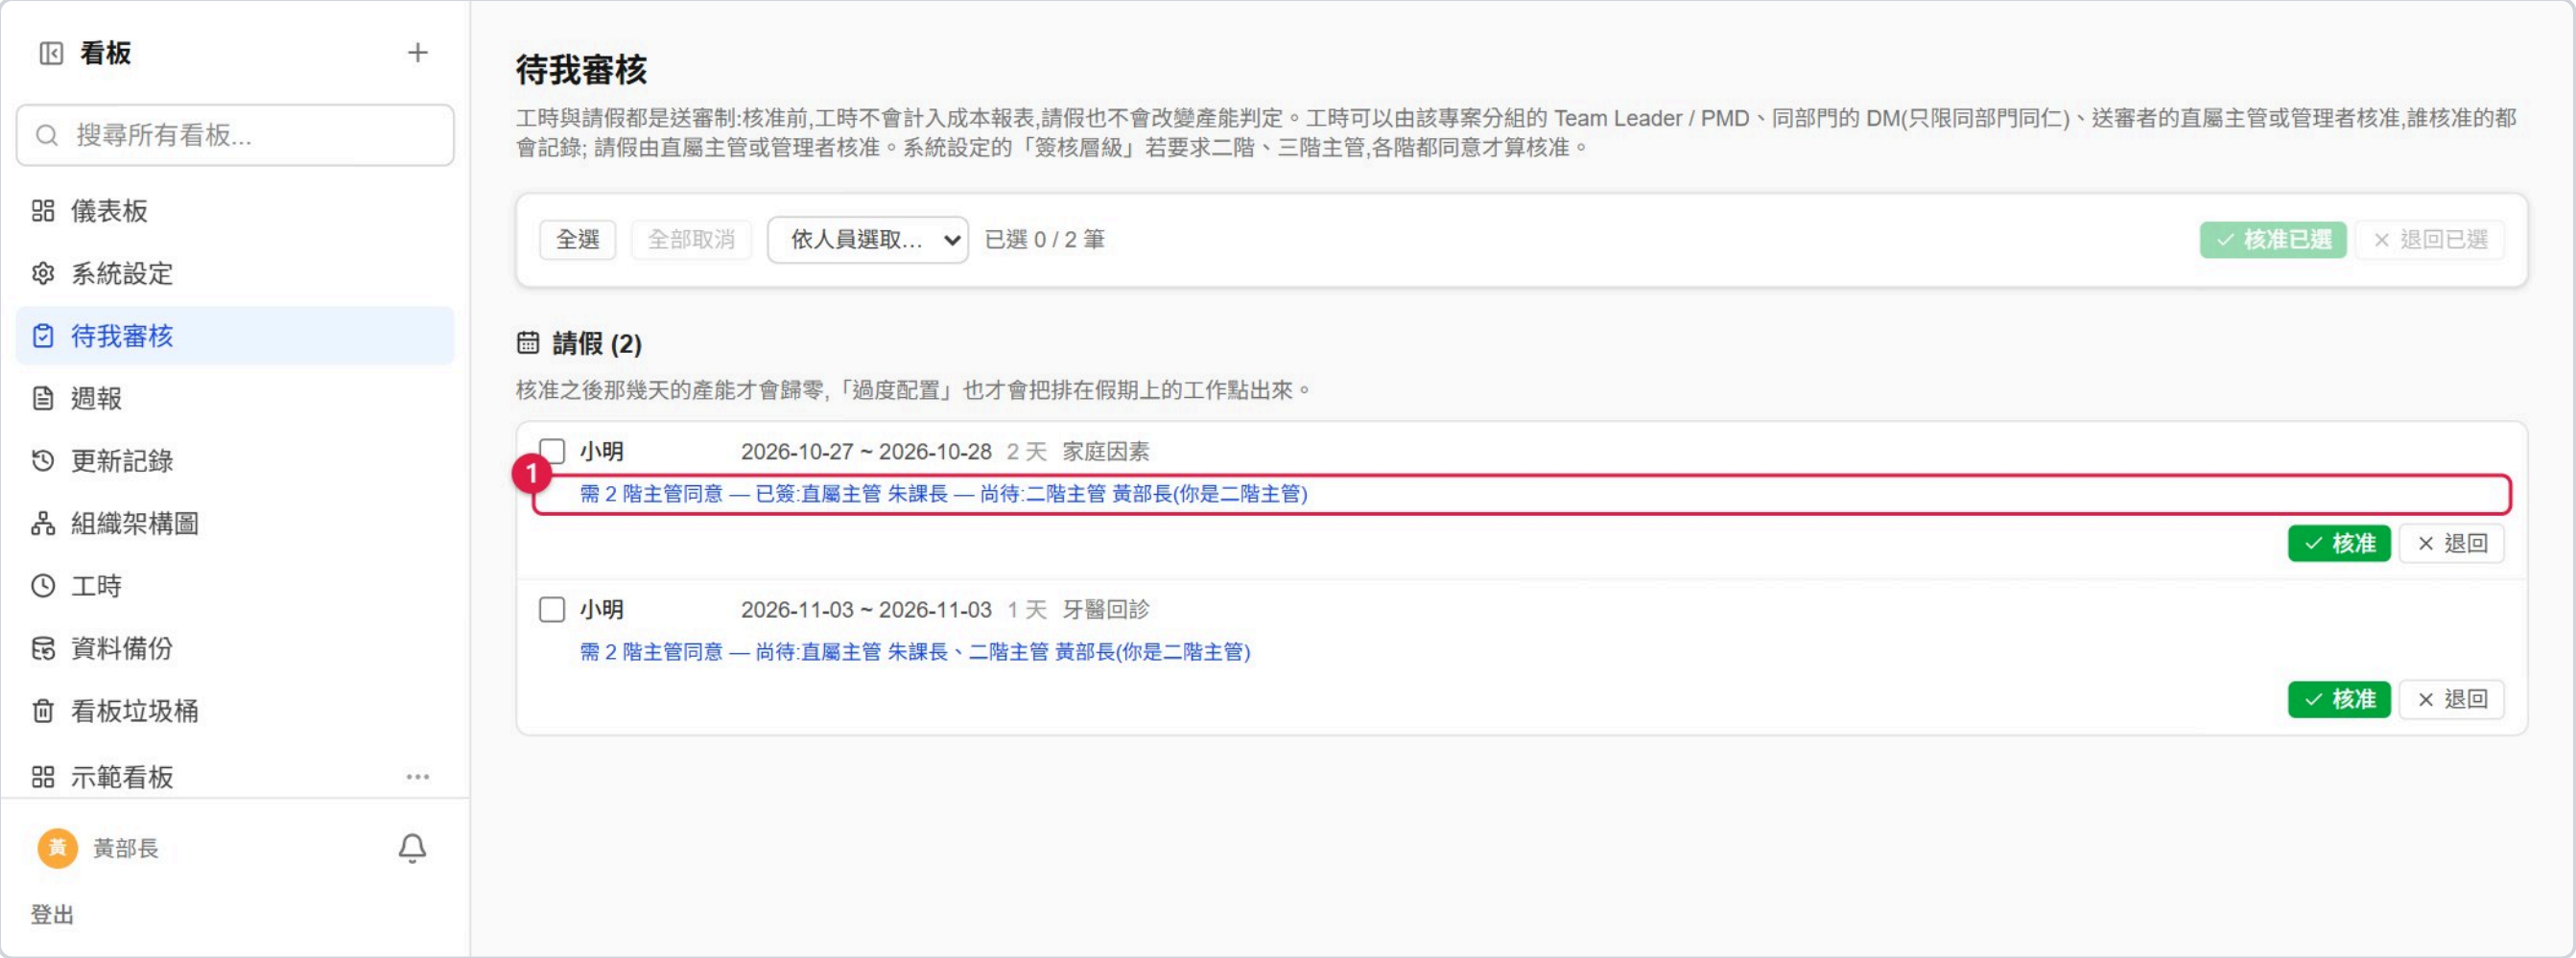

待我審核

工時與請假都是送審制:核准前,工時不會計入成本報表,請假也不會改變產能判定。工時可以由該專案分組的 Team Leader / PMD、同部門的 DM(只限同部門同仁)、送審者的直屬主管或管理者核准,誰核准的都會記錄; 請假由直屬主管或管理者核准。系統設定的「簽核層級」若要求二階、三階主管,各階都同意才算核准。

已選 0 / 2 筆

請假 (2)

核准之後那幾天的產能才會歸零,「過度配置」也才會把排在假期上的工作點出來。

☐ 小明 2026-10-27 ~ 2026-10-28 2 天 家庭因素
需 2 階主管同意 — 已簽:直屬主管 朱課長 — 尚待:二階主管 黃部長(你是二階主管)

☐ 小明 2026-11-03 ~ 2026-11-03 1 天 牙醫回診
需 2 階主管同意 — 尚待:直屬主管 朱課長、二階主管 黃部長(你是二階主管)

一次處理很多筆:每一列最左邊有勾選框(工時、專案會議與其他工時、請假都有),上面的工具列捲動時會固定在畫面最上方:

- **全選 / 全部取消**:一次勾起或取消全部待審的項目,旁邊顯示「已選 幾 / 全部 筆」。
- **依人員選取**(下拉選單):列出每個送審的人,後面是他待審的筆數。**選一個人就選他所有待審的項目**(工時、會議工時、請假都包含),選完選單會回到「依人員選取...」,可以再選下一個人疊加;已經全選的人(前面標 ✓)再選一次就取消他的。只勾了他的一部分時前面標 ◐,這時再選會補成全選。
- **核准已選 / 退回已選**:對勾選的全部一次處理。核准前會先跳出確認,寫明選了什麼(例如「已選 6 筆(工時 4、專案會議與其他工時 1、請假 1)」);退回要寫一個原因,**每一筆都會寫上同一個原因**。
- 權限、稽核紀錄跟一筆一筆按完全一樣——每一筆都會各記一筆稽核,誰核准、以什麼身分。**有幾筆做不到**(例如權限不足,或剛好被別人處理掉了)不會擋住其他的:做得到的照常處理,最後跳出說明成功幾筆、沒成功的原因。
- 每一列右邊原本的「核准」「退回」還在,只處理那一筆。一次最多處理 500 筆。

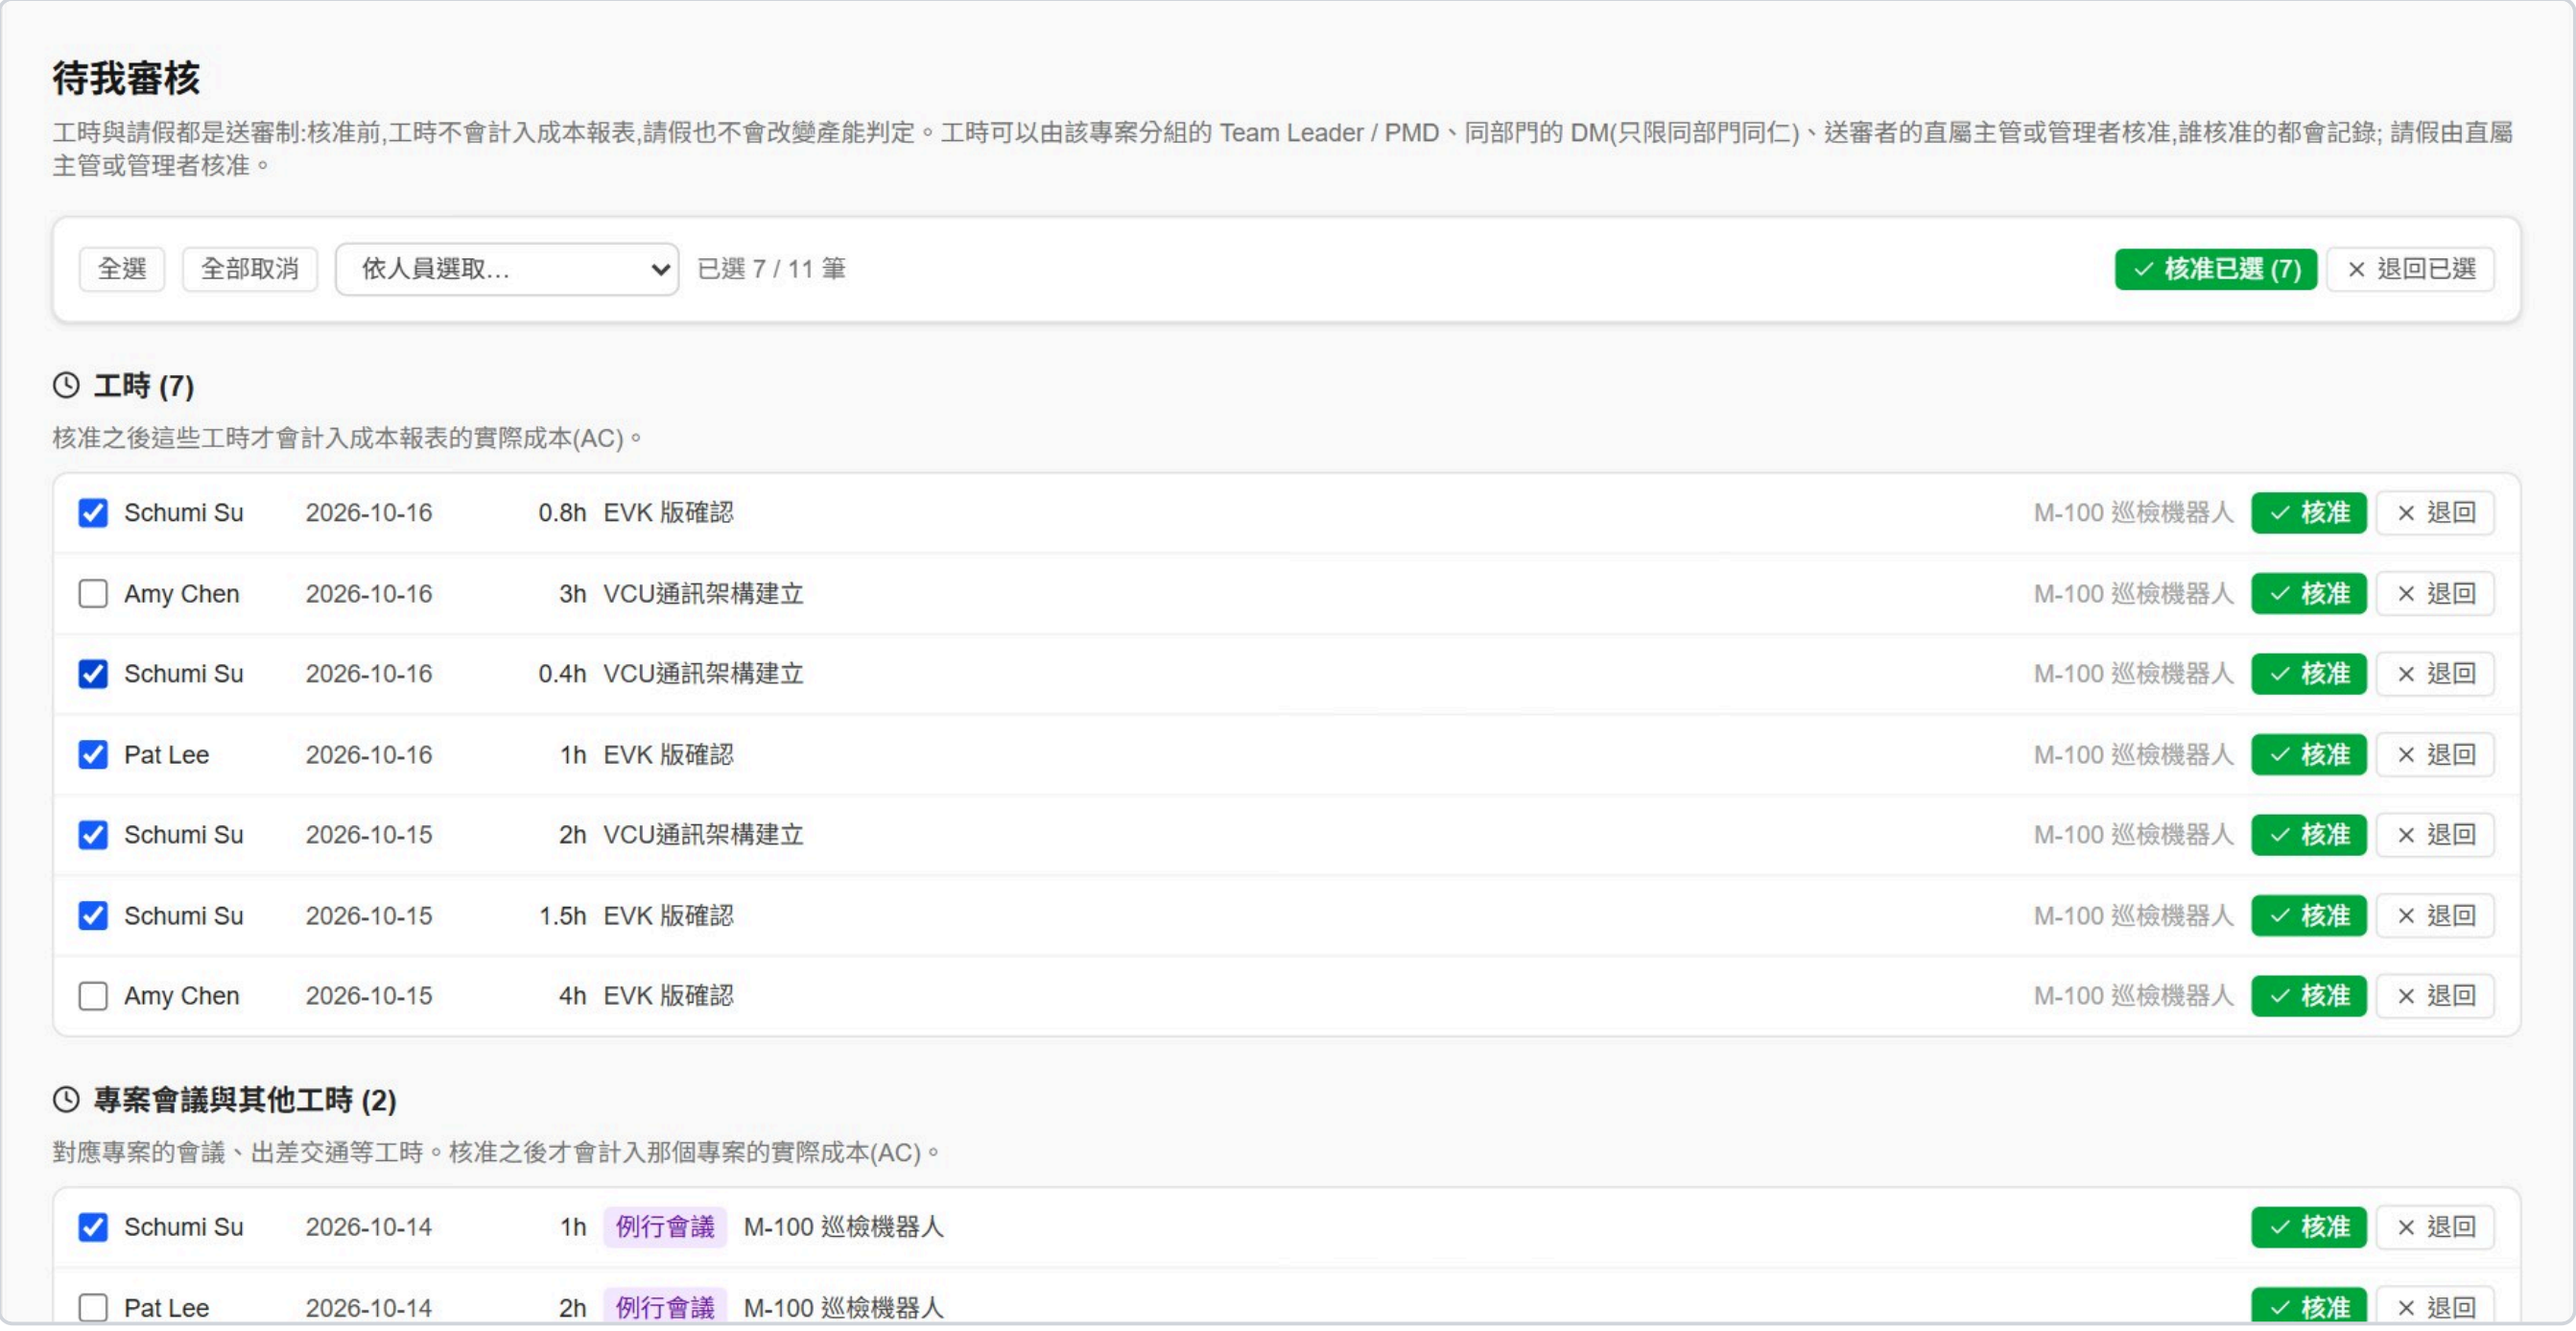

待我審核

工時與請假都是送審制:核准前,工時不會計入成本報表,請假也不會改變產能判定。工時可以由該專案分組的 Team Leader / PMD、同部門的 DM(只限同部門同仁)、送審者的直屬主管或管理者核准,誰核准的都會記錄; 請假由直屬主管或管理者核准。

已選 7 / 11 筆

工時 (7)

核准之後這些工時才會計入成本報表的實際成本(AC)。

☑	Schumi Su	2026-10-16	0.8h	EVK 版確認	M-100 巡檢機器人
☐	Amy Chen	2026-10-16	3h	VCU通訊架構建立	M-100 巡檢機器人
☑	Schumi Su	2026-10-16	0.4h	VCU通訊架構建立	M-100 巡檢機器人
☑	Pat Lee	2026-10-16	1h	EVK 版確認	M-100 巡檢機器人
☑	Schumi Su	2026-10-15	2h	VCU通訊架構建立	M-100 巡檢機器人
☑	Schumi Su	2026-10-15	1.5h	EVK 版確認	M-100 巡檢機器人
☐	Amy Chen	2026-10-15	4h	EVK 版確認	M-100 巡檢機器人

專案會議與其他工時 (2)

對應專案的會議、出差交通等工時。核准之後才會計入那個專案的實際成本(AC)。

☑	Schumi Su	2026-10-14	1h	例行會議	M-100 巡檢機器人
☐	Pat Lee	2026-10-14	2h	例行會議	M-100 巡檢機器人

登記請假:目前由管理者在「使用者管理」的「**休假**」分頁替成員登記,填起訖日與事由,送出後狀態為「待主管核准」。

19. 週報

側邊欄「週報」。每週一份,涵蓋範圍跟你登入時看得到的看板一樣。

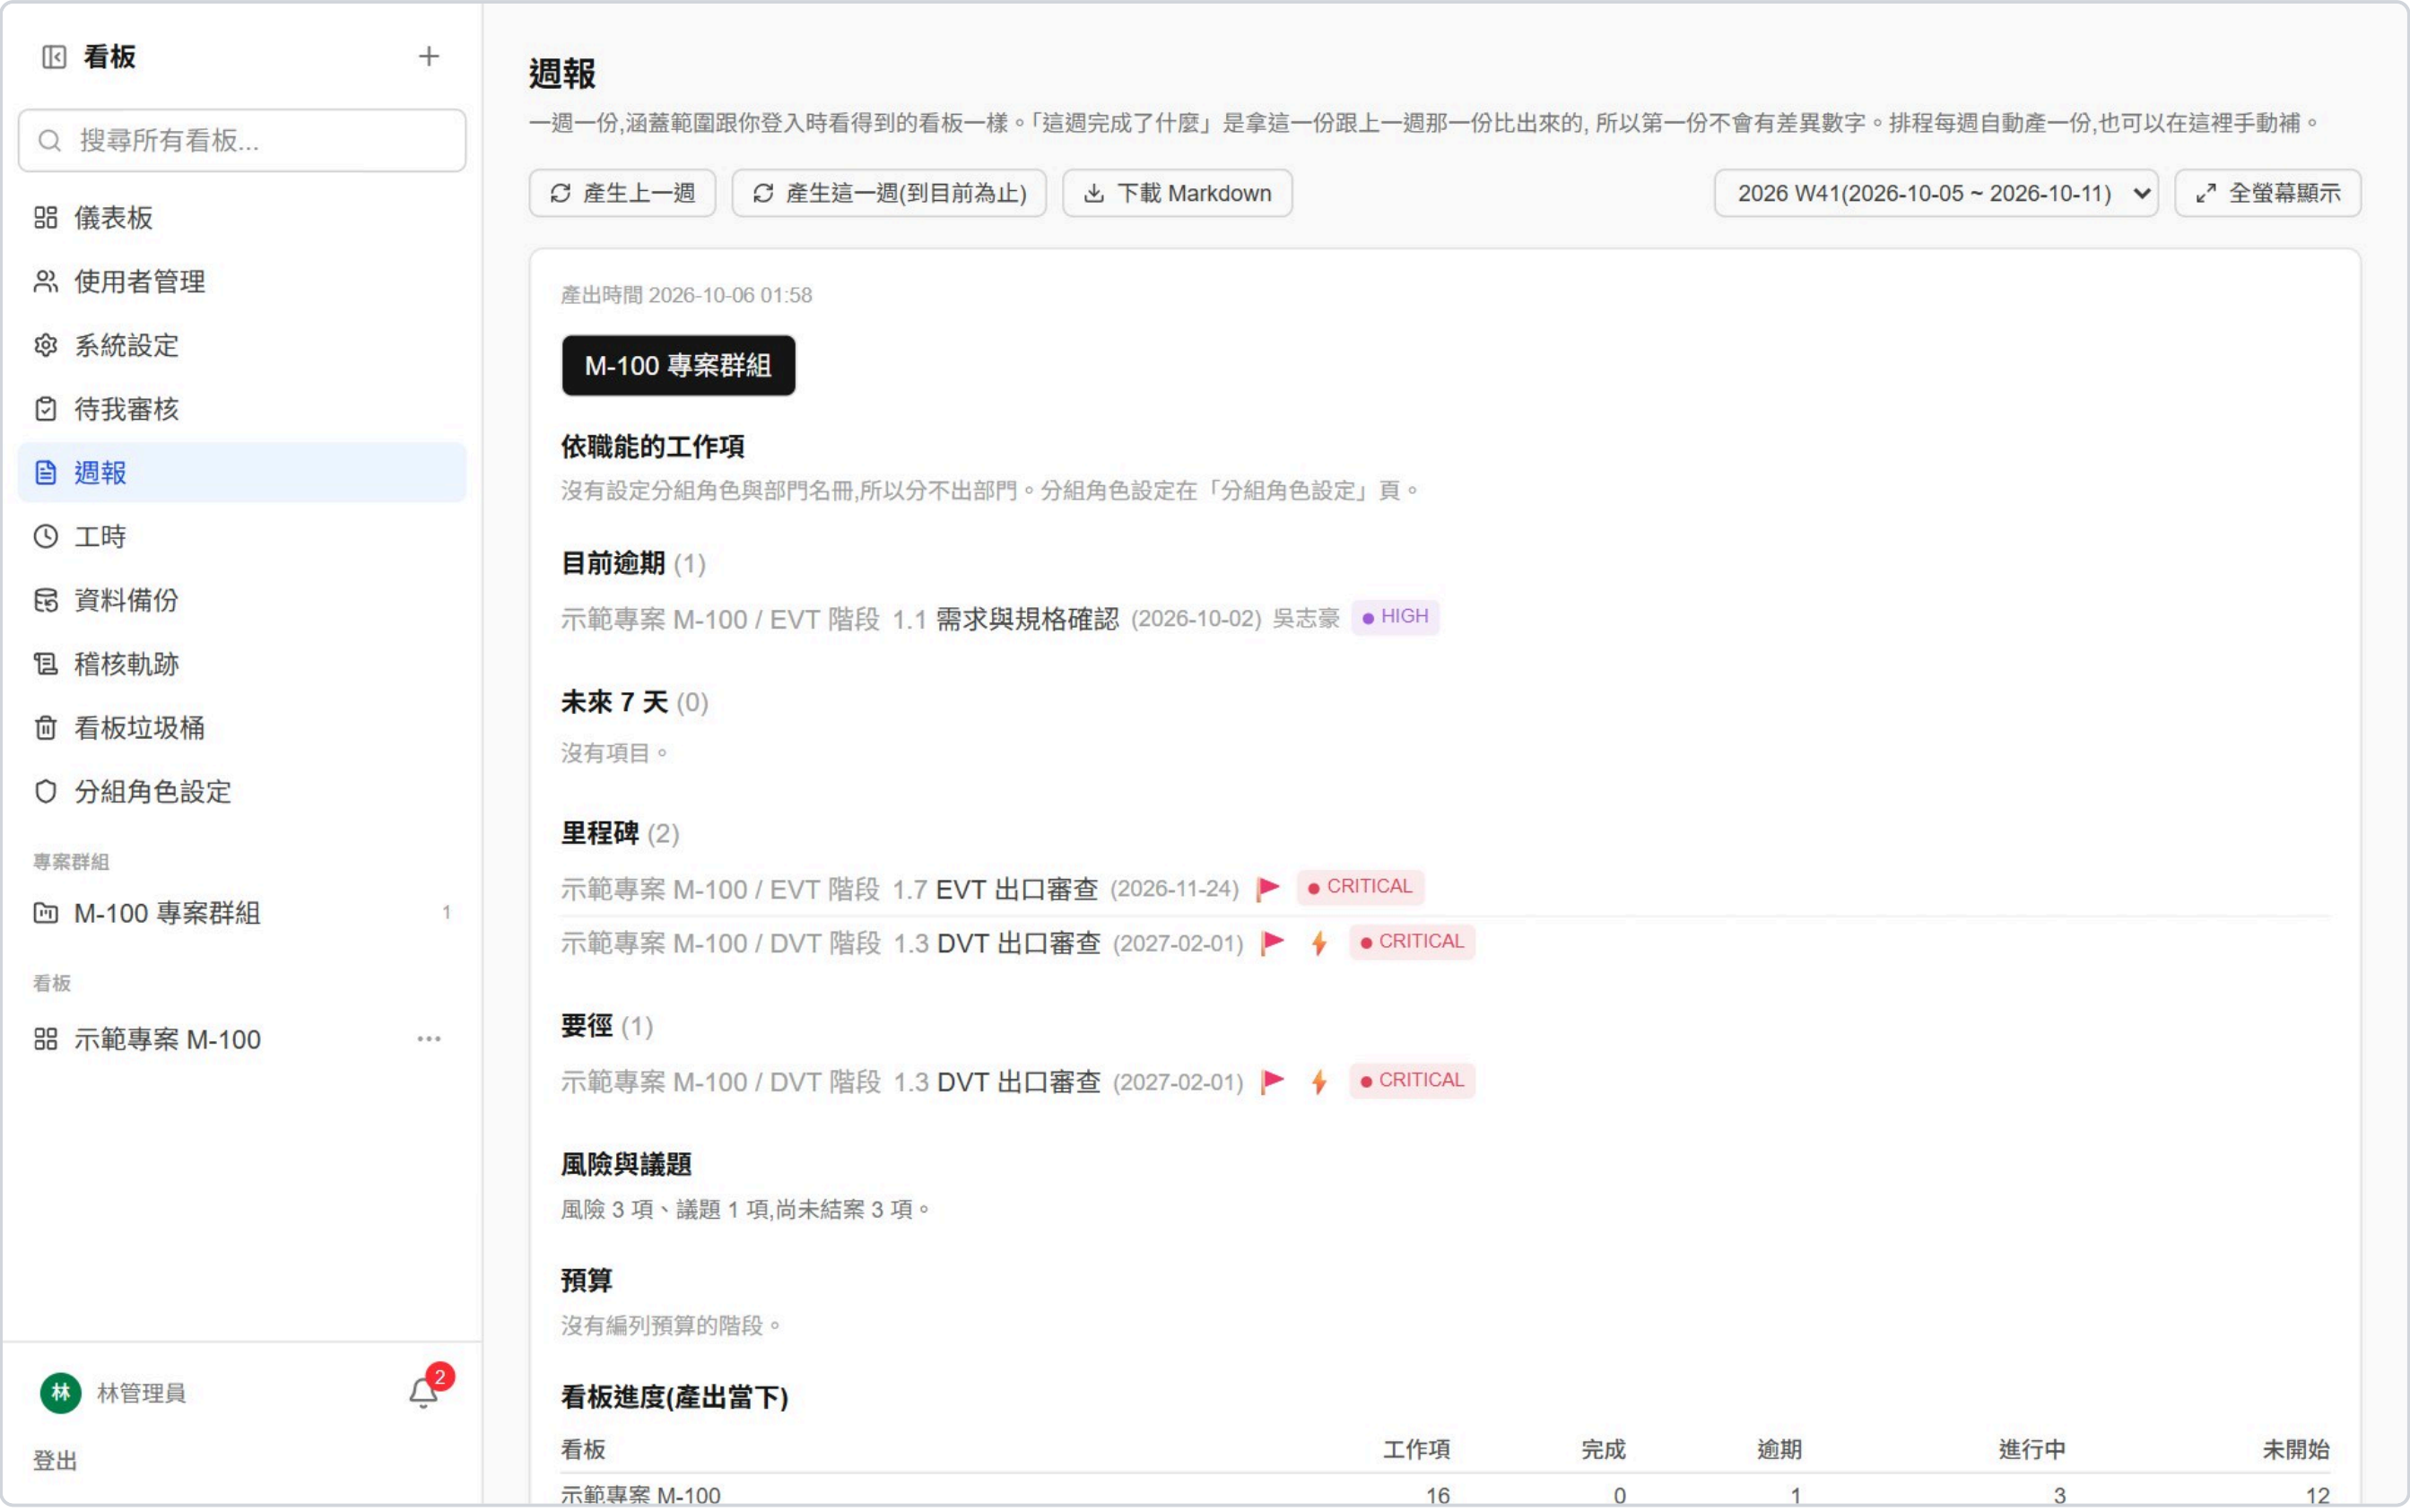
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林
林管理員
2
登出
產生上一週
產生這一週(到目前為止)
下載 Markdown
2026 W41(2026-10-05 ~ 2026-10-11)
全螢幕顯示
HIGH
CRITICAL
CRITICAL
CRITICAL

週報

一週一份,涵蓋範圍跟你登入時看得到的看板一樣。「這週完成了什麼」是拿這一份跟上一週那一份比出來的, 所以第一份不會有差異數字。排程每週自動產一份,也可以在這裡手動補。

產出時間 2026-10-06 01:58

M-100 專案群組

依職能的工作項

沒有設定分組角色與部門名冊,所以分不出部門。分組角色設定在「分組角色設定」頁。

目前逾期 (1)

示範專案 M-100 / EVT 階段 1.1 需求與規格確認 (2026-10-02) 吳志豪 ● HIGH

未來 7 天 (0)

沒有項目。

里程碑 (2)

示範專案 M-100 / EVT 階段 1.7 EVT 出口審查 (2026-11-24) ● CRITICAL

示範專案 M-100 / DVT 階段 1.3 DVT 出口審查 (2027-02-01) ● CRITICAL

要徑 (1)

示範專案 M-100 / DVT 階段 1.3 DVT 出口審查 (2027-02-01) ● CRITICAL

風險與議題

風險 3 項、議題 1 項,尚未結案 3 項。

預算

沒有編列預算的階段。

看板進度(產出當下)

看板	工作項	完成	逾期	進行中	未開始
示範專案 M-100	16	0	1	3	12

- 「產生上一週」「產生這一週(到目前為止)」可以手動補一份;右上角下拉選單翻歷史週報;「下載 Markdown」存檔;「全螢幕顯示」。
- **週報是產生當下的快照:**畫面上「產出時間」(台北時間)之後才發生的事——切成完成、留言、改進度——不在那一份裡面,所以工作項明明有更新、週報卻看不到,先看產出時間。如果這份是前幾天產的、而它的範圍在產生之後才結束(例如週二產了「這一週」、現在已經週日),上面會多一行**黃色提醒**「這份是...產生的快照,...之後的更新不在裡面」;要看最新的,按「產生這一週(到目前為止)」重新產生(會再寄一封信給你)。排程每週自動產的那一份,是在範圍結束**之後**才產的,不會有這個提醒。
- **工作項底下附上:更新、連結、待辦事項、欄位修改**(按鈕旁邊的四個勾選,**預設都勾**):決定這次產生的週報,每個工作項底下附哪些資訊——「更新」是更新分頁的留言,「連結」含連結與附件,「待辦事項」是新增與勾選完成的待辦,「**欄位修改**」是欄位上的修改(進度 % Done、改名、指派、使用樣機...,就是「更新記錄」頁標「修改」「指派」的那些)。**狀態變化(切成進行中、完成)一定會附。**排程自動產的週報四項都附。

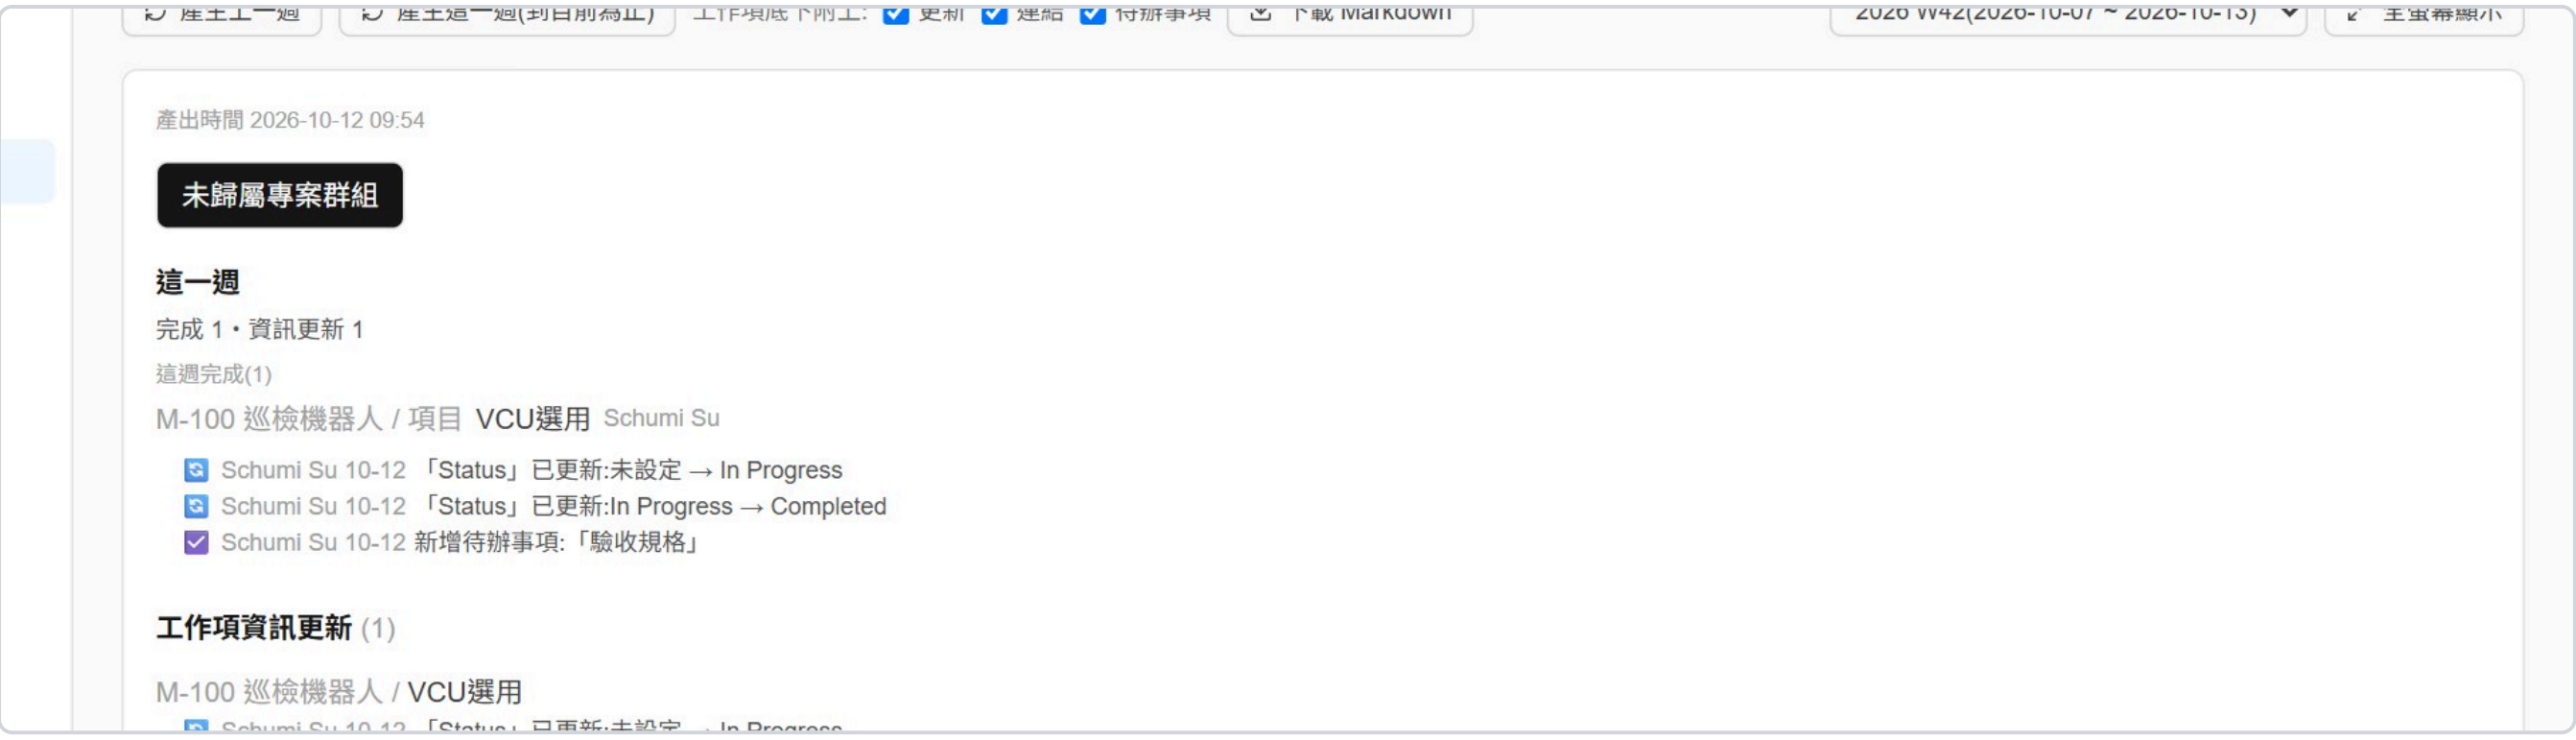

產出時間 2026-10-12 09:54

未歸屬專案群組

這一週

完成 1・資訊更新 1

這週完成(1)

M-100 巡檢機器人 / 項目 VCU選用 Schumi Su

- Schumi Su 10-12 「Status」已更新:未設定 → In Progress
- Schumi Su 10-12 「Status」已更新:In Progress → Completed
- ☑ Schumi Su 10-12 新增待辦事項:「驗收規格」

工作項資訊更新 (1)

M-100 巡檢機器人 / VCU選用

- **每一筆也可以決定要不要進週報**:工作項視窗的「**更新**」「**連結**」「**待辦事項**」三個分頁,新增時旁邊都有「**更新至週報**」勾選(**預設勾選**),**每一則更新、每一個連結、每一個待辦事項**右邊也各有一個「**週報**」勾選,之後隨時可以改。**沒勾的那一筆不會彙整進週報**(不論上面「這次附哪些」怎麼勾);待辦事項的勾選管它的新增與完成兩筆紀錄。改別人寫的更新或加的連結要是寫的人、主管或管理者。狀態變化一定會附,沒有這個勾選。
- 內容:**工作項資訊更新**、依職能的工作項、目前逾期、未來 7 天、里程碑、要徑、風險與議題、預算(只有看得到預算的人才有金額,見第 2 章)、各看板進度,以及「這週 vs 上週」的差異(完成、新逾期、狀態更新、時程變化、新增 / 結案的風險)。第一份週報沒有上週可以比,所以沒有差異數字——只有「完成」例外:**這週完成**以**實際把狀態切成完成的時間**為準,不必靠上週去比,所以第一份也列得出來(沒有切換紀錄的舊資料才拿上週那一份去比)。
- **週報涵蓋的範圍**不一定是週一到週日:管理者在系統設定設定「從星期幾到星期幾」,預設**週三到週二**(見 21.3)。週數標籤(例如 W41)看範圍的最後一天落在哪個 ISO 週;「產生上一週」與排程報的是**已經結束**的那一個範圍(最後一天過完才算結束)。

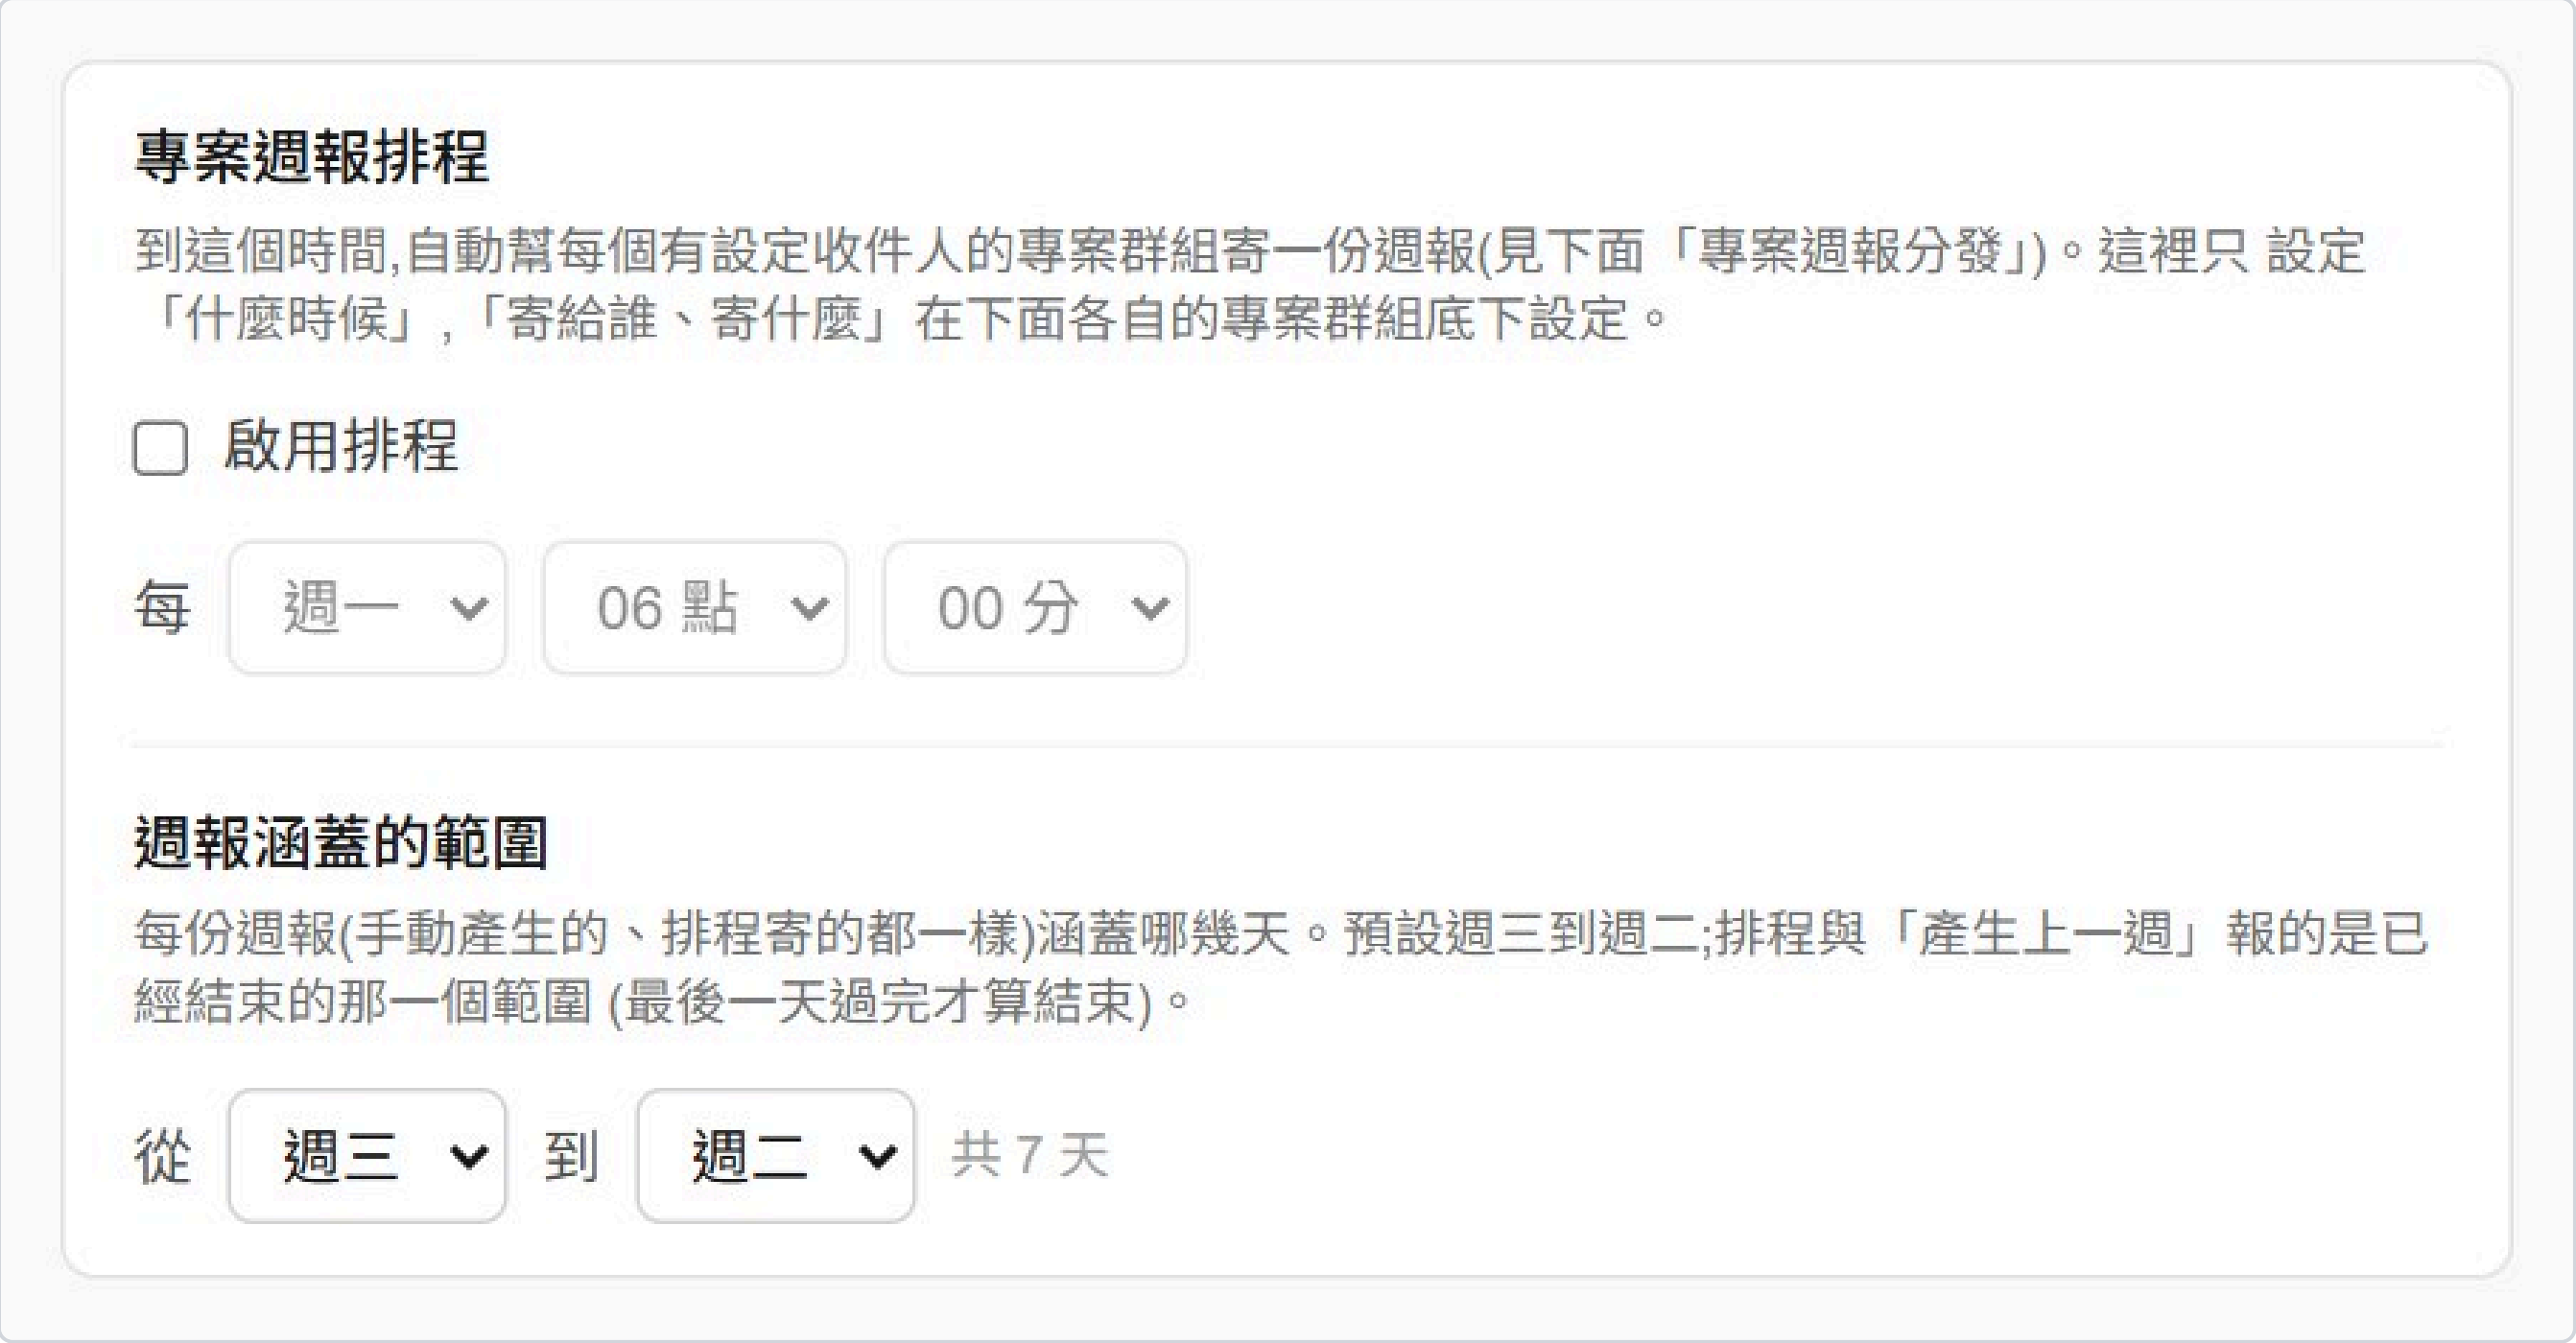

專案週報排程

到這個時間,自動幫每個有設定收件人的專案群組寄一份週報(見下面「專案週報分發」)。這裡只 設定「什麼時候」,「寄給誰、寄什麼」在下面各自的專案群組底下設定。

□ 啟用排程

每 週一 06 點 00 分

週報涵蓋的範圍

每份週報(手動產生的、排程寄的都一樣)涵蓋哪幾天。預設週三到週二;排程與「產生上一週」報的是已經結束的那一個範圍 (最後一天過完才算結束)。

從 週三 到 週二 共 7 天

- **產生前提醒同仁更新工作事項**:系統設定 → 專案週報排程裡有一欄「**週報產生前 N 小時寄提醒信**」(預設 **0 = 不提醒**,可填 0 到 168,離開欄位就存)。填了之後,每一輪週報產生**前 N 小時**,系統會寄一封信給**會寄週報的專案的成員**,信裡說明:
    - 他**所屬的專案名稱**(標題與內文都寫,例如「【週報提醒】M3、PS30 週報將於…」);

  - 週報**什麼時候產生**(日期、星期、時間),以及這份週報**涵蓋哪一段日期**;
  - 請在那之前到系統**更新自己負責的工作事項**(狀態與進度、日期、卡住或有風險的在項目留言),週報以產生當下系統裡的資料為準。
  - 設定欄位底下會直接寫出「提醒信會在 週日 06:00 寄出,信裡會說明週報於 週一 06:00 產生」,填完就看得到寄出時間。
  - **誰會收到**:有設定週報收件人的專案群組,底下**看板的擁有者、看板成員、看板與分組的角色(Team Leader、DM、PMD...)、分組成員**。**不在這些名單裡的人不會收到**,包括只是被指派到某個工作項(人員分配或負責人欄位)、卻不是成員或角色的人;同時在好幾個專案的人**只收一封**,信裡把他的專案全部列出來;週報的收件人如果不是專案成員(例如外部信箱),也不會收到提醒。
  - **什麼時候不寄**:排程沒有啟用,或沒有任何專案群組設定了週報收件人(週報不會寄,就不用提醒大家),或這些專案底下沒有任何成員可以提醒;同一輪只寄一次,不會重複。一封都沒寄出去(例如信箱沒設定、SMTP 暫時掛掉)時,下一次檢查會再試。

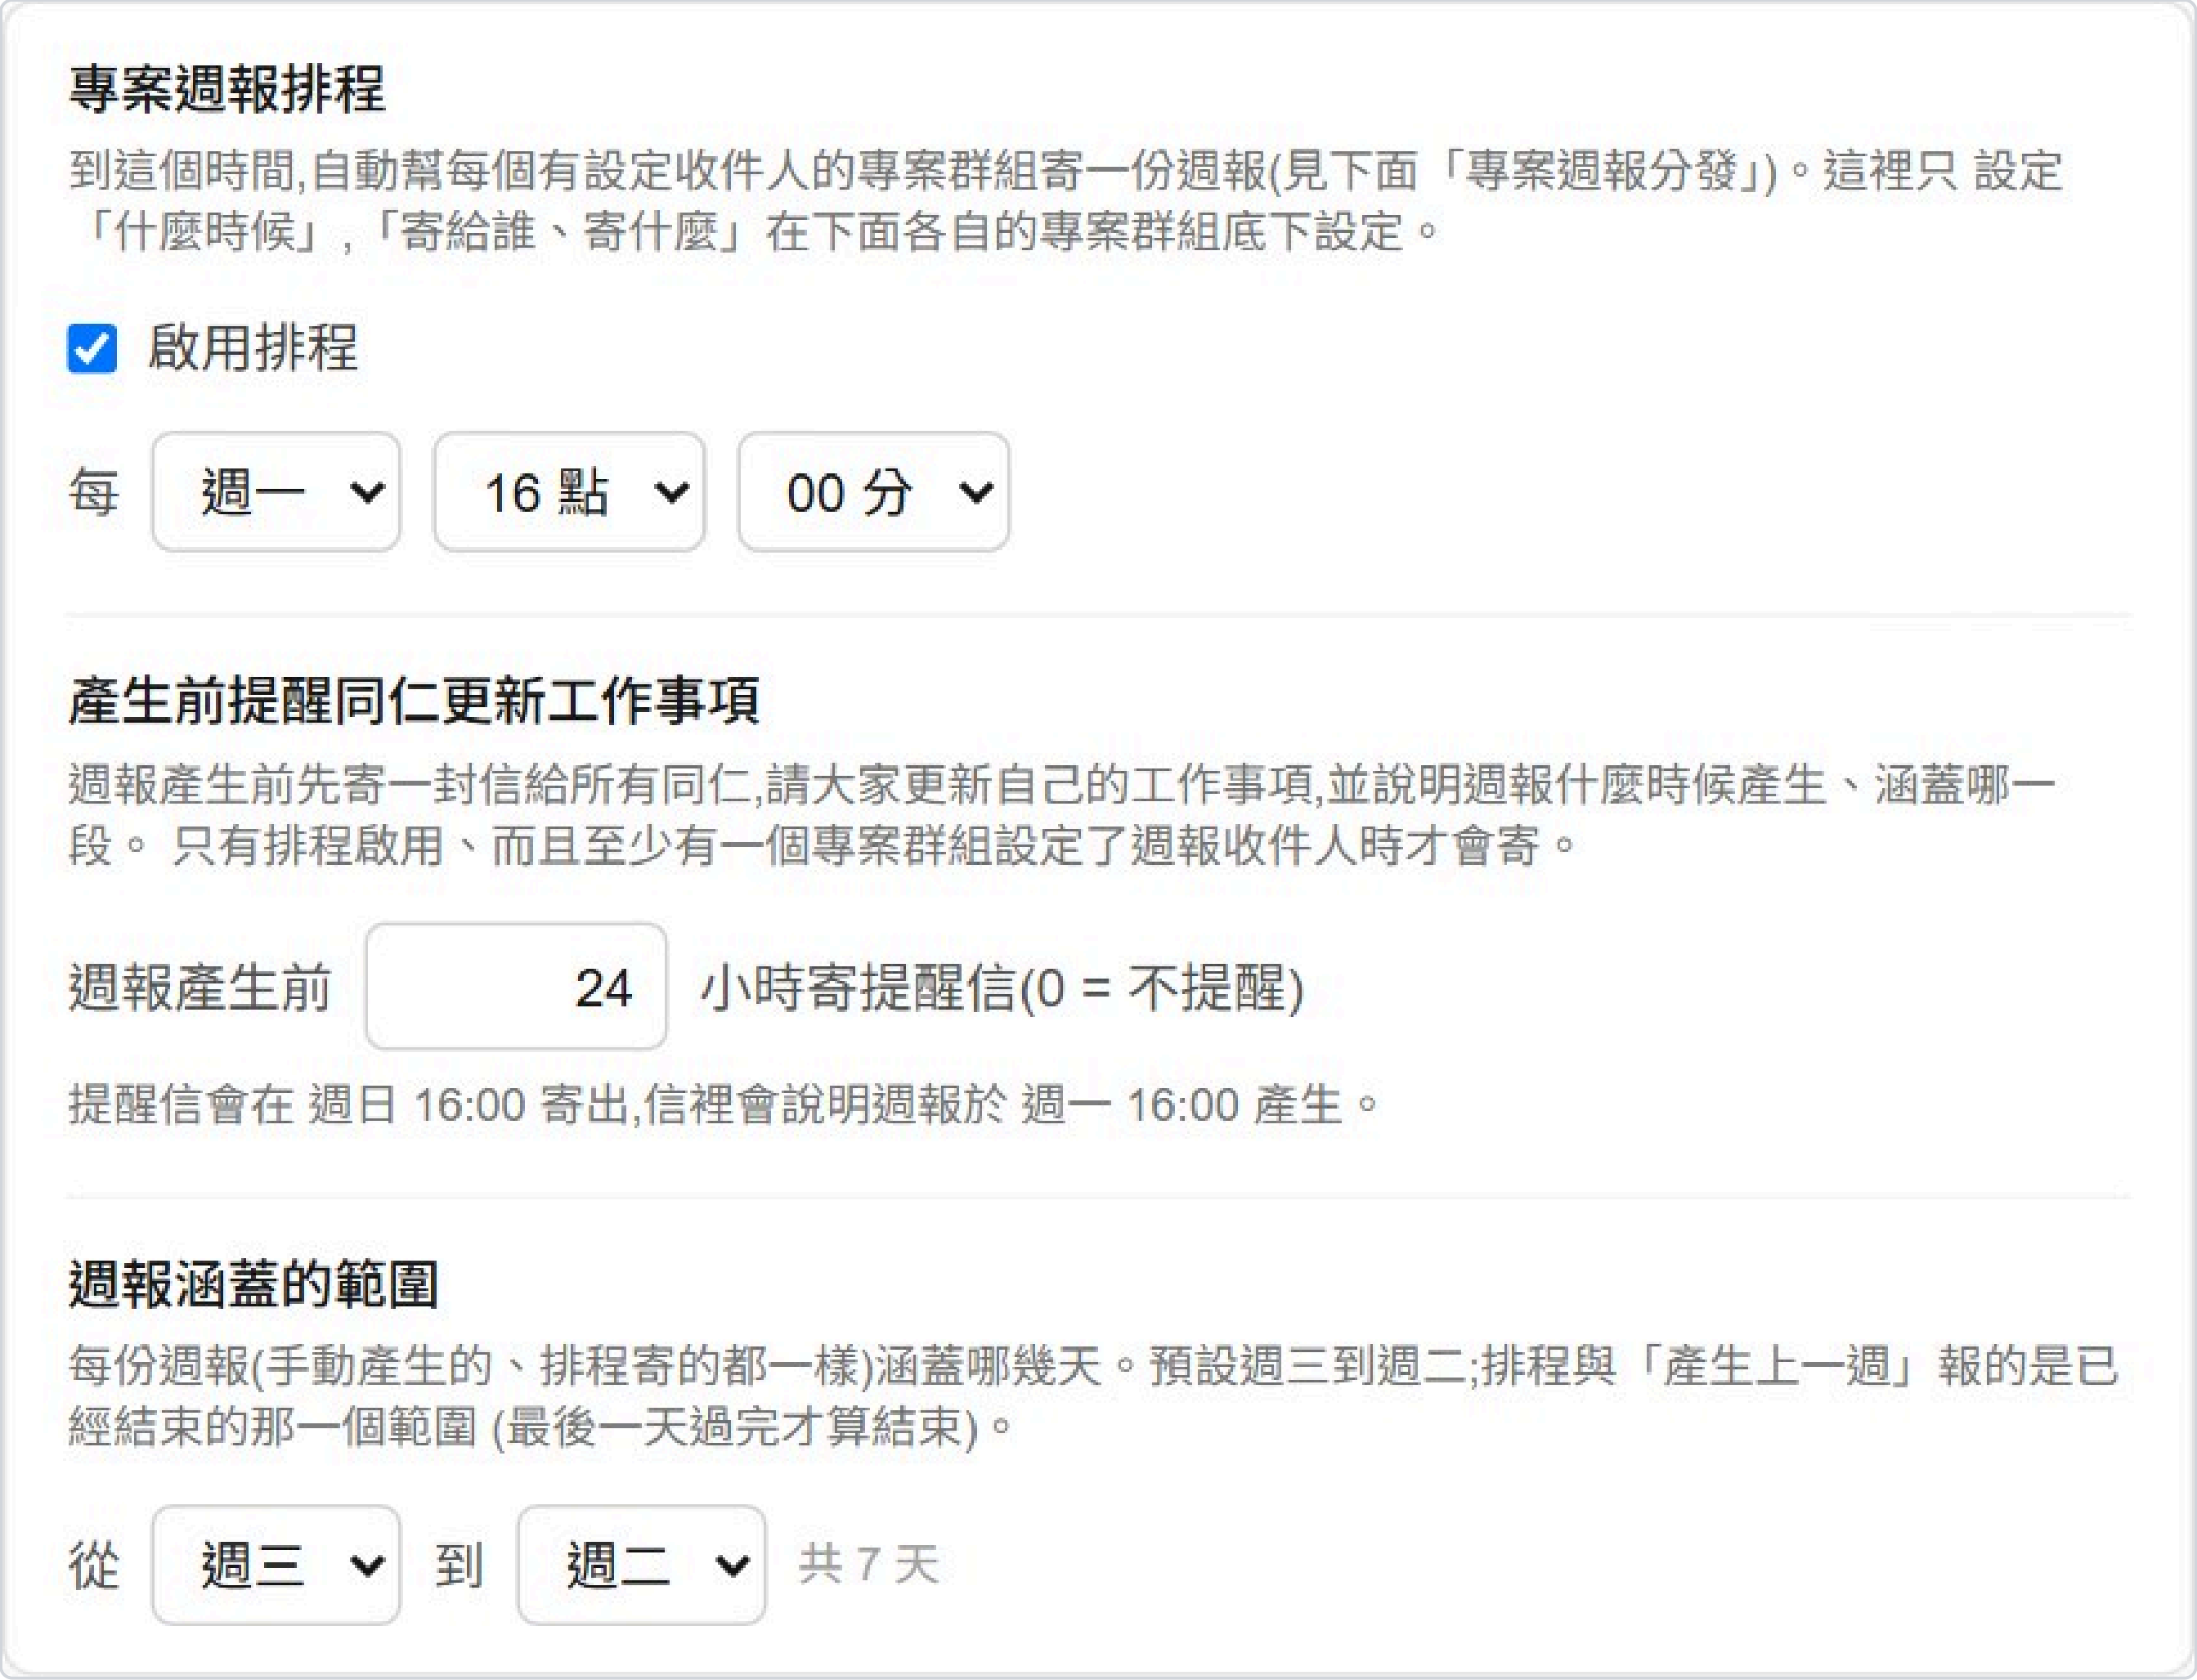

專案週報排程

到這個時間,自動幫每個有設定收件人的專案群組寄一份週報(見下面「專案週報分發」)。這裡只 設定「什麼時候」,「寄給誰、寄什麼」在下面各自的專案群組底下設定。

☑ 啟用排程

每 週一 16 點 00 分

產生前提醒同仁更新工作事項

週報產生前先寄一封信給所有同仁,請大家更新自己的工作事項,並說明週報什麼時候產生、涵蓋哪一段。 只有排程啟用、而且至少有一個專案群組設定了週報收件人時才會寄。

週報產生前 24 小時寄提醒信(0 = 不提醒)

提醒信會在 週日 16:00 寄出,信裡會說明週報於 週一 16:00 產生。

週報涵蓋的範圍

每份週報(手動產生的、排程寄的都一樣)涵蓋哪幾天。預設週三到週二;排程與「產生上一週」報的是已經結束的那一個範圍 (最後一天過完才算結束)。

從 週三 到 週二 共 7 天

- **工作項資訊更新**:這個範圍內,工作項上有變化的**狀態切換、欄位修改、更新(留言)、連結(網址)、附件與待辦事項**(依上面的勾選;欄位修改長這樣:✏️ 修改(Frank Chuang 11-02):「% Done」:0 → 1),依工作項分組列出,網址附在後面可以直接點開。只列你看得到的工作項。**這週完成的工作項**(部門那段每個人的「這週已完成」、信裡「這一週」的「完成」清單),底下會直接接著它這個範圍內的留言、連結與附件,看一筆就知道做完了什麼、成果放在哪裡(全部列出)。

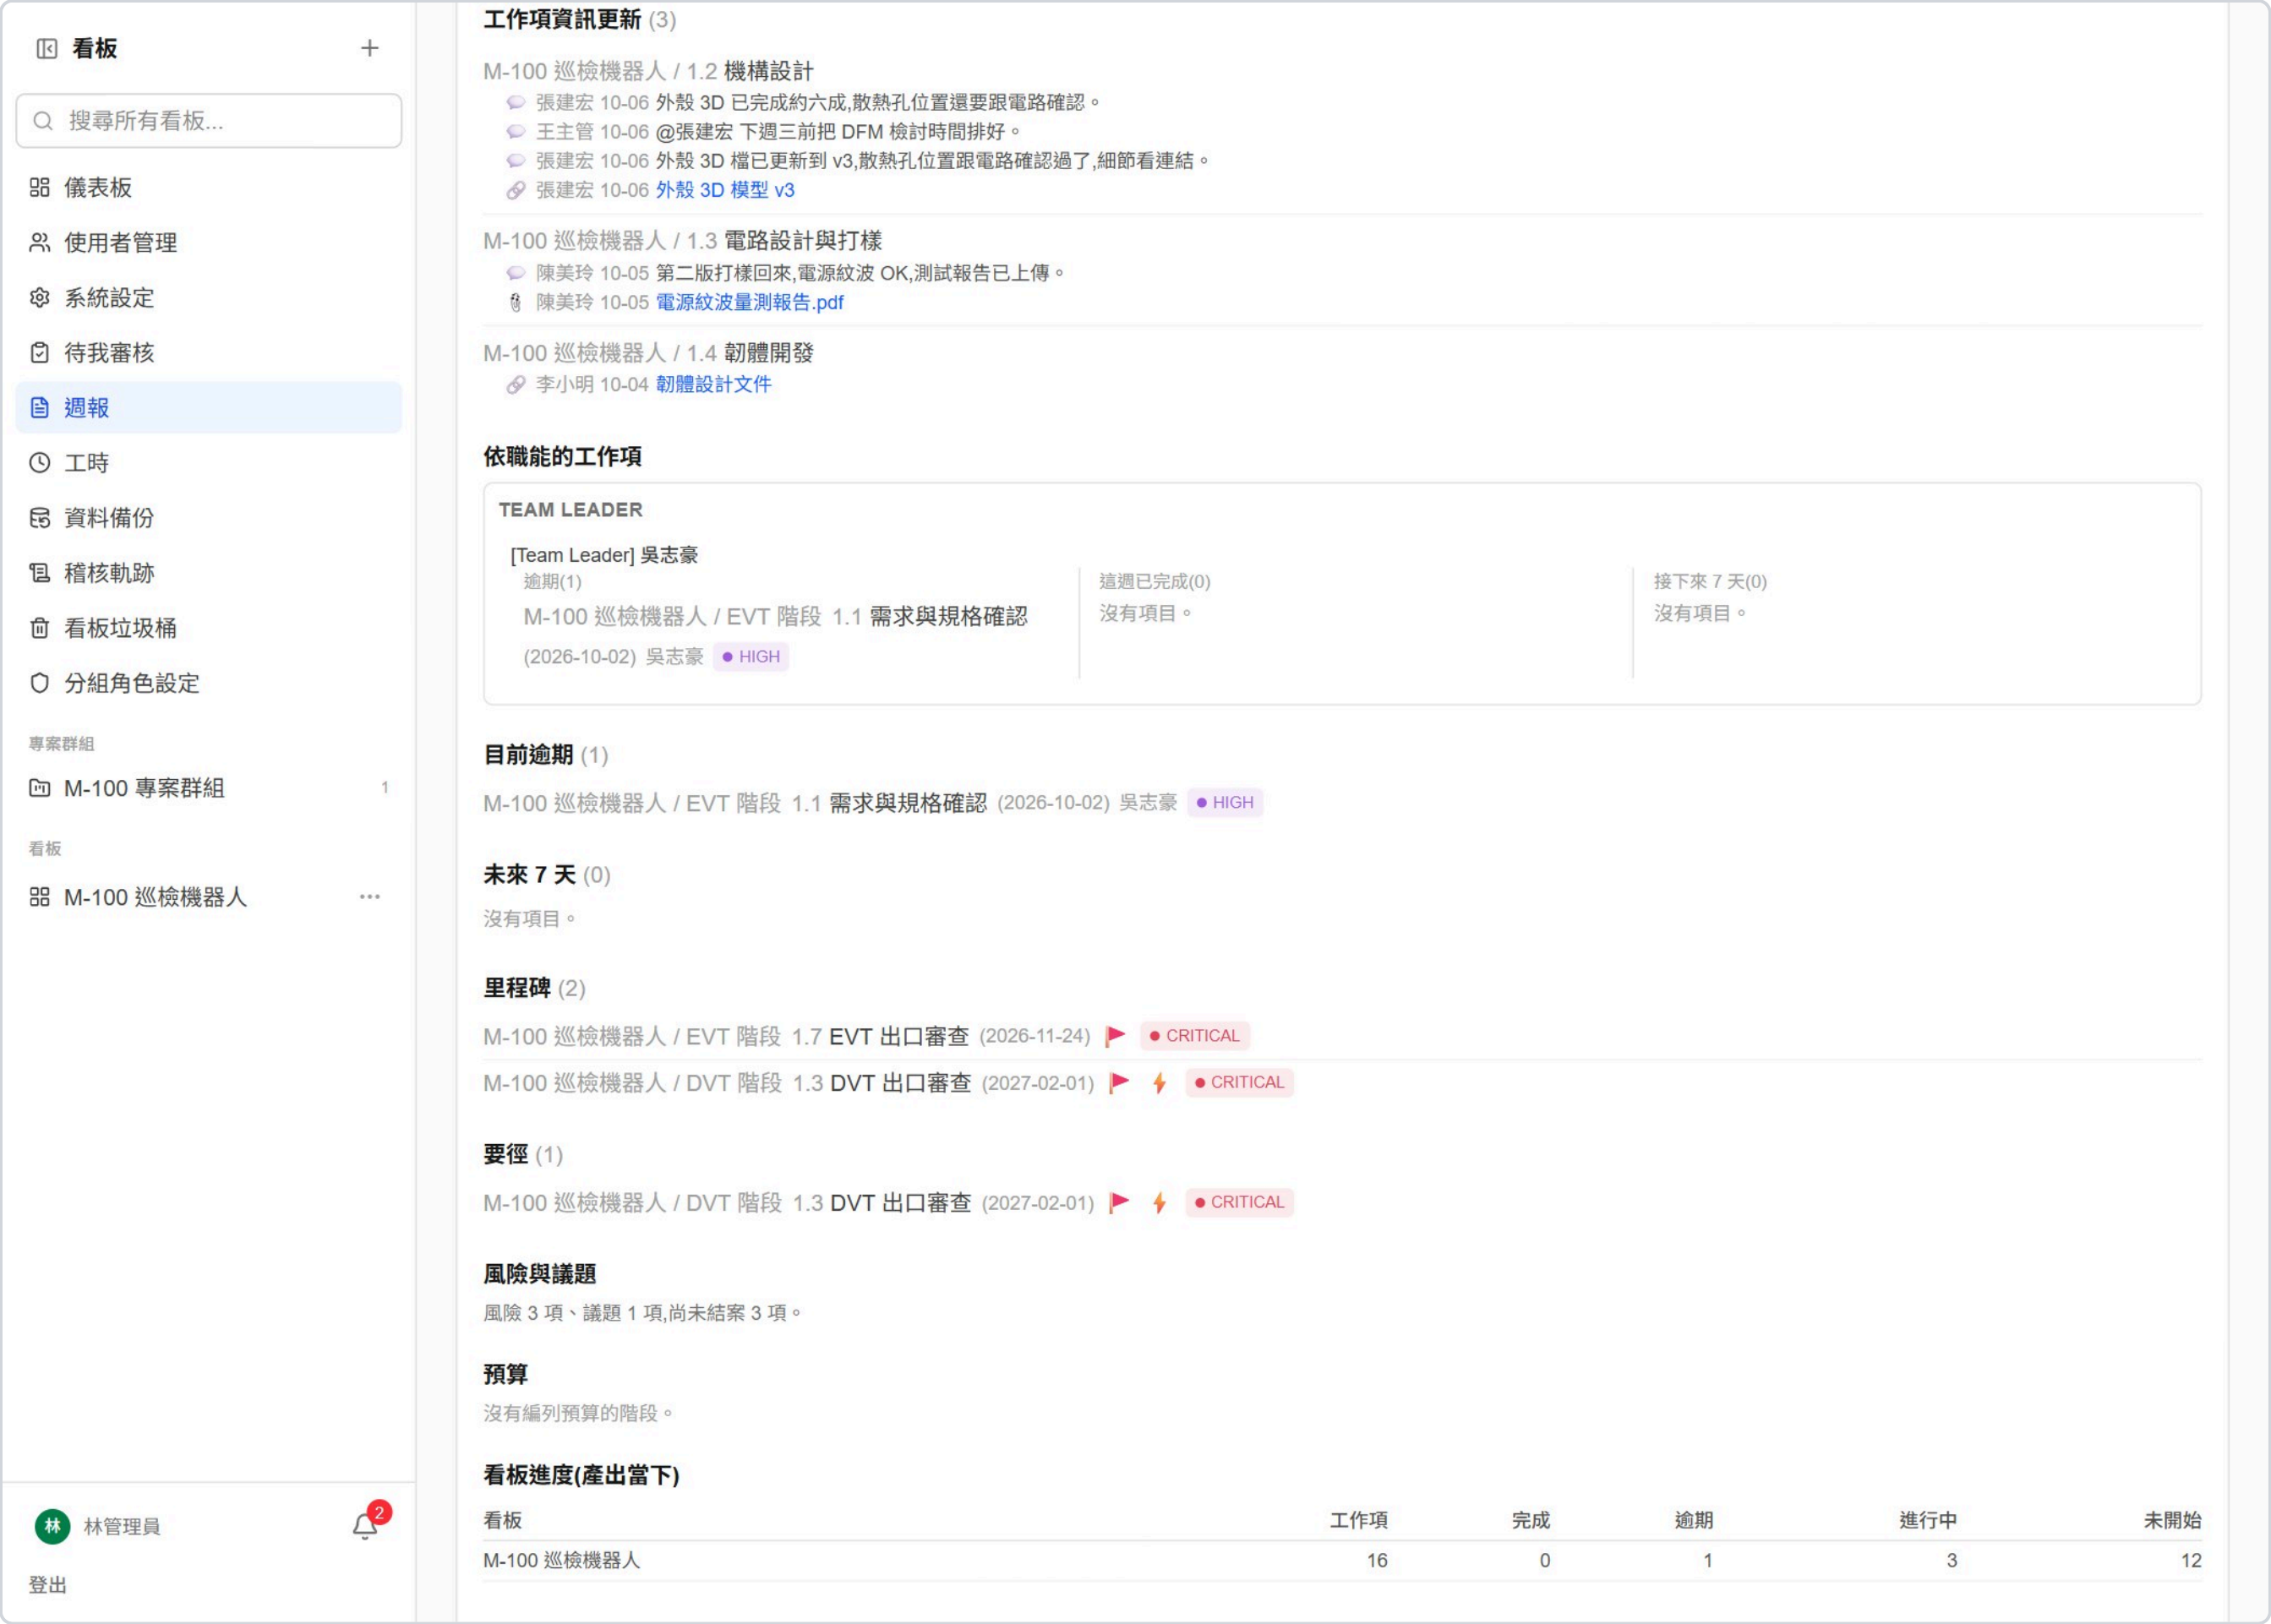

工作項資訊更新 (3)

M-100 巡檢機器人 / 1.2 機構設計
- 張建宏 10-06 外殼 3D 已完成約六成,散熱孔位置還要跟電路確認。
- 王主管 10-06 @張建宏 下週三前把 DFM 檢討時間排好。
- 張建宏 10-06 外殼 3D 檔已更新到 v3,散熱孔位置跟電路確認過了,細節看連結。
- 張建宏 10-06 外殼 3D 模型 v3

M-100 巡檢機器人 / 1.3 電路設計與打樣
- 陳美玲 10-05 第二版打樣回來,電源紋波 OK,測試報告已上傳。
- 陳美玲 10-05 電源紋波量測報告.pdf

M-100 巡檢機器人 / 1.4 韌體開發
- 李小明 10-04 韌體設計文件

依職能的工作項

TEAM LEADER

[Team Leader] 吳志豪

逾期(1)	這週已完成(0)	接下來 7 天(0)
M-100 巡檢機器人 / EVT 階段 1.1 需求與規格確認 (2026-10-02) 吳志豪 ● HIGH	沒有項目。	沒有項目。

目前逾期 (1)

M-100 巡檢機器人 / EVT 階段 1.1 需求與規格確認 (2026-10-02) 吳志豪 ● HIGH

未來 7 天 (0)

沒有項目。

里程碑 (2)

M-100 巡檢機器人 / EVT 階段 1.7 EVT 出口審查 (2026-11-24) ● CRITICAL

M-100 巡檢機器人 / DVT 階段 1.3 DVT 出口審查 (2027-02-01) ● CRITICAL

要徑 (1)

M-100 巡檢機器人 / DVT 階段 1.3 DVT 出口審查 (2027-02-01) ● CRITICAL

風險與議題

風險 3 項、議題 1 項,尚未結案 3 項。

預算

沒有編列預算的階段。

看板進度(產出當下)

看板	工作項	完成	逾期	進行中	未開始
M-100 巡檢機器人	16	0	1	3	12

- **看板頻道對話**:這個範圍內,**看板頻道**(對話頁每個看板的那一間)裡的發言,依看板分組、依發言先後全部列出(誰、幾月幾日幾點、說了什麼、附了哪些檔案)。**只有看板頻道**:私訊與自己建的聊天室不進週報;已收回的訊息不列;每則發言內容過長會截短。跟「更新」勾選連動(取消「更新」就不附這一段);網頁版與信件都有。

- **週報的清單一律全部列出,不截斷**——逾期、未來幾天、里程碑、要徑、各部門的清單、狀態與時程變化、工作項資訊更新、風險與議題,信件與網頁版都是,不會有「另外還有 N 項」。

- **風險與議題明細**:每個專案的「風險與議題」除了統計(風險幾項、議題幾項、尚未結案幾項),也會**逐筆列出**:類型標記(風險 / 議題,從 Mantis 同步來的標「Mantis #編號」)、**名稱、狀態**、分數、負責人、到期日,底下是看板、說明、對策、Mantis 網址,以及**這個範圍內新增的進度更新**(誰、哪天、寫了什麼,全部列出)。這個範圍內沒有新更新的,會放它**最近一次更新**,並標明日期,讓你知道是舊的。還沒結案的全部列出,已結案的只列這個範圍內才剛結案的;分數高的在前。

- **產生週報時會寄信**:按「產生上一週」「產生這一週」,每個專案各寄**一封**信給你自己,標題是「專案名稱 週報 W41 (起 ~ 迄)」,內容只有那個專案的部分;一封寄失敗不影響其他封,結果訊息會說寄了幾封、哪幾封沒寄出。

- 管理者可以在系統設定排程,每週固定時間為每個專案群組**自動寄**一份給指定收件人(見 21.3)。

- **信件裡也有「依職能的工作項」**:每個職能(例如 EE 電機)底下列出每個人的逾期、這週已完成、接下來幾天的工作項,跟網頁版同一份內容。**同一個人在同一個專案、同一個職能只列一份**——就算他在這個專案的好幾個分組都擔任同一個角色(看板角色沿用到每個分組就是這樣),也不會重複;他在某個分組是

DM、別的分組只是成員時,算 DM。自動寄的設定裡,「**各部門工作事項**」跟「**專案時程與預算**」是兩個獨立的勾選——只勾各部門、不勾專案時程,信裡仍然會有這一段(專案名稱底下只留各部門的人);兩個都不勾才不會出現。

---

20. 搜尋、專案群組、資料備份

20.1 搜尋

側邊欄上方的搜尋框,輸入**至少兩個字**,會搜尋你看得到的所有看板:工作項名稱、留言、附件檔名、風險與議題。

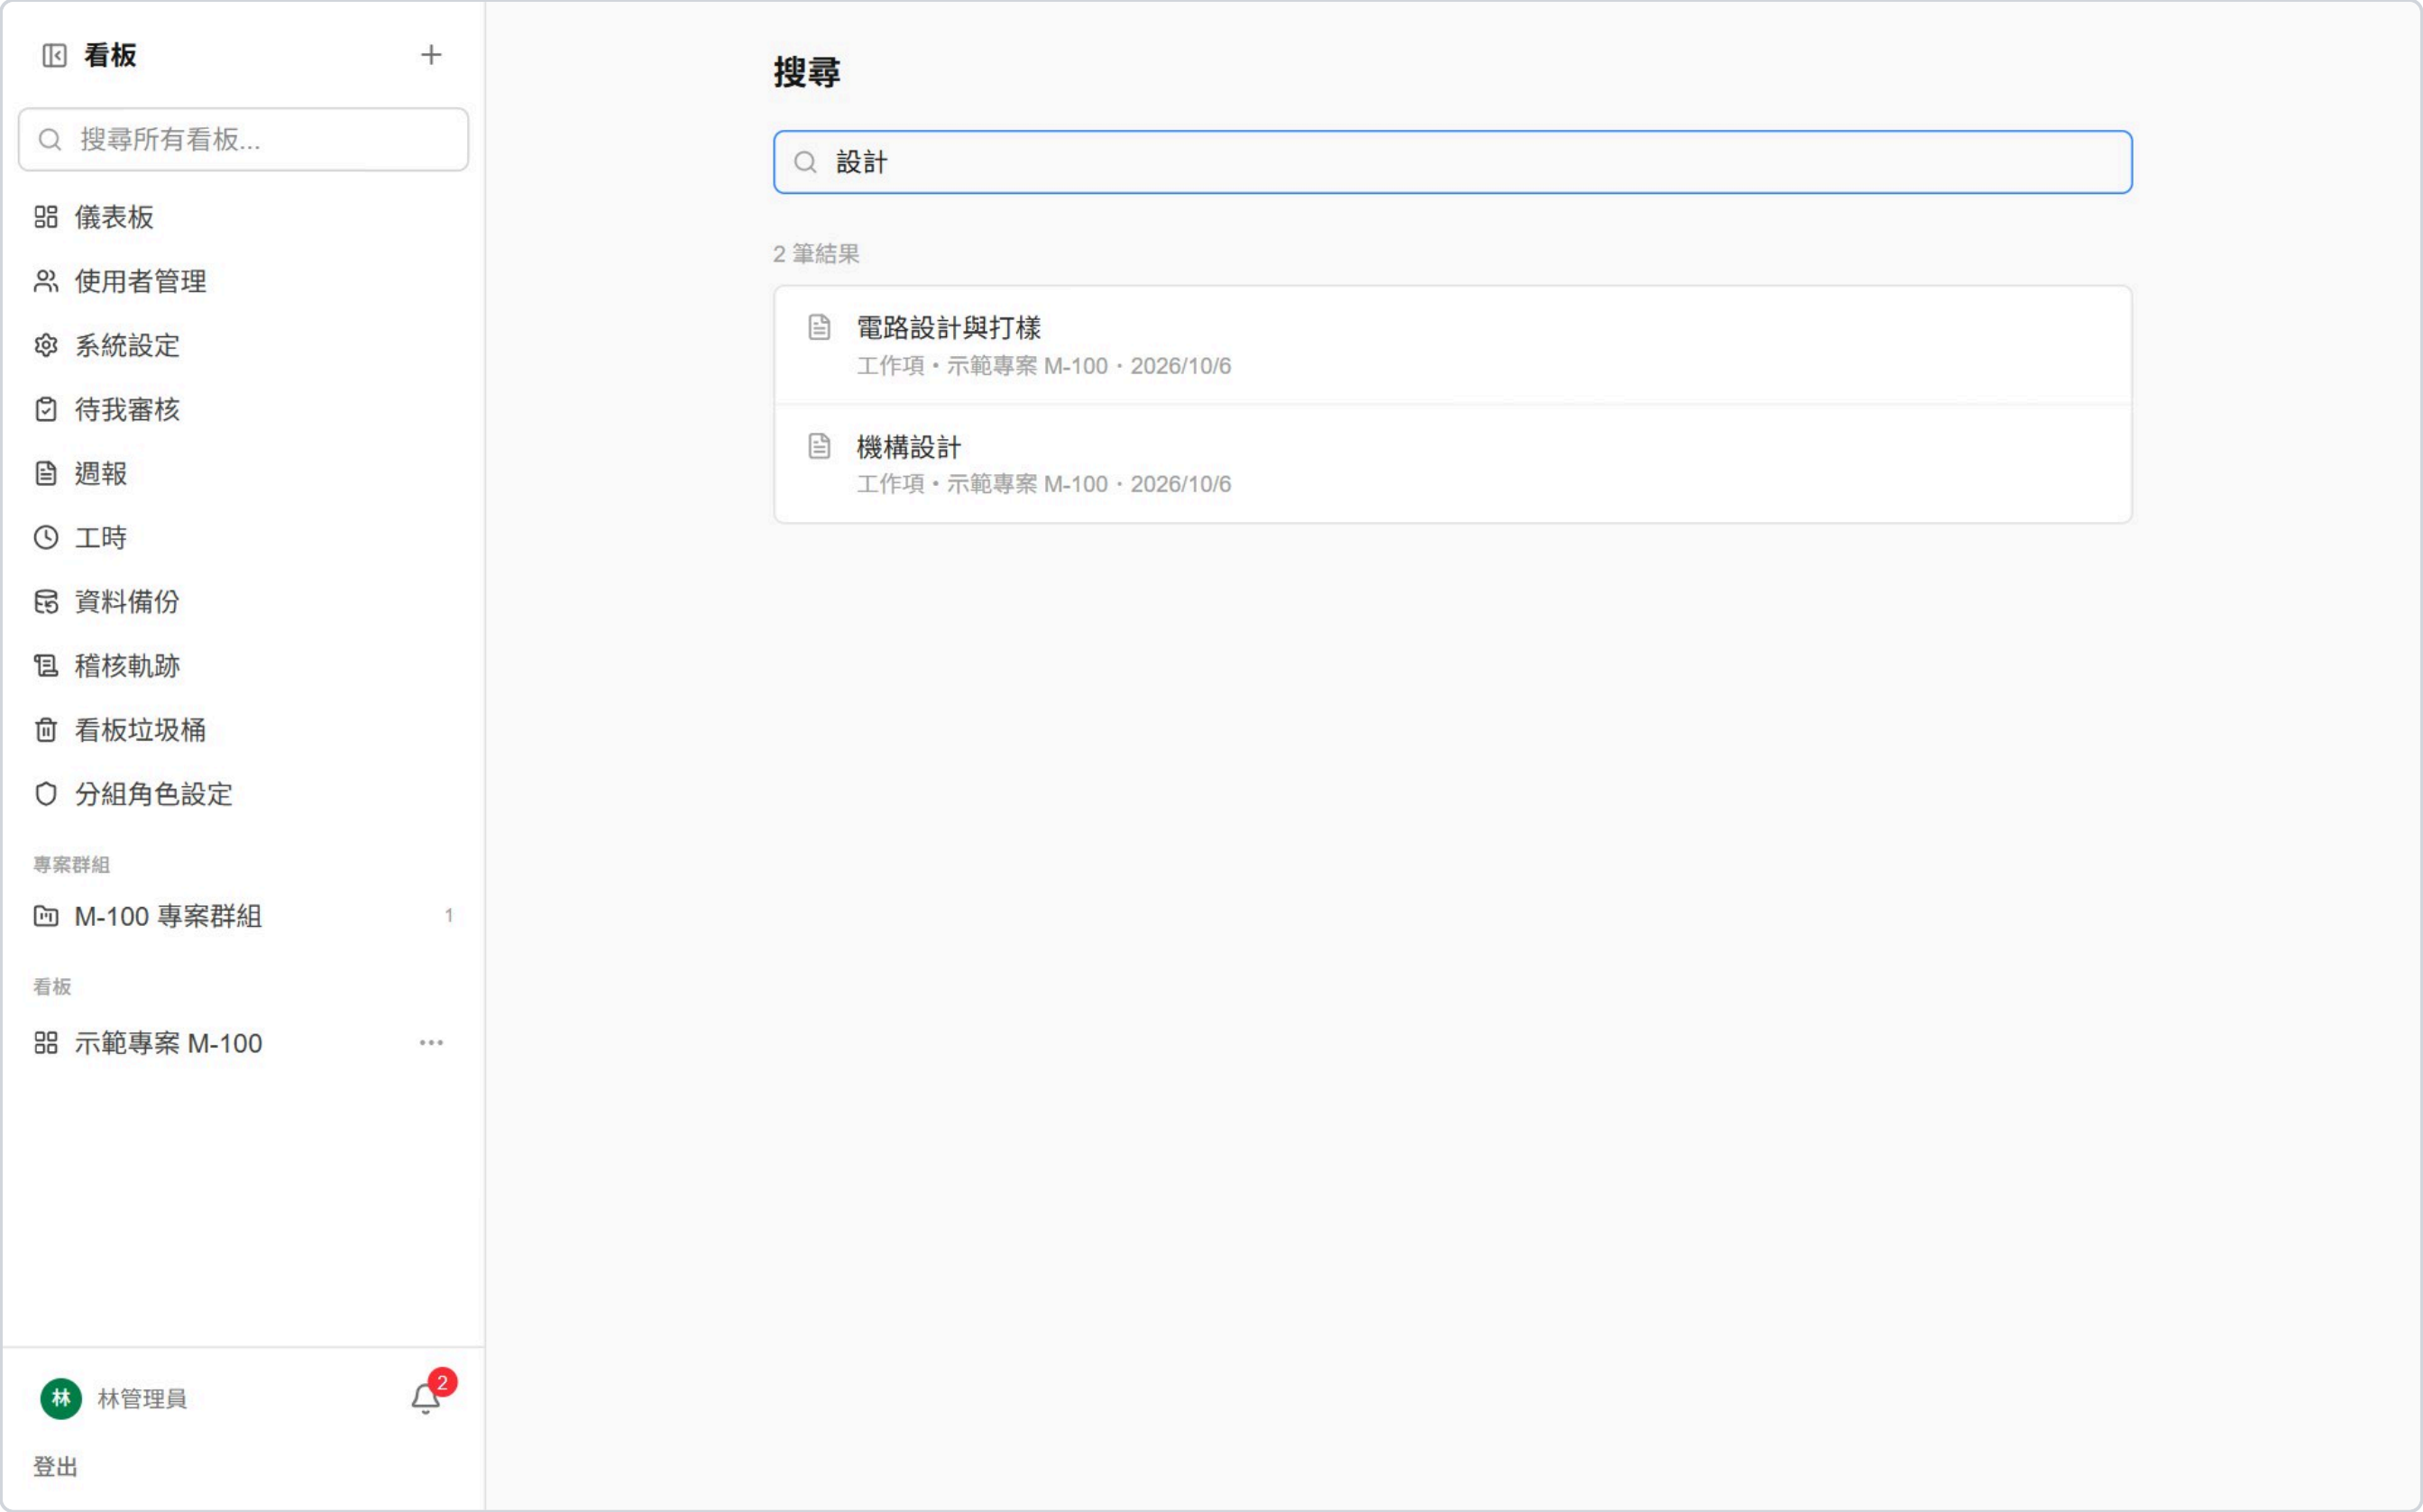
看板
+
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林
林管理員
2
登出

搜尋

設計

2 筆結果

電路設計與打樣
工作項・示範專案 M-100・2026/10/6

機構設計
工作項・示範專案 M-100・2026/10/6

20.2 專案群組

同一個專案拆成幾個看板(例如 POC / EVT / PVT)時,管理者可以把它們放進一個**專案群組**,前置依賴就可以**跨看板**:上一階段的驗證一延,下一階段的開工日跟著移,要徑也會貫穿整個群組一起算。側邊欄「專案群組」進入:

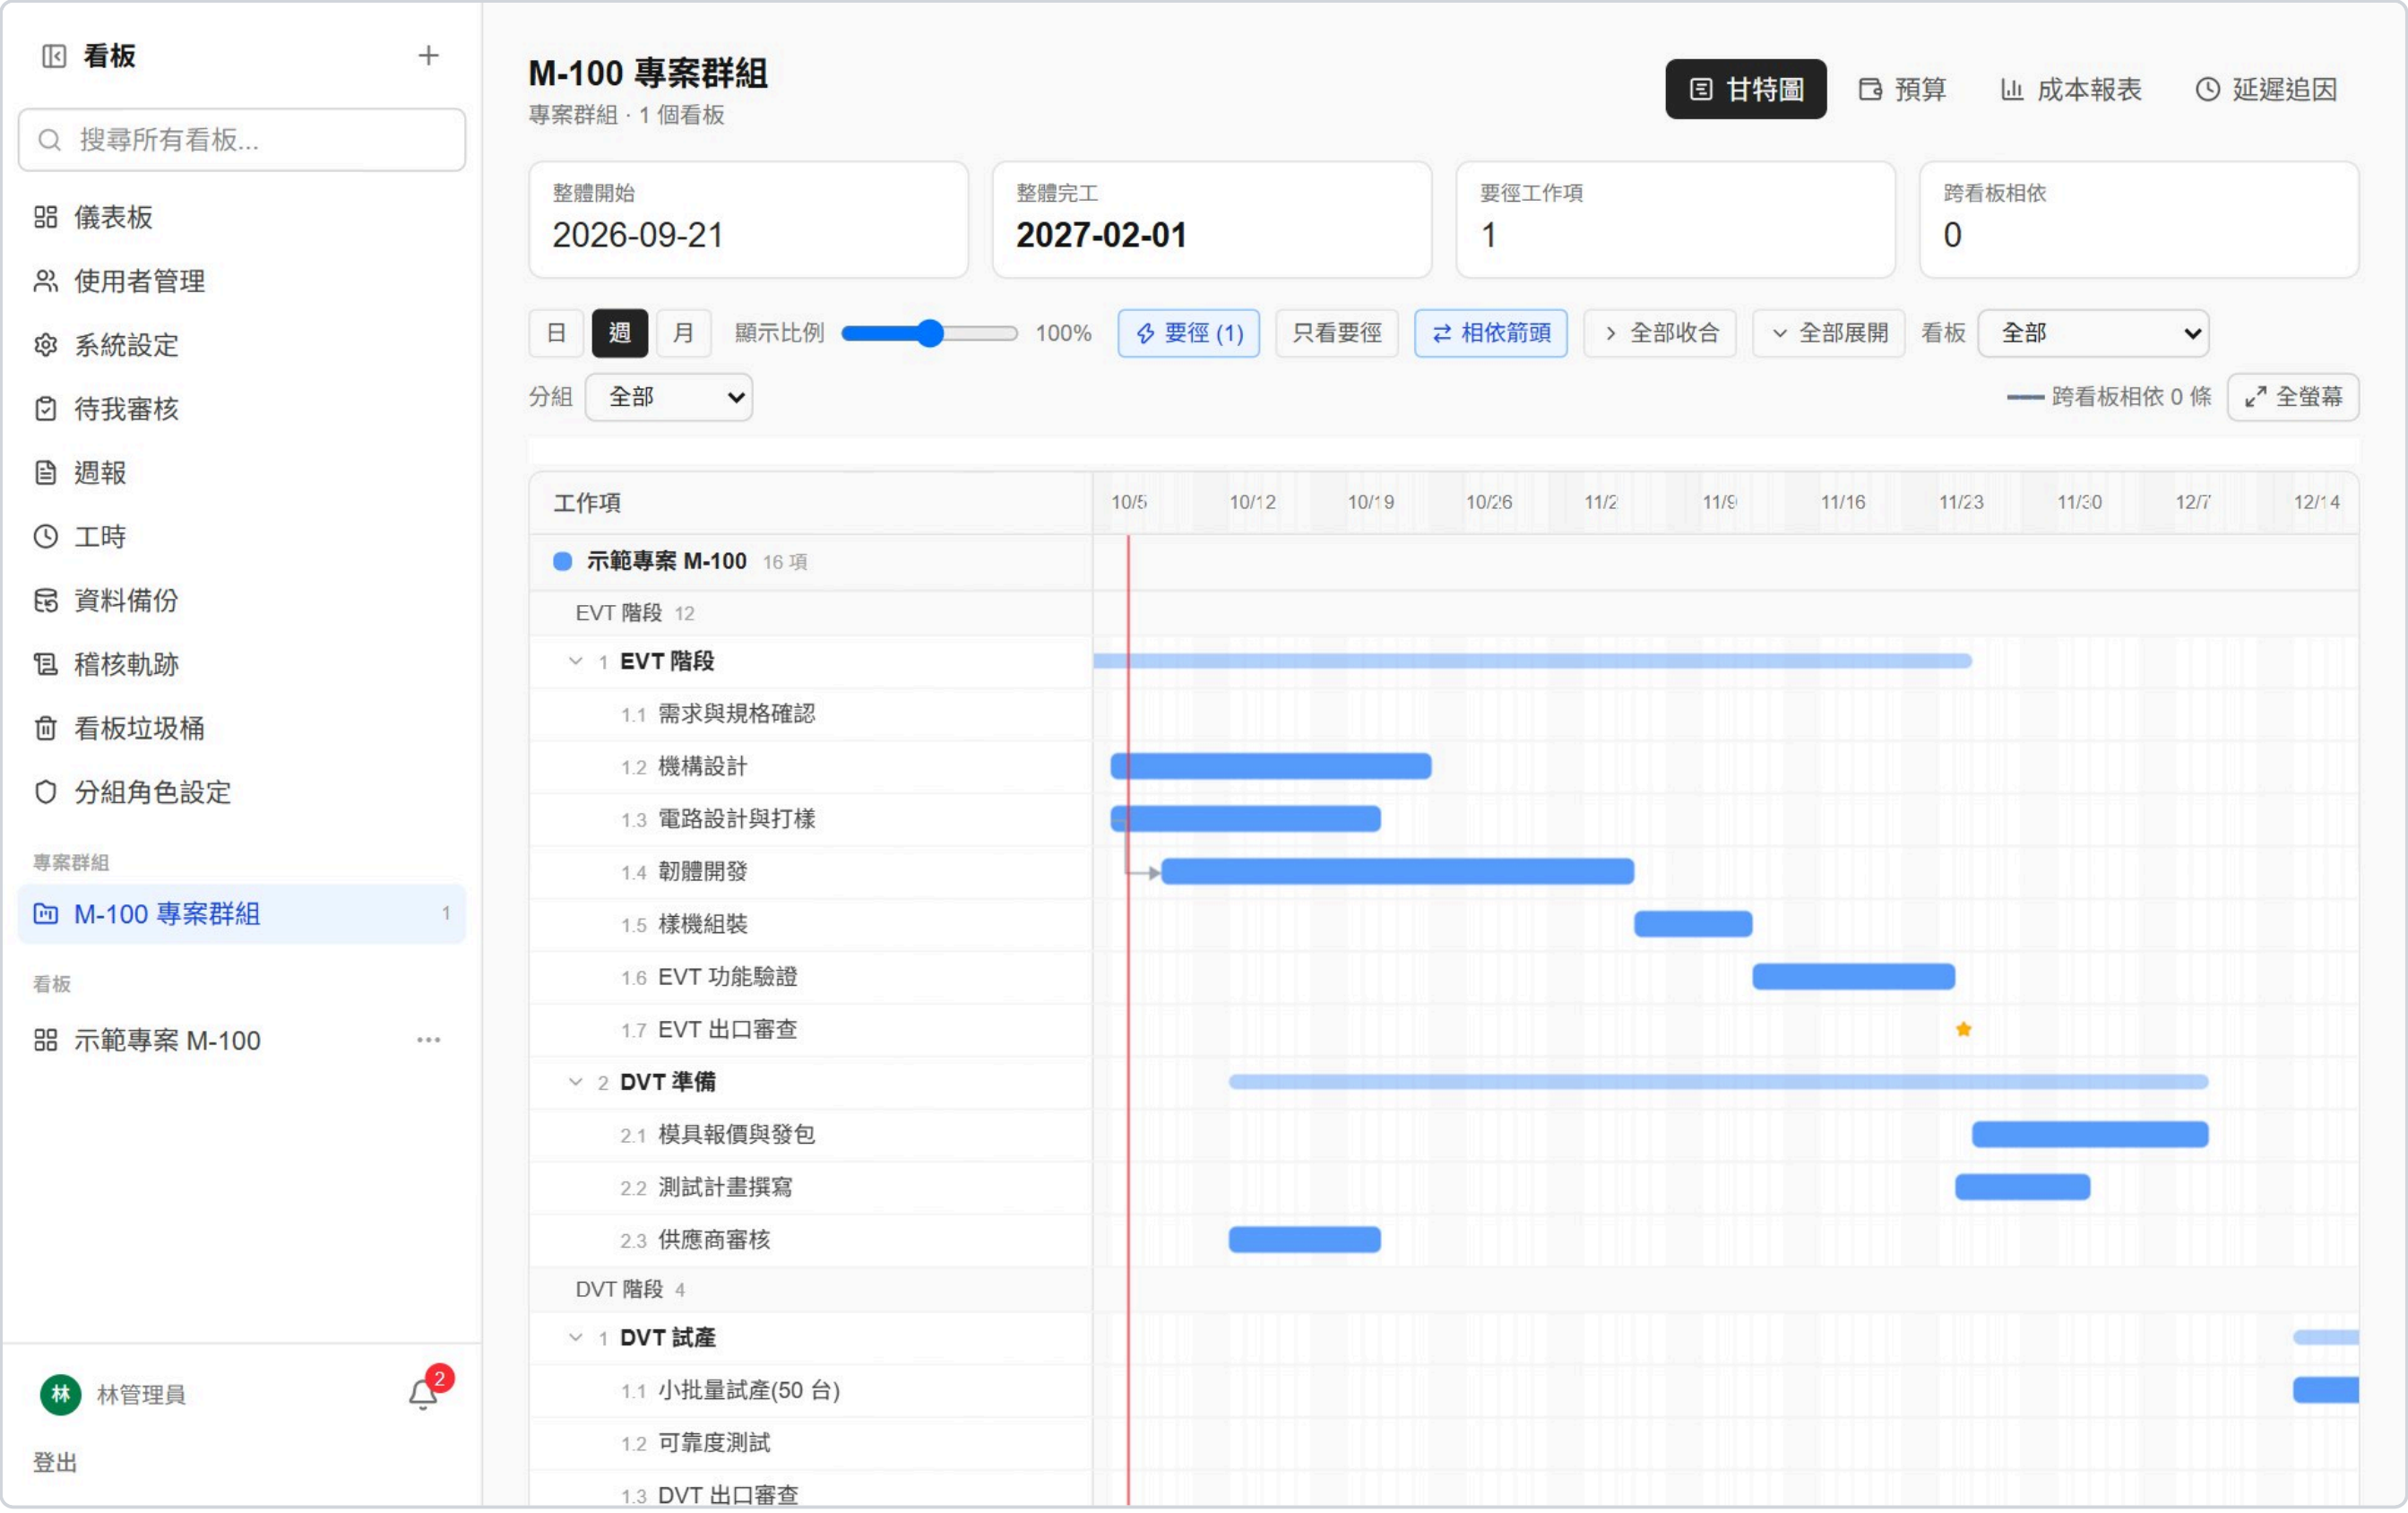
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組 1
看板
示範專案 M-100
林管理員
2
登出
甘特圖
預算
成本報表
延遲追因
日
週
月
顯示比例
100%
要徑 (1)
只看要徑
相依箭頭
全部收合
全部展開
跨看板相依 0 條
全螢幕
工作項
10/5
10/12
10/19
10/26
11/2
11/9
11/16
11/23
11/30
12/7
12/14

M-100 專案群組
專案群組 · 1 個看板

整體開始: 2026-09-21
整體完工: 2027-02-01
要徑工作項: 1
跨看板相依: 0

看板: 全部
分組: 全部

示範專案 M-100 16 項
EVT 階段 12
1 EVT 階段
1.1 需求與規格確認
1.2 機構設計
1.3 電路設計與打樣
1.4 韌體開發
1.5 樣機組裝
1.6 EVT 功能驗證
1.7 EVT 出口審查
2 DVT 準備
2.1 模具報價與發包
2.2 測試計畫撰寫
2.3 供應商審核
DVT 階段 4
1 DVT 試產
1.1 小批量試產(50 台)
1.2 可靠度測試
1.3 DVT 出口審查

四個分頁:**甘特圖**(整個群組的時程)、**預算**(整個專案的總額)、**成本報表**、**延遲追因**。上方是整體開始 / 完工、要徑工作項數、跨看板相依數。沒有加入群組的看板行為完全不變。設定在「系統設定 → 專案群組」。

20.3 資料備份(每個看板的 CSV)

側邊欄「資料備份」:每個看板一個 **CSV** 檔,涵蓋所有工作項與每個欄位的值。

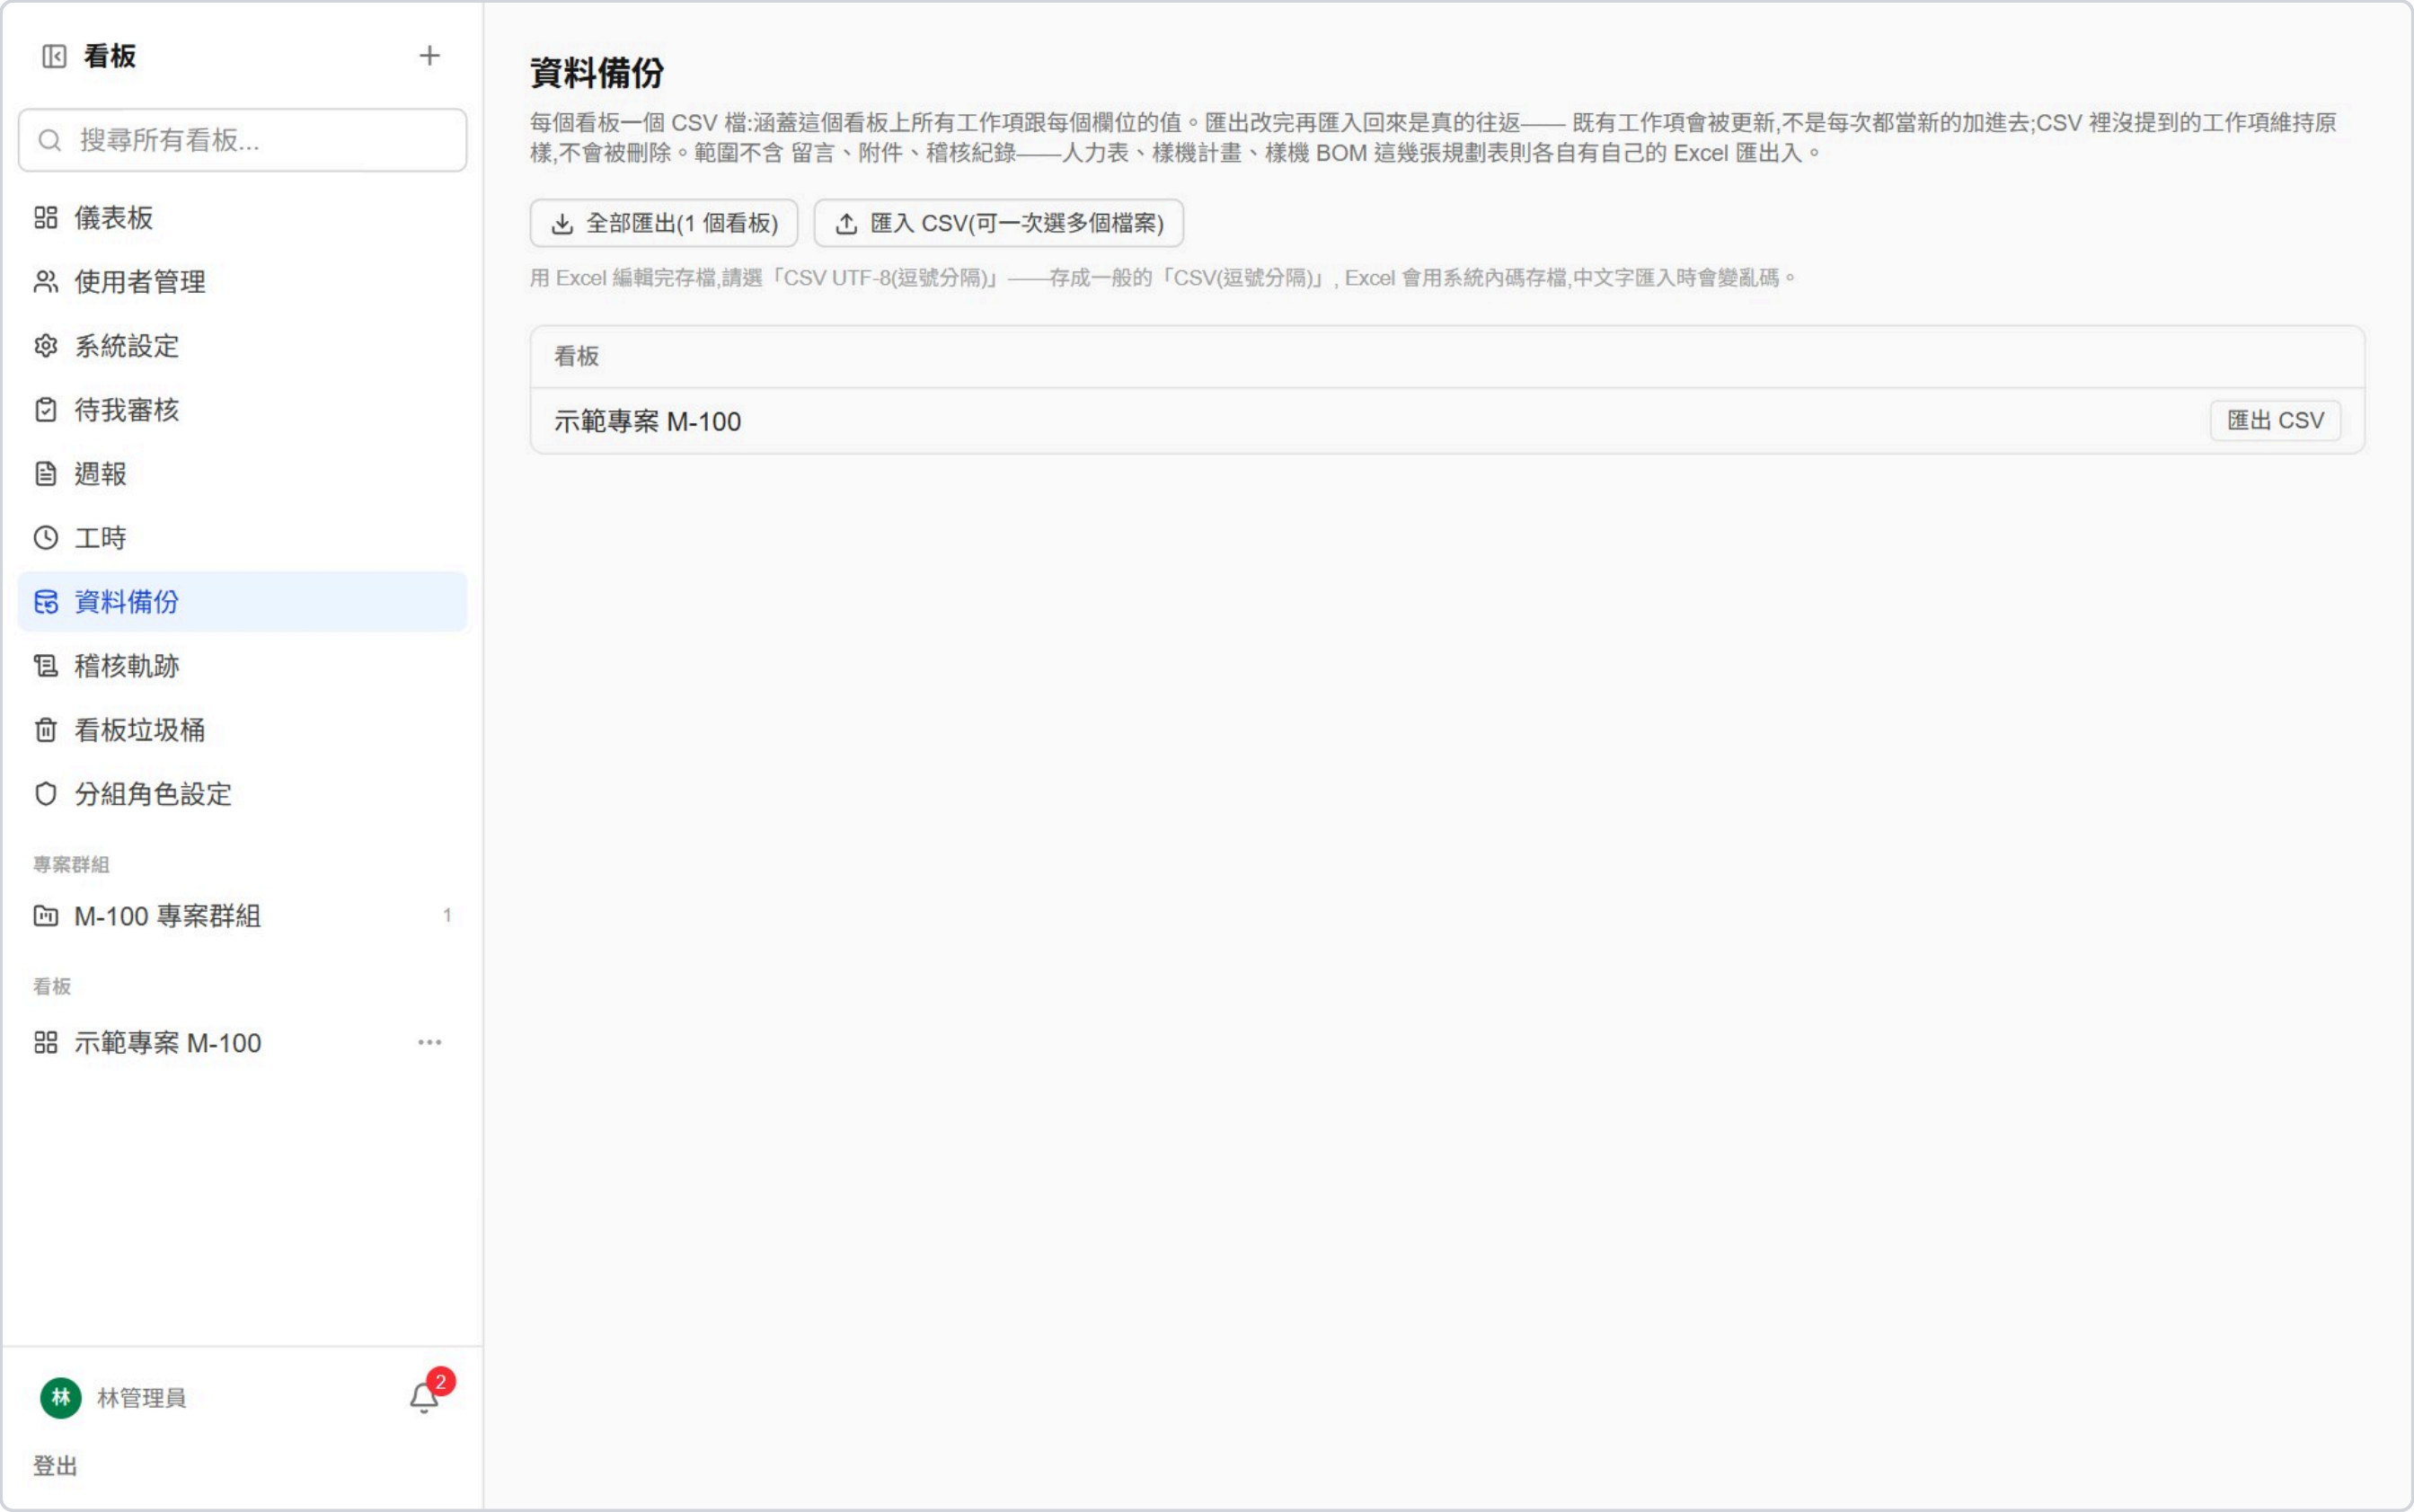
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林管理員
2
登出
全部匯出(1 個看板)
匯入 CSV(可一次選多個檔案)
匯出 CSV

資料備份

每個看板一個 CSV 檔:涵蓋這個看板上所有工作項跟每個欄位的值。匯出改完再匯入回來是真的往返—— 既有工作項會被更新,不是每次都當新的加進去;CSV 裡沒提到的工作項維持原樣,不會被刪除。範圍不含 留言、附件、稽核紀錄——人力表、樣機計畫、樣機 BOM 這幾張規劃表則各自有自己的 Excel 匯出入。

用 Excel 編輯完存檔,請選「CSV UTF-8(逗號分隔)」——存成一般的「CSV(逗號分隔)」, Excel 會用系統內碼存檔,中文字匯入時會變亂碼。

看板
示範專案 M-100

- **匯出 CSV**:每個看板一鍵匯出,或「全部匯出」。
- **匯入 CSV**【管理者】:改完再匯入是真的往返 —— 既有工作項會被**更新**(不是當新的加進去),CSV 裡沒提到的工作項維持原樣、**不會被刪除**。
- 用 Excel 編輯後,存檔請選「**CSV UTF-8(逗號分隔)**」,否則中文字匯入會變亂碼。
- 範圍不含留言、附件與稽核紀錄;人力表、樣機計畫、樣機 BOM 各自有自己的 Excel 匯出入。

> 這和管理者在「系統設定」做的整個**資料庫備份**(21.4)是兩回事。

21. 管理者功能

21.1 使用者管理【管理者】

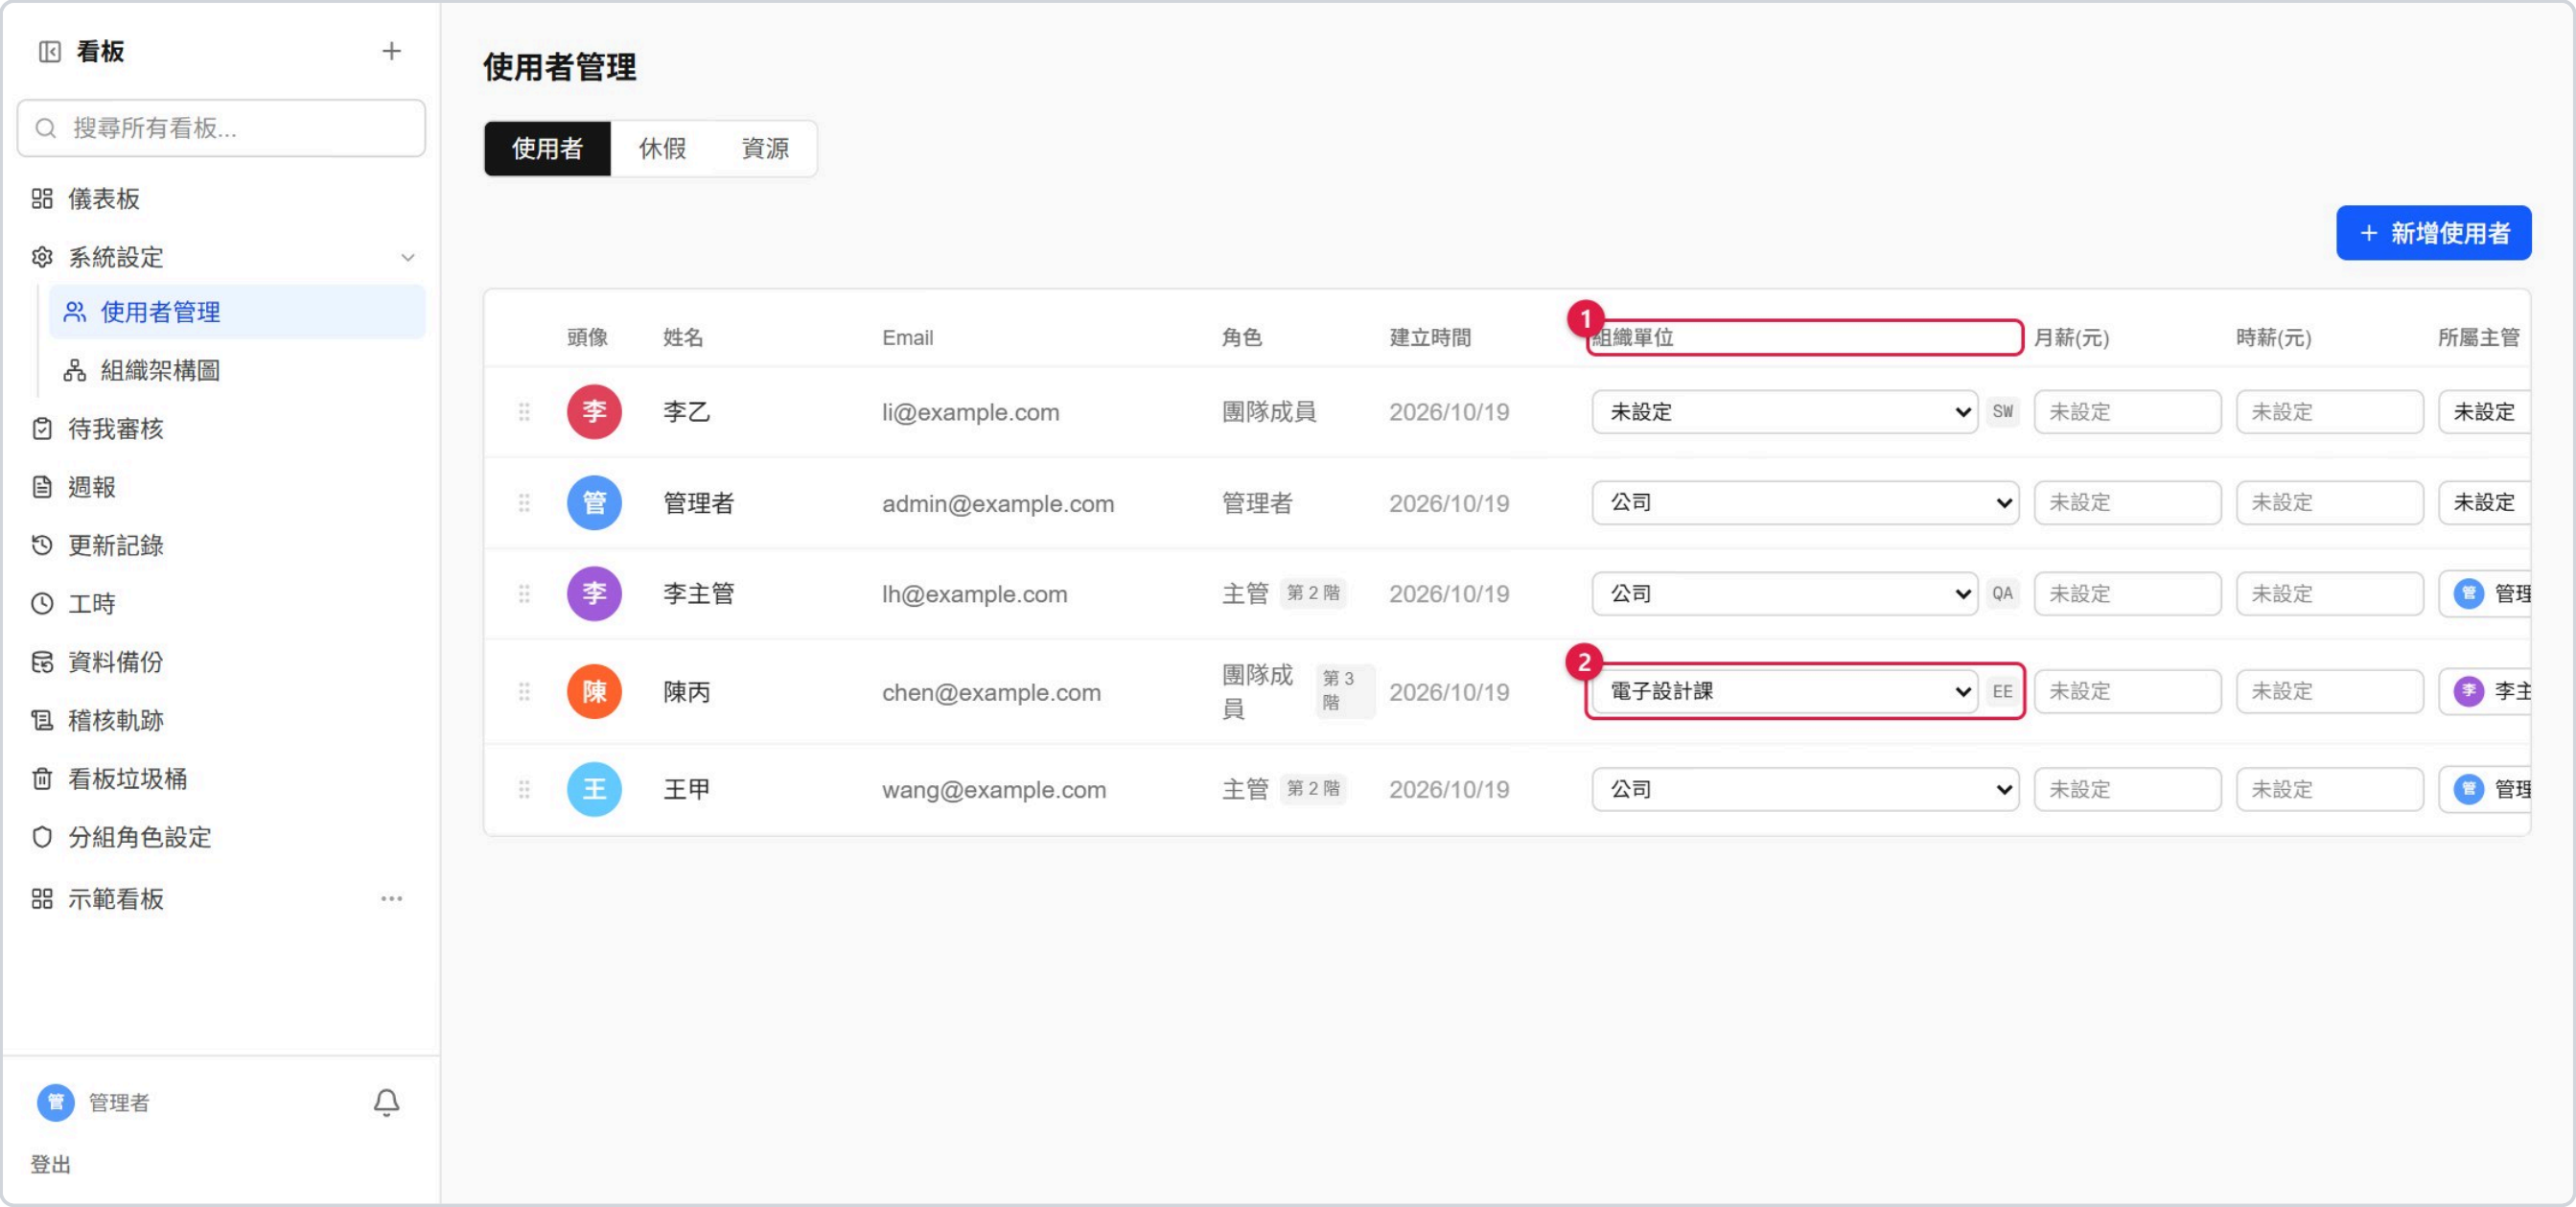

頭像	姓名	Email	角色	建立時間	組織單位	月薪(元)	時薪(元)	所屬主管
李	李乙	li@example.com	團隊成員	2026/10/19	未設定 SW	未設定	未設定	未設定
管	管理者	admin@example.com	管理者	2026/10/19	公司	未設定	未設定	未設定
李	李主管	lh@example.com	主管 第 2 階	2026/10/19	公司 QA	未設定	未設定	管 管理
陳	陳丙	chen@example.com	團隊成員 第 3 階	2026/10/19	電子設計課 EE	未設定	未設定	李 李主
王	王甲	wang@example.com	主管 第 2 階	2026/10/19	公司	未設定	未設定	管 管理

三個分頁:**使用者**、**休假**、**資源**(沒有登入帳號的工具或廠商,有指定的窗口)。

- **新增使用者**:姓名、Email、初始密碼(至少 8 字元)、角色、所屬主管。
- 表格欄位可以直接改:**組織單位**(從組織架構圖的部門選,見下)、**月薪**、**時薪**(成本計算用;時薪有填就優先於月薪)。月薪另外會用在**人力預算**:人力表裡指到這個人的名額用他的月薪算(見第 14 章預算的「人力預算怎麼算」),改了就自動重算。
- 每列右側:**工作交接**(⇄ 圖示)、編輯(姓名、Email、角色、所屬主管;角色為主管時可勾「可以檢視全部成員的工時」;另有「**工時免審核**」)、**重設密碼**、**解除鎖定**、刪除(無法復原)。頁面右上角另有「**工作交接**」按鈕。
- **工作交接**:把一個人名下**還沒完成**的工作交給另一個人——離職、轉調、休長假時用。從右上角的按鈕進來自己選「轉出者」「接手者」,從某一列的 ⇄ 進來轉出者就是那個人。選好之後系統列出會動到哪些,**預設全部勾起來,可以逐筆取消**(每一類都有「全選 / 全不選」),按「確認轉移」並再確認一次才真的轉:
  - **工作項**:項目卡片「人員分配」裡轉出者那一列(投入 %)改成接手者——接手者本來就在那個項目裡,就把 % 加總(上限 100%);以及負責人、測試工具這類**人員欄位**裡填的名字。**已完成的、已刪除的工作項不動**,留在原來的人名下當紀錄。
  - **風險與議題**:進行中(還沒結案)的——負責人,以及他**還沒同意**的審核人(已經同意過的不動)。
  - **人力名額**:人力表上掛著他名字、而且還有這個月以後投入的名額;整個都在過去月份的名額是已經發生的人力成本,留在原來的人名下。轉完會重算那塊看板的人力預算。
  - **分組角色**:他在各分組的 Team Leader、DM、PMD 等;接手者在那個分組本來就有同一個角色,就不重複。
  - 每個被轉的工作項,「活動紀錄」會留一筆「工作交接:甲 → 乙(...)」;稽核軌跡記整次交接;接手者會收到一則「N 個工作項交接給你」的通知(開了 Email 通知的也會收到信)。

  - **不在交接範圍**:所屬主管與部屬關係、組織架構圖上的部門主管、看板擁有者(刪除使用者前仍要先轉移看板擁有者)、留言與工時紀錄、分組成員名冊。

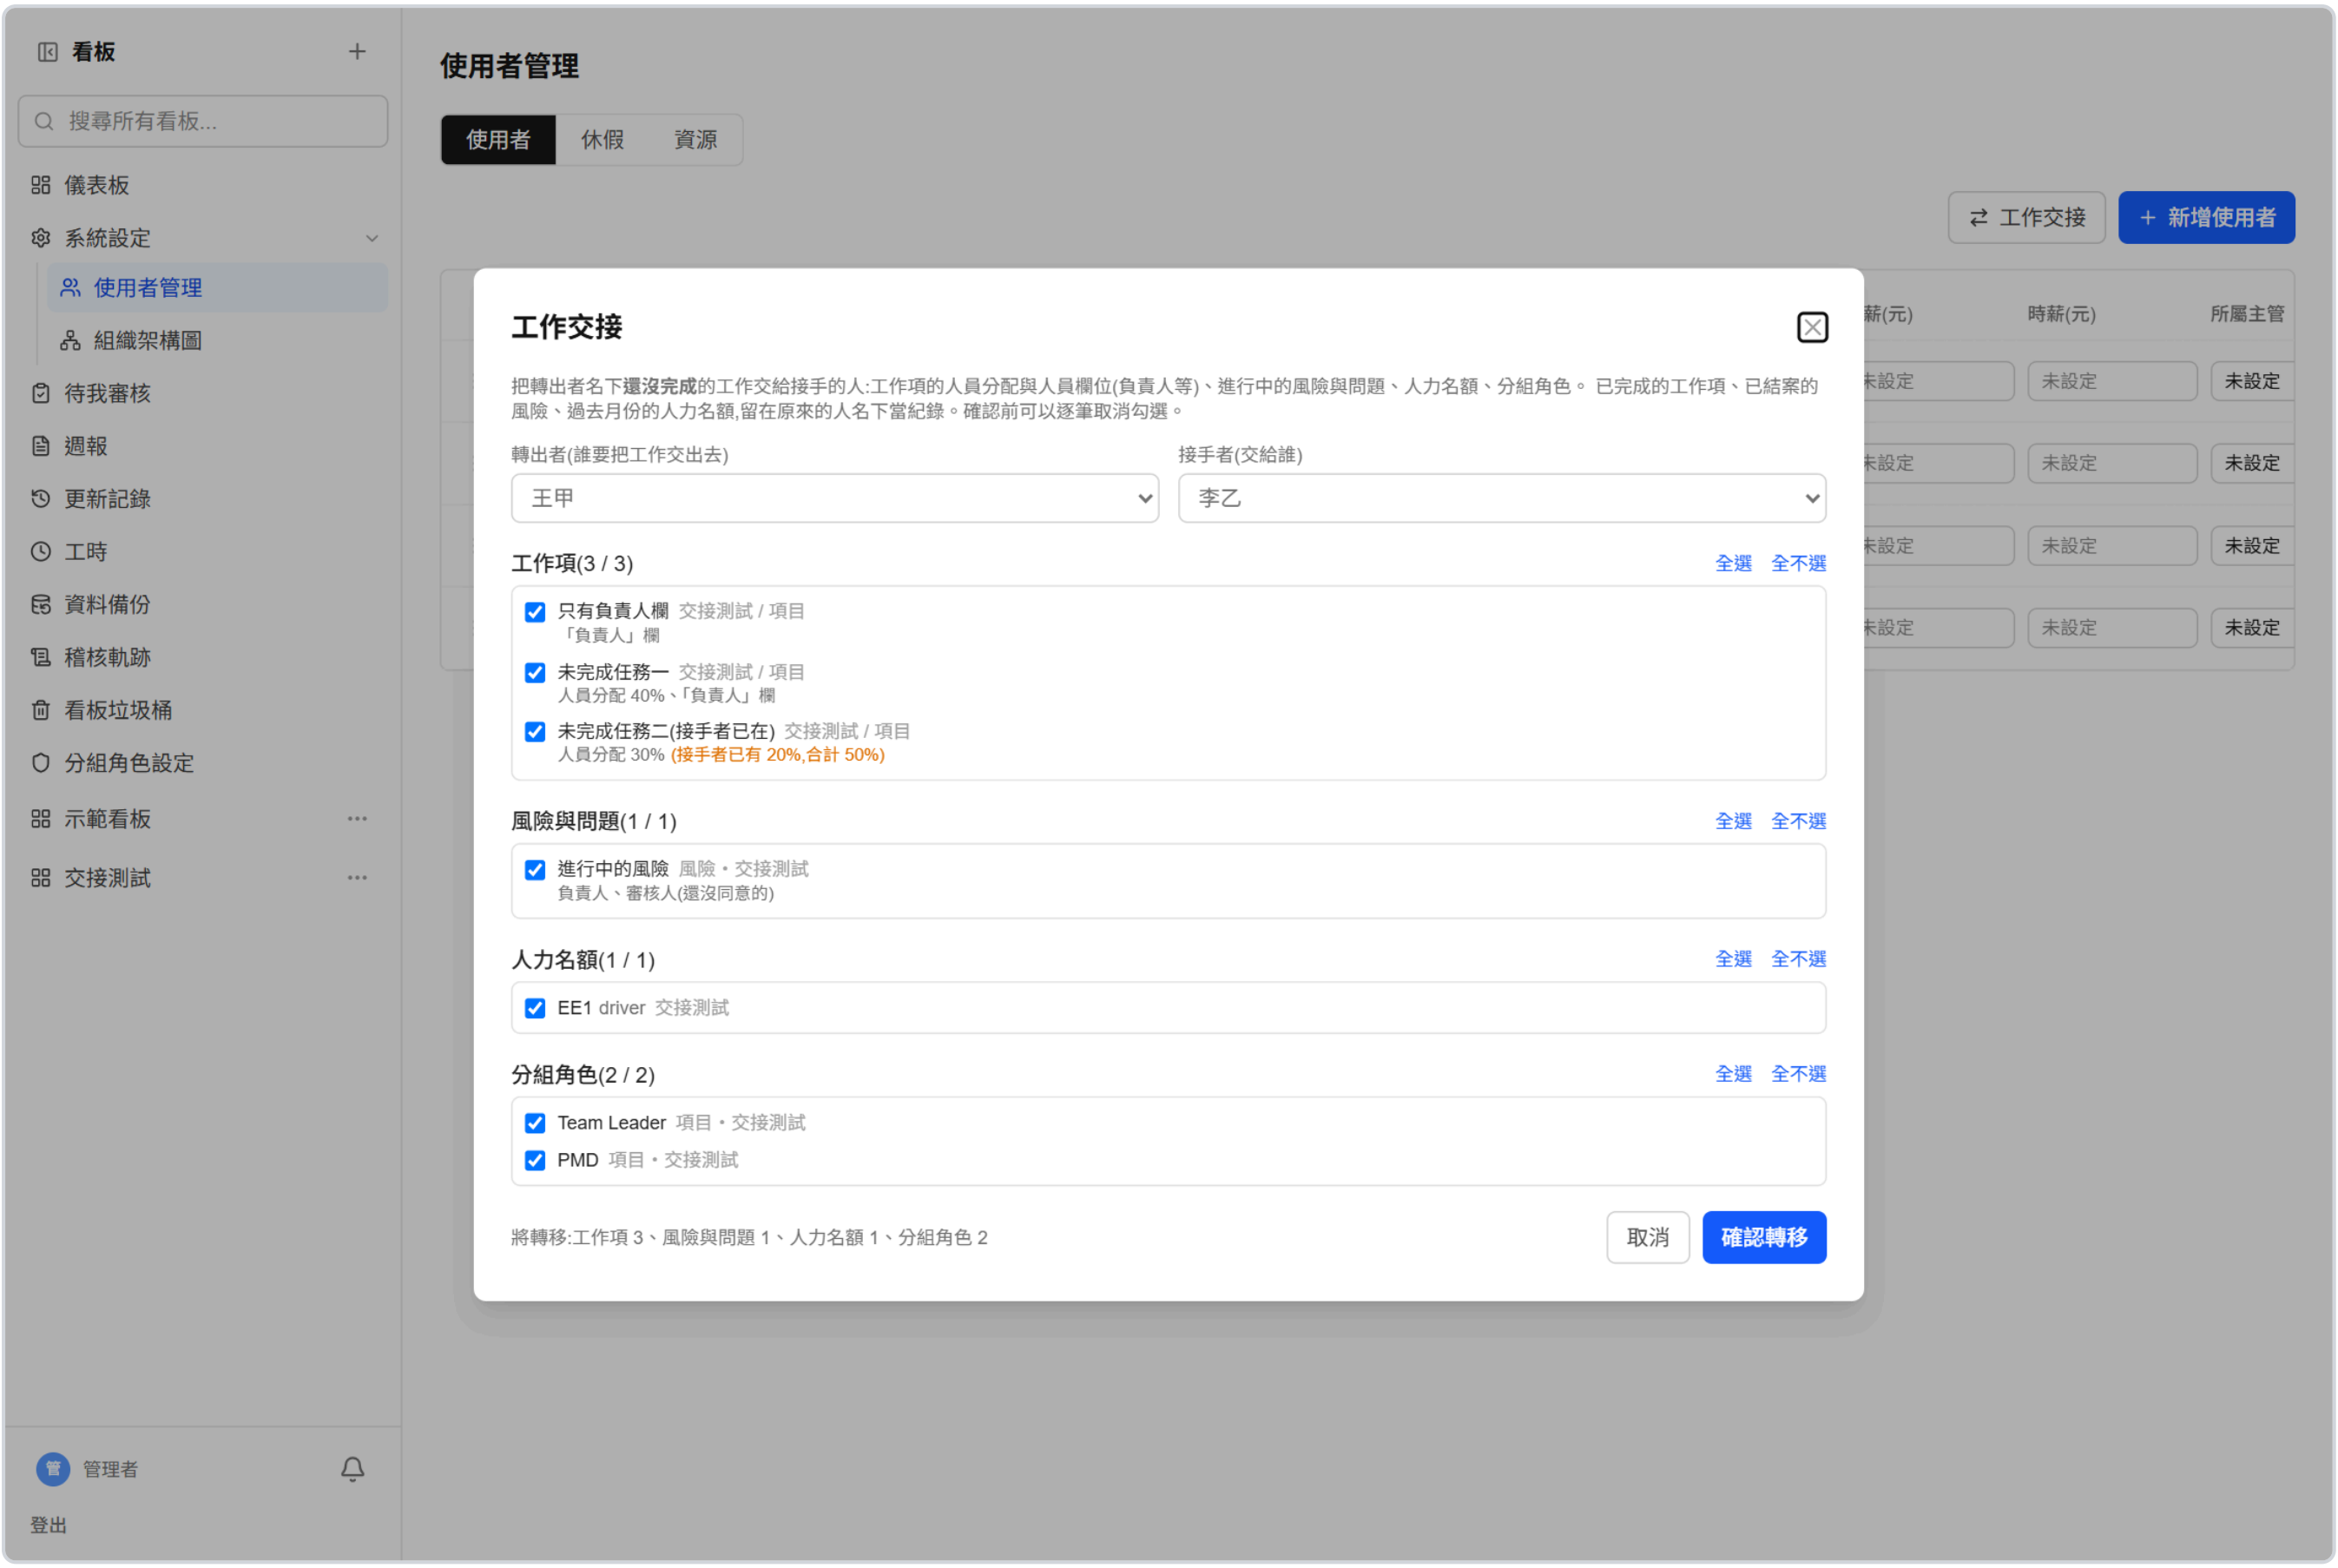
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
示範看板
交接測試
管理者
登出
使用者管理
使用者
休假
資源
工作交接
新增使用者
薪(元)
時薪(元)
所屬主管
未設定
全選
全不選
取消
確認轉移

工作交接

把轉出者名下**還沒完成**的工作交給接手的人:工作項的人員分配與人員欄位(負責人等)、進行中的風險與問題、人力名額、分組角色。 已完成的工作項、已結案的風險、過去月份的人力名額,留在原來的人名下當紀錄。確認前可以逐筆取消勾選。

轉出者(誰要把工作交出去):王甲

接手者(交給誰):李乙

工作項(3 / 3)

- ☑ 只有負責人欄 交接測試 / 項目
  「負責人」欄
- ☑ 未完成任務一 交接測試 / 項目
  人員分配 40%、「負責人」欄
- ☑ 未完成任務二(接手者已在) 交接測試 / 項目
  人員分配 30% (接手者已有 20%,合計 50%)

風險與問題(1 / 1)

- ☑ 進行中的風險 風險・交接測試
  負責人、審核人(還沒同意的)

人力名額(1 / 1)

- ☑ EE1 driver 交接測試

分組角色(2 / 2)

- ☑ Team Leader 項目・交接測試
- ☑ PMD 項目・交接測試

將轉移:工作項 3、風險與問題 1、人力名額 1、分組角色 2

- **工時免審核**:勾選後,這個人登記的專案工時與對應專案的會議工時直接生效、不用核准(註記「免審核」,列上有標籤);勾選時,他目前待審的也一併視為核准。

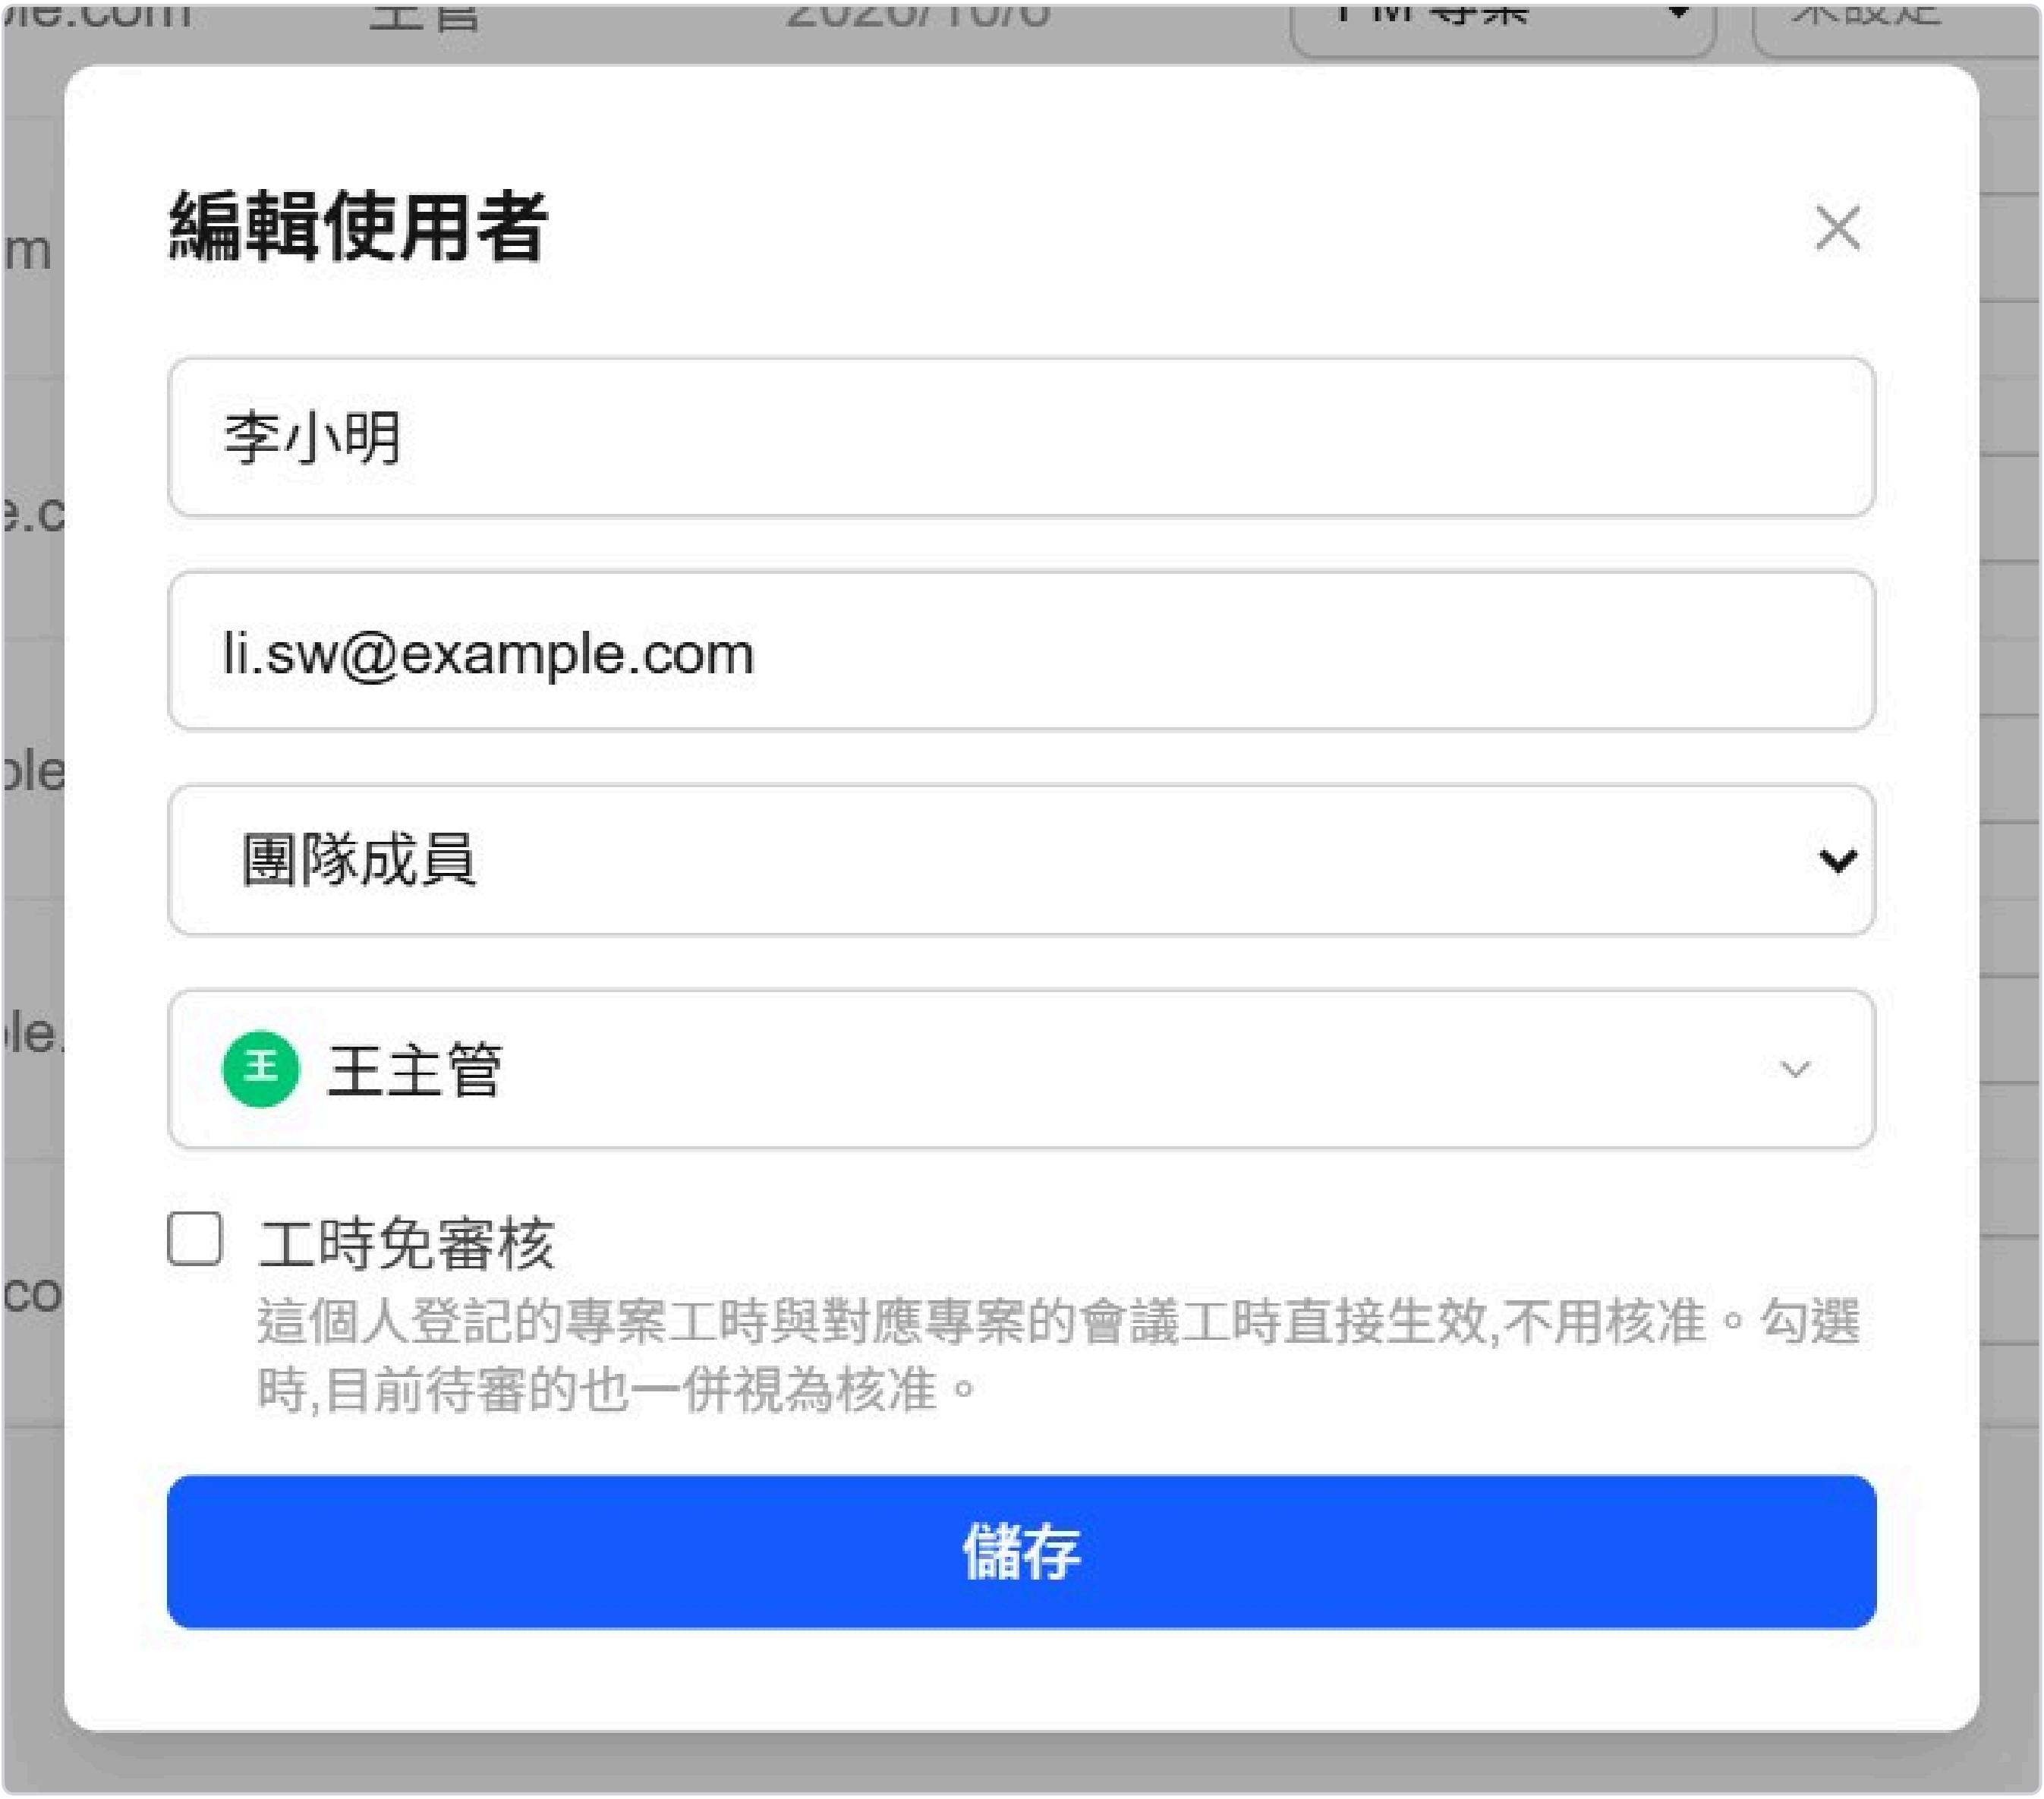

李小明

li.sw@example.com

團隊成員

王 王主管

□ 工時免審核

這個人登記的專案工時與對應專案的會議工時直接生效,不用核准。勾選時,目前待審的也一併視為核准。

- **組織單位**:欄位的下拉選單列的是**組織架構圖的部門**(依上下層縮排)。選了就等於把這個人掛在那個部門,他的**所屬主管**跟著架構圖算出來(同 21.1b);旁邊的小標籤(例如 `EE`)是他的**人力單位**,由系統設定「公司組織單位」裡的「對應組織架構圖部門」自動帶入;**如果那個部門同時對應好幾個人力單位**(例如品質管理部 = QA + FAE),標籤會變成一個下拉選單,只列那個部門對應的單位(代號 + 顯示名稱),由你選這個人是哪一個。選「未設定」是把他移出架構圖,人力單位不會被清掉。人力表、費率、DM 角色仍然照人力單位代號,所以那些功能不用改。
- 「所屬主管」決定誰能審核這個人的工時與請假,也決定主管的「我的團隊」範圍。**已經掛在組織架構圖上的人,這個欄位由架構圖決定、在這裡是鎖住的**(滑鼠停上去有說明),要改請到「組織架構圖」(21.1b)。
- 拖曳左邊的把手可以調整顯示順序。

21.1b 組織架構圖與主管階層【全員可看,管理者編輯】

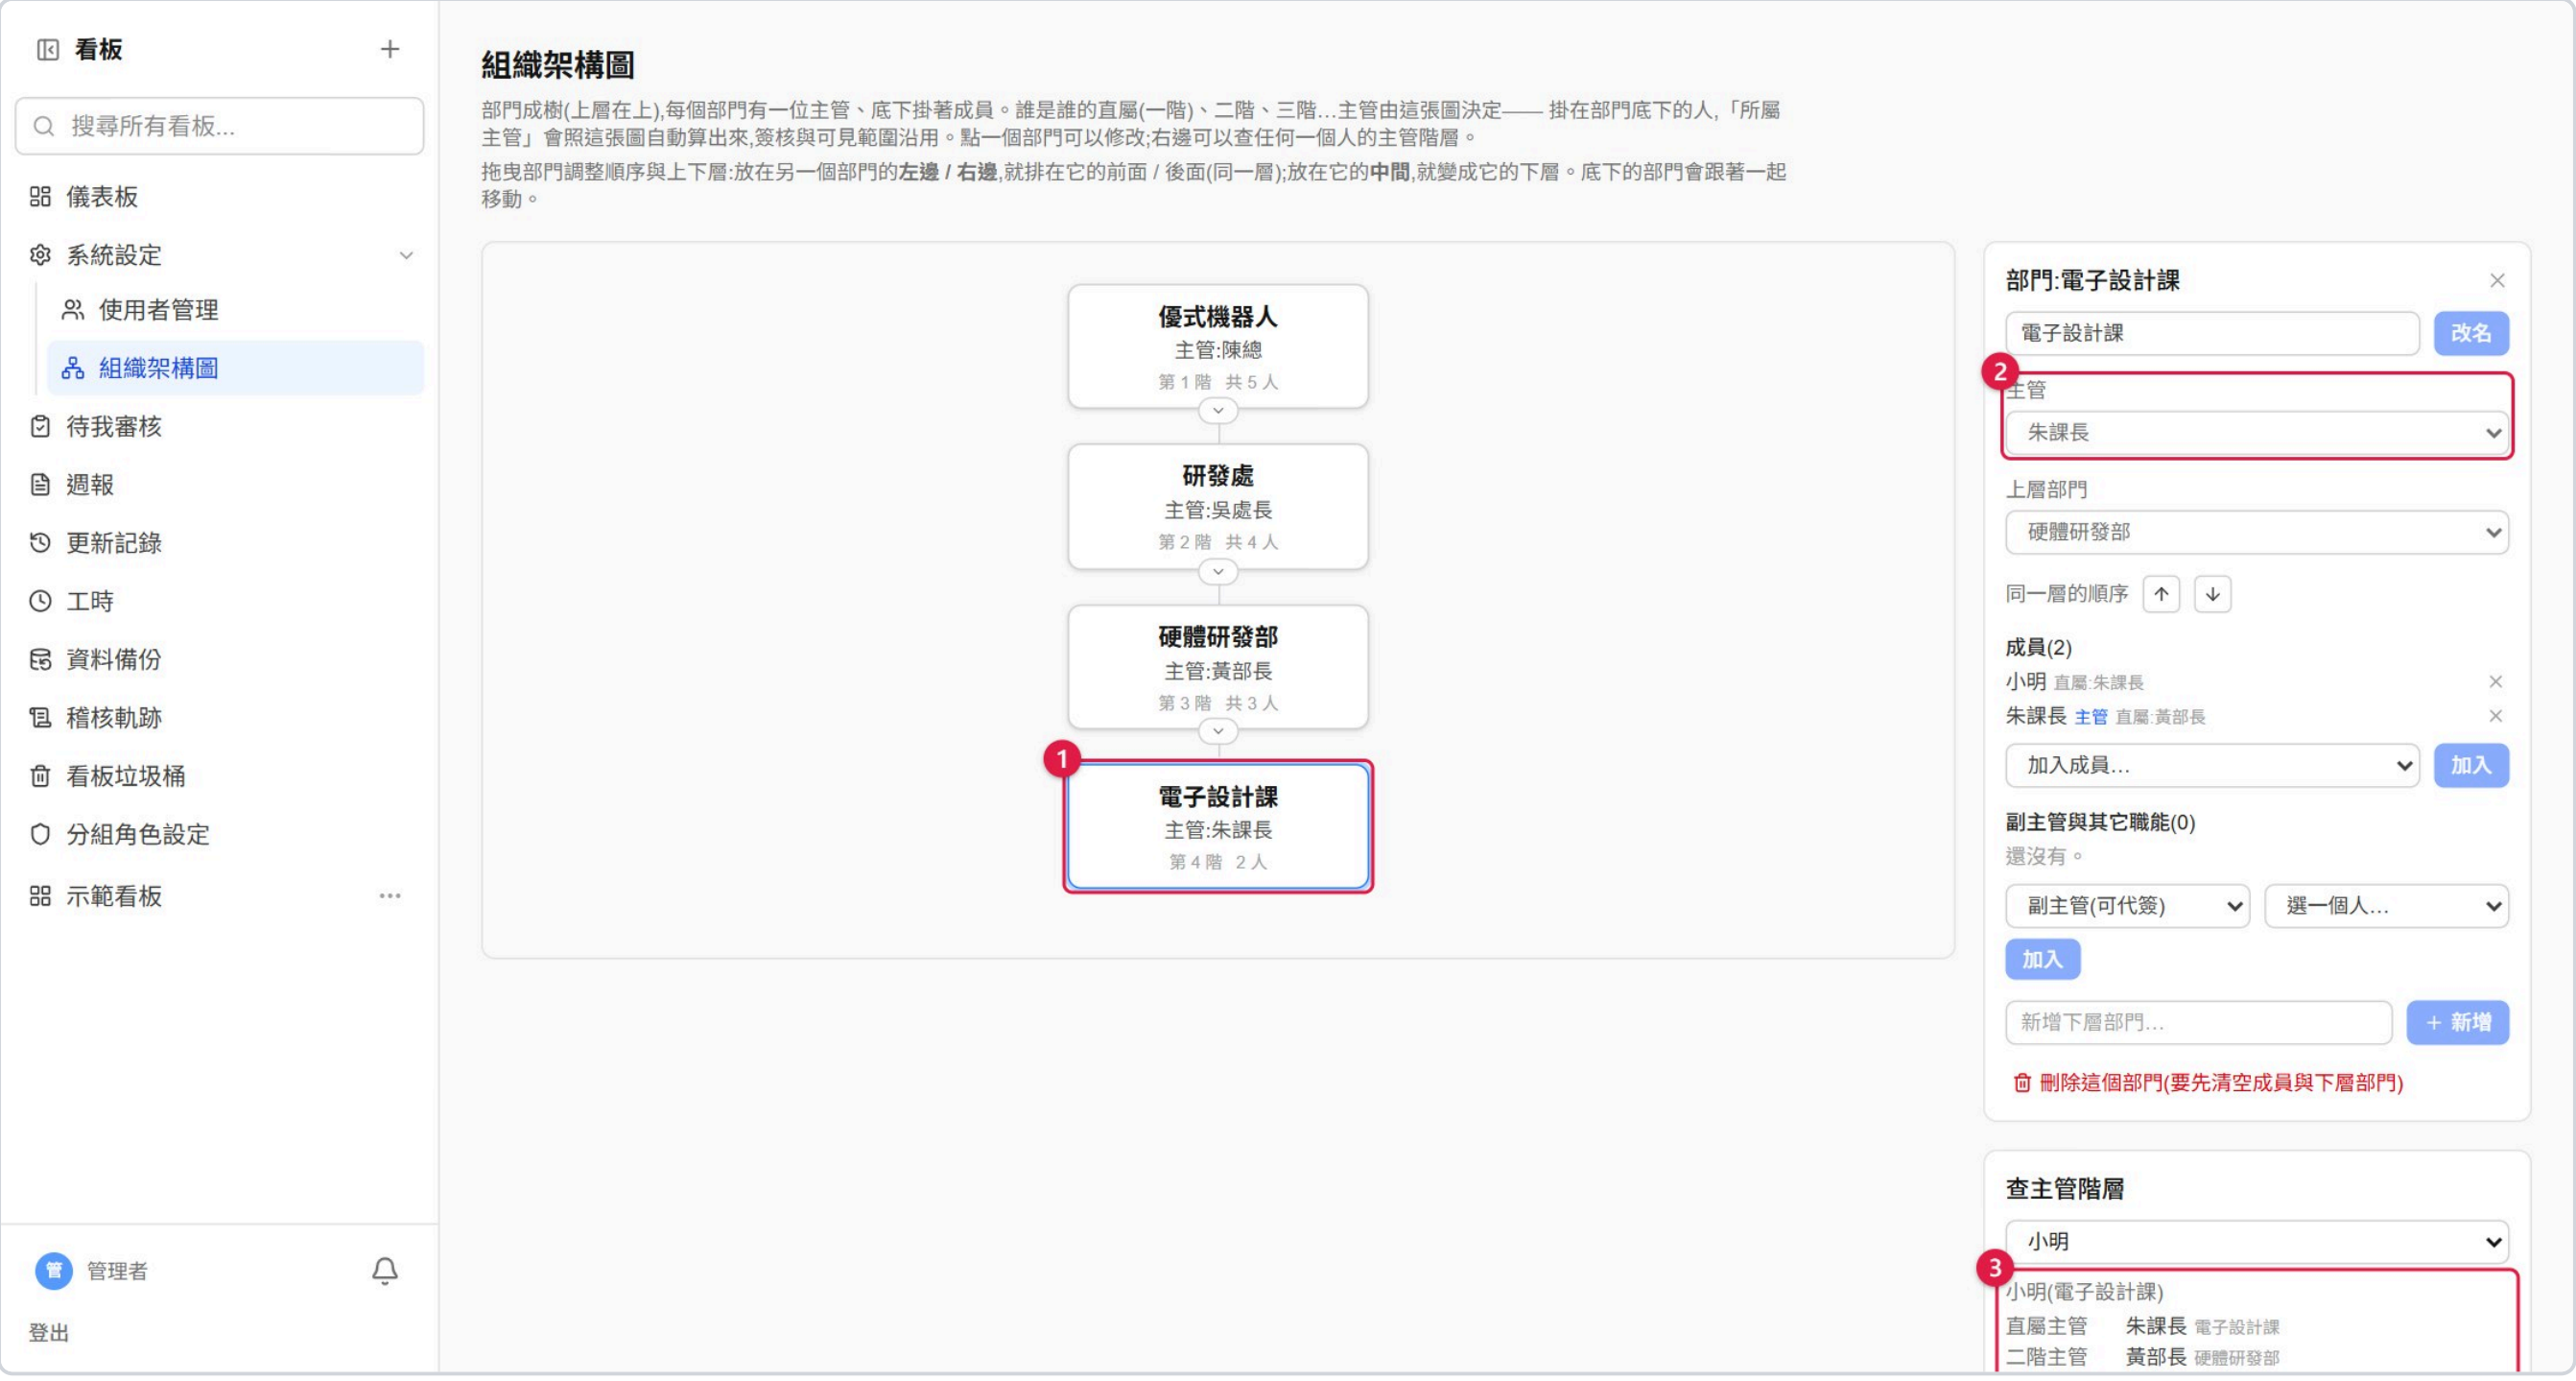
看板
＋
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
示範看板
管理者
登出
優式機器人
主管:陳總
第 1 階 共 5 人
研發處
主管:吳處長
第 2 階 共 4 人
硬體研發部
主管:黃部長
第 3 階 共 3 人
電子設計課
主管:朱課長
第 4 階 2 人
1
2
3
改名
↑
↓
加入
＋ 新增

組織架構圖

部門成樹(上層在上),每個部門有一位主管、底下掛著成員。誰是誰的直屬(一階)、二階、三階...主管由這張圖決定—— 掛在部門底下的人,「所屬主管」會照這張圖自動算出來,簽核與可見範圍沿用。點一個部門可以修改;右邊可以查任何一個人的主管階層。

拖曳部門調整順序與上下層:放在另一個部門的**左邊 / 右邊**,就排在它的前面 / 後面(同一層);放在它的**中間**,就變成它的下層。底下的部門會跟著一起移動。

部門:電子設計課

電子設計課

主管: 朱課長

上層部門: 硬體研發部

同一層的順序

成員(2)

小明 直屬:朱課長

朱課長 主管 直屬:黃部長

加入成員...

副主管與其它職能(0)

還沒有。

副主管(可代簽) 選一個人...

新增下層部門...

刪除這個部門(要先清空成員與下層部門)

查主管階層

小明

小明(電子設計課)

直屬主管 朱課長 電子設計課

二階主管 黃部長 硬體研發部

側邊欄「**組織架構圖**」把公司的部門畫成一棵樹(上層在上、下層在下),每個部門有一位**主管**、底下掛著**成員**。有了這張圖,就知道誰是誰的直屬(一階)、二階、三階......主管,最多算到五階。

- ① **部門卡片**:名稱、主管、「第幾階」(這個部門離最上層幾層)與人數(上層部門顯示底下所有部門的總數,見下)。點一下選取;卡片下緣的小箭頭可以收合 / 展開下層部門。
- ② **修改面板**【管理者】:選取部門後,右邊可以改名、設**主管**、換**上層部門**(選單裡不會出現它自己的下層部門,避免繞成圈)、調同一層的順序(↑ ↓)、**加入 / 移出成員**、新增下層部門、刪除部門(要先清空成員與下層部門)。第一次使用:右邊「新增最上層部門」建立公司,再一層層往下加。把某人設成部門主管時,如果他還沒有所屬部門,會自動掛在他帶領的部門;**他的登入角色如果是「團隊成員」,會自動升成「主管」**(管理者不動,也不會自動降級,稽核軌跡會寫明)。升級之後他要重新登入,新的權限才會生效。
- ③ **查主管階層**(所有人都能用):選任何一個人,列出他頭上的直屬、二階、三階......主管,以及各是哪個部門的主管。
- ④ **副主管與其它職能**【管理者】:選取部門後,右邊「副主管與其它職能」可以在主管之外再加人。選「**副主管**」:職稱就是副主管,**可以代主管簽核**;選「**其它職能...**」:自己填職稱(例如行政、秘書),預設只是標示在架構圖上,勾「**可代簽**」才能代主管簽核(已加的人也可以隨時勾選或取消)。一個人在一個部門只有一個職稱;部門的主管本人不用再加。卡片上主管底下會多出一行「副主管:某某」。
- 還沒掛在任何部門的人列在「尚未掛在架構圖的人」,他們的所屬主管仍然在「使用者管理」手動指定。

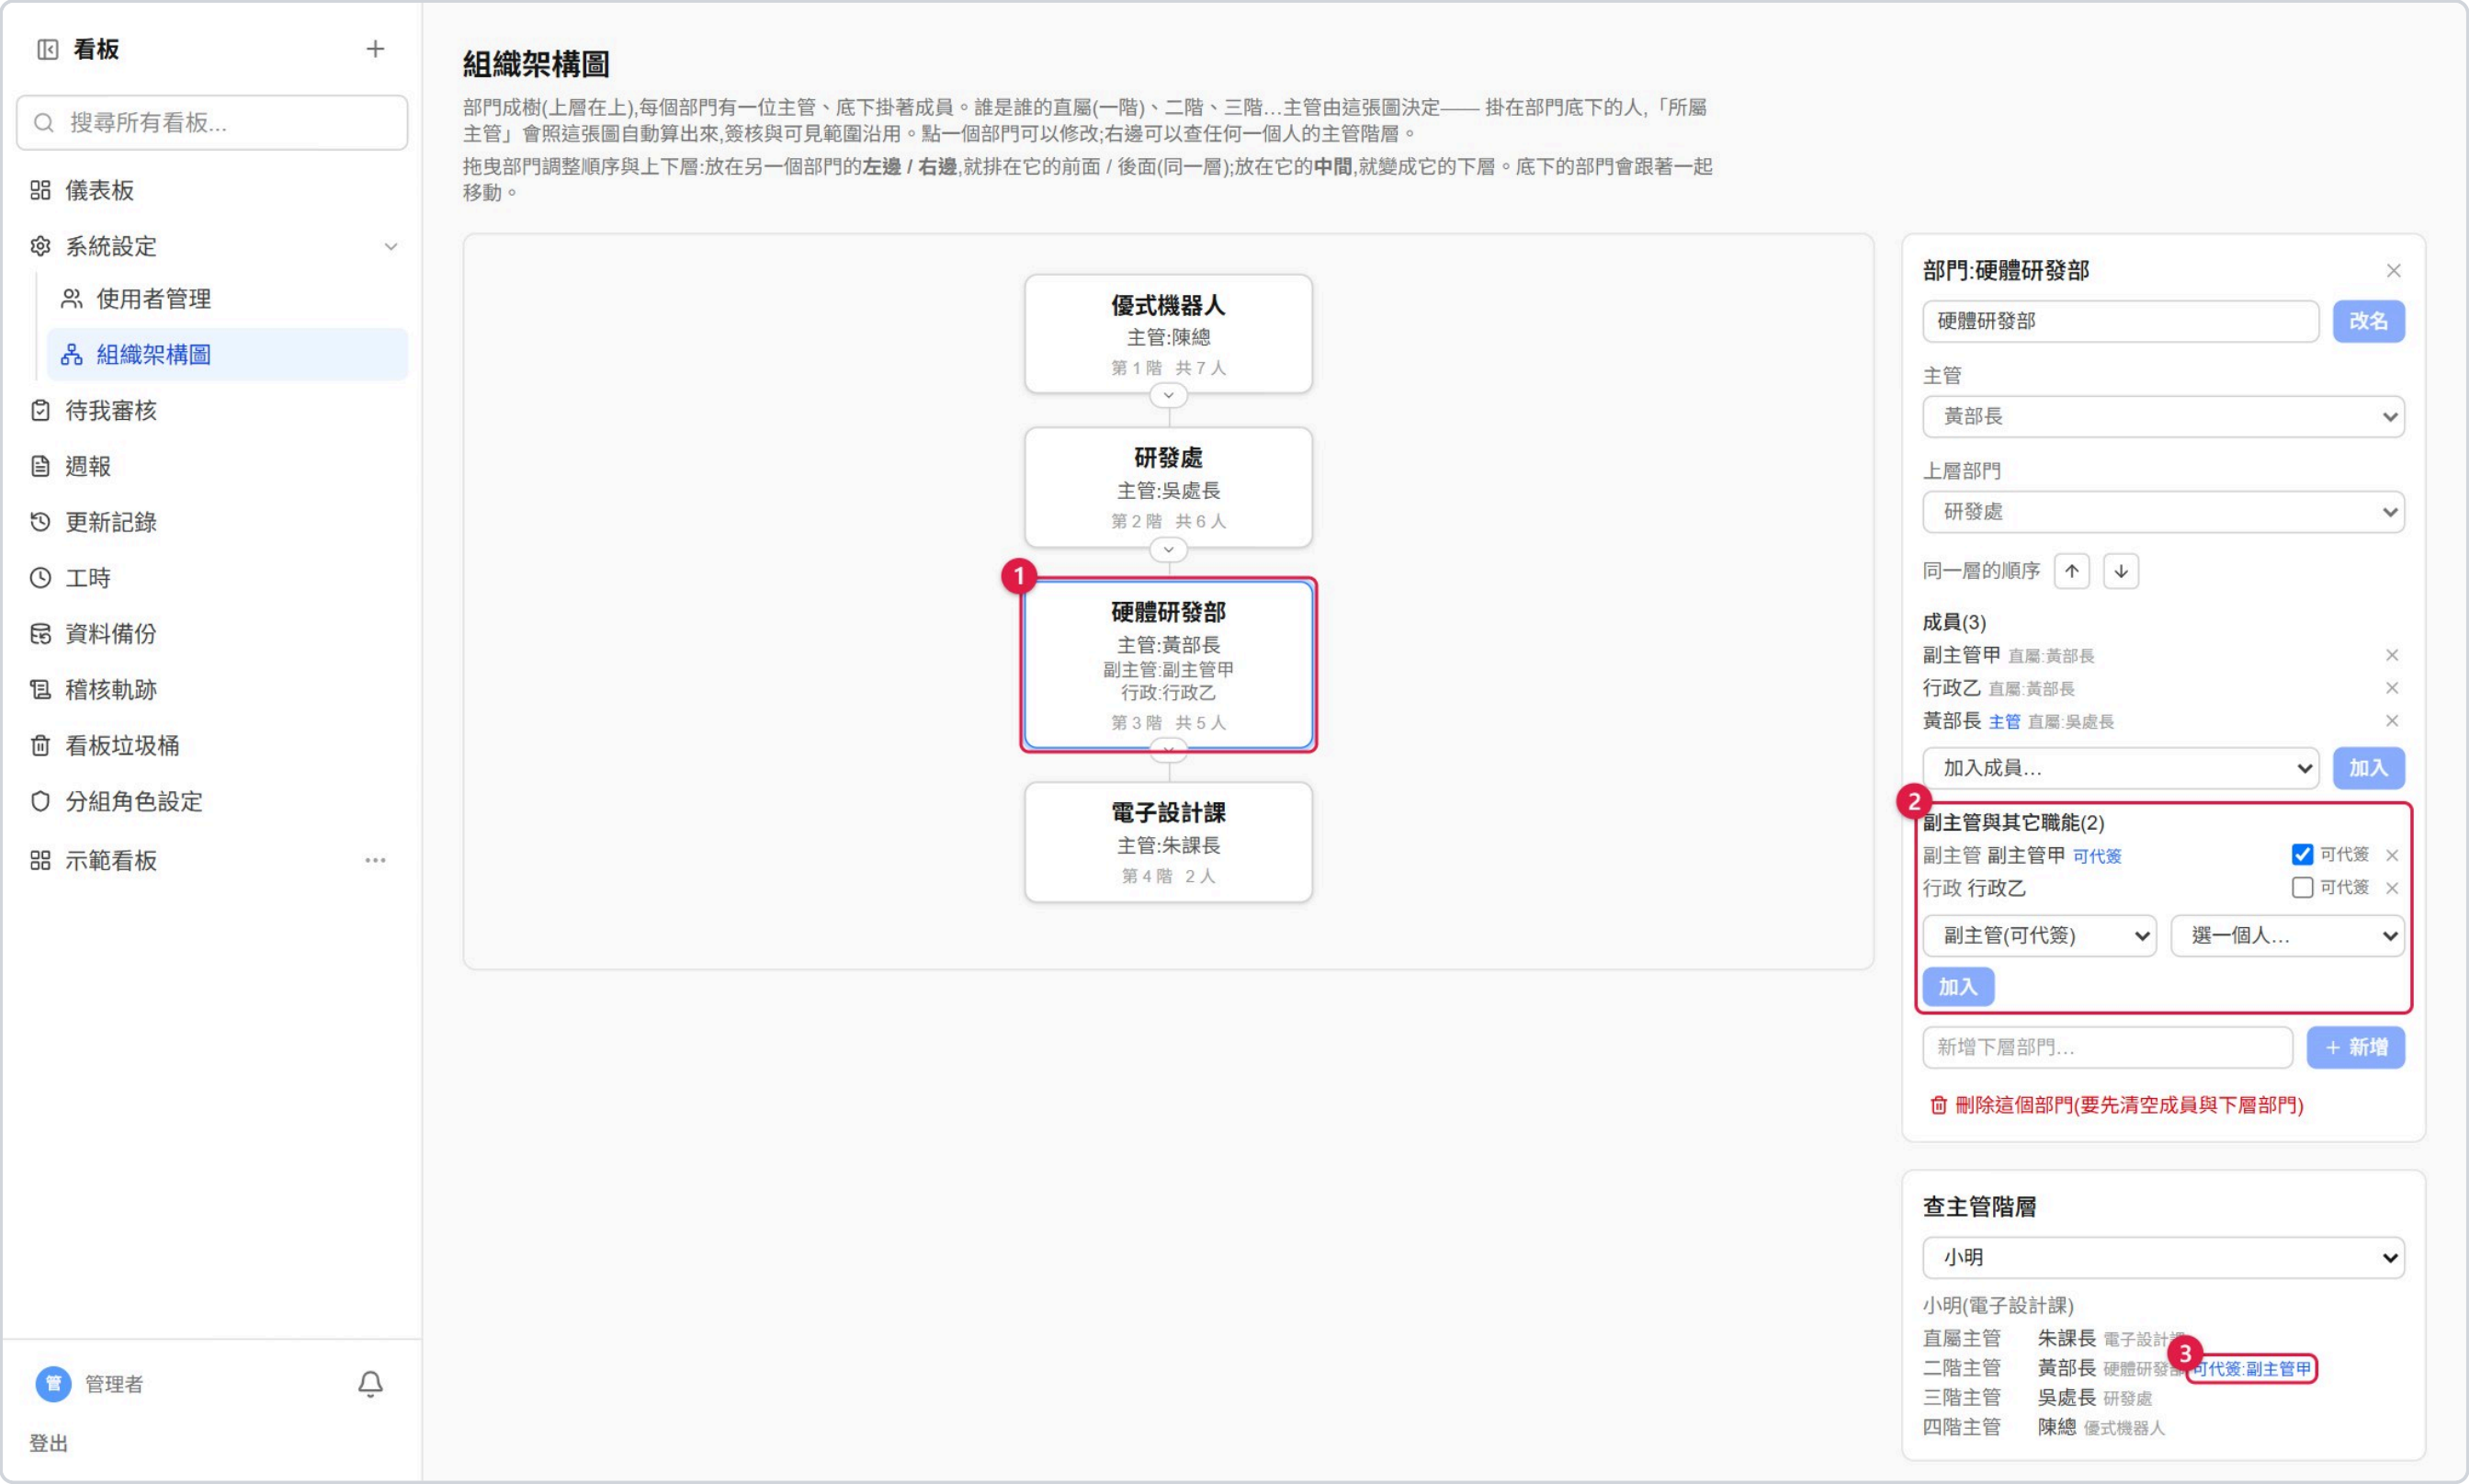
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
示範看板
管理者
登出
優式機器人
主管:陳總
第 1 階　共 7 人
研發處
主管:吳處長
第 2 階　共 6 人
1
硬體研發部
主管:黃部長
副主管:副主管甲
行政:行政乙
第 3 階　共 5 人
電子設計課
主管:朱課長
第 4 階　2 人
改名
加入
2
加入
＋ 新增
3

組織架構圖

部門成樹(上層在上),每個部門有一位主管、底下掛著成員。誰是誰的直屬(一階)、二階、三階…主管由這張圖決定—— 掛在部門底下的人,「所屬主管」會照這張圖自動算出來,簽核與可見範圍沿用。點一個部門可以修改;右邊可以查任何一個人的主管階層。

拖曳部門調整順序與上下層:放在另一個部門的**左邊 / 右邊**,就排在它的前面 / 後面(同一層);放在它的**中間**,就變成它的下層。底下的部門會跟著一起移動。

部門:硬體研發部

硬體研發部

主管
黃部長

上層部門
研發處

同一層的順序 ↑ ↓

成員(3)
副主管甲 直屬:黃部長
行政乙 直屬:黃部長
黃部長 主管 直屬:吳處長

加入成員...

副主管與其它職能(2)
副主管 副主管甲 可代簽　☑ 可代簽
行政 行政乙　☐ 可代簽
副主管(可代簽)　選一個人...

新增下層部門...

刪除這個部門(要先清空成員與下層部門)

查主管階層

小明

小明(電子設計課)
直屬主管　朱課長 電子設計課
二階主管　黃部長 硬體研發部 可代簽:副主管甲
三階主管　吳處長 研發處
四階主管　陳總 優式機器人

拖曳調整順序與上下層【管理者】:用滑鼠按住部門卡片,拖到另一個部門上再放開,依放開的位置決定:

- 放在另一個部門的**左邊 / 右邊**(那一側出現藍色直線):排在它的前面 / 後面,跟它同一層。
- 放在**中間**(整張卡片亮藍框):變成它的下層。

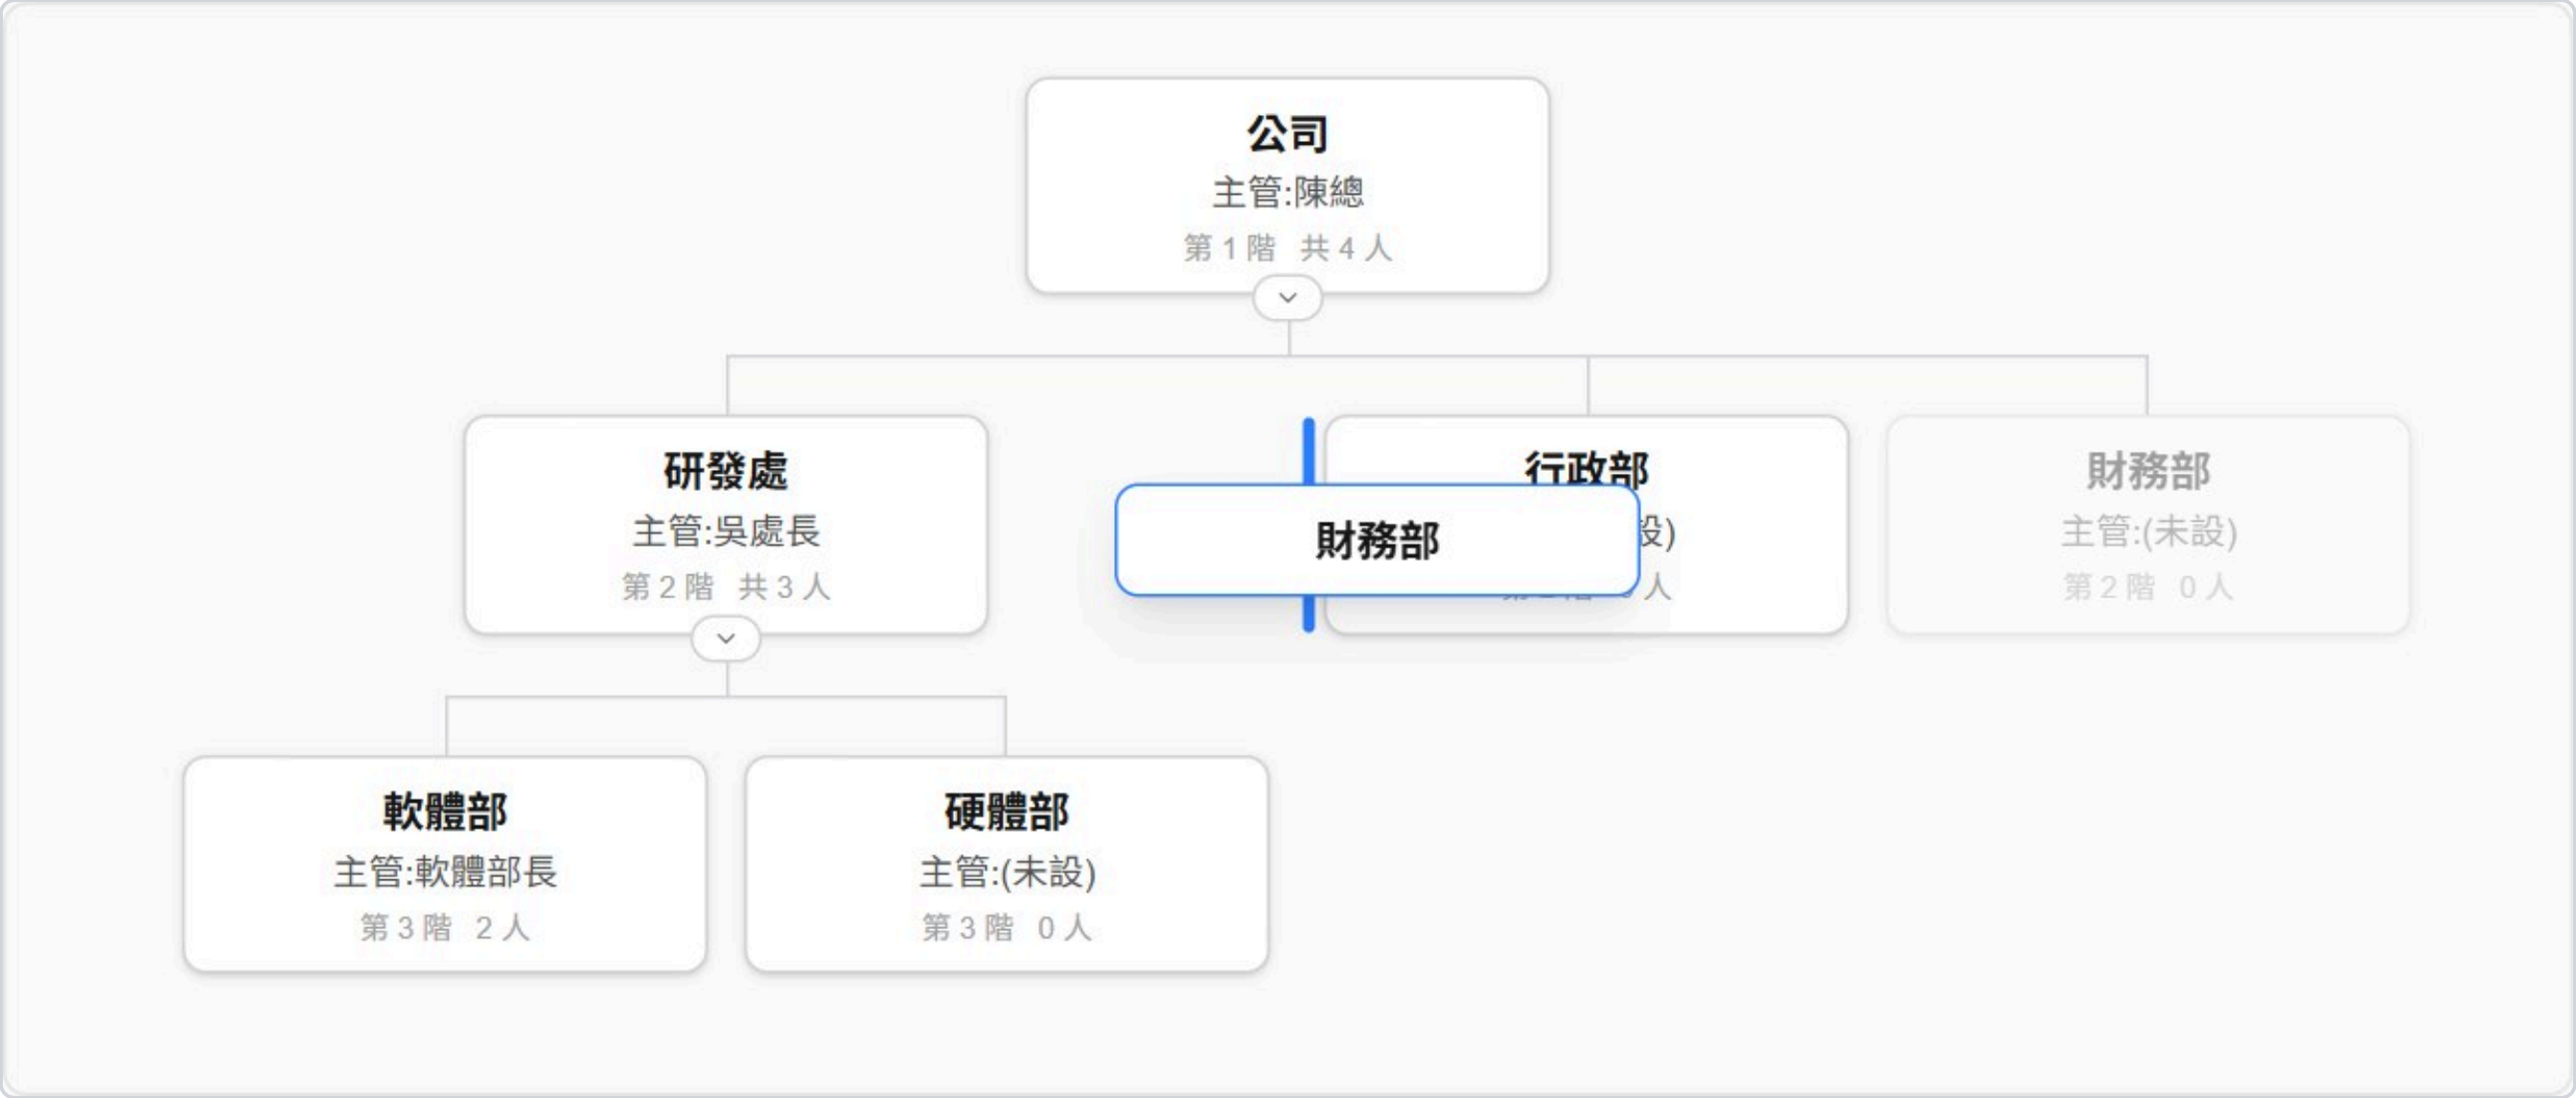
公司
主管:陳總
第 1 階　共 4 人
研發處
主管:吳處長
第 2 階　共 3 人
財務部
行政部
設)
人
財務部
主管:(未設)
第 2 階　0 人
軟體部
主管:軟體部長
第 3 階　2 人
硬體部
主管:(未設)
第 3 階　0 人

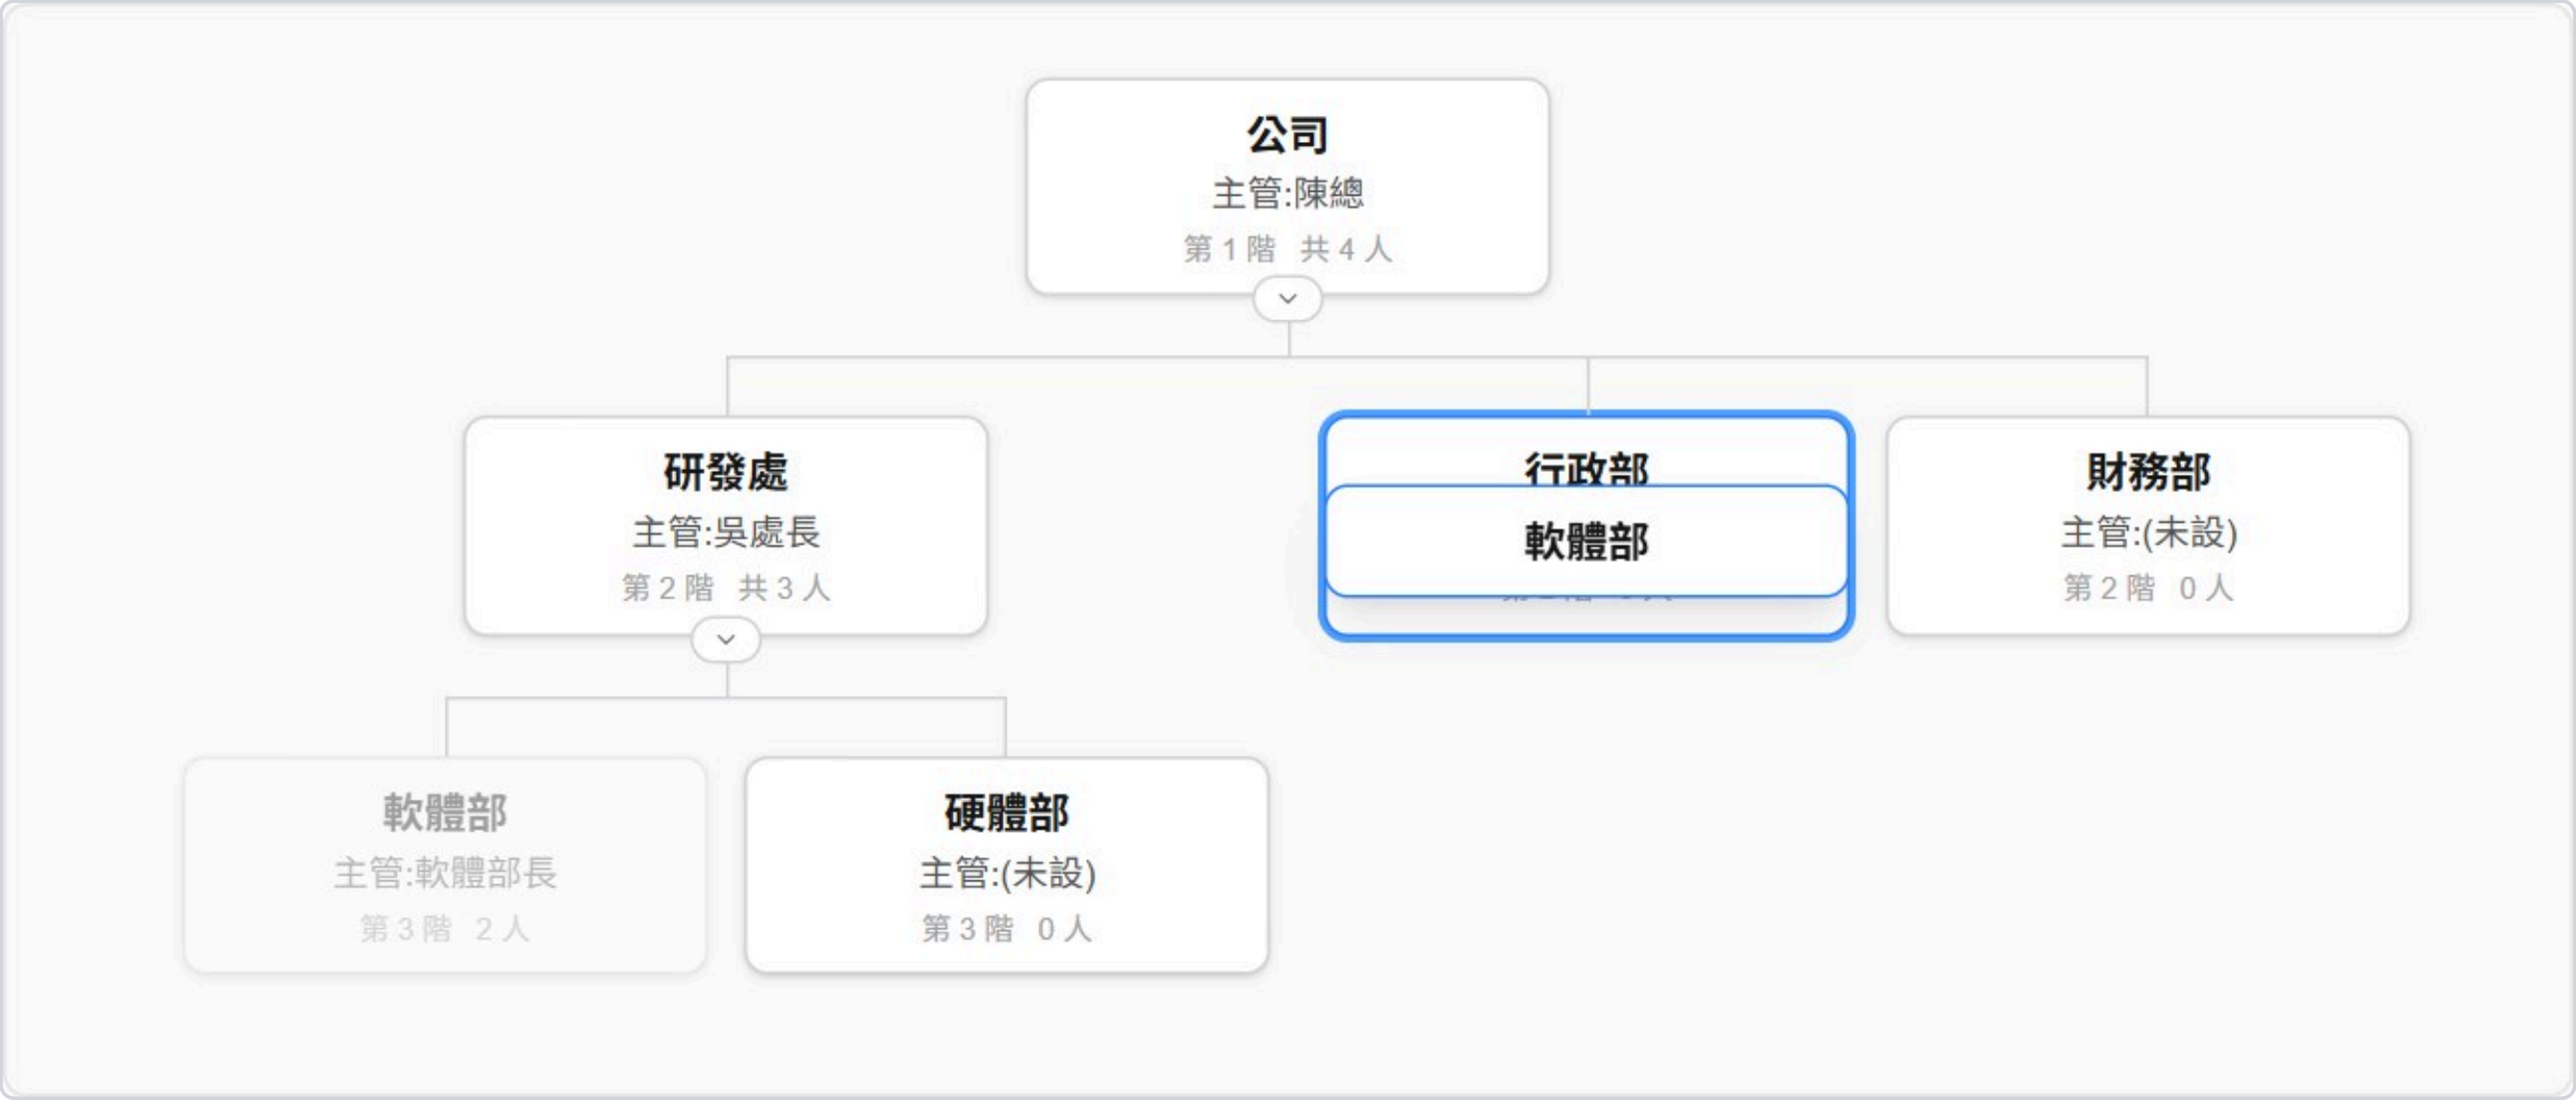

- 底下的部門會跟著一起移動。拖到自己的下層、或放下去位置沒變,不會有標示,放開也不會改任何東西;拖到一半按 Esc 可以取消。
- 放進一個收合著的部門,它會自動展開,看得到剛放進去的。
- 拖完後所屬主管照新的架構圖重算,畫面上方會說明有幾位同仁的直屬主管跟著改變。
- 不方便拖曳時,也可以點選部門,用右邊面板的「上層部門」選單與「同一層的順序」↑ ↓ 調整。

人數怎麼算:卡片上的人數是**這個部門的人**——掛在這個部門的成員,加上這個部門的主管。一個人只掛在一個部門(他的所屬部門),卻可以同時是好幾個部門的主管;他在別的部門當主管時,那個部門的卡片會標「(兼任)」,**兼任的主管也算在那個部門的人數裡**,選取部門時成員清單會列出他(標「兼任主管」與他的所屬部門),主管下方也會說明他的所屬部門在哪。他的主管關係與簽核照常。**上層部門顯示的是底下所有部門的總數**(「共 N 人」,含自己),同一個人不論在幾個部門出現都只算一次;最底層的部門顯示自己的人數。

人力單位對應:每個部門可以對應**一個或好幾個**人力單位(EE、ME...),在「系統設定 → 公司組織單位」的「對應組織架構圖部門」欄設定(見 21.3)。選取部門時,右邊會寫出它對應的人力單位(代號 + 顯示名稱;自己沒有對應的部門沿用上層,會註明)。

所屬主管怎麼算出來:掛在部門底下的人,「所屬主管」由架構圖決定——從他所在的部門往上找,第一個「主管不是他自己」的部門主管,就是他的直屬主管;部門主管本人的直屬主管,就是上一層部門的主管。修改架構圖後,所有人的所屬主管會一併更新(畫面上方會說「剛才的修改讓 N 位同仁的直屬主管跟著改變了」),待我審核、可見範圍、「我的團隊」都沿用。

擋下的設定:會讓兩個人互為主管的修改(例如最上層部門的主管,自己卻掛在最下層的部門)會被擋下並說明原因,資料不會被改到。

代簽怎麼運作:能代簽的人(副主管,或勾了「可代簽」的職能)可以代**這個部門目前的主管**簽核——部門換了主管,代簽的對象跟著換。「查主管階層」會在那一階主管旁標出「可代簽:某某」(上圖 ③)。代簽不改變誰是誰的主管,也不會讓他看到主管看得到的工時與資料。**副主管能看到的是「我的團隊」**:儀表板的團隊工作量、團隊項目、到期清單,以及看板的「看板」與「報表」分頁的團隊範圍,都會包含**他擔任副主管的那個部門的人**(部門成員、底下子部門的主管與成員,不含部門主管本人;主管如果同時是更大部門的主管,副主管也只看他那一個部門,不是主管整條下轄)(只是「看」,指派與改時程的權限不變)。

哪些簽核需要二階、三階主管同意,在「系統設定 → 簽核層級」設定,見第 18 章。

21.2 稽核軌跡【管理者】

誰在什麼時候改了什麼:費率、基準線、可見範圍、看板刪除、閘門與變更的決定、工時與請假的審核等。

21.2b 使用者回報【管理者】

側邊欄「**使用者回報**」(只有管理者看得到,還有未處理的會標數字)。這裡是同仁按畫面右下角「?」(1.8)送出的所有問題,**固定放在這一頁**:

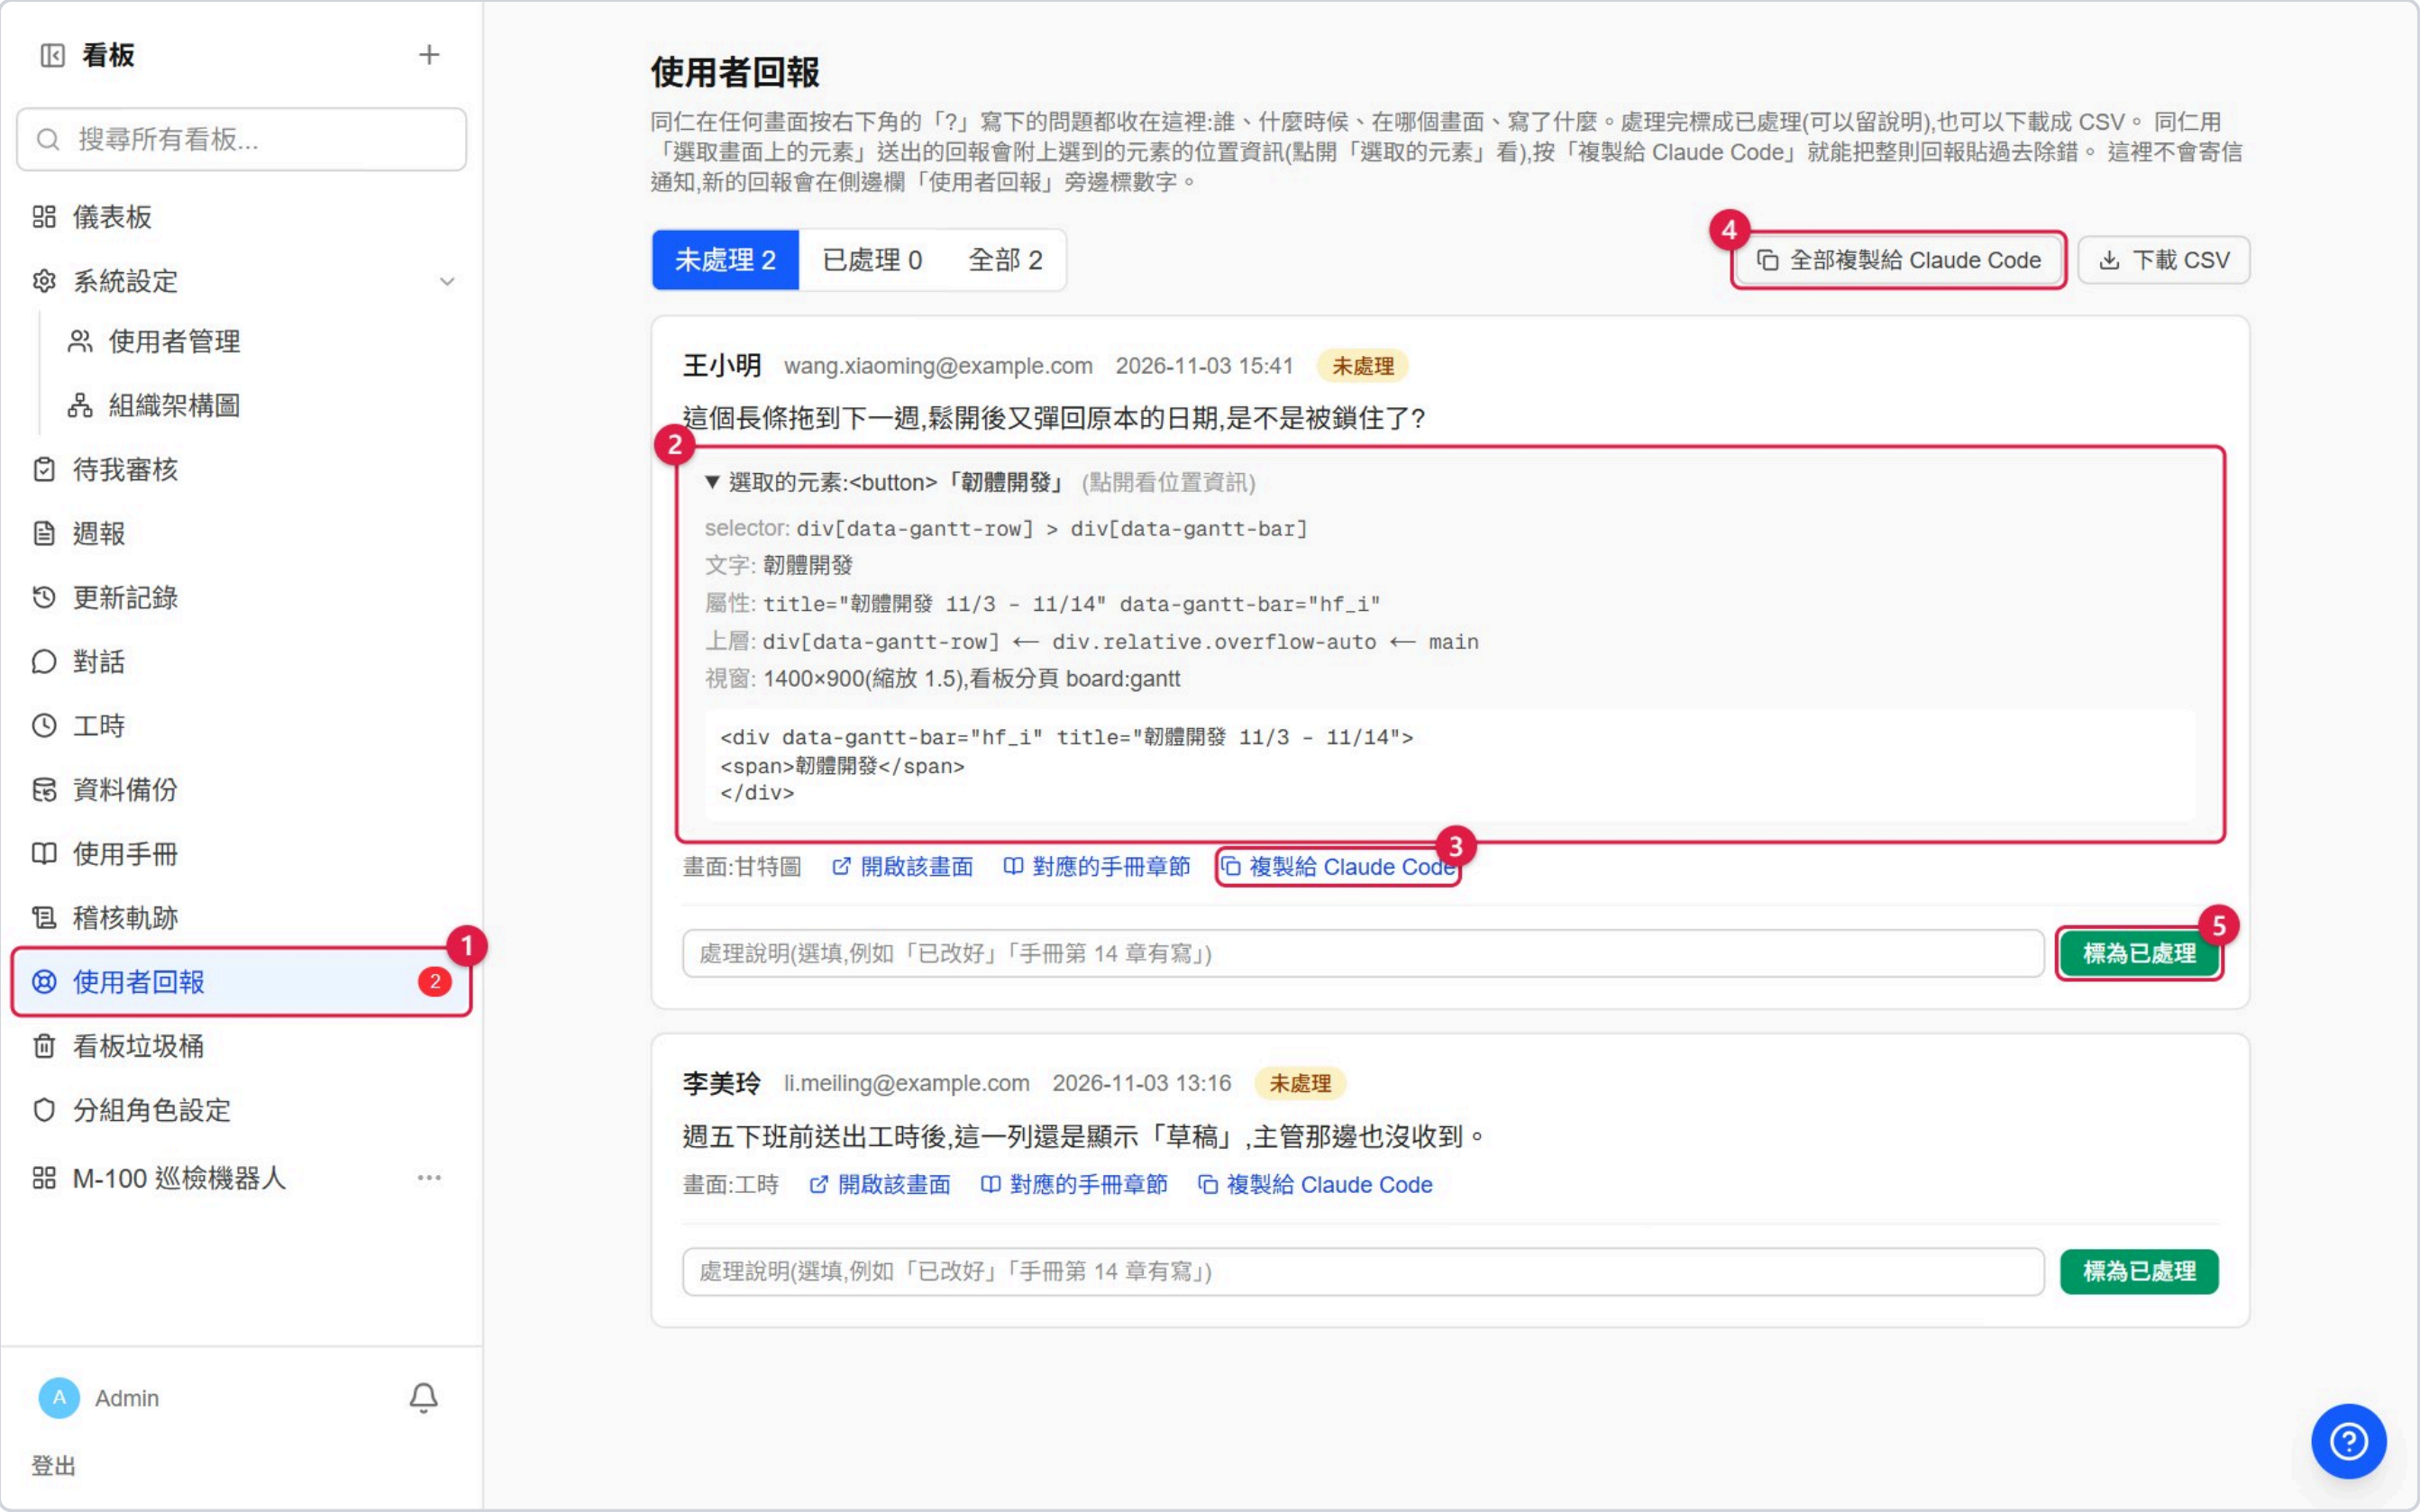
看板
搜尋所有看板...
儀表板
系統設定
使用者管理
組織架構圖
待我審核
週報
更新記錄
對話
工時
資料備份
使用手冊
稽核軌跡
使用者回報
2
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
Admin
登出
1
2
3
4
5
未處理 2
已處理 0
全部 2
全部複製給 Claude Code
下載 CSV
未處理
開啟該畫面
對應的手冊章節
複製給 Claude Code
標為已處理

使用者回報

同仁在任何畫面按右下角的「?」寫下的問題都收在這裡:誰、什麼時候、在哪個畫面、寫了什麼。處理完標成已處理(可以留說明),也可以下載成 CSV。 同仁用「選取畫面上的元素」送出的回報會附上選到的元素的位置資訊(點開「選取的元素」看),按「複製給 Claude Code」就能把整則回報貼過去除錯。 這裡不會寄信通知,新的回報會在側邊欄「使用者回報」旁邊標數字。

王小明 wang.xiaoming@example.com 2026-11-03 15:41 未處理

這個長條拖到下一週,鬆開後又彈回原本的日期,是不是被鎖住了?

▼ 選取的元素:<button>「韌體開發」 (點開看位置資訊)

selector: `div[data-gantt-row] > div[data-gantt-bar]`

文字: 韌體開發

屬性: `title="韌體開發 11/3 - 11/14" data-gantt-bar="hf_i"`

上層: `div[data-gantt-row] ⟵ div.relative.overflow-auto ⟵ main`

視窗: 1400×900(縮放 1.5),看板分頁 board:gantt

```
<div data-gantt-bar="hf_i" title="韌體開發 11/3 - 11/14">
<span>韌體開發</span>
</div>
```

畫面:甘特圖

處理說明(選填,例如「已改好」「手冊第 14 章有寫」)

李美玲 li.meiling@example.com 2026-11-03 13:16 未處理

週五下班前送出工時後,這一列還是顯示「草稿」,主管那邊也沒收到。

畫面:工時

處理說明(選填,例如「已改好」「手冊第 14 章有寫」)

- 每一則寫:誰、什麼時候、**在哪個畫面**(點「開啟該畫面」回到他當時的位置)、對應的手冊章節(點了開手冊)、他寫的內容。
- 上方分頁:**未處理**(預設)、**已處理**、**全部**。
- 處理完按「**標為已處理**」,可以先在框裡留一段說明(例如「已改好」「手冊第 14 章有寫」);按「重新開啟」改回未處理。處理人與時間會記下來。
- 同仁用「選取畫面上的元素」(1.8)送出的回報,多一塊「**選取的元素**」:點開看 selector、畫面上的文字、屬性、上層元素、HTML 片段與瀏覽器視窗大小。
- 「**複製給 Claude Code**」:把這一則回報(誰、哪個畫面、選的元素、說了什麼)組成一段說明,貼給 Claude Code,請它依 selector、`data-` 屬性與畫面上的字到原始碼裡找出對應的元件、判斷原因並修正。上方的「**全部複製給 Claude Code**」把目前分頁的每一則一次複製。
- 「**下載 CSV**」把目前這個分頁的回報存成檔案(Excel 可以直接開);多了「選取的元素」「selector」兩欄。
- 回報存在資料庫裡,**不會寄信通知**——常看一眼側邊欄的數字。同仁的帳號之後被刪除,他寫過的回報還留著(姓名與 Email 送出當時已經記下)。

21.3 系統設定【管理者】

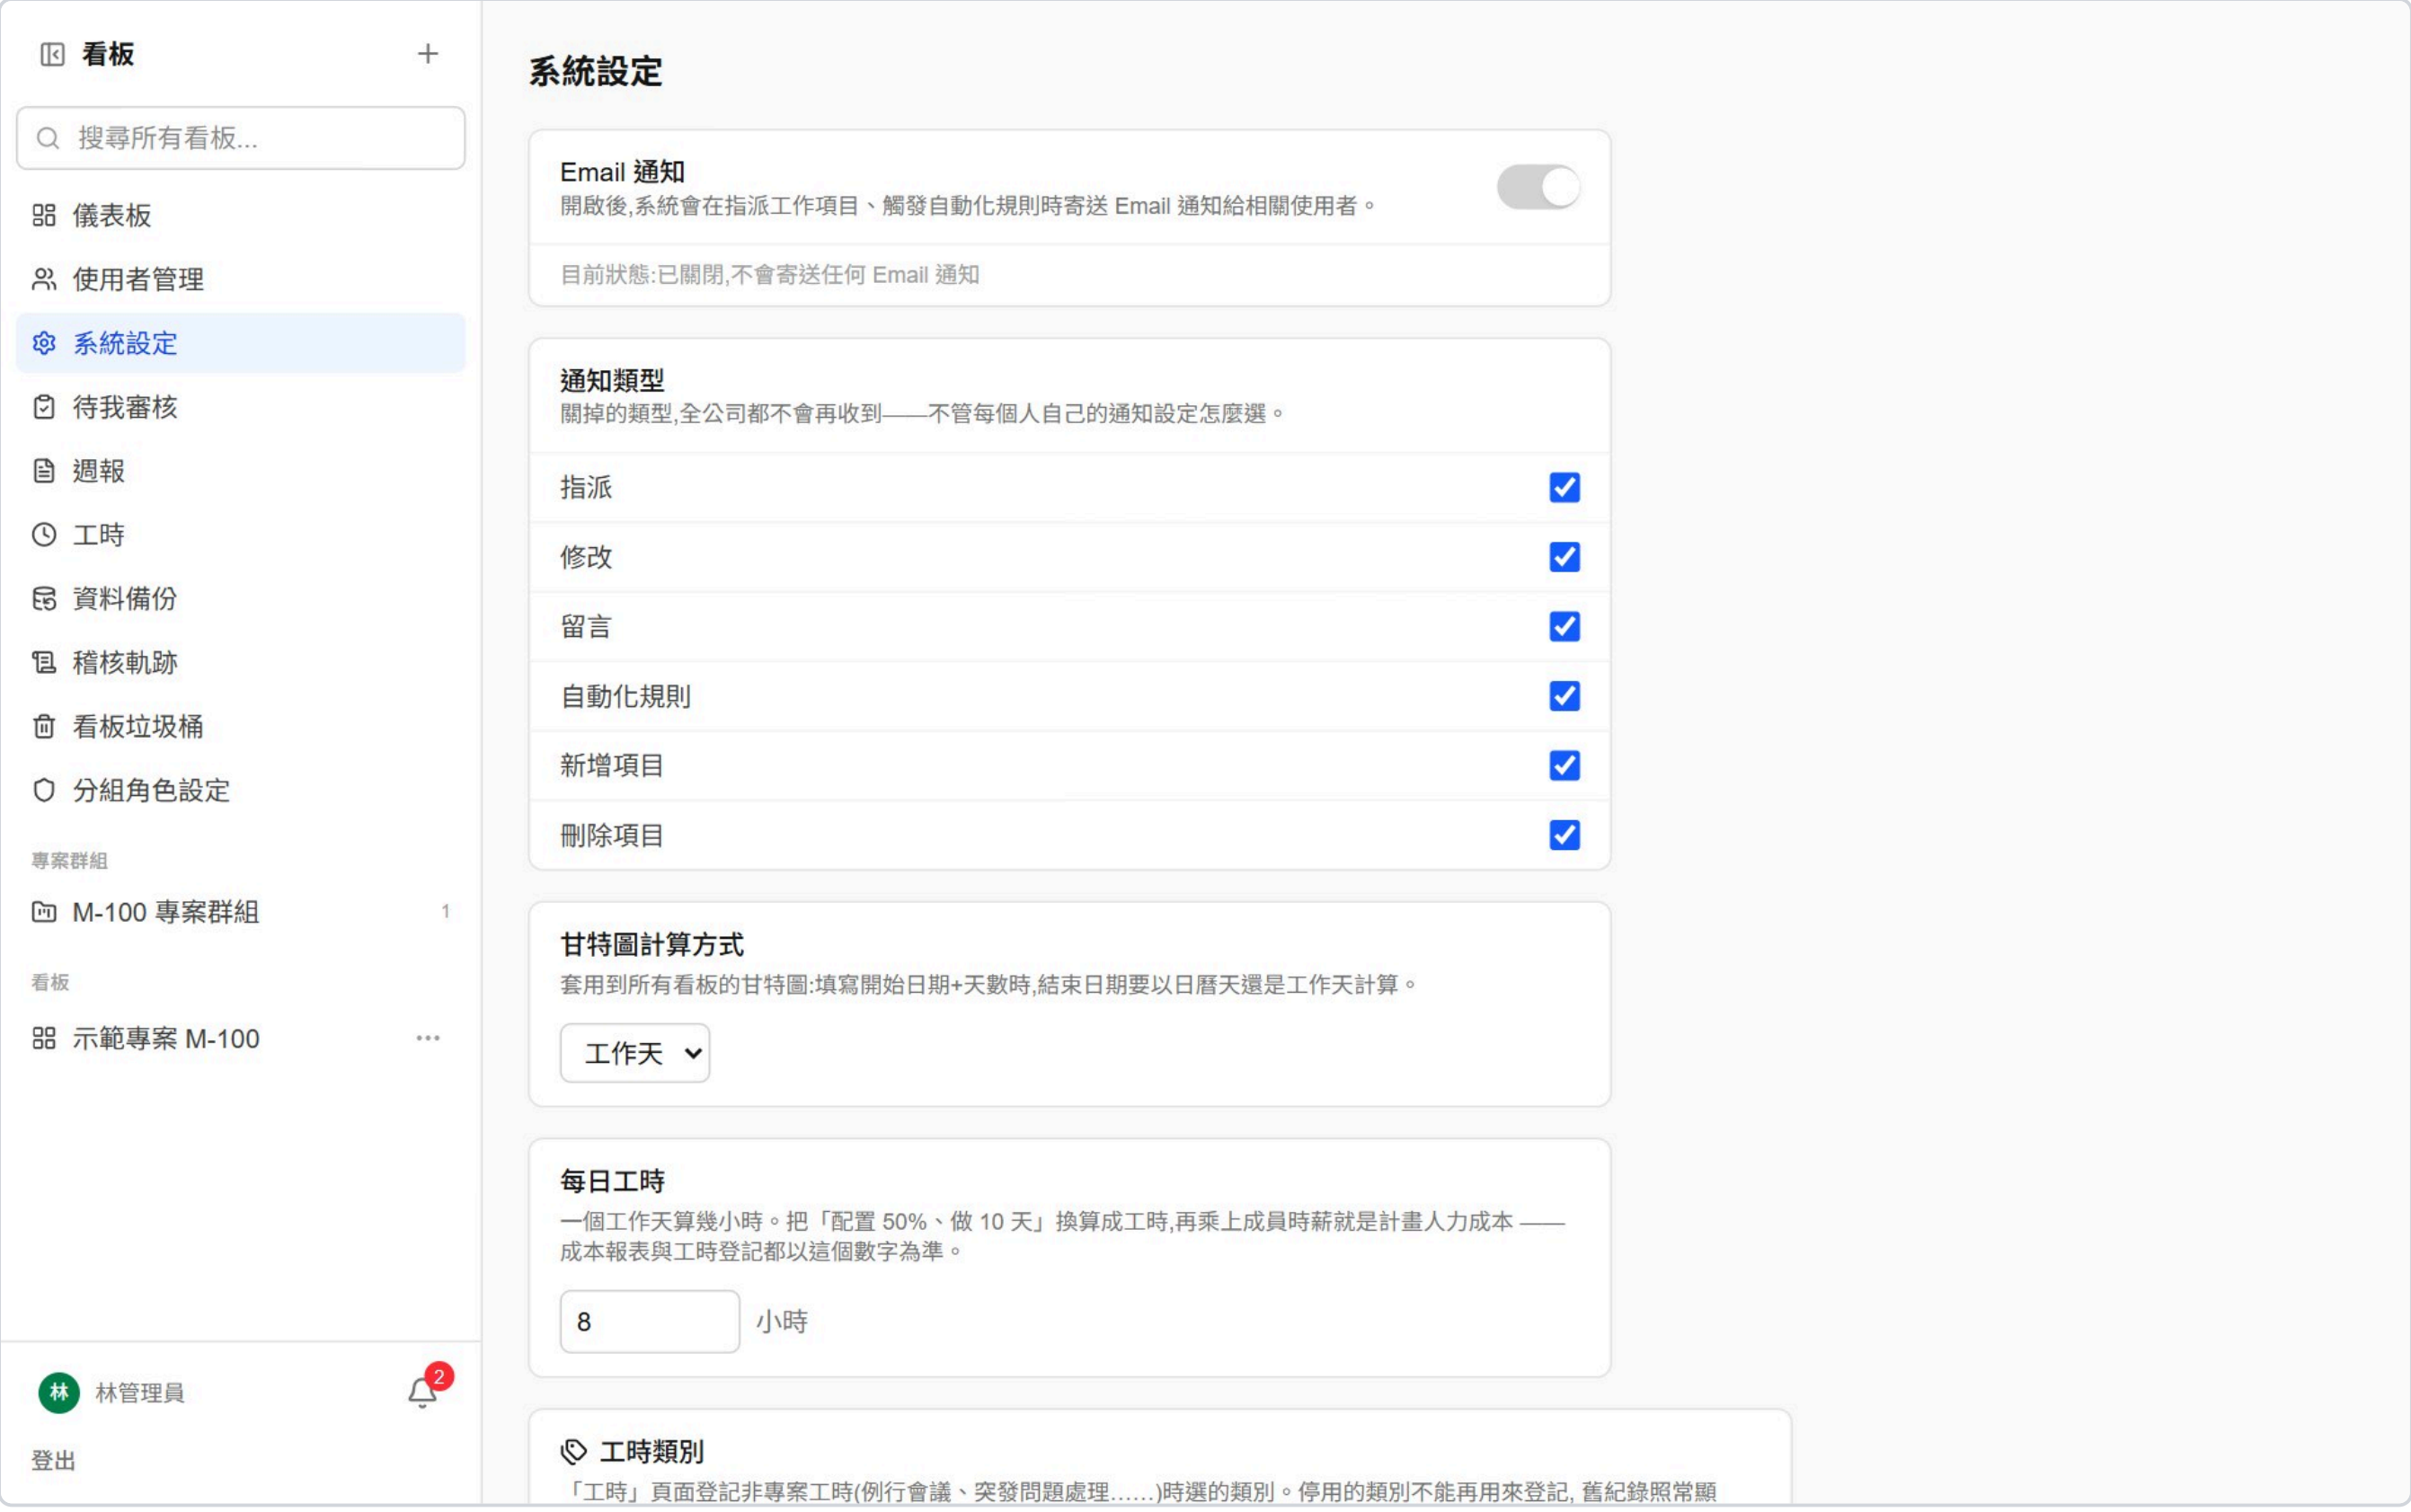
看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
專案群組
M-100 專案群組
1
看板
示範專案 M-100
林
林管理員
2
登出

系統設定

Email 通知
開啟後,系統會在指派工作項目、觸發自動化規則時寄送 Email 通知給相關使用者。

目前狀態:已關閉,不會寄送任何 Email 通知

通知類型
關掉的類型,全公司都不會再收到——不管每個人自己的通知設定怎麼選。

- 指派 ☑
- 修改 ☑
- 留言 ☑
- 自動化規則 ☑
- 新增項目 ☑
- 刪除項目 ☑

甘特圖計算方式
套用到所有看板的甘特圖:填寫開始日期+天數時,結束日期要以日曆天還是工作天計算。

工作天

每日工時
一個工作天算幾小時。把「配置 50%、做 10 天」換算成工時,再乘上成員時薪就是計畫人力成本 —— 成本報表與工時登記都以這個數字為準。

8 小時

工時類別
「工時」頁面登記非專案工時(例行會議、突發問題處理……)時選的類別。停用的類別不能再用來登記, 舊紀錄照常顯

系統設定是一整頁的卡片,由上到下:

卡片	用途
Email 通知	開關。開啟後,指派工作項、觸發自動化時會寄 Email
通知類型	全公司要不要產生某一類通知(關掉就不管個人設定,站內與 Email 都不產生)
甘特圖計算方式	**日曆天**或**工作天**(套用到所有看板)
每日工時	一個工作天算幾小時,用來把「配置 50%、做 10 天」換算成工時與成本
工時類別	會議與其他工時的類別、是否可連結風險 / 議題、是否「可對應專案」(開了才能選專案,對應專案的要核准)、啟用 / 停用
公司組織單位	人力表欄位、名額單位與使用者所屬單位(EE、ME...)共用的清單;每個單位可以**對應組織架構圖的部門**,見下
簽核層級	請假、工時(主管這一條路)要幾階主管都同意才算核准:直屬主管、直屬 + 二階......最多五階;誰是幾階主管看組織架構圖。見第 18 章
單位標準月薪與人月換算	每個單位的標準月薪,供人力預算在還不知道是誰做的時候估算金額
匯率	預算的外幣換算(1 單位外幣等於多少台幣)

卡片	用途
國定假日	工作天計算時不計入天數的日子
階層顏色	依 Lvl 1–6 設表格整列背景色
甘特圖項目名稱顏色	逾期 / 完成 / 實作中 的名稱顏色
狀態欄位顏色	每個狀態選項的顏色(表格、看板、甘特圖、報表同步變)
Pred 燈號顏色	可開始 / 等待中 / 被阻擋
工作量顏色門檻	儀表板負載百分比的顏色分界
負責人預設工作量	只掛在負責人欄位、沒有人員分配的人,算幾 % 的工作量(預設 2%,0 = 不計入)
基準線 (Baseline)	把目前所有項目的起訖與天數存成「原始計畫」,之後長條下面會畫出原計畫;可建立新版、切換、改名、刪除版本
專案群組	建立群組、把看板加入或移出(加入時會重算整個群組排程)
預算可見範圍	勾選組織:被勾的組織的主管,對所有看板都看得到預算金額(見第 2 章)
MantisBT 同步	看板與 Mantis 專案的連線(同步問題到風險與議題;可設定欄位對應,並選擇開啟寫回 Mantis),見 11.5
專案週報排程	每週哪一天、幾點自動寄專案週報(時間下方一行寫著「**上次執行**」:什麼時候跑的、每個專案群組寄出幾封、失敗幾封與原因;停在「進行中」代表跑到一半中斷了。一輪只會寄一次;這一輪**一封都沒寄出去**(例如寄信帳號的密碼被 Google 拒絕)不算跑過,**每 30 分鐘自動重試**,最多重試到設定時間後 3 小時,再失敗就放棄這一輪,原因寫在這一行。旁邊的「**立即執行一次**」(管理者)不等排程,現在就產生並寄出這一輪的週報給各專案群組的收件人,失敗的原因會直接跳出來;有寄出去才把這一輪標成跑過,排程就不會同一週再寄一次);「**產生前提醒同仁更新工作事項**」:週報產生前幾小時先寄信提醒大家(見下);以及「**週報涵蓋的範圍**」:從星期幾到星期幾(預設週三到週二)。手動產生與排程寄的週報都照這個範圍
資料庫備份	見 21.4
專案週報分發	每個專案群組的收件人(現有帳號或外部 Email)與要寄的內容(本週摘要、專案時程與預算、**預算金額**、各部門工作事項、本週異動筆數)
甘特圖欄位設定	每個看板的開始日期、天數、結束日期、前置依賴、關聯類型、Type、Lag、手動開始 / 天數欄位對應;「重算全部」
新看板預設欄位	之後新增的看板要帶哪些欄位;最省事是從一個排好的看板複製
報表設定	每個看板報表用哪個狀態欄位、每個狀態屬於哪個分類

卡片	用途
API / Webhook	唯讀 REST API 金鑰、Webhook(工作項有變動時 POST 到你的網址,以 HMAC 簽章)、MCP 授權
看板分享設定	每個看板公開或限制存取(**看板擁有者也看得到自己看板的這一張**)

公司組織單位怎麼對應架構圖:表格中間有一欄「對應組織架構圖部門」。每個單位(EE、ME...)一列,已對應的部門顯示成藍色標籤(標籤上的 × 可以取消),旁邊的按鈕點開是**勾選清單**——部門依上下層縮排,**可以一次複選好幾個部門**,按「套用」才存。

一個部門可以同時對應好幾個單位(例如品質管理部 = QA + FAE):在 QA 的清單勾品質管理部,再到 FAE 的清單也勾它就行,不會把它從另一個單位搶走。清單裡已經對應別的單位的部門,旁邊的小字會寫「也對應:XX」。沒有自己對應的部門沿用上層部門的對應。

對應之後,使用者管理裡選了那個部門(或它底下沒有自己對應的部門)的人,所屬單位會這樣帶入:對應**只有一個**單位,就直接帶入;對應**好幾個**單位,不替他決定,由你在使用者管理的下拉選單選(他現在的單位已經在其中就維持)。改了對應,已經掛在底下的人也一併更新。取消對應不會把已經帶入的單位清掉。

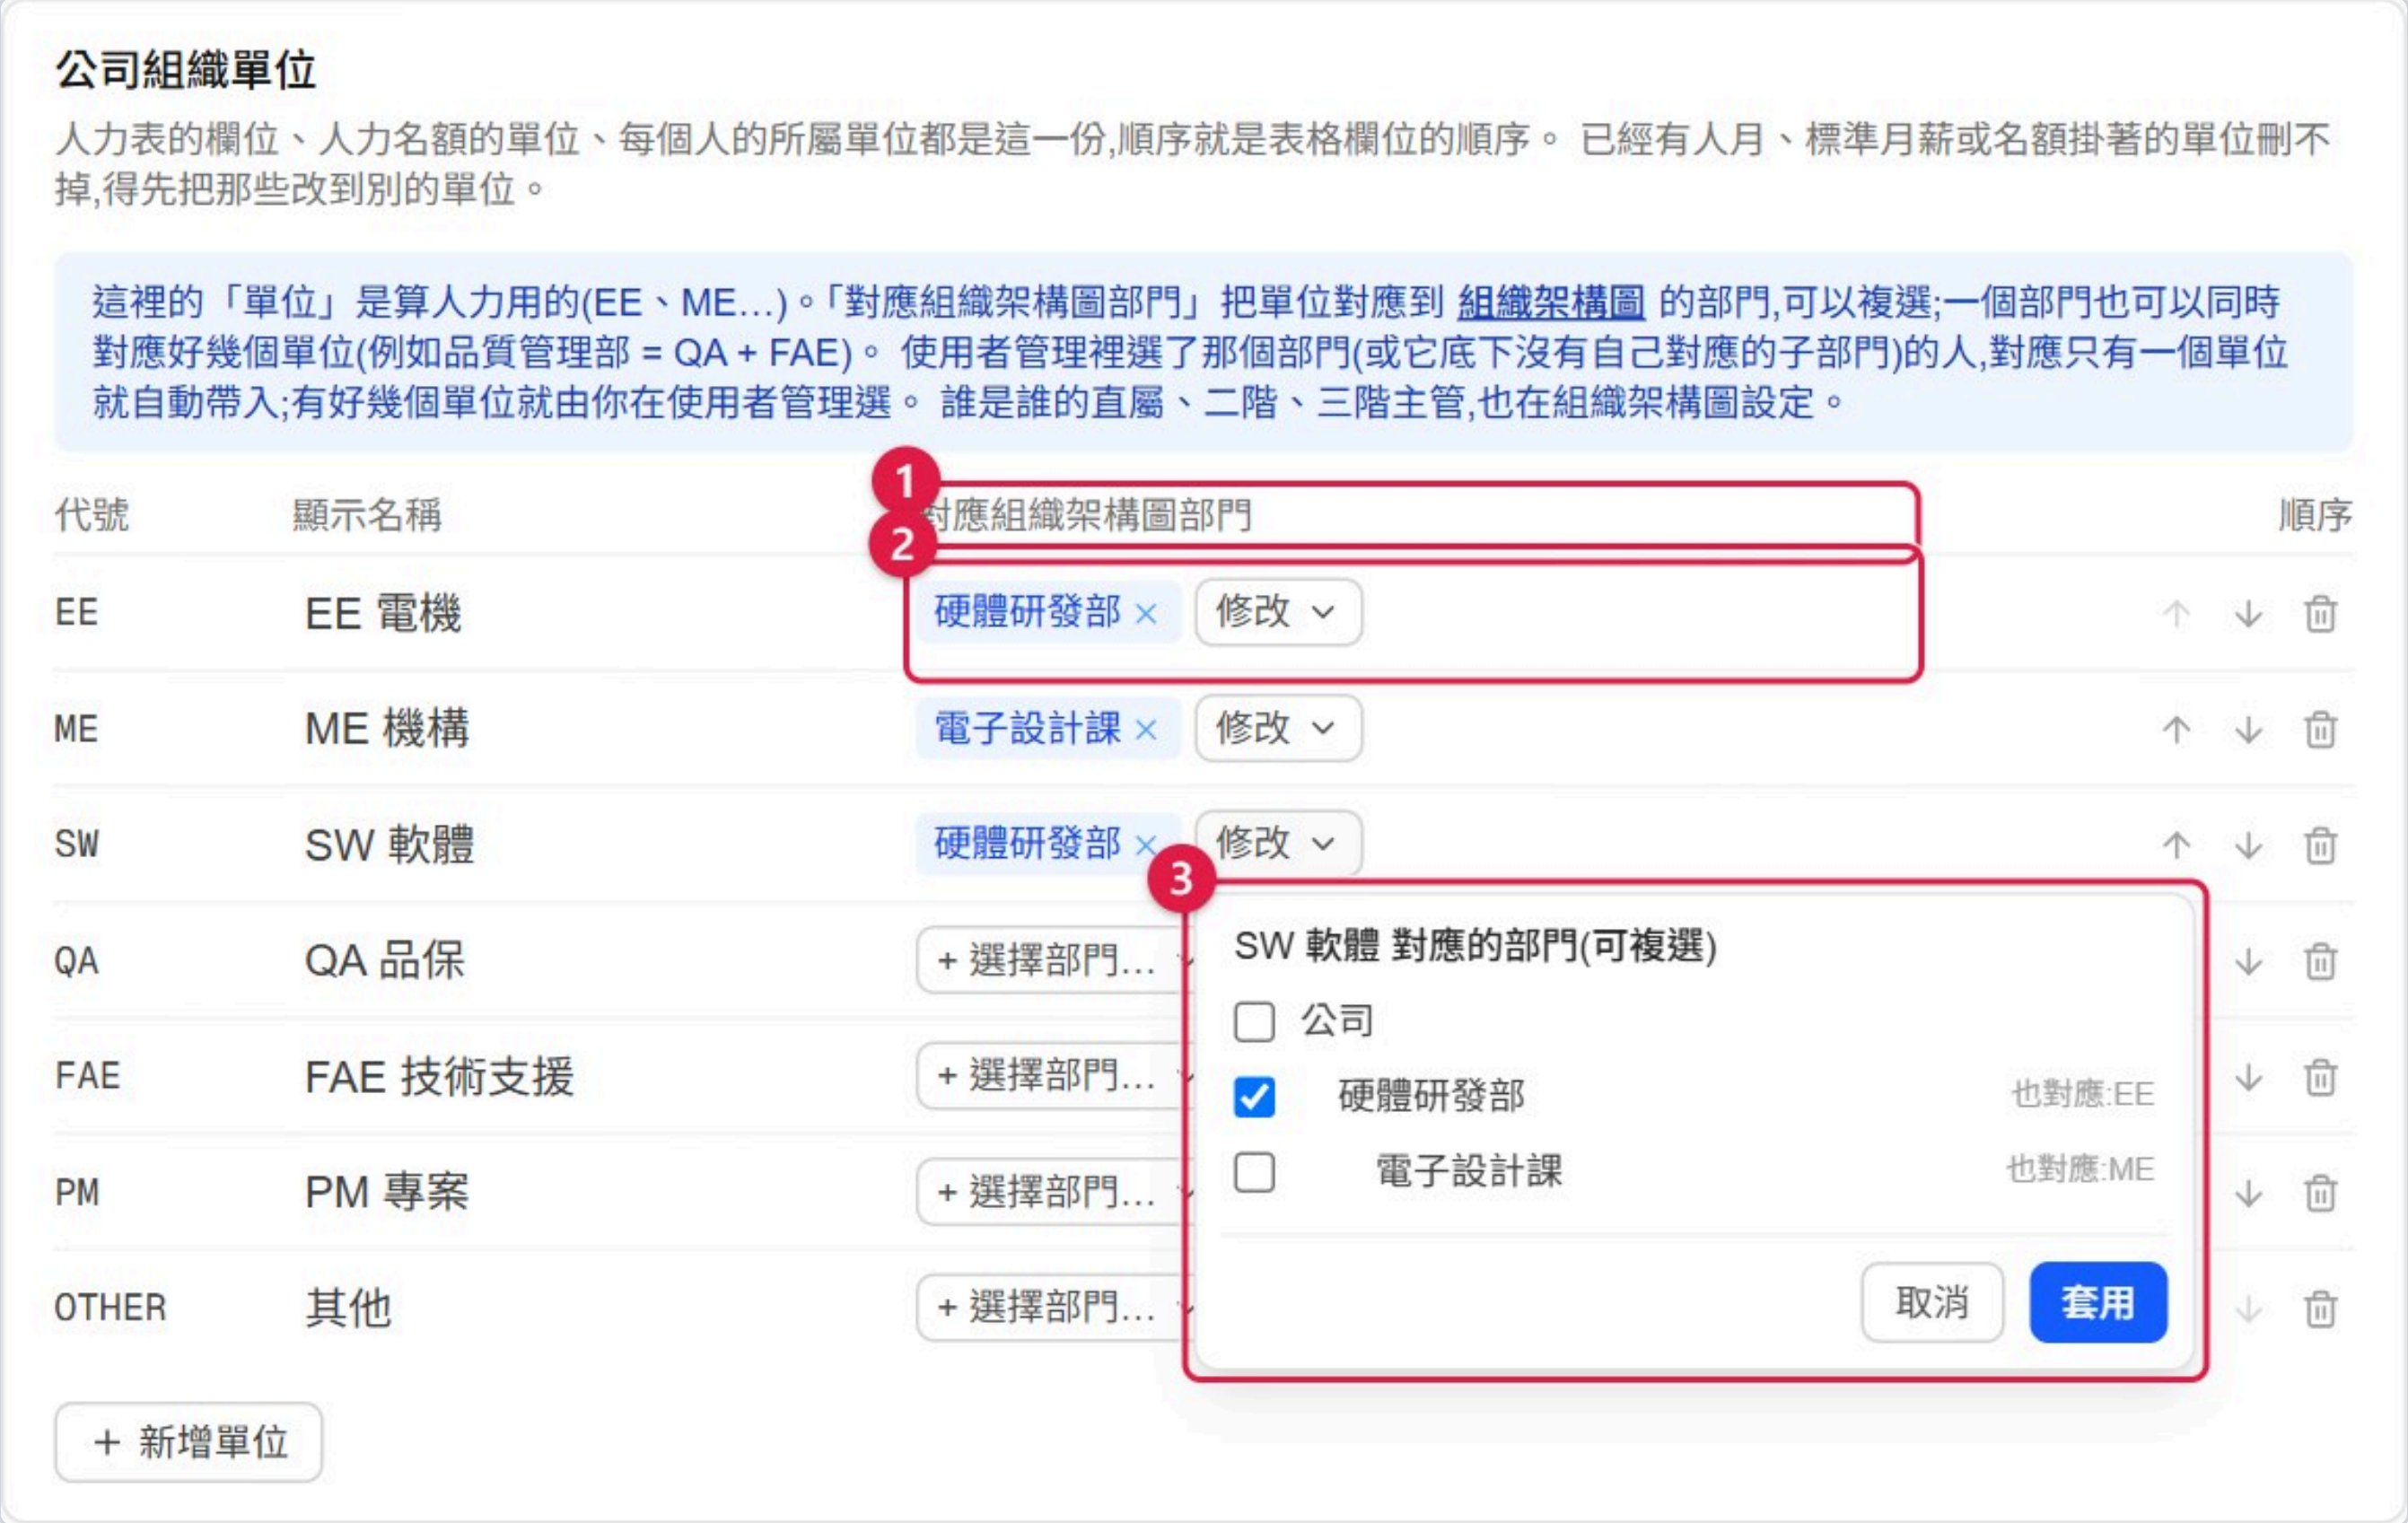

公司組織單位

人力表的欄位、人力名額的單位、每個人的所屬單位都是這一份,順序就是表格欄位的順序。 已經有人月、標準月薪或名額掛著的單位刪不掉,得先把那些改到別的單位。

這裡的「單位」是算人力用的(EE、ME...)。「對應組織架構圖部門」把單位對應到 組織架構圖 的部門,可以複選;一個部門也可以同時對應好幾個單位(例如品質管理部 = QA + FAE)。 使用者管理裡選了那個部門(或它底下沒有自己對應的子部門)的人,對應只有一個單位就自動帶入;有好幾個單位就由你在使用者管理選。 誰是誰的直屬、二階、三階主管,也在組織架構圖設定。

代號	顯示名稱	對應組織架構圖部門	順序
EE	EE 電機	硬體研發部 × 修改	↑ ↓
ME	ME 機構	電子設計課 × 修改	↑ ↓
SW	SW 軟體	硬體研發部 × 修改	↑ ↓
QA	QA 品保	+ 選擇部門…	↓
FAE	FAE 技術支援	+ 選擇部門…	↓
PM	PM 專案	+ 選擇部門…	↓
OTHER	其他	+ 選擇部門…	↓

SW 軟體 對應的部門(可複選)

□ 公司
☑ 硬體研發部 也對應:EE
□ 電子設計課 也對應:ME

圖中 ① 是「對應組織架構圖部門」這一欄;② 是已經對應的部門,按標籤上的 × 取消;③ 是按「修改」(還沒有對應時是「+ 選擇部門…」)開啟的勾選清單,可以複選,按「套用」才存——EE 與 SW 都對應到硬體研發部,清單裡硬體研發部旁邊就會寫「也對應:EE」。

Google 日曆匯入(工時用)需要的設定:沿用匯入 Google Sheet 同一組 Google OAuth 用戶端 (`GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET`)與同一個回呼網址(`/api/auth/google/callback`),不必另外登記。管理者要在 Google Cloud 專案做兩件事:**啟用「Google Calendar API」**,並在 OAuth 同意畫面加上唯讀行程的範圍 `https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly` 。沒做的話,同仁連結後會看到「Google 拒絕讀取日曆」的說明。任何登入的人都可以連結自己的日曆,不限管理者。

21.4 資料庫備份與還原【管理者】

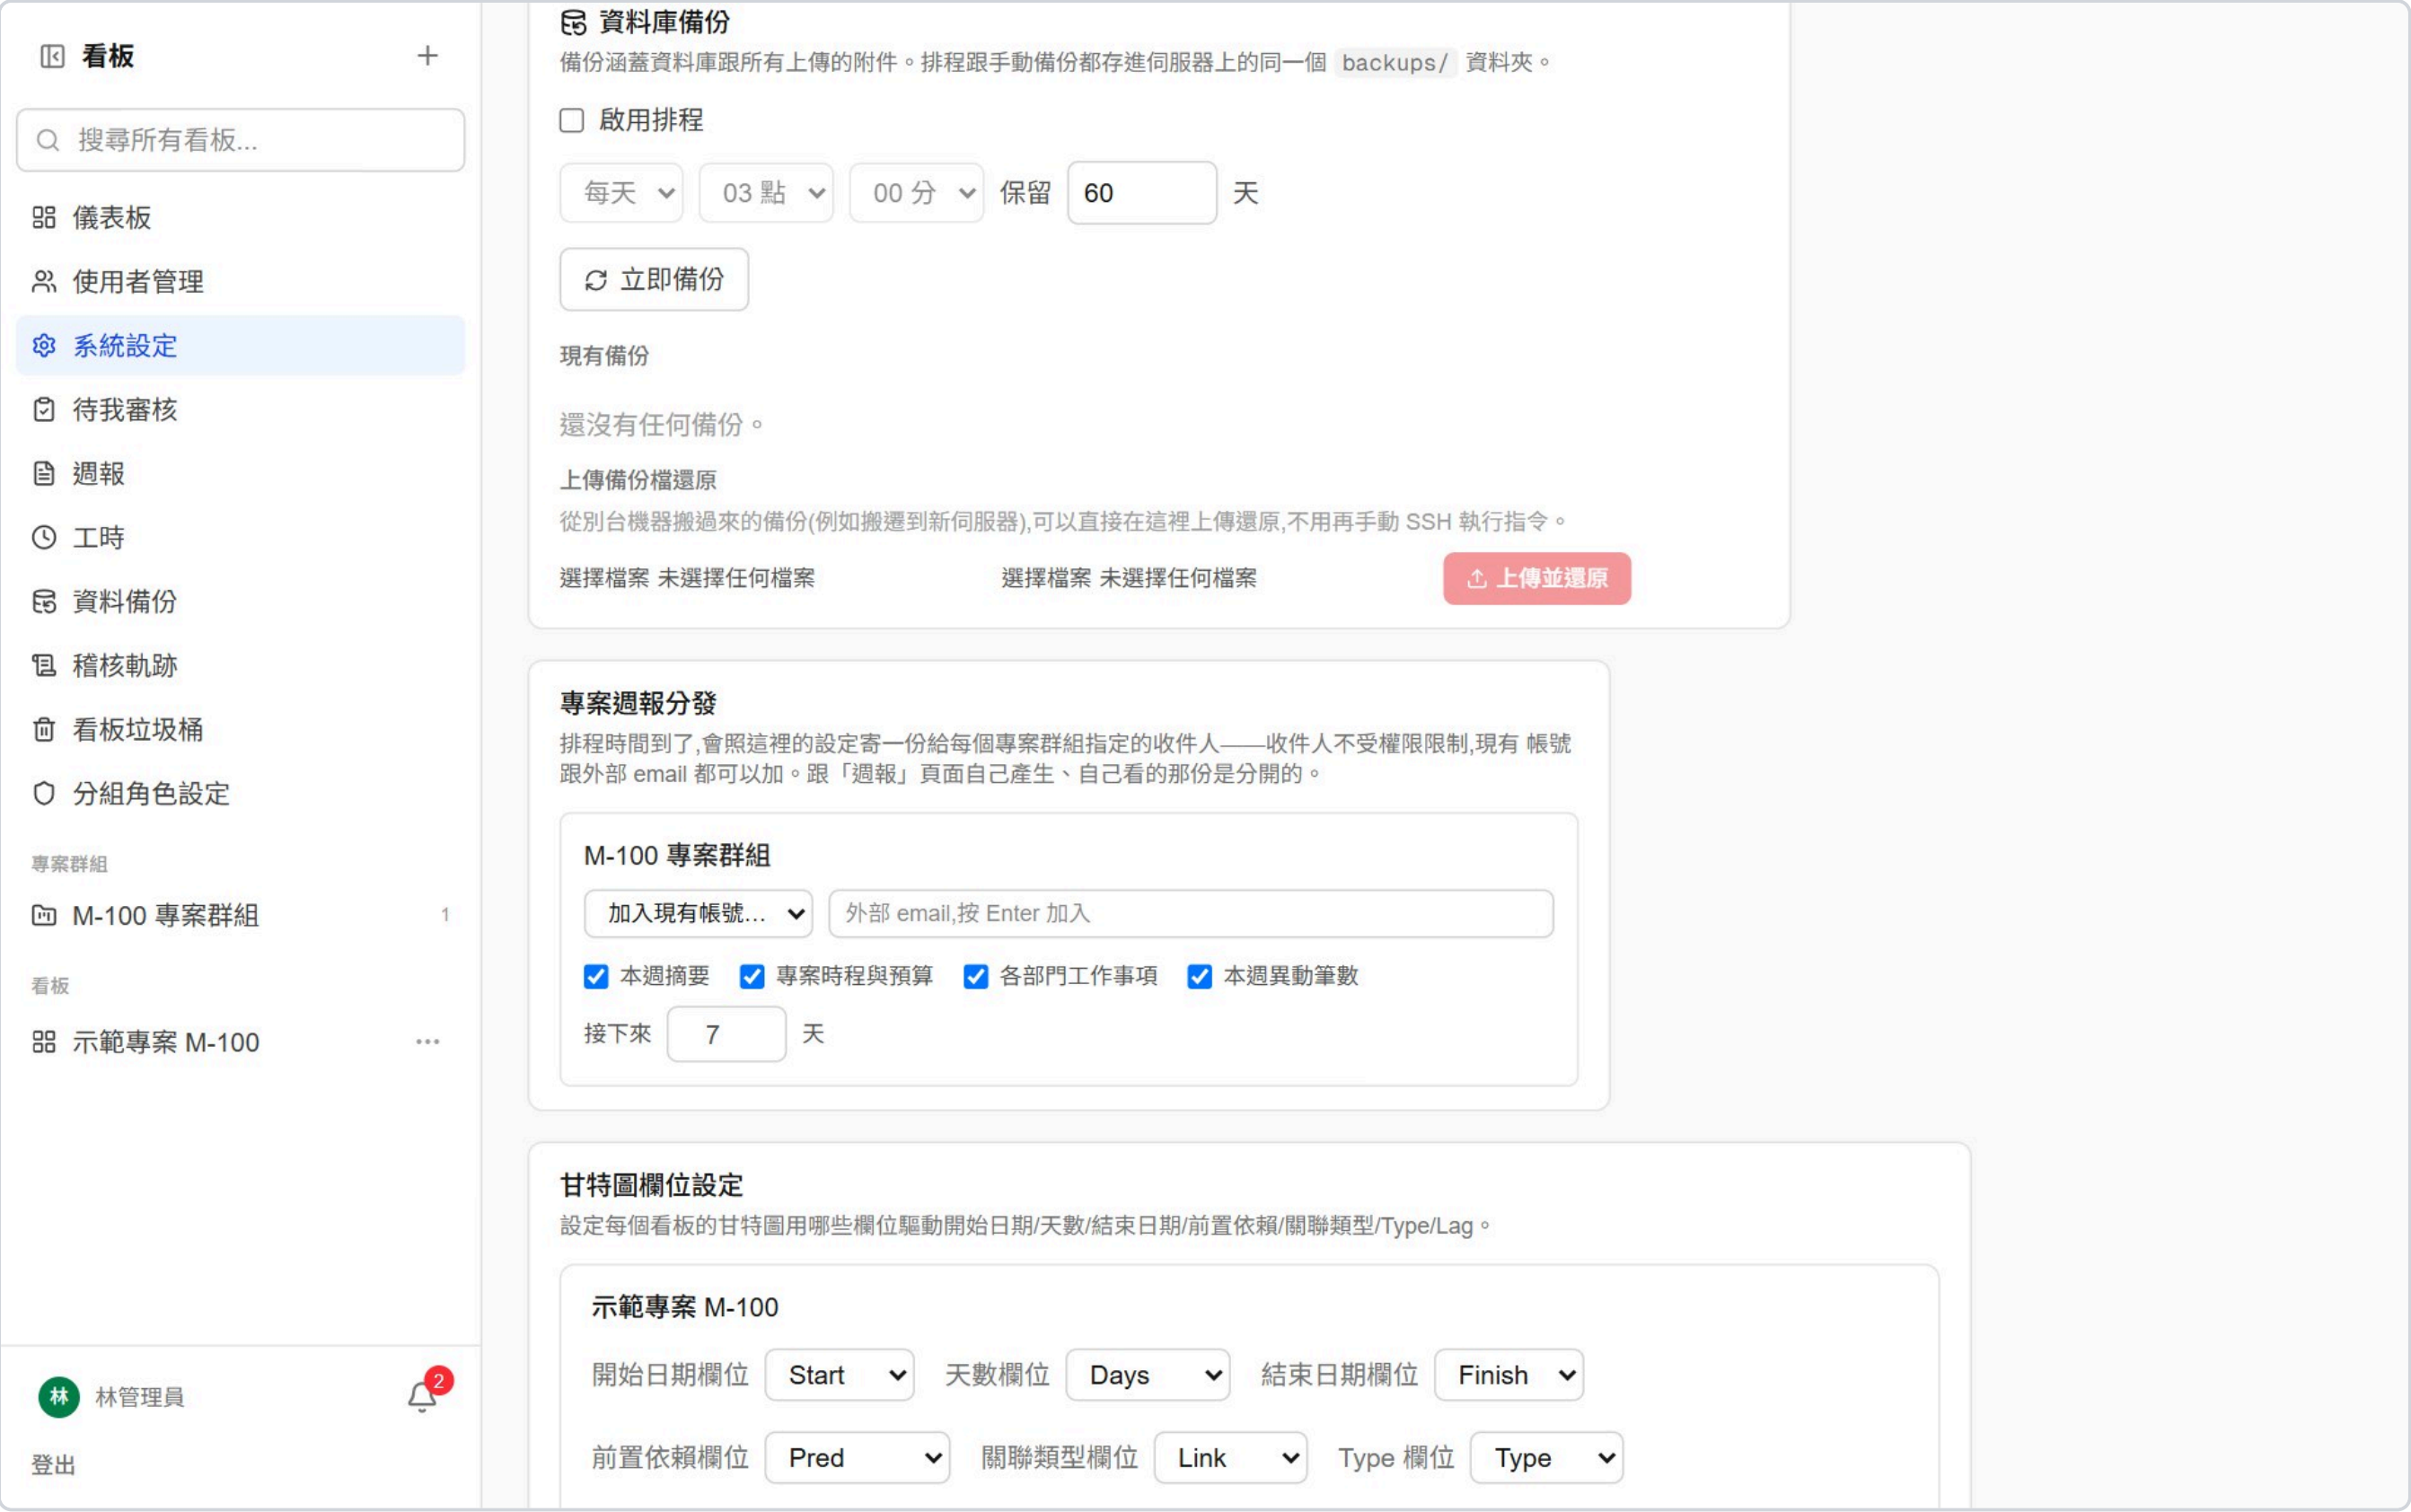

資料庫備份

備份涵蓋資料庫跟所有上傳的附件。排程跟手動備份都存進伺服器上的同一個 `backups/` 資料夾。

☐ 啟用排程

每天 03 點 00 分 保留 60 天

立即備份

現有備份

還沒有任何備份。

上傳備份檔還原

從別台機器搬過來的備份(例如搬遷到新伺服器),可以直接在這裡上傳還原,不用再手動 SSH 執行指令。

選擇檔案 未選擇任何檔案　選擇檔案 未選擇任何檔案　上傳並還原

專案週報分發

排程時間到了,會照這裡的設定寄一份給每個專案群組指定的收件人——收件人不受權限限制,現有 帳號跟外部 email 都可以加。跟「週報」頁面自己產生、自己看的那份是分開的。

M-100 專案群組

加入現有帳號… 外部 email,按 Enter 加入

☑ 本週摘要 ☑ 專案時程與預算 ☑ 各部門工作事項 ☑ 本週異動筆數

接下來 7 天

甘特圖欄位設定

設定每個看板的甘特圖用哪些欄位驅動開始日期/天數/結束日期/前置依賴/關聯類型/Type/Lag。

示範專案 M-100

開始日期欄位 Start　天數欄位 Days　結束日期欄位 Finish

前置依賴欄位 Pred　關聯類型欄位 Link　Type 欄位 Type

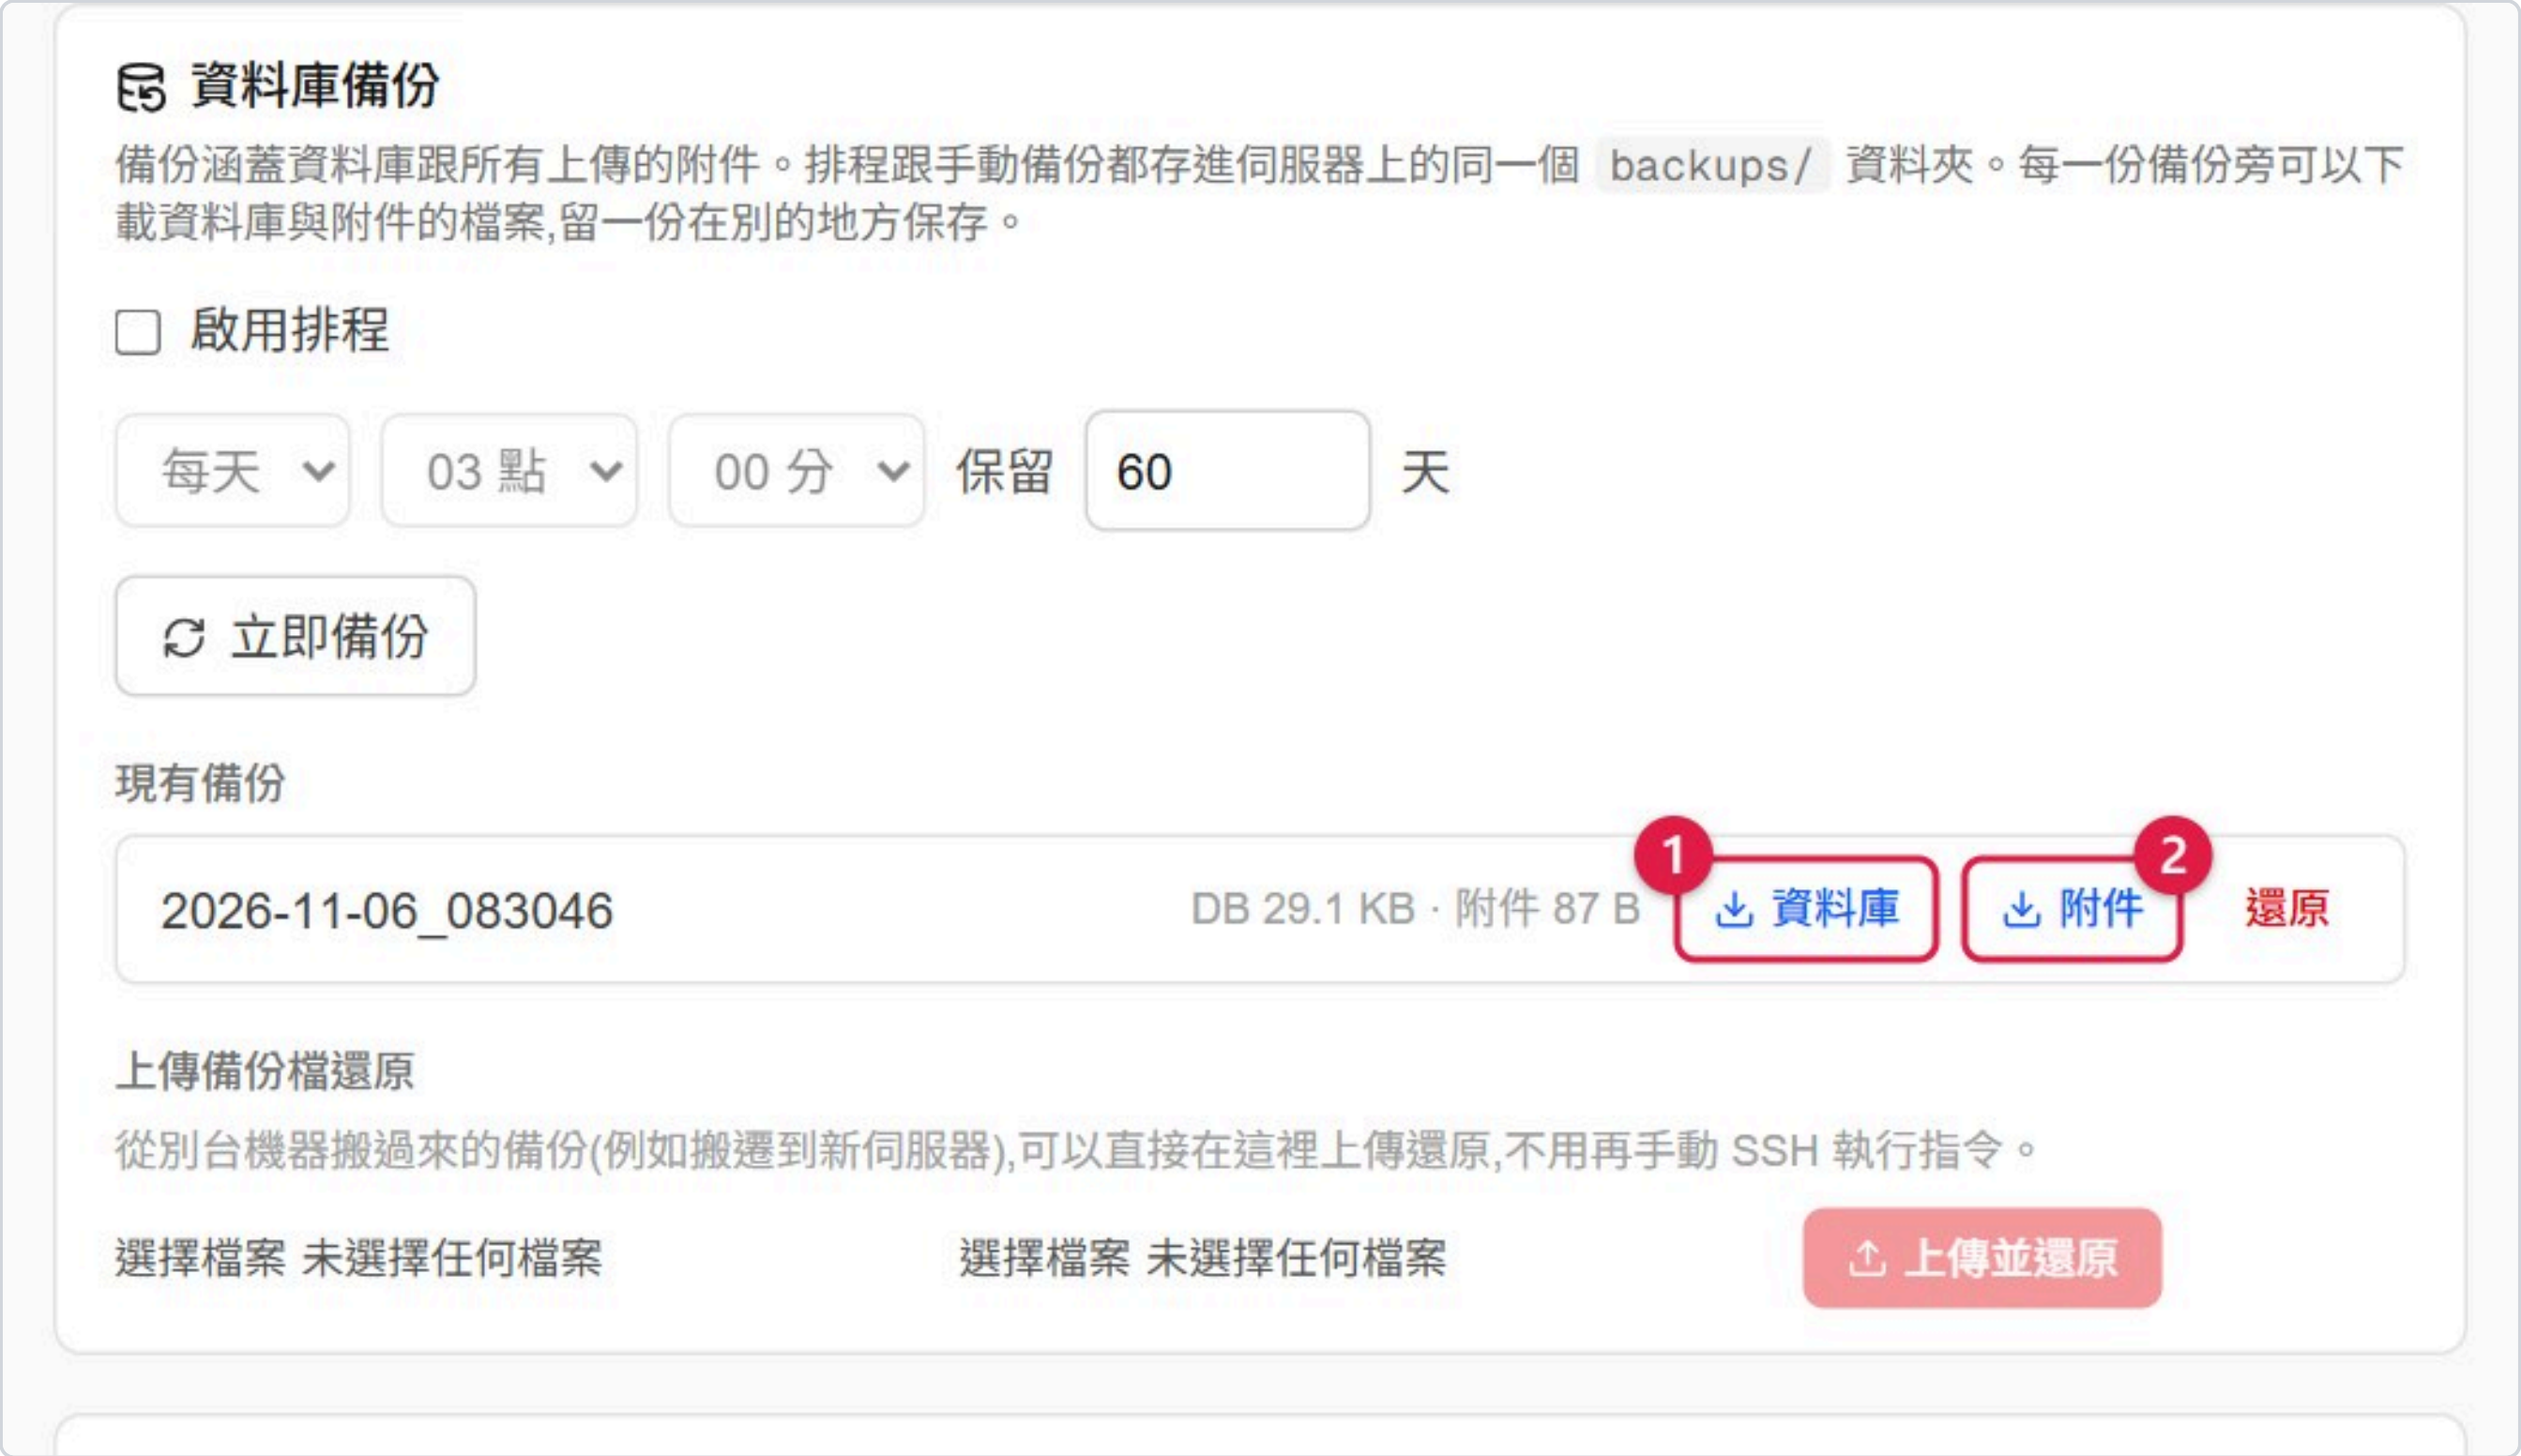

資料庫備份

備份涵蓋資料庫跟所有上傳的附件。排程跟手動備份都存進伺服器上的同一個 `backups/` 資料夾。每一份備份旁可以下載資料庫與附件的檔案,留一份在別的地方保存。

□ 啟用排程

每天 03 點 00 分 保留 60 天

現有備份

2026-11-06_083046 DB 29.1 KB · 附件 87 B

上傳備份檔還原

從別台機器搬過來的備份(例如搬遷到新伺服器),可以直接在這裡上傳還原,不用再手動 SSH 執行指令。

選擇檔案 未選擇任何檔案 選擇檔案 未選擇任何檔案

- **排程**:勾「啟用排程」,選每天或每週、時間、保留天數(超過的舊備份自動清掉)。備份涵蓋資料庫與所有上傳的附件,存在伺服器的 `backups/` 資料夾。
- **立即備份**:馬上做一份。
- **現有備份**:列出所有備份(時間戳記就是那一天幾點幾分做的)與大小。**要哪一天的就下載那一列:** **①「資料庫」**下載資料庫的備份檔(.sql.gz)、**②「附件」**下載所有上傳附件的備份檔(.tgz,那一份沒有附件檔就沒有這個連結);點「還原」是還原成那一份。
    - 下載給別的地方保存,或搬到別台伺服器用「上傳備份檔還原」時,**兩個檔都要下載**(資料庫與附件各一個)。
    - 只有管理者能下載(備份有整個資料庫與所有附件);每次下載都會在稽核紀錄留一筆「下載備份檔」。檔案很大時,瀏覽器會邊下載邊顯示進度,不用等伺服器整份讀完。
- **上傳備份檔還原**:把別台機器的備份檔上傳還原,例如搬遷伺服器時。
- **伺服器磁碟空間**(備份區塊下面那張卡片,見下圖):備份、週報檔案、上傳的附件各佔多少,以及它們所在的磁碟還剩多少;按「**重新檢查**」重讀。剩餘空間低於 **10 GB 或 15%** 標「快滿了」,低於 **2 GB 或 5%** 標「危險」,這時**管理者的儀表板最上面**也會出現警示卡(平常不出現)。備份會一直長——磁碟滿了,新的備份、上傳與部署都會寫不進去——快滿的時候先看哪個資料夾最大,把舊備份複製到別處後再清掉,並把上面的保留天數調短。

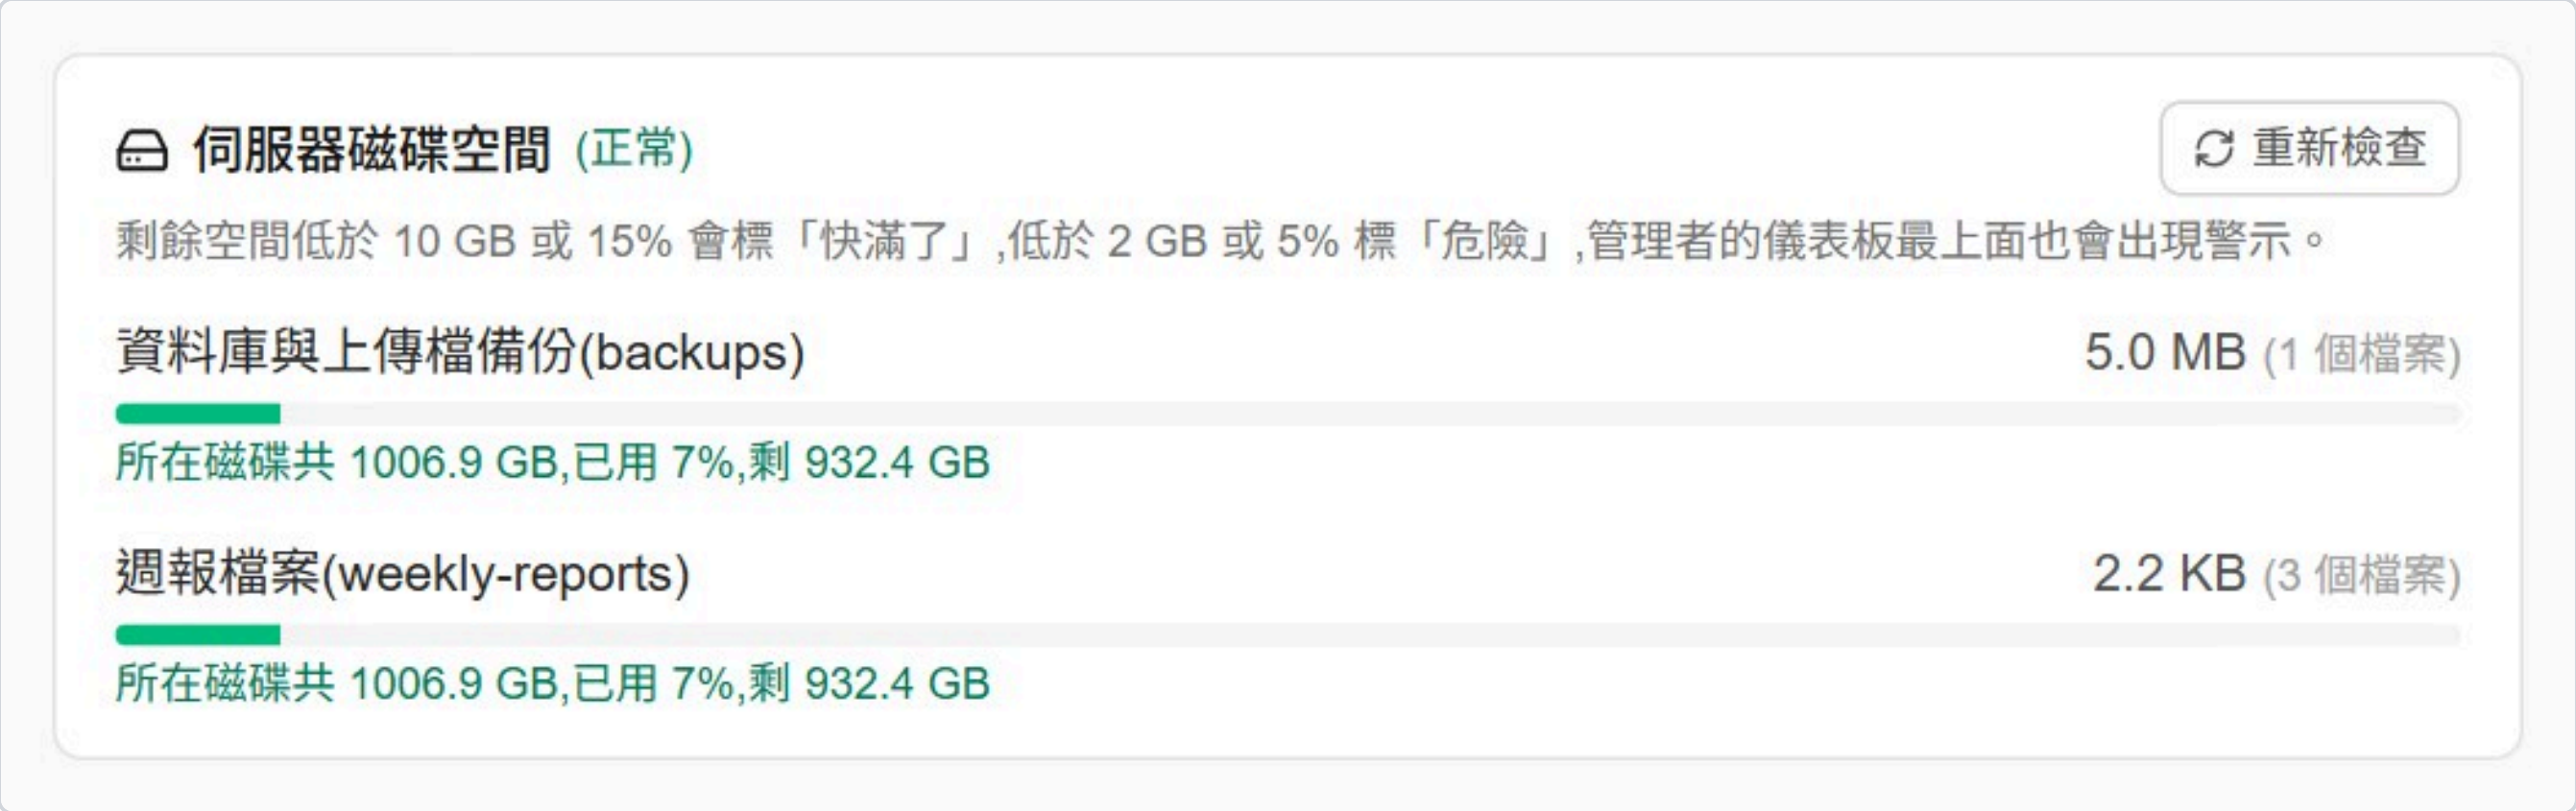

伺服器磁碟空間 (正常)

剩餘空間低於 10 GB 或 15% 會標「快滿了」,低於 2 GB 或 5% 標「危險」,管理者的儀表板最上面也會出現警示。

資料庫與上傳檔備份(backups) 5.0 MB (1 個檔案)

所在磁碟共 1006.9 GB,已用 7%,剩 932.4 GB

週報檔案(weekly-reports) 2.2 KB (3 個檔案)

所在磁碟共 1006.9 GB,已用 7%,剩 932.4 GB

- ⚠ **還原會蓋掉現有資料庫**。操作前系統會要求你輸入**指定的確認文字**(該份備份的時間戳記或檔名),並會**先自動存一份「還原前」快照**,萬一選錯還救得回來。請在非上班時間、確認沒人在使用時進行。

21.5 帳號與資料的日常維護建議

- 人員異動:在使用者管理改**所屬主管**與**單位**,工時審核與團隊範圍才會正確。
- 離職:先把項目的負責人與指派轉給別人,再刪除帳號(刪除無法復原)。
- 每個月確認一次備份是否正常產生,並定期把備份檔複製到另一台機器。

22. 常見問題

為什麼我拖不動甘特圖的長條?

滑鼠停在長條兩端看提示。常見是:前置依賴決定了日期、這是有子項的父項(範圍由子項統計)、里程碑天數固定,或你沒有調整這個項目時程的權限(只有建立者、管理者、Team Leader / PMD)。

為什麼日期欄位是灰色的、不能改?

它是算出來的:由前置依賴、子項目統計,或(自動排程看板)由 start(set) 加 duration 算出。要改請改它背後的欄位。

父項目的長條比子項目長(或短),為什麼?

父項目的範圍會自動依子項目統計。如果父項目自己有 Pred,就保留依前置排出來的自己的日期,子項目要落在區間內。

不知道怎麼操作,想找對應的說明?

按畫面右下角的「**?**」(1.8):第一個按鈕會直接開使用手冊裡你現在這個畫面的那一章;對不上就搜尋關鍵字;還是不懂,把問題寫下來送給管理者,系統會自動記下你在哪個畫面。

刪錯了怎麼辦?

項目:看板「...」→ 垃圾桶 → 還原。整個看板:側邊欄「看板垃圾桶」。剛剛的修改:「上一步」(第 6 章)。

「上一步」按鈕是灰的?

這次開著的畫面還沒有可以復原的修改,或剛換了看板 / 重新整理。復原只記得這次畫面上自己做的修改。

復原時跳出「無法復原」?

代表那個值在你改完之後又被別人(或另一個分頁)改過,系統為了不蓋掉新的修改而擋下來。重新整理畫面看目前的值,再決定要不要手動改。

為什麼我改不了某一筆風險的內容?

只有建立者、審核人與管理者可以改內容。你若是負責人,只能寫進度更新、切換處理狀態、申請結案(第 11 章)。

風險不能直接改成「已結案」?

要由負責人按「申請結案」,再由**所有審核人**同意才會結案。沒有審核人的舊資料,請先補上審核人。

取代名稱取代錯了,或沒改到子項目?

批次取代不能用「上一步」還原,把「尋找」與「取代為」對調再做一次即可。它只改**打勾的項目本身**,想連子項目一起改,請把子項目也勾起來。

複製的項目沒有指派人員?

複製不帶人員分配、留言、附件、待辦與工時,只帶欄位值與階層。請在複本上重新指派。

我登記的工時沒有出現在成本報表?

專案工時,以及選了「對應專案」的會議、出差交通等工時,要由核准人(專案分組的 Team Leader / PMD、同部門 DM、直屬主管或管理者)在「待我審核」核准後,才會計入那個專案的實際成本;日曆上虛線框的就是還在

待審。沒有對應專案的會議、請假等工時不計入專案成本。

看不到「待我審核」?

只有「有人以你為所屬主管」的主管,以及管理者看得到。

使用者管理裡某個人的「所屬主管」改不了?

他已經掛在組織架構圖的某個部門底下,所屬主管由架構圖決定。請到「組織架構圖」改他的部門或部門主管(21.1b)。

我是二階主管,為什麼沒看到某人的請假(或工時)?

要管理者在「系統設定 → 簽核層級」設成需要二階主管同意,二階主管才會收到;而且要看「組織架構圖」裡你確實是他的二階主管。設定只要一階時,只有直屬主管與管理者看得到。

副主管 / 代理人看不到「待我審核」?

要在組織架構圖裡,該部門加了他為「副主管」,或他的職能有勾「可代簽」,而且那個部門要有設定主管(代簽的是主管那一階)。部門沒有主管、或沒勾「可代簽」的職能,看不到也簽不了。

組織架構圖卡片上的人數怎麼算?

最底層的部門是掛在這個部門的成員加上這個部門的主管(兼任的主管也算);上層部門顯示「共 N 人」,是它底下所有部門的總數,同一個人只算一次(21.1b)。

某個人的人力單位(EE、ME...)自己變了?

他在使用者管理選的組織單位(部門),或那個部門在「系統設定 → 公司組織單位」的對應改了,而且那個部門只對應一個單位時,人力單位就會照新的對應帶入。部門對應好幾個單位時不會自動改,由你在使用者管理選。要讓它不再自動變,可以把那個部門的對應取消。

為什麼某個人的角色自己變成「主管」了?

他被設成某個部門的主管(組織架構圖),而他原本的登入角色是「團隊成員」——部門主管的角色至少是「主管」,所以自動升上去。不會自動降級,也不會動管理者;稽核軌跡有紀錄。升級後他要重新登入,新的權限才生效。

看不到某個看板?

該看板可能是「限制存取」,而你不在名單內。請看板擁有者或管理者在「系統設定 → 看板分享設定」把你加進去。

議題和 Mantis 的「問題」有什麼不一樣?

議題是風險登記冊裡**手動建立**、已經發生的事,內容與結案流程都可以在這邊改;「問題」是從 MantisBT 同步進來的問題單,風險清單的「類型」欄寫「問題」;**預設**內容、狀態都是唯讀(要改請到 Mantis),管理者開啟「寫回」之後,開放的欄位可以在這邊改、存檔會寫進 Mantis;刪除都不行。看板另外有唯讀的「問題」分頁(11.5)。兩者的待辦事項、進度更新、在對話裡用 # 引用的方式都一樣。

對話輸入框打 # 沒有跳出選單?

引用只在看板頻道有,私訊和群組沒有。# 前面要是開頭或空白(`abc#` 不算);# 後面的空白會把選單關掉,要重新引用就再打一次 #。選單裡工作項、風險、議題、問題分成四區,可以收放,打字可以搜尋,Esc 關閉(1.7)。

Mantis 的問題在這邊改不了,或按儲存說「沒有存」?
先看視窗上方的說明:寫「這裡唯讀」代表這個連線沒開寫回(要請管理者到系統設定的「欄位對應與寫回」開啟),欄位是灰的代表那一類沒勾寫回。按儲存之後說明原因的幾種常見情況:Mantis 上那一筆在這之後被別人改過(請管理者先按「立即同步」);那個 API token 的帳號沒有更新問題的權限;Mantis 不允許那個狀態轉換;對不到 Mantis 帳號(Email、姓名、帳號名稱都比對不到,要在「處理人對應」手動指定)。出現這些時,這次的修改都**沒有存**,Mantis 也沒動(11.5)。

我看得到這個看板,為什麼「預算」只剩人力表和樣機計畫?
看得到看板不等於看得到預算金額。預算只給管理者、看板擁有者、Team Leader / PMD / PM DM、看板指名的人,以及系統設定裡指定組織的主管。需要看的話,請看板擁有者或管理者在「系統設定 → 看板分享設定」把你加進「可以看預算金額的人」(第 2 章)。

畫面出現「需要重新整理」或操作一直失敗?
系統剛更新過版本,舊的畫面送出的請求已經對不上。重新整理頁面即可。

帳號被鎖住了?
連續輸入錯誤密碼 5 次會鎖 15 分鐘;請稍等,或請管理者在使用者管理「解除鎖定」。

23. 名詞對照

名詞	說明
WBS 編號	項目名稱前的階層編號,例如 1.2.3,由位置自動產生
Summary(摘要)	有子項目的父項,時間範圍由子項目統計
Milestone(里程碑)	重要節點,時間固定為一天,甘特圖上是星形
Pred(前置依賴)	這個工作要等哪些工作
FS / SS / FF / SF	前置與後續的四種關聯:完成→開始、開始→開始、完成→完成、開始→完成
Lag	前置與後續之間要空的天數,負數代表提前
要徑	專案中總浮時為 0 的工作鏈,延一天整個專案就延一天
浮時	一個工作最多可以延幾天而不影響專案完工
基準線	當初計畫的日期快照,用來比較延遲或提前
BAC / AC / EV / PV	完工總預算 / 實際成本 / 實獲值(已完成的工作值多少錢) / 計畫價值(照計畫今天該完成多少)
CPI / SPI	成本效率 / 進度效率,大於 1 是好的
CV / EAC	成本差異 / 完工預估(照目前效率跑完的總花費)
EMV	風險金額 = 機率 × 發生時的金額
準備金	應變準備金(已知風險用)與管理準備金(沒想到的事用),要「動支」才能花
專案群組	把同一專案的幾個看板放在一起,前置依賴可跨看板
分組角色	某個分組的 Team Leader、DM、PMD 等,在該分組內有額外權限
直屬 / 二階 / 三階主管	由組織架構圖算出來的主管階層:一階是直屬主管,往上依序二階、三階......(最多五階)
組織單位	使用者管理裡每個人所屬的組織架構圖部門;人力單位(EE、ME...)由部門的對應帶入
兼任主管	一個人只掛在一個部門,卻是別的部門的主管;卡片標「(兼任)」,也算在那個部門的人數裡
副主管 / 可代簽	組織架構圖裡部門主管以外的職能。副主管,或勾了「可代簽」的職能,可以代那個部門的主管簽核那一階
多階簽核	請假、工時要直屬以上的多階主管都同意才算核准,各階同時送審;在系統設定的「簽核層級」設定
start(set) / duration	自動排程看板的手動開始日與手動天數
議題	風險登記冊裡**已經發生**的事(風險是還沒發生、有機率的事);手動建立的叫議題

名詞	說明
問題	從 MantisBT 同步進來的問題單;風險清單的類型欄寫「問題」,看板另有唯讀的「問題」分頁(11.5)
預算可見範圍	誰看得到預算金額:管理者、擁有者、Team Leader / PMD / PM DM、看板指名的人、指定組織的主管;看得到看板不等於看得到預算(第 2 章)
寫回(Mantis)	在本系統改了 Mantis 同步來的問題,存檔時一併寫進 Mantis;每個連線在「欄位對應與寫回」開啟,預設關閉(11.5)
待辦事項	工作項、風險、議題、問題底下的小事項:可設期限與處理者、寫備註,到期前會提醒
備註(待辦事項)	待辦事項上記錄進度的文字,最多 1000 字;對話訊息可以接在既有待辦事項的備註後面(1.7)
# 引用	在看板頻道的輸入框打 #,從選單挑工作項、風險、議題或問題,送出後變成點得開的連結(1.7)
樣機計畫	每個產品、用途單位在各階段要幾台樣機;階段欄照人力表的時間排,可拖曳調整(14)
使用樣機	表格上的欄位,記錄這個工作項用到樣機計畫排出來的哪幾台(3)
樣機使用時程	儀表板上每一台樣機被哪些工作項使用的時間軸;長條上的百分比是工作項佔用這台的比例,預設 100%,同一天超過 100% 標紅(16)
說明與問題回報	畫面右下角的「?」按鈕:開對應的手冊章節、選取畫面上的元素(查手冊或回報問題)、搜尋手冊、把問題送給管理者(1.8);管理者在「使用者回報」看(21.2b)
